



揚塵防治 週報表

113/03/11~113/03/17




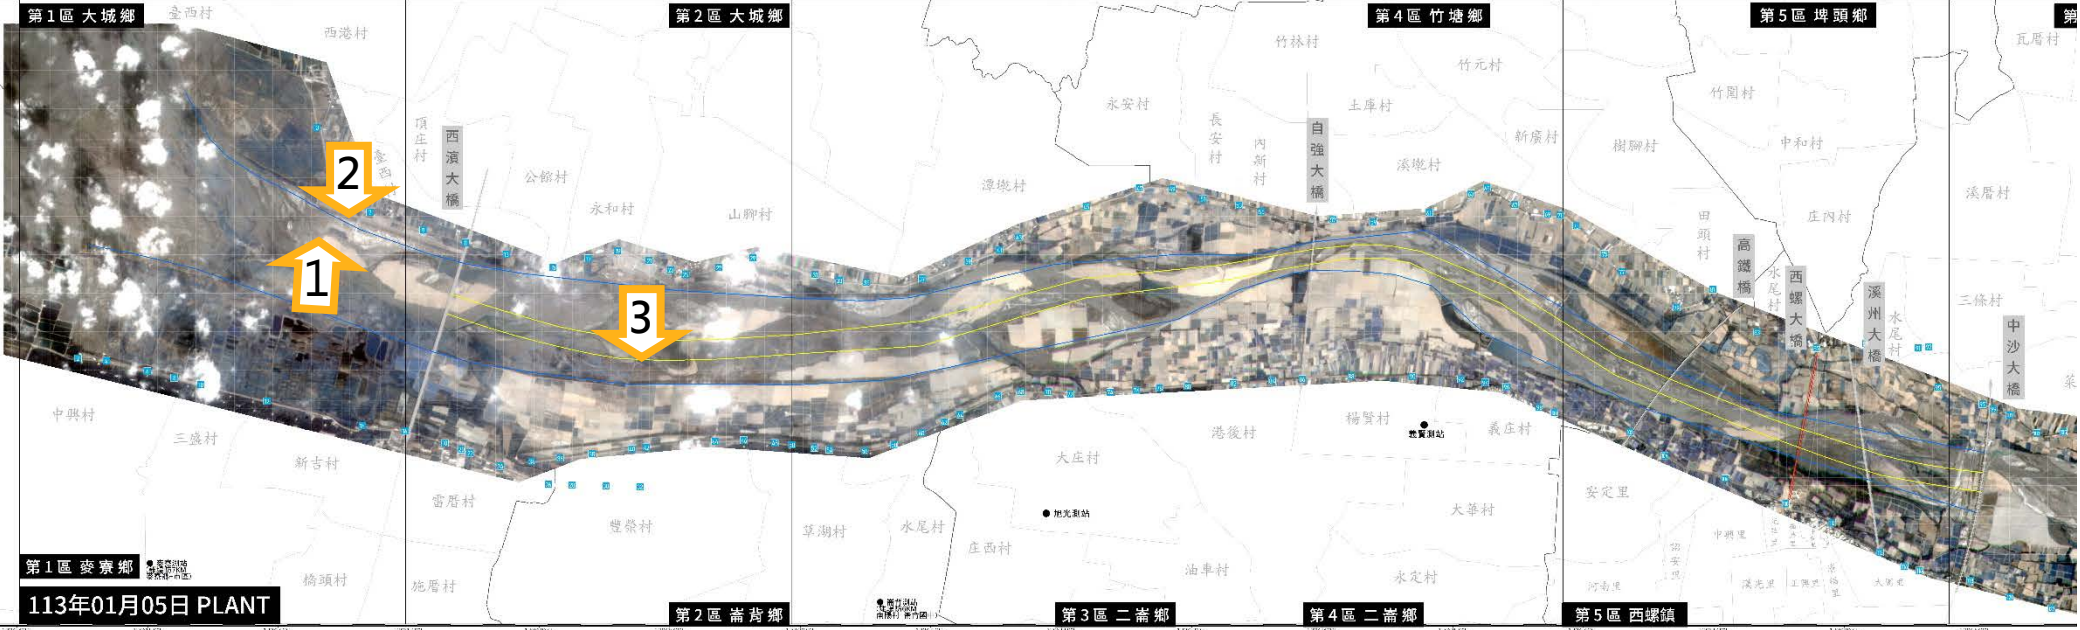


1 5號越堤段河中灘地_鋪設稻草蓆

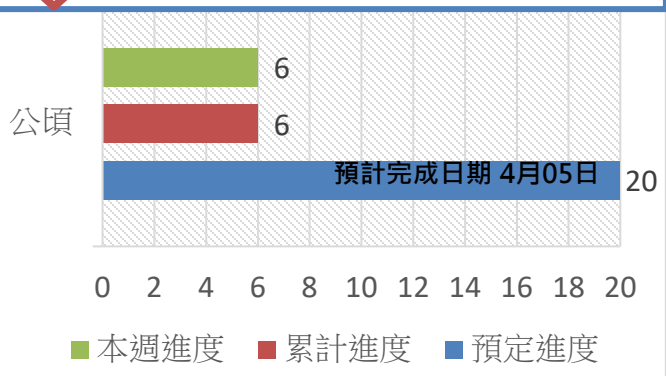

2 7號越堤路段河道灘地_培厚植栽

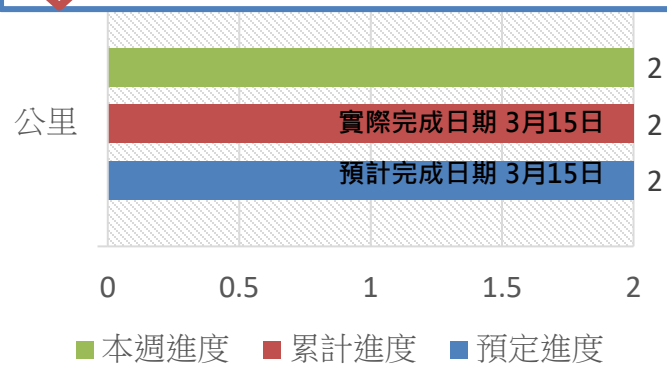

3 40號越堤路段_攔水土堤

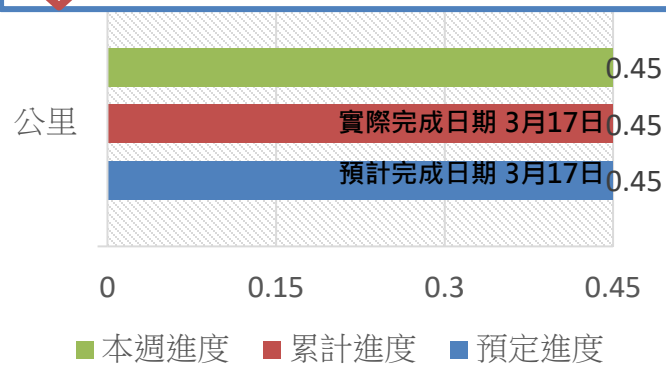

各區 空拍現況


第一區

出海口 0號井



第二區

40號越堤段 上游

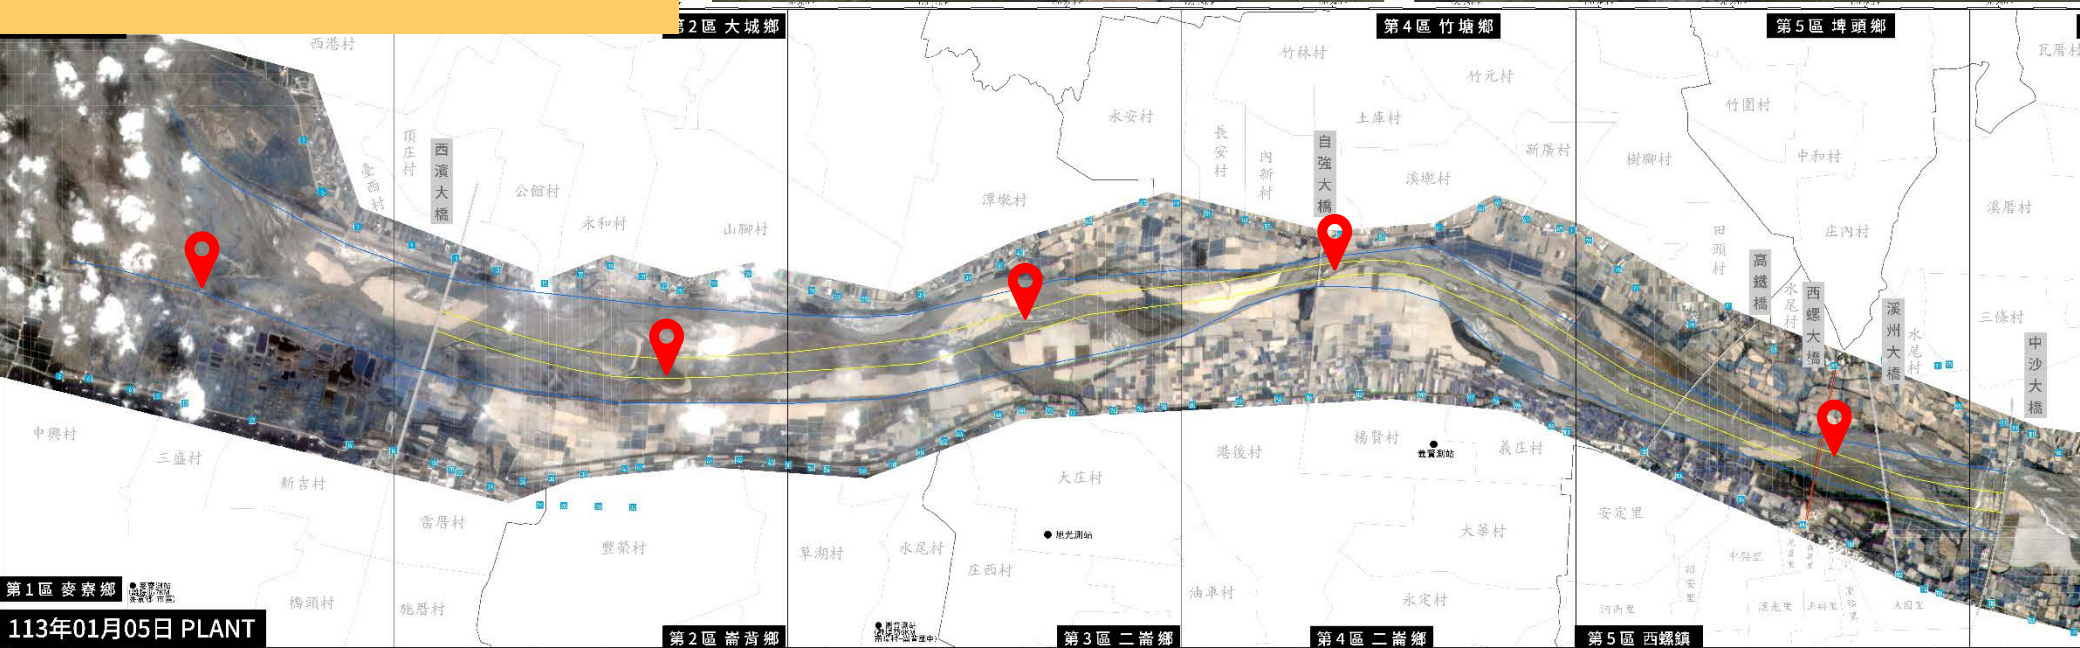

第1區 麥寮鄉 113年01月05日 PLANT 第2區 崙背鄉 第3區 二崙鄉 第4區 二崙鄉 第5區 西螺鎮

第三區

大義崙排水 上游



第四區

自強大橋 上游



第五區

西螺大橋 上游



西螺大橋



112年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:112年5月至113年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值 : 450 公頃
- 已完成 : 342.2 公頃
- 達成率 : 76 %



水覆蓋

- 目標值 : 400 公頃
- 已完成 : 370 公頃
- 達成率 : 92.5 %



河道整理

- 目標值 : 2.5 公里
- 已完成 : 4.4 公里
- 達成率 : 176%



防洪植栽

- 目標值 : 6 公里
- 已完成 : 8.05 公里
- 達成率 : 134.2 %



綠覆蓋

- 目標值 : 50 公頃
- 已完成 : 292公頃
- 達成率 : 584 %



營造複式斷面規劃圖

年度	107-109	110-112	113	114	115	合計
KPI(公里)	8	12	4	4	4	20
實際完成	8	12.23	-	-	-	20.23



113年營造複式斷面進度管控

KPI / 4公里

已完成 / 0 km


達成率/ 0 %

執行進度說明：

- 預計113年度案件執行期間為113年5月起，分署將俟相關契約簽訂後，再行擇期召開工作會議研商進場期程。
- 目前將持續辦理現場已完成複式斷面及相關揚塵措施巡查作業，並依河道內水位及裸露地現況，滾動調整因應及緊急應變作為。

水防道路植栽規劃圖

年度	110	111	112	113	114	115	合計
KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
實際完成	1	2.3	2	-	-	-	5.3

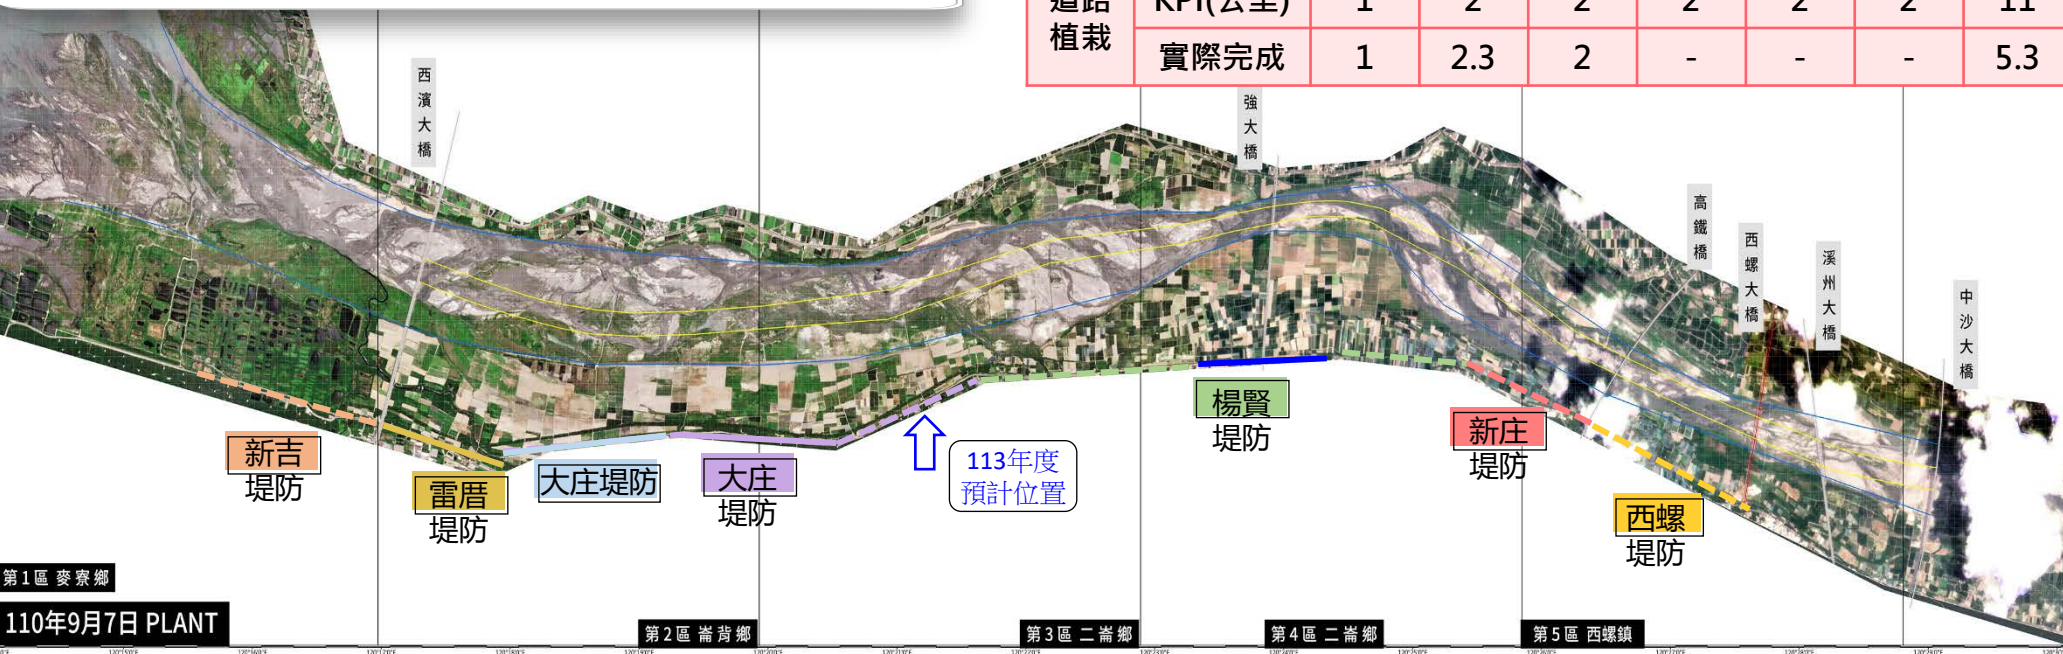

113年水防道路植栽進度管控

KPI / 2公里


已完成 / 0公里

達成率/ 0 %

➤ 執行進度說明：

預計113年度案件執行期間為113年5月起，分署將俟相關契約簽訂後，再行擇期召開工作會議研商進場期程。



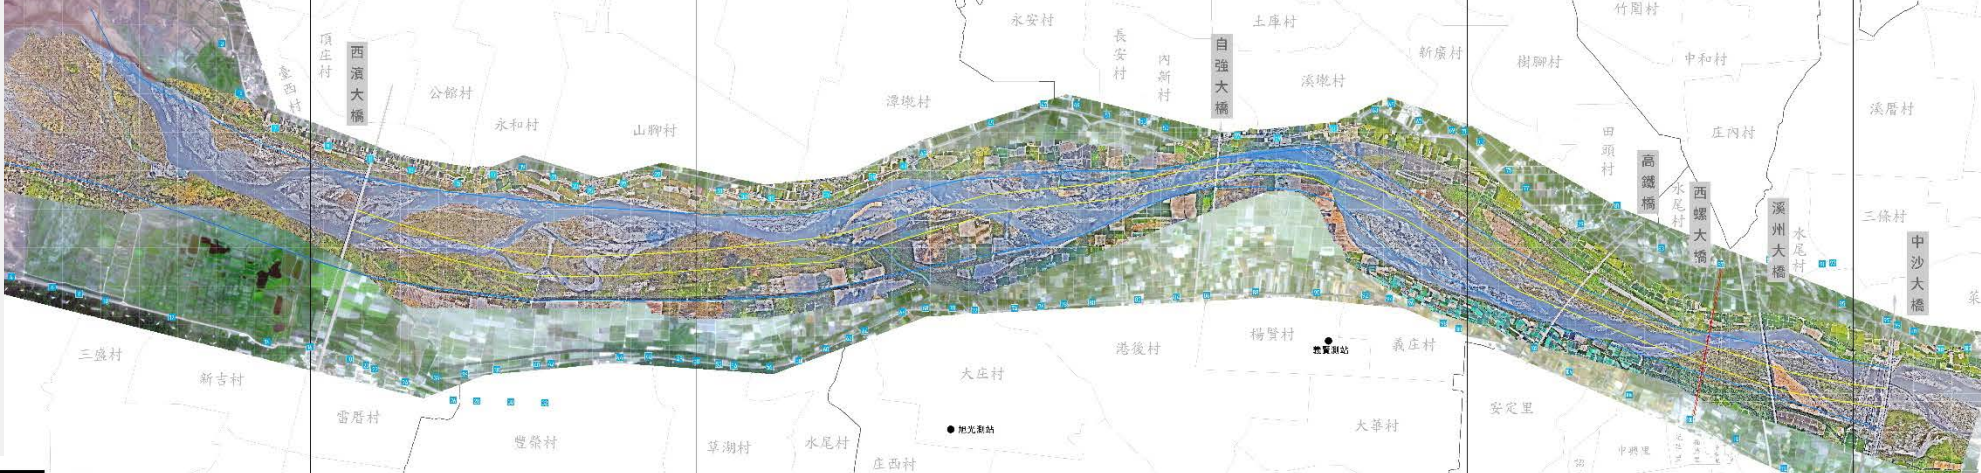

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
	1)西濱橋下游段(北岸)_蓄水池50公頃 2)西濱橋上游南岸_蓄水池60公頃 3)40號越堤路段_蓄水池20公頃	1) 跨河電塔上游_蓄水池40公頃	1)51號越堤段_蓄水池80公頃 2)94號越堤段_蓄水池50公頃 3)高鐵橋下游河道灘地_蓄水池40公頃	1) 溪州大橋上游_蓄水池30公頃
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
1) 7號越堤路段河道灘地_河道整理2公里	1) 40號越堤路段_河道整理0.4公里	1) 跨河電塔下游0.74公里		1) 高鐵橋上游(北岸)1.26公里
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
1) 出海口 23口井灘地_空灑草籽52公頃 2) 西濱大橋下游至7號越堤路_空灑草籽45公頃		1) 跨河電塔上下游低灘地_空灑草籽40公頃	1) 94號越堤段北側河道灘地_空灑草籽55公頃	1) 中沙大橋至溪州大橋灘地_空灑草籽70公頃 2) 西螺大橋上下游河中低灘地_空灑草籽30公頃
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
1) 7號越堤路段河道灘地_培厚植栽2公里。	1) 大庄堤防44-54號越堤_水防道路植栽1.5公里。	1) 自強大橋下游南岸_培厚區植栽1.2公里 2) 大庄堤防62-66號越堤_水防道路植栽0.5公里。	1) 94號越堤路段下游(北岸)_培厚植栽1.6公里	1) 高鐵橋上游(北岸)_培厚植栽1.25公里
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 7號越堤路段_鋪設稻草蓆9公頃 2) 7號越堤路段低灘地B_鋪設稻草蓆5公頃 3) 7號越堤路段河道灘地_簡易灑水系統14公頃 4) 5號越堤河中灘地_稻草蓆鋪設6公頃	1) 40-44號越堤路段_鋪設稻草蓆38公頃 2) 西濱橋下河中島_鋪設稻草蓆47公頃 3) 40號越堤路段培厚區_稻草蓆10公頃	1) 自強大橋下游南岸_培厚區簡易灑水系統6公頃 2) 大義崙上游低灘地_稻草蓆30公頃 3) 跨河電塔上游(北岸)_稻草蓆鋪13公頃 4) 跨河電塔下游(北岸)_稻草蓆鋪18公頃 5) 跨河電塔上下游低灘地_防塵網鋪20公頃 6) 大義崙排水口上游河道灘地_稻草11公頃	1)94號越堤路段_鋪設稻草蓆18公頃 2)51號越堤段上游_鋪設稻草蓆20公頃 3)94號越堤路段下游(北岸)_簡易灑水設施11.2公頃 4)自強大橋上下游低灘地_稻草蓆21公頃	1)溪州大橋上游北岸_稻草蓆鋪設20公頃 2)高鐵橋上游(北岸)_簡易灑水系統10公頃 3)西螺大橋下游_鋪設稻草蓆15公頃
