


揚塵防治 週報表

113/04/01~113/04/07



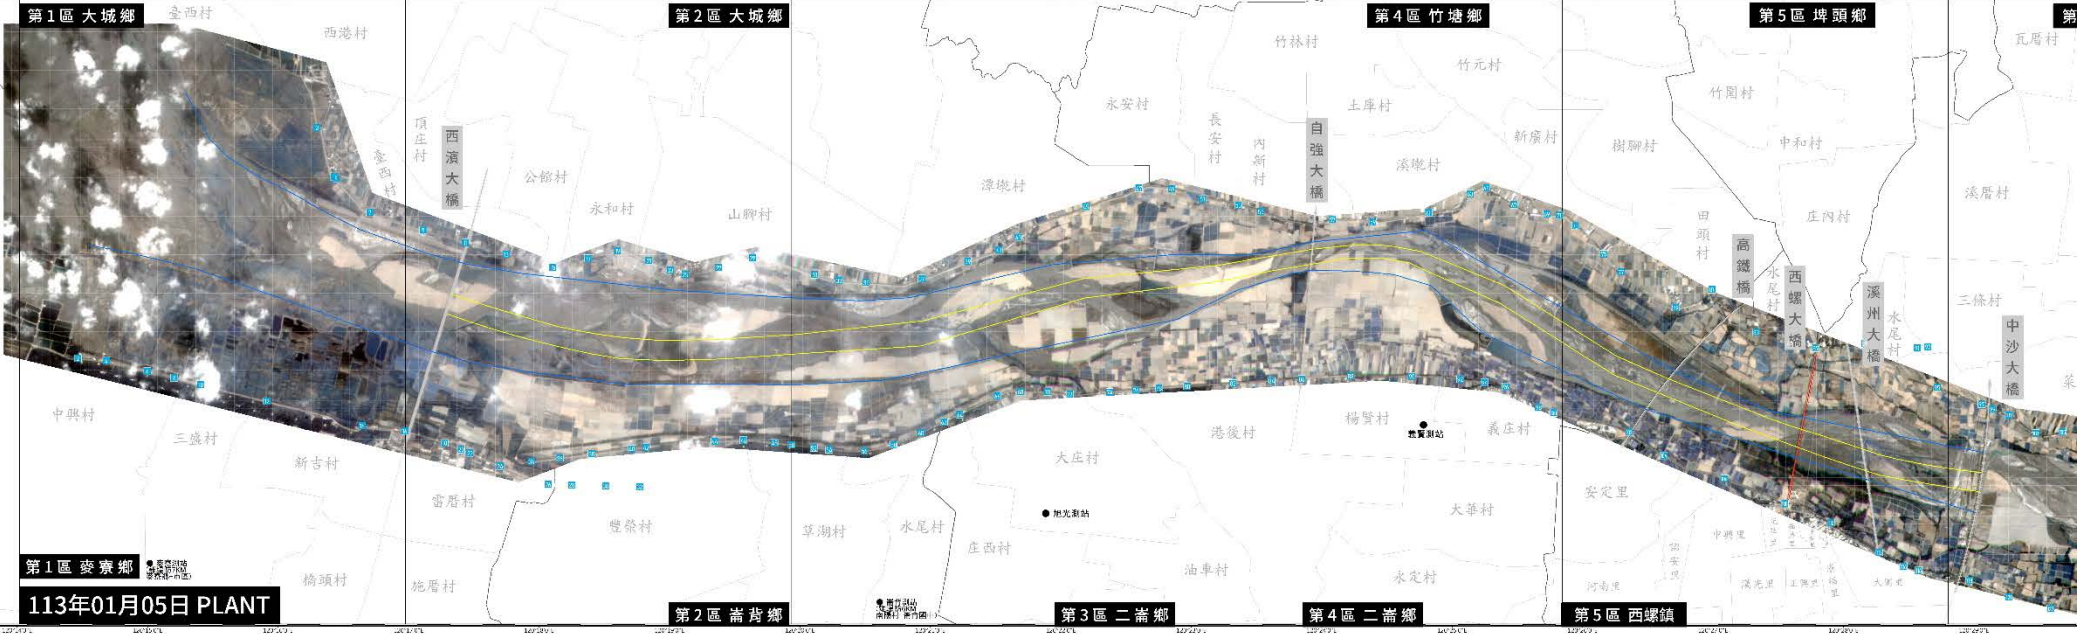

例行性現地巡查



各區 空拍現況


第一區

麥寮 出海口



第二區

40號越堤路 上游

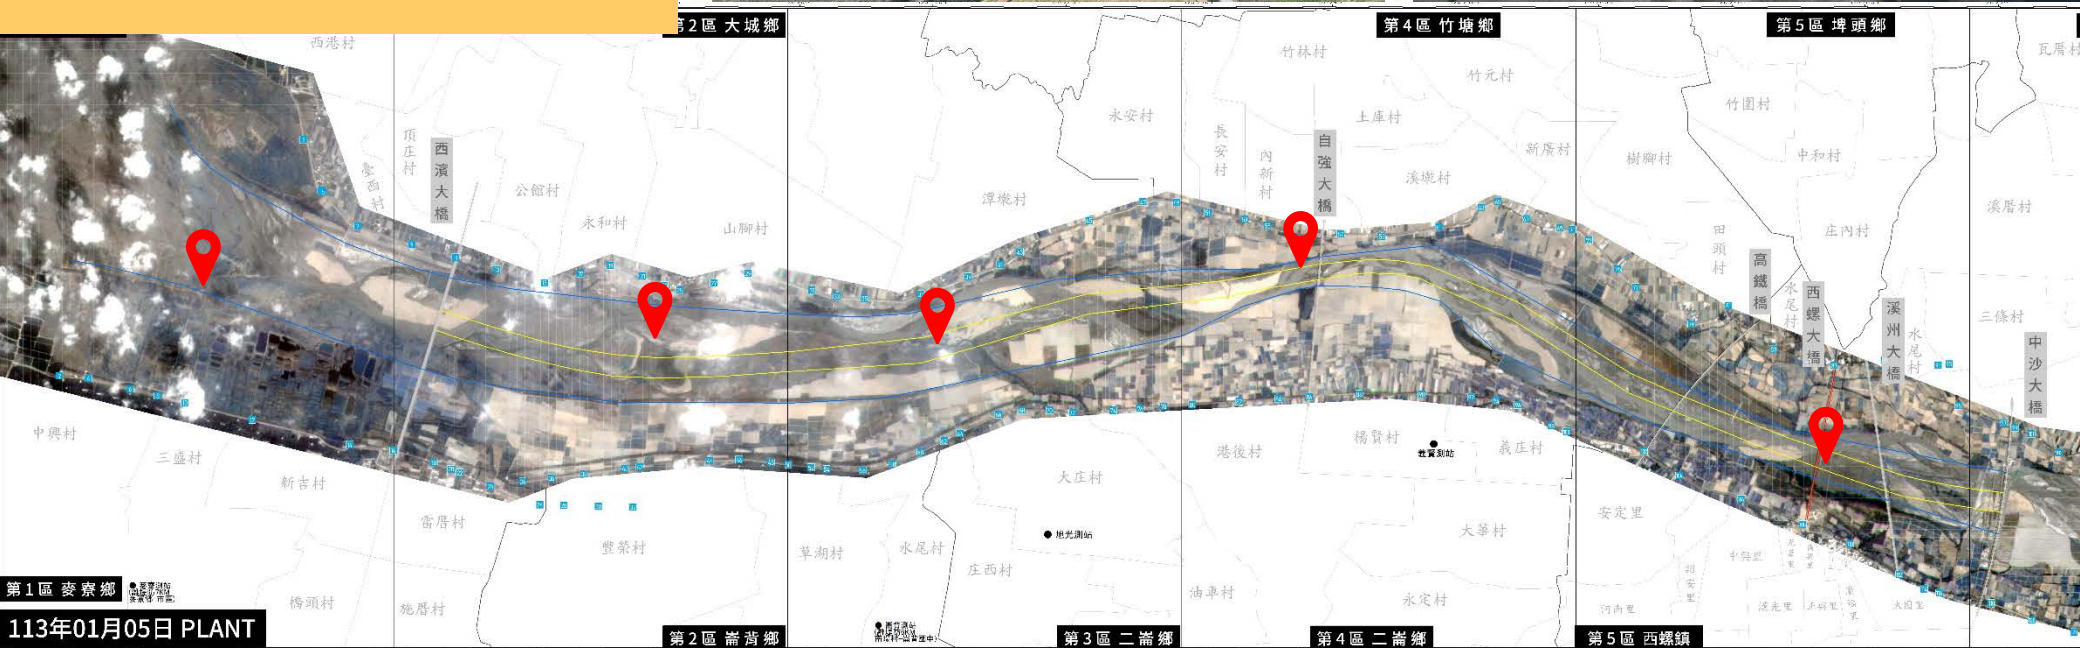

第三區

大義崙排水 下游



第四區

自強大橋 下游



第五區

西螺大橋 上游



112年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:112年5月至113年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值 : 450 公頃
- 已完成 : 356.2 公頃
- 達成率 : 79.2 %



水覆蓋

- 目標值 : 400 公頃
- 已完成 : 370 公頃
- 達成率 : 92.5 %



河道整理

- 目標值 : 2.5 公里
- 已完成 : 4.4 公里
- 達成率 : 176%



防洪植栽

- 目標值 : 6 公里
- 已完成 : 8.05 公里
- 達成率 : 134.2 %



綠覆蓋

- 目標值 : 50 公頃
- 已完成 : 292公頃
- 達成率 : 584 %



營造複式斷面規劃圖

年度	107-109	110-112	113	114	115	合計
KPI(公里)	8	12	4	4	4	20
實際完成	8	12.23	-	-	-	20.23



113年營造複式斷面進度管控

KPI / 4公里

已完成 / 0 km


達成率/ 0 %

執行進度說明：

- 預計113年度案件執行期間為113年5月起，分署將俟相關契約簽訂後，再行擇期召開工作會議研商進場期程。
- 目前將持續辦理現場已完成複式斷面及相關揚塵措施巡查作業，並依河道內水位及裸露地現況，滾動調整因應及緊急應變作為。

水防道路植栽規劃圖

年度	110	111	112	113	114	115	合計
KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
實際完成	1	2.3	2	-	-	-	5.3

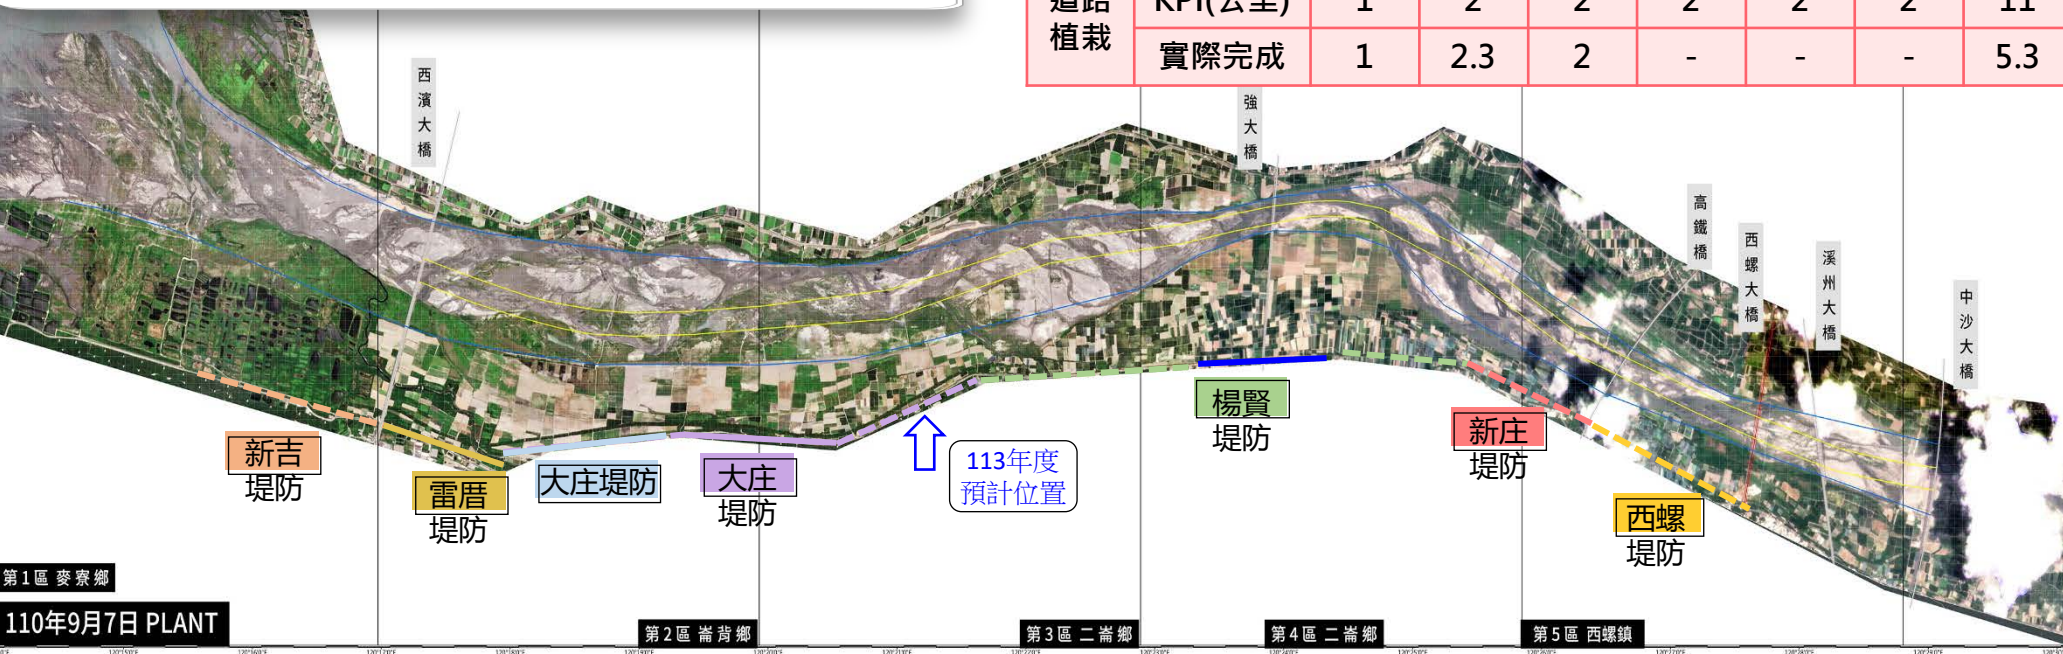

113年水防道路植栽進度管控

KPI / 2公里

已完成 / 0公里


達成率/ 0 %

➤ 執行進度說明：

預計113年度案件執行期間為113年5月起，分署將俟相關契約簽訂後，再行擇期召開工作會議研商進場期程。

112/09/20

揚塵抑制措施

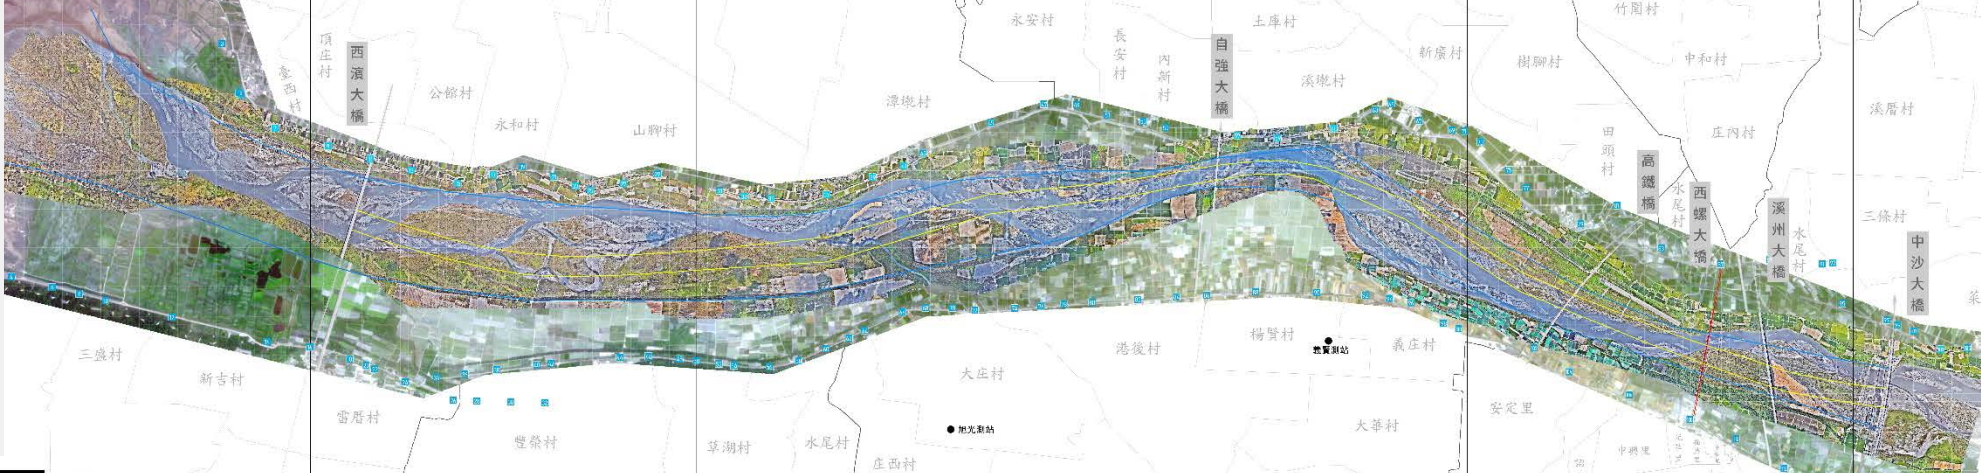

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
	1)西濱橋下游段(北岸)_蓄水池50公頃 2)西濱橋上游南岸_蓄水池60公頃 3)40號越堤路段_蓄水池20公頃	1) 跨河電塔上游_蓄水池40公頃	1)51號越堤段_蓄水池80公頃 2)94號越堤段_蓄水池50公頃 3)高鐵橋下游河道灘地_蓄水池40公頃	1) 溪洲大橋上游_蓄水池30公頃
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
1) 7號越堤路段河道灘地_河道整理2公里	1) 40號越堤路段_河道整理0.4公里	1) 跨河電塔下游0.74公里		1) 高鐵橋上游(北岸)1.26公里
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
1) 出海口 23口井灘地_空灑草籽52公頃 2) 西濱大橋下游至7號越堤路_空灑草籽45公頃		1) 跨河電塔上下游低灘地_空灑草籽40公頃	1) 94號越堤段北側河道灘地_空灑草籽55公頃	1) 中沙大橋至溪洲大橋灘地_空灑草籽70公頃 2) 西螺大橋上下游河中低灘地_空灑草籽30公頃
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
1) 7號越堤路段河道灘地_培厚植栽2公里。	1) 大庄堤防44-54號越堤_水防道路植栽1.5公里。	1) 自強大橋下游南岸_培厚區植栽1.2公里 2) 大庄堤防62-66號越堤_水防道路植栽0.5公里。	1) 94號越堤路段下游(北岸)_培厚植栽1.6公里	1) 高鐵橋上游(北岸)_培厚植栽1.25公里
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 7號越堤路段_鋪設稻草蓆9公頃 2) 7號越堤路段低灘地B_鋪設稻草蓆5公頃 3) 7號越堤路段河道灘地_簡易灑水系統14公頃 4) 5號越堤河中灘地_稻草蓆鋪設20公頃	1) 40-44號越堤路段_鋪設稻草蓆38公頃 2) 西濱橋下河中島_鋪設稻草蓆47公頃 3) 40號越堤路段培厚區_稻草蓆10公頃	1) 自強大橋下游南岸_培厚區簡易灑水系統6公頃 2) 大義崙上游低灘地_稻草蓆30公頃 3) 跨河電塔上游(北岸)_稻草蓆鋪13公頃 4) 跨河電塔下游(北岸)_稻草蓆鋪18公頃 5) 跨河電塔上下游低灘地_防塵網鋪20公頃 6) 大義崙排水口上游河道灘地_稻草11公頃	1)94號越堤路段_鋪設稻草蓆18公頃 2)51號越堤段上游_鋪設稻草蓆20公頃 3)94號越堤路段下游(北岸)_簡易灑水設施11.2公頃 4)自強大橋上下游低灘地_稻草蓆21公頃	1)溪洲大橋上游北岸_稻草蓆鋪設20公頃 2)高鐵橋上游(北岸)_簡易灑水系統10公頃 3)西螺大橋下游_鋪設稻草蓆15公頃
