

# 揚塵防治 週報表

113/04/08~113/04/14











112年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:112年5月至113年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值 : 450 公頃
- 已完成 : 356.2 公頃
- 達成率 : 79.2 %



水覆蓋

- 目標值 : 400 公頃
- 已完成 : 370 公頃
- 達成率 : 92.5 %



河道整理

- 目標值 : 2.5 公里
- 已完成 : 4.4 公里
- 達成率 : 176%



防洪植栽

- 目標值 : 6 公里
- 已完成 : 8.05 公里
- 達成率 : 134.2 %



綠覆蓋

- 目標值 : 50 公頃
- 已完成 : 292公頃
- 達成率 : 584 %



# 營造複式斷面規劃圖

| 年度      | 107-109 | 110-112 | 113 | 114 | 115 | 合計    |
|---------|---------|---------|-----|-----|-----|-------|
| KPI(公里) | 8       | 12      | 4   | 4   | 4   | 20    |
| 實際完成    | 8       | 12.23   | -   | -   | -   | 20.23 |



## 113年營造複式斷面進度管控

KPI / 4公里

已完成 / 0 km

達成率 / 0 %


### 執行進度說明：

- 預計113年度案件執行期間為113年5月起，分署將俟相關契約簽訂後，再行擇期召開工作會議研商進場期程。
- 目前將持續辦理現場已完成複式斷面及相關揚塵措施巡查作業，並依河道內水位及裸露地現況，滾動調整因應及緊急應變作為。



# 水防道路植栽規劃圖

| 水防道路植栽 | 年度      | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 合計  |
|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        | KPI(公里) | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 11  |
|        | 實際完成    | 1   | 2.3 | 2   | -   | -   | -   | 5.3 |

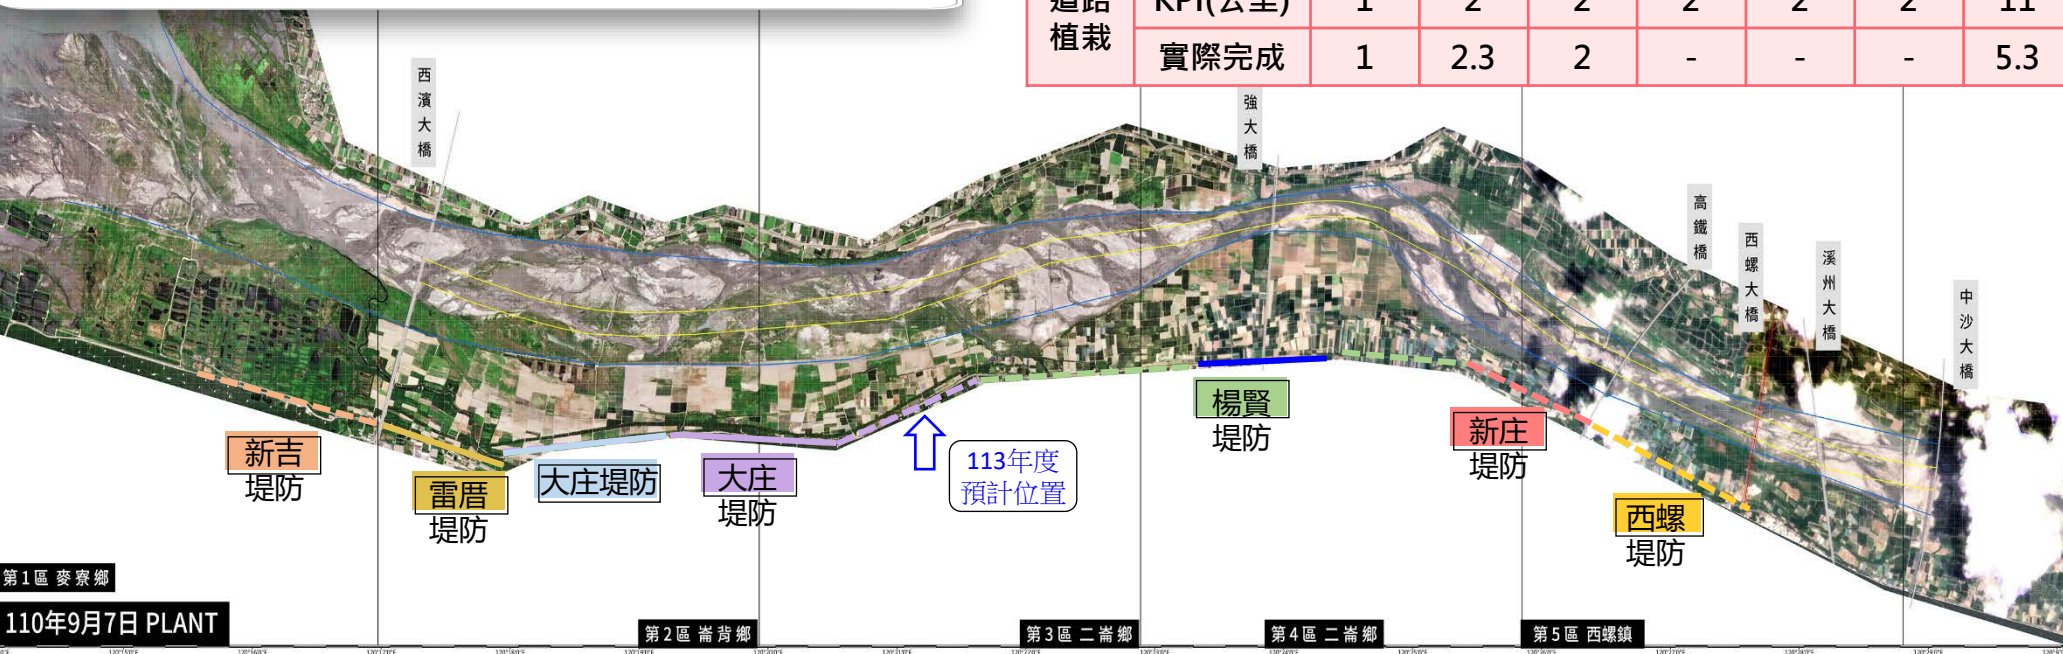

## • 113年水防道路植栽進度管控

KPI / 2公里


已完成 / 0公里

達成率/ 0 %

➤ 執行進度說明：

預計113年度案件執行期間為113年5月起，分署將俟相關契約簽訂後，再行擇期召開工作會議研商進場期程。



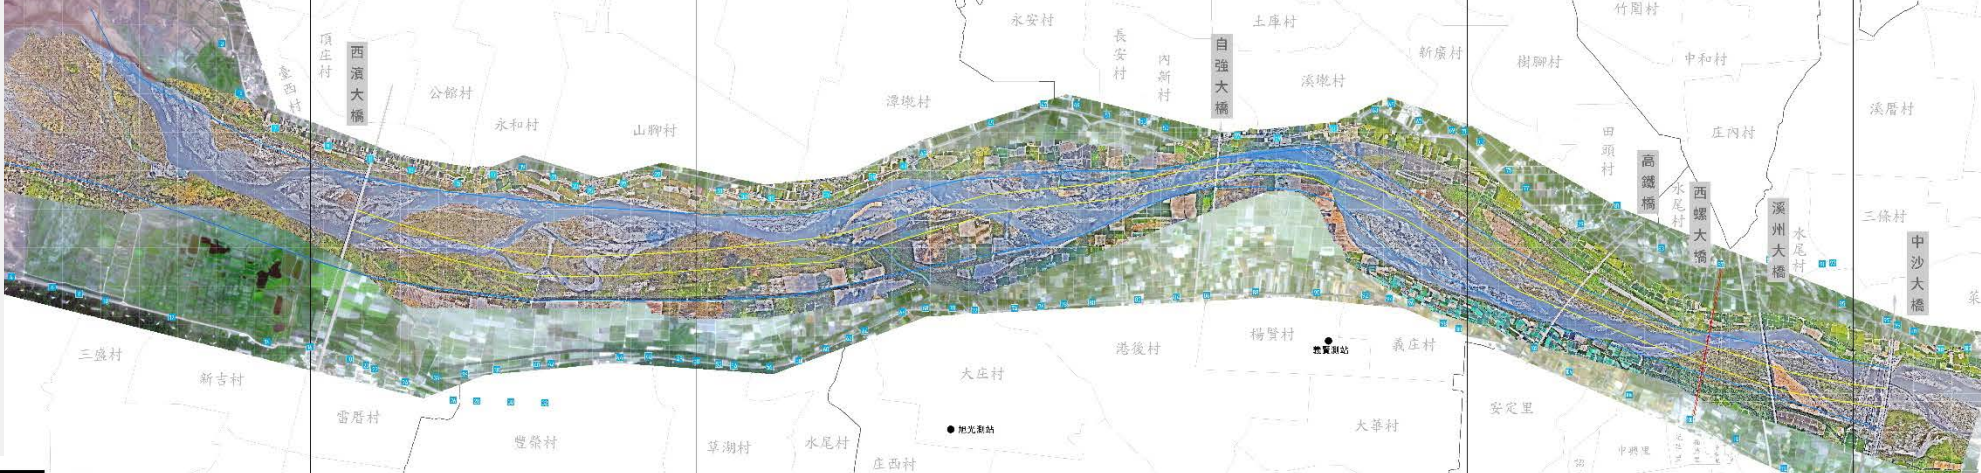

| 水覆蓋                                                                                               | 水覆蓋                                                                      | 水覆蓋                                                                                                                                                     | 水覆蓋                                                                                                 | 水覆蓋                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | 1)西濱橋下游段(北岸)_蓄水池50公頃<br>2)西濱橋上游南岸_蓄水池60公頃<br>3)40號越堤路段_蓄水池20公頃           | 1) 跨河電塔上游_蓄水池40公頃                                                                                                                                       | 1)51號越堤段_蓄水池80公頃<br>2)94號越堤段_蓄水池50公頃<br>3)高鐵橋下游河道灘地_蓄水池40公頃                                         | 1) 溪州大橋上游_蓄水池30公頃                                                    |
| 河道整理                                                                                              | 河道整理                                                                     | 河道整理                                                                                                                                                    | 河道整理                                                                                                | 河道整理                                                                 |
| 1) 7號越堤路段河道灘地_河道整理2公里                                                                             | 1) 40號越堤路段_河道整理0.4公里                                                     | 1) 跨河電塔下游0.74公里                                                                                                                                         |                                                                                                     | 1) 高鐵橋上游(北岸)1.26公里                                                   |
| 綠覆蓋                                                                                               | 綠覆蓋                                                                      | 綠覆蓋                                                                                                                                                     | 綠覆蓋                                                                                                 | 綠覆蓋                                                                  |
| 1) 出海口 23口井灘地_空灑草籽52公頃<br>2) 西濱大橋下游至7號越堤路_空灑草籽45公頃                                                |                                                                          | 1) 跨河電塔上下游低灘地_空灑草籽40公頃                                                                                                                                  | 1) 94號越堤段北側河道灘地_空灑草籽55公頃                                                                            | 1) 中沙大橋至溪州大橋灘地_空灑草籽70公頃<br>2) 西螺大橋上下游河中低灘地_空灑草籽30公頃                  |
| 防洪植栽                                                                                              | 防洪植栽                                                                     | 防洪植栽                                                                                                                                                    | 防洪植栽                                                                                                | 防洪植栽                                                                 |
| 1) 7號越堤路段河道灘地_培厚植栽2公里。                                                                            | 1) 大庄堤防44-54號越堤_水防道路植栽1.5公里。                                             | 1) 自強大橋下游南岸_培厚區植栽1.2公里<br>2) 大庄堤防62-66號越堤_水防道路植栽0.5公里。                                                                                                  | 1) 94號越堤路段下游(北岸)_培厚植栽1.6公里                                                                          | 1) 高鐵橋上游(北岸)_培厚植栽1.25公里                                              |
| 其他覆蓋                                                                                              | 其他覆蓋                                                                     | 其他覆蓋                                                                                                                                                    | 其他覆蓋                                                                                                | 其他覆蓋                                                                 |
| 1) 7號越堤路段_鋪設稻草蓆9公頃<br>2) 7號越堤路段低灘地B_鋪設稻草蓆5公頃<br>3) 7號越堤路段河道灘地_簡易灑水系統14公頃<br>4) 5號越堤河中灘地_稻草蓆鋪設20公頃 | 1) 40-44號越堤路段_鋪設稻草蓆38公頃<br>2) 西濱橋下河中島_鋪設稻草蓆47公頃<br>3) 40號越堤路段培厚區_稻草蓆10公頃 | 1) 自強大橋下游南岸_培厚區簡易灑水系統6公頃<br>2) 大義崙上游低灘地_稻草蓆30公頃<br>3) 跨河電塔上游(北岸)_稻草蓆鋪13公頃<br>4) 跨河電塔下游(北岸)_稻草蓆鋪18公頃<br>5) 跨河電塔上下游低灘地_防塵網鋪20公頃<br>6) 大義崙排水口上游河道灘地_稻草11公頃 | 1)94號越堤路段_鋪設稻草蓆18公頃<br>2)51號越堤段上游_鋪設稻草蓆20公頃<br>3)94號越堤路段下游(北岸)_簡易灑水設施11.2公頃<br>4)自強大橋上下游低灘地_稻草蓆21公頃 | 1)溪州大橋上游北岸_稻草蓆鋪設20公頃<br>2)高鐵橋上游(北岸)_簡易灑水系統10公頃<br>3)西螺大橋下游_鋪設稻草蓆15公頃 |
