


107年度揚塵改善措施第三季執行期程

改善措施		本季度			目前進度	辦理機關
		7	8	9		
水利 防制 法	水覆蓋	計畫 發包		視汛期後 灘地變化 檢討	已完成發包	四河局
	河道整理	計畫 發包		視汛期後 灘地變化 檢討	已完成發包	四河局
造林 新植 與撫 育	堤防培厚植栽4公里		完成 造林		已完成2公里	四河局
防災 應變	稻草	計畫核定 及發包	收集 稻草	進場 鋪設	完成發包	四河局 農糧署 地方政府
	三仙膠		完成 發包	施作	鋪設防塵網 及稻草蓆2公 頃	四河局 環保署 地方政府
	灑水					
環境清理						

揚塵防治施工報告

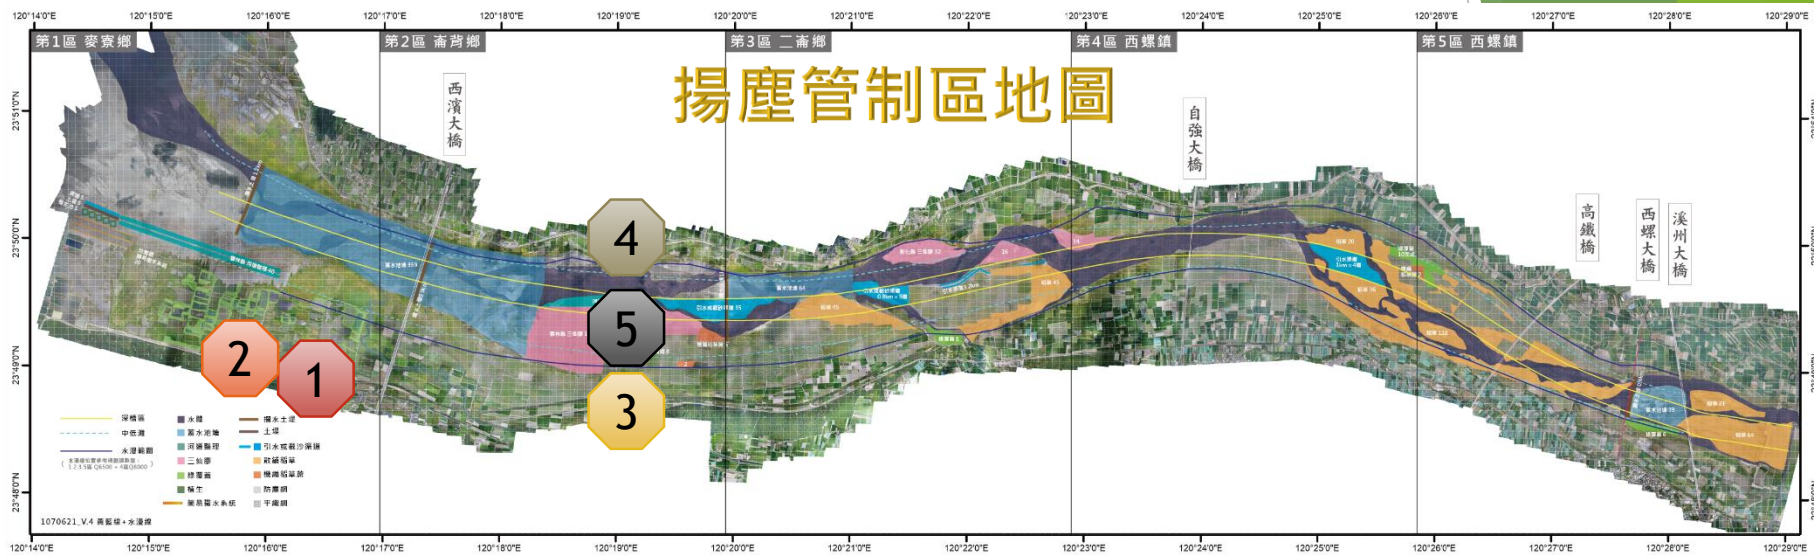

區域	施工位置	施工內容	目前進度
1	新吉堤防疏濬區	疏濬去除土砂	完成 23.9萬方去除沙源
2	新吉堤防	堤前培厚植栽 1公里	完成0.7公里
3	大庄堤防	堤前培厚植栽 2公里	完成0.1公里
4	下山腳堤防	河道整理及抽砂	施工便道施作
5	大庄堤防前	佈設防塵網及稻草蓆	已完成2公頃，預計施作8公頃

揚塵防治施工照片



文字說明

▶ 標題：7/18~7/24揚塵防治施工報告

▶ 內文：

七月份河道內普遍濕潤無裸露地揚塵現象，現階段施作長效型抑制工法。

本周主要施作『河道整理去除沙源』、『種植防風林』，並於大庄堤防44號越堤路前河床裸露地施作『平鋪式防塵網』。

為規畫9月份至隔年3月份揚塵好發期因應作為，本局於本周間取得最新空照圖資，配合圖資比對迅速分析河道裸露地的變異處加強控管，以利日後進行抑制作業。
