

濁水溪揚塵抑制 1070809~1070815周報表

- ▶ 八月份河道內普遍濕潤無裸露地揚塵現象，現階段施作**長效型抑制工法**。

本周主要施作『**河道整理去除沙源**』、『**種植防風林**』，麥寮出海口區施作『**防塵網5公里**』已完成，並依現地需求預計增設至**9公里**；麥寮出海口『**植生蓄水池1公頃**』；溪州大橋上下游預佈『**蓄水池塘約70公頃**』。


本周依據前周中央地方平台會議指示與麥寮鄉親代表共同商討反映之議題，並另訂增辦地方說明會。

107年度揚塵改善措施第三季執行期程

截至8/15日止

改善措施		本季度			目前進度	辦理機關
		7	8	9		
水利防制法	水覆蓋	計畫發包		視汛期後灘地變化檢討	已完成發包	四河局
	河道整理	計畫發包		視汛期後灘地變化檢討	已完成發包	四河局
造林新與撫育	堤防培厚植栽4公里		完成造林		已完成2公里	四河局
防災應變	稻草	計畫核定及發包	收集稻草	進場鋪設	完成發包	四河局農糧署 地方政府
	三仙膠		完成發包	施作	鋪設防塵網及稻草蓆2公頃	四河局環保署 地方政府
	灑水					
環境清理						

揚塵防治施工報告

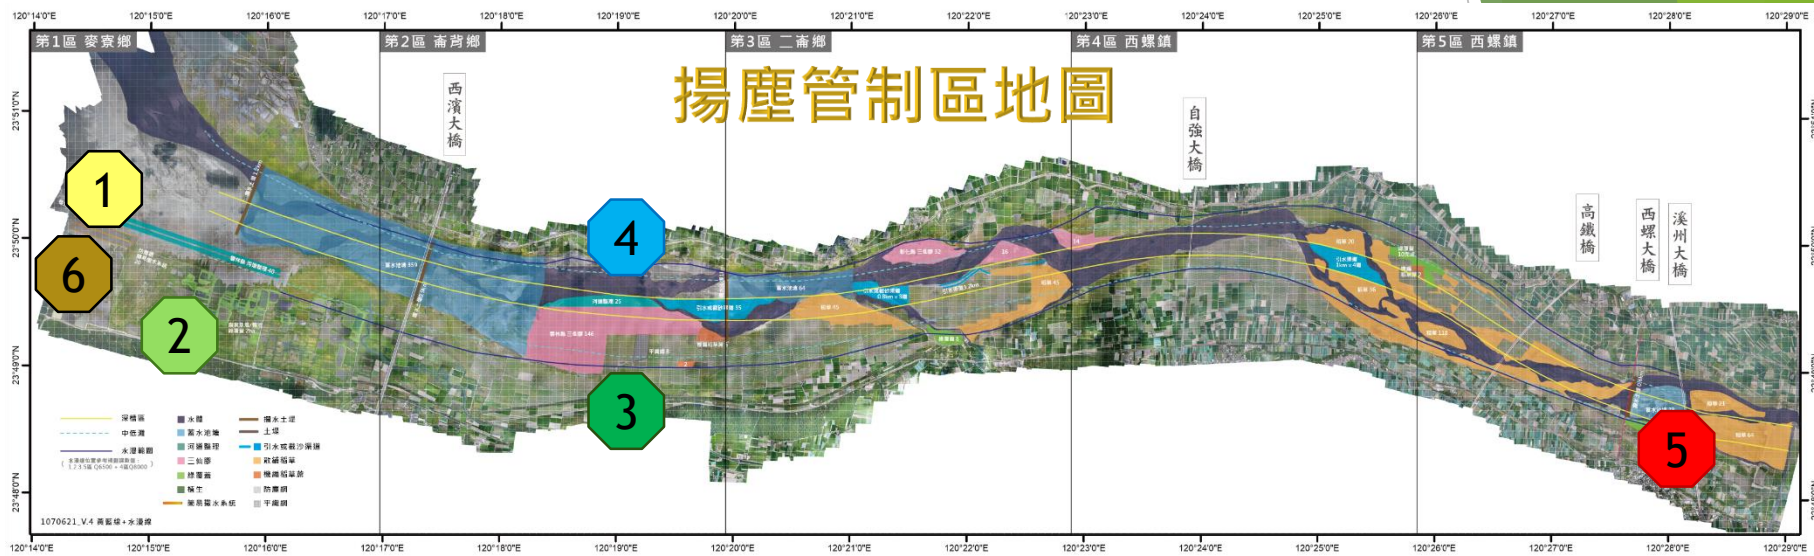

區域	施工位置	施工內容	目前進度
1	新吉堤防	直立式防塵網	完成5公里，預計施作9公里
2	新吉堤防	堤前培厚植栽 1公里	完成1公里，除沙源7萬方
3	大庄堤防	堤前培厚植栽 2公里	完成1.6公里，去除沙源8.4萬方
4	下山腳堤防	河道整理及抽砂	抽砂，去除沙源2.7萬方
5	大庄堤防前	佈設防塵網及稻草蓆	7公頃施作完畢
6	新吉堤防	植生蓄水池1公頃	完成0.84公頃

揚塵防治施工照片

