

濁水溪揚塵抑制

1080701~1080707周報表


- ▶ 第五區北岸竹塘防洪植栽造林作業本周因便道泥濘暫停作業。
- ▶ 第一區北岸大城簡易灑水系統本周完成100%達6.0公頃。
- ▶ 第一區北岸大城防洪植栽造林作業本周完成100%達6.0公里。

108年度改善措施執行期程

實際進度


預定進度

改善措施		108年度												實際完成
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	
水利 防制 工法	水覆蓋	5%		計畫 發包		視汛期後 灘地變化 檢討	進場施作			施作				執行中
				5%		10%	30%	50%	70%	80%	100%			
	河道整理	12%		計畫 發包		視汛期後 灘地變化 檢討	進場施作			施作				300公尺
				5%		10%	30%	50%	70%	80%	100%			
防災 應變	疏濬	施作												83萬m3
		30%		10%		30%		50%		70%		80%	100%	
	其他措施	核定 計畫			完成 發包	施作								發包完成
		10.0%				5%	10%	80%	100%					
造林 新植 與撫 育	灘地綠覆蓋						施作			施作				執行中
		5%					5%		10%		80%	100%		
	堤防培厚植栽	施作			完成 造林									執行中
		60%		10%		30%		50%		70%		80%	100%	

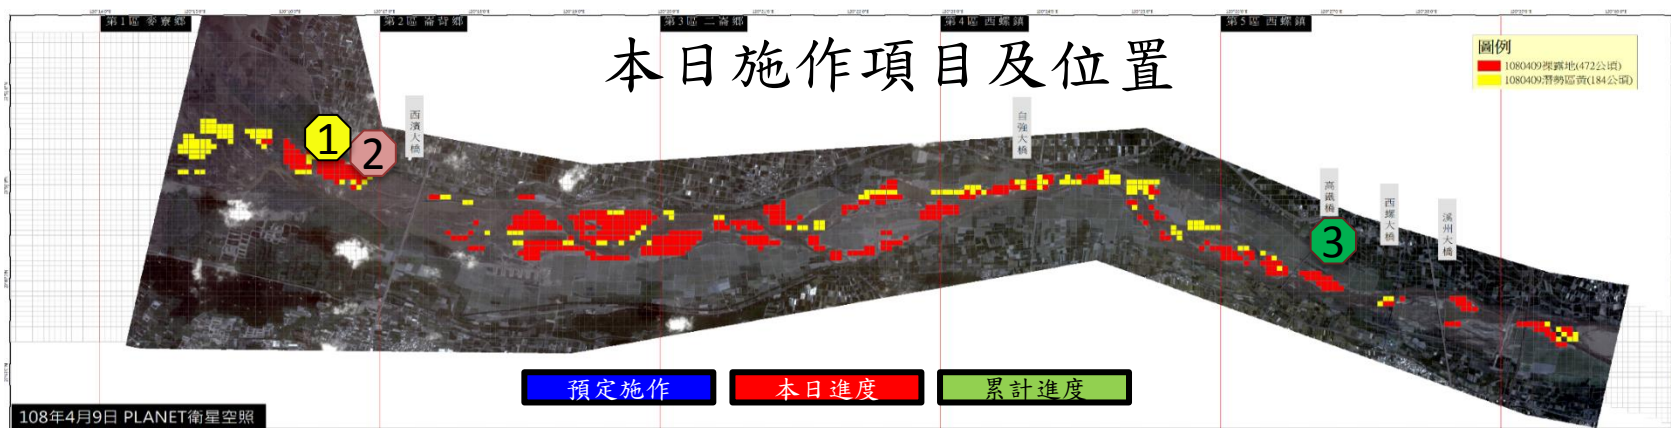

區域	施工位置	施工內容	目前進度
—	北岸大城	簡易灑水系統	完成6.0公頃
—	北岸大城	植樹造林	完成6.0公里
五	北岸竹塘	植樹造林	施工便道作業

108年濁水溪揚塵抑制工法規劃圖

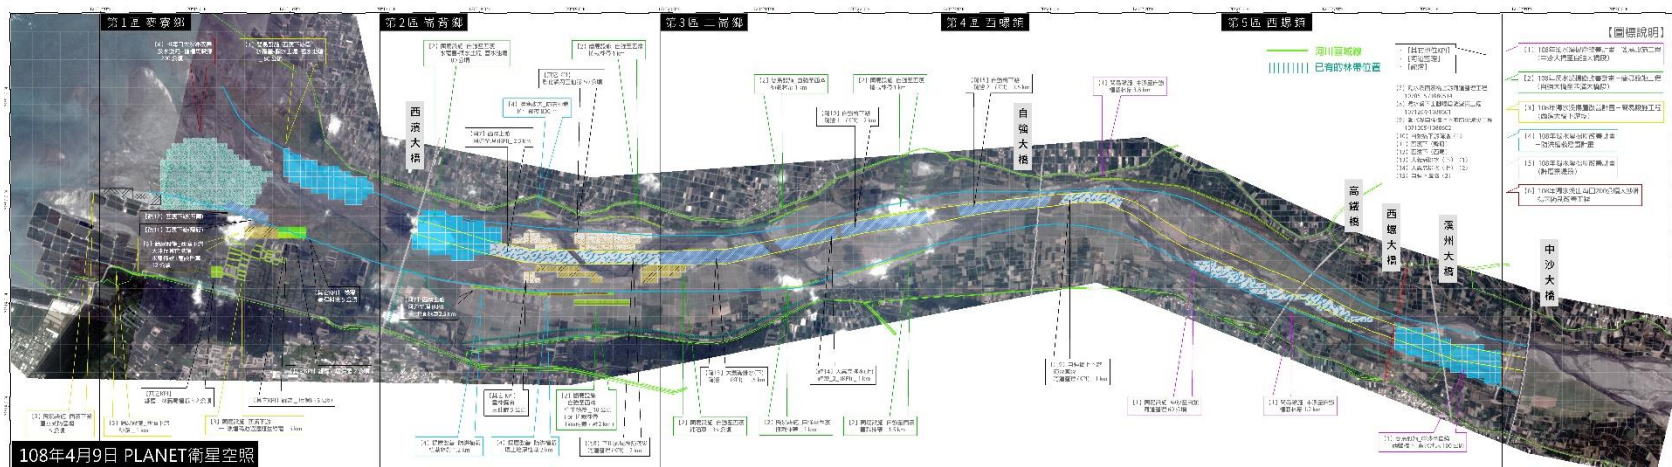

108年濁水溪揚塵抑制已完成項目

第一區	第二區	第三區	第四區	第五區
●水覆蓋： ●綠覆蓋： 1. 防洪植栽6.0公里 ●其他措施： 1. 簡易灑水系統抑制 (6.0公頃)	●水覆蓋： ●綠覆蓋： 1. 防洪植栽7.2公里 ●其他措施： 1. 簡易灑水系統抑制 (12公頃)	●水覆蓋： ●綠覆蓋： ●其他措施：	●水覆蓋： ●綠覆蓋： ●其他措施：	●水覆蓋： ●綠覆蓋： ●其他措施：

各區空拍現況(108/06/23)

第一區

水位降，低灘地浮現




第二區

水位降，低灘地浮現，半濕潤




第三區

水位降，低灘地濕潤

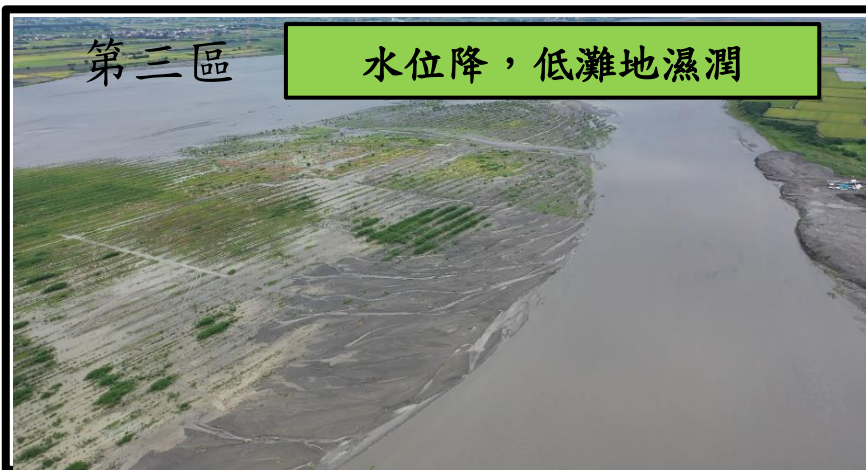

第四區

水位降，低灘地浮現，半濕潤

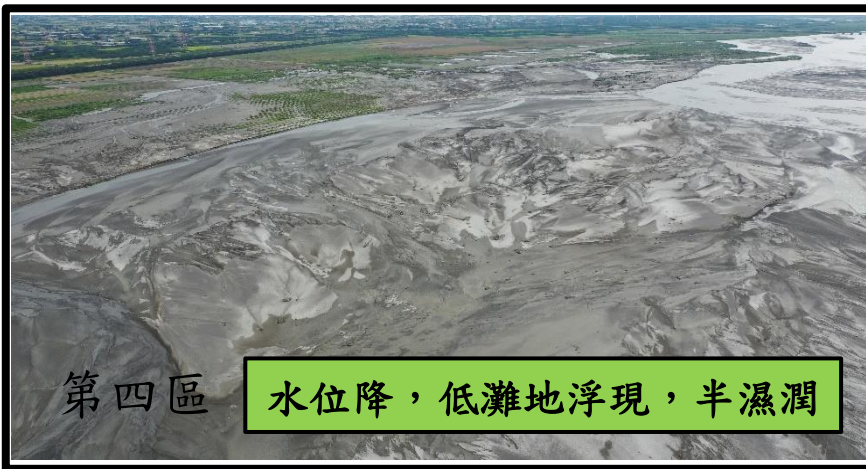

第五區

水位降，低灘地浮現，濕潤

