

濁水溪揚塵抑制

10800513~1080519周報表

- ▶ 本周各區有零星降雨，因上游強降雨水位暴漲。
- ▶ 本周於第二區南岸培厚區完成簡易灑水系統佈設，進行植樹造林作業。


108年度改善措施執行期程

實際進度

預定進度


改善措施		108年度											實際完成	
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		4
水利防制工法	水覆蓋			計畫發包		視汛期後灘地變化檢討	進場施作			施作				發包完成
		5%		5%	10%	30%	50%	70%	80%	100%				
	河道整理			計畫發包		視汛期後灘地變化檢討	進場施作			施作				300公尺
		12%		5%	10%	30%	50%	70%	80%	100%				
	疏濬	施作											52萬m3	
		19%		10%	30%	50%	70%	80%	100%					
防災應變	其他措施	核定計畫			完成發包	施作						發包完成		
		5%	10%	80%	100%									
造林新植與撫育	灘地綠覆蓋					施作			施作				發包完成	
		5%				5%	10%	80%	100%					
	堤防培厚植栽	施作			完成造林							執行中		
		13%		10%	30%	50%	70%	80%	100%					

本日施作項目及位置

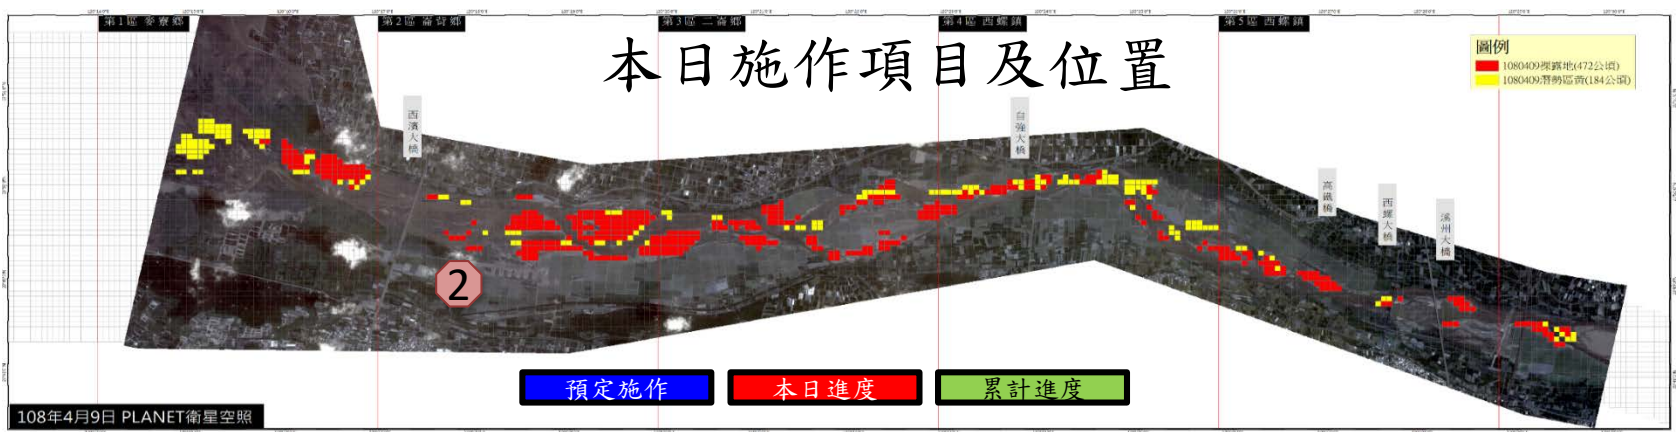

區域	施工位置	施工內容	目前進度
	大庄堤防前	植樹造林	施工中

108年濁水溪揚塵抑制已完成項目及位置

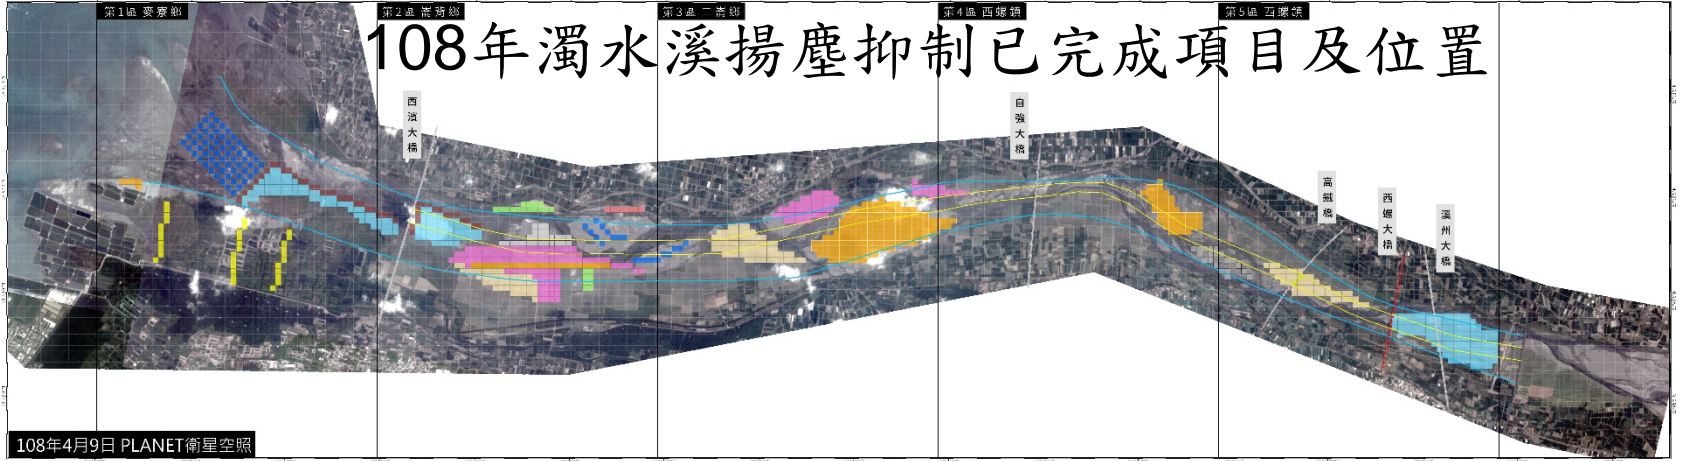

108年4月9日 PLANET衛星空照

第一區	第二區	第三區	第四區	第五區
<ul style="list-style-type: none"> ● 水綠覆蓋其他措施： 	<ul style="list-style-type: none"> ● 水綠覆蓋其他措施： 1. 防 洪 植 栽 2 公 里 ● 其他措施： 1. 簡 易 灑 水 系 統 抑 制 (12公頃) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 水綠覆蓋其他措施： 	<ul style="list-style-type: none"> ● 水綠覆蓋其他措施： 	<ul style="list-style-type: none"> ● 水綠覆蓋其他措施：



本周揚塵防治工程
照片
