

濁水溪揚塵抑制

10800520~1080526周報表

- ▶ 本周因上周上游強降雨水位尚高。
- ▶ 本周第二區南北岸培厚區完成植樹造林作業，共計6.6公里。
- ▶ 本周開始出海口試驗井作業


108年度改善措施執行期程

實際進度

預定進度


改善措施		108年度											實際完成	
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		4
水利 防制 工法	水覆蓋			計畫 發包		視汛期後 灘地變化 檢討	進場施作			施作				發包完成
		5%		5%	10%	30%	50%	70%	80%	100%				
	河道整理			計畫 發包		視汛期後 灘地變化 檢討	進場施作			施作				300公尺
		12%		5%	10%	30%	50%	70%	80%	100%				
	疏濬	施作											52萬m3	
		19%		10%	30%	50%	70%	80%	100%					
防災 應變	其他措施	核定 計畫			完成 發包	施作							發包完成	
		5%	10%	80%	100%									
造林 新植 與 撫育	灘地綠覆蓋					施作			施作				發包完成	
		5%				5%	10%	80%	100%					
	堤防培厚植栽	施作			完成 造林								執行中	
		44%		10%	30%	50%	70%	80%	100%					

本日施作項目及位置

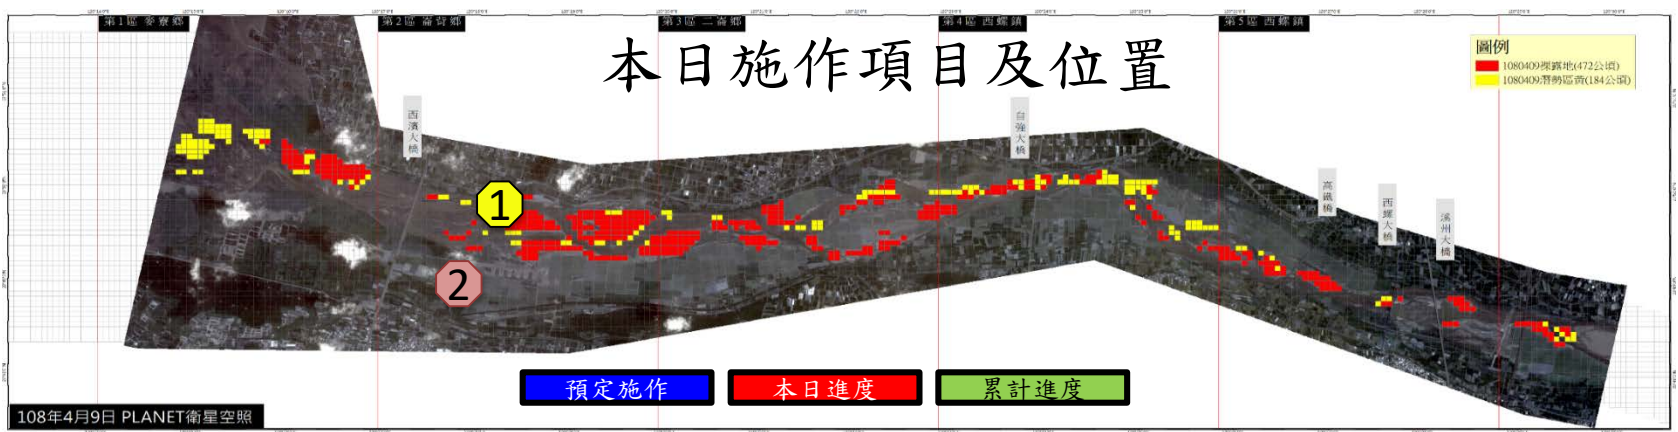

區域	施工位置	施工內容	目前進度
二	大庄堤防前	植樹造林	施工完畢，計6.6公里

108年濁水溪揚塵抑制已完成項目及位置

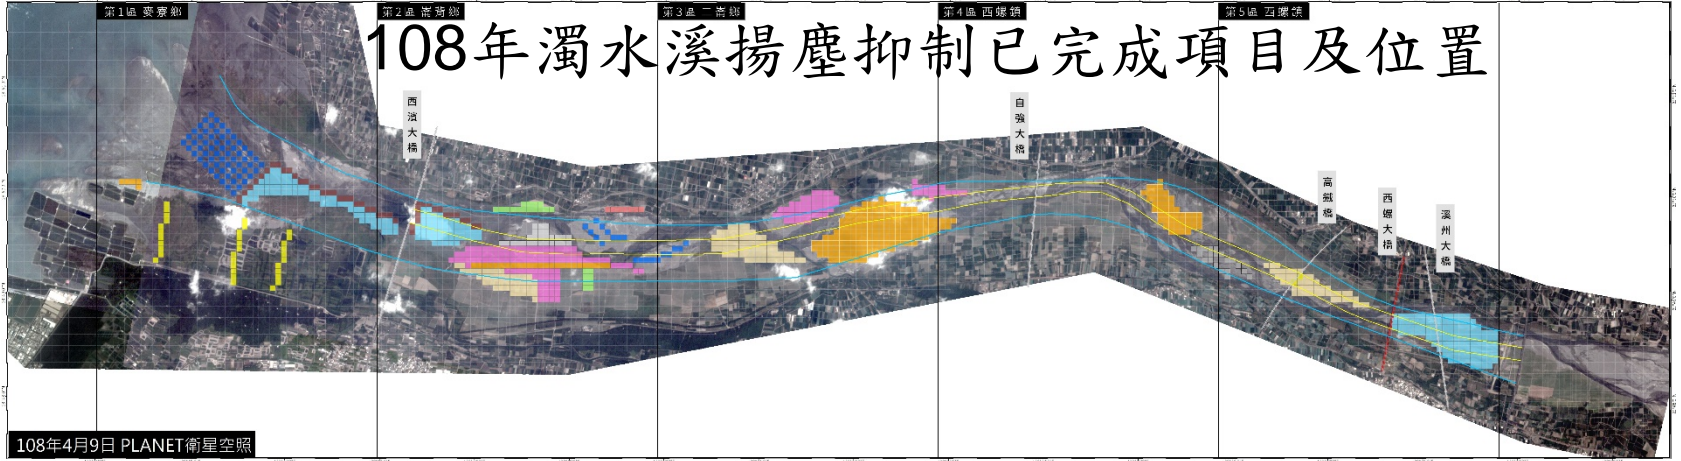

第一區	第二區	第三區	第四區	第五區
<p>● 水綠覆蓋其他措施：</p>	<p>● 水綠覆蓋其他措施：</p> <p>1. 防洪植栽6.6里</p> <p>● 其他措施：</p> <p>1. 簡易灑水系統抑制(12公頃)</p>	<p>● 水綠覆蓋其他措施：</p>	<p>● 水綠覆蓋其他措施：</p>	<p>● 水綠覆蓋其他措施：</p>

本周揚塵防治 工程照片

