

濁水溪揚塵抑制

1080819~1080825周報表

- ▶ 第一區出海口打井作業便道鋪設級配
- ▶ 第一區出海口水井打設
- ▶ 第五區北岸竹塘防洪植栽造林作業
- ▶ 第五區北岸竹塘簡易灑水系統設置




108年度改善措施執行期程

實際進度


預定進度

改善措施		108年度											實際完成				
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		4			
水利防制工法	水覆蓋			計畫發包 50%		視汛期後灘地變化檢討 10%	進場施作			施作					執行中		
		5%					30%	50%	70%	80%							
	河道整理			100% 計畫發包 50%		視汛期後灘地變化檢討 10%	進場施作			施作					300公尺		
		12%					30%	50%	70%	80%							
	疏濬	100%											83萬m3				
		50%		10%		30%	50%			70%		80%					
防災應變	其他措施	100% 核定計畫			完成發包	施作										發包完成	
			7.6%			5%	10%	80%	100%								
造林新植與撫育	灘地綠覆蓋						施作			施作				執行中			
		5%					5%	10%	80%	100%							
	堤防培厚植栽	5%		施作	50%	完成造林											執行中
		100%															

本周施作项目及位置

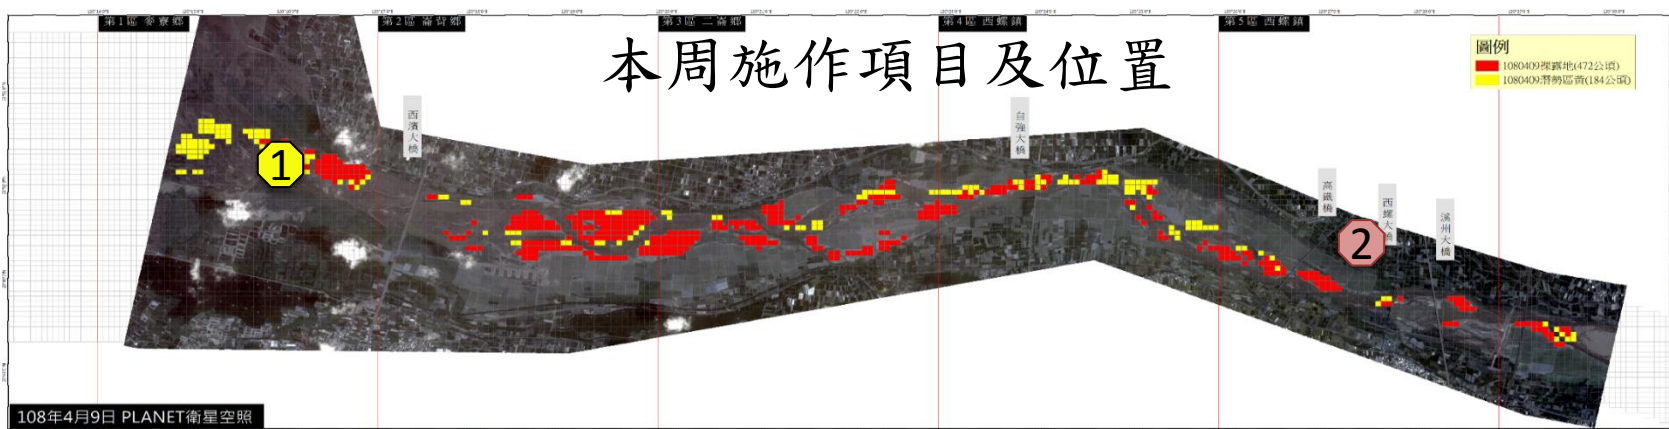

區域	施工位置	施工內容	目前進度
一	南岸麥寮	打井作業	3.5口
一	南岸麥寮	打井作業	便道級配鋪設
五	北岸竹塘	植樹造林	7公里
五	北岸竹塘	簡易灑水系統	7.5公頃

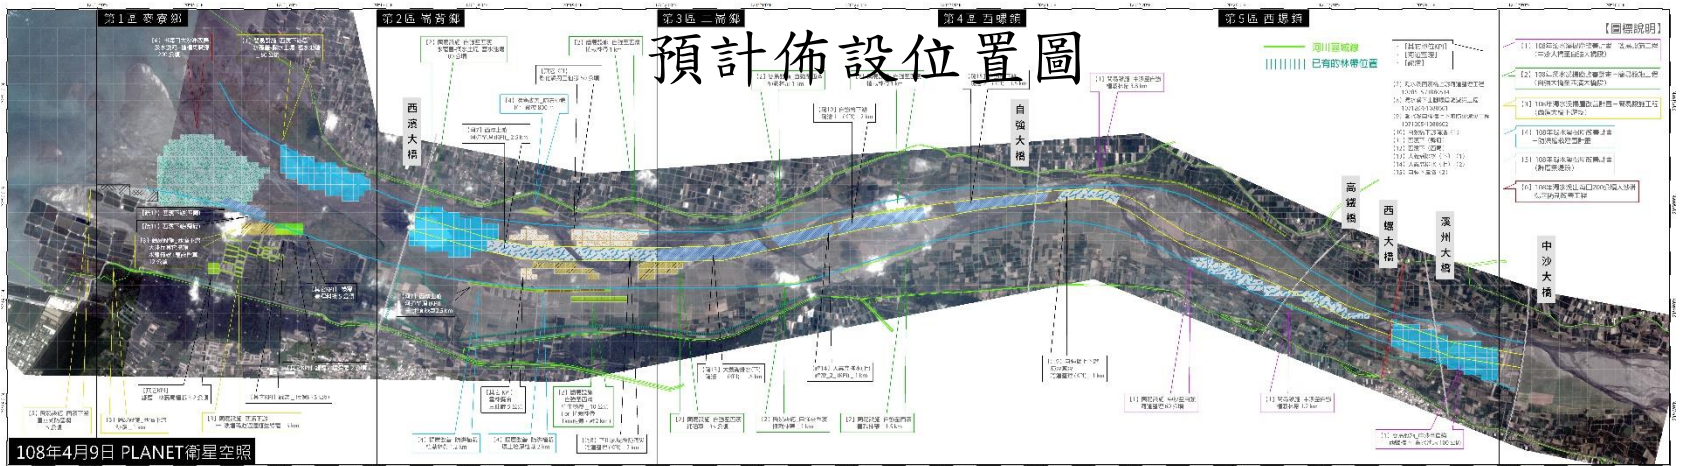

108年濁水溪揚塵抑制已完成項目及位置

第一區	第二區	第三區	第四區	第五區
<ul style="list-style-type: none"> ●水覆蓋： ●綠覆蓋： 1. 防洪植栽6.0公里 ●其他措施： 1. 簡易灑水系統抑制 (16.0公頃) 2. 三仙膠噴灑 (2公頃) 3. 稻草鋪設 (0.4公頃) 4. 直立式防塵網 (0.2公頃) 	<ul style="list-style-type: none"> ●水覆蓋： ●綠覆蓋： 1. 防洪植栽7.2公里 ●其他措施： 1. 簡易灑水系統抑制 (12公頃) 	<ul style="list-style-type: none"> ●水覆蓋： ●綠覆蓋： ●其他措施： 	<ul style="list-style-type: none"> ●水覆蓋： ●綠覆蓋： ●其他措施： 	<ul style="list-style-type: none"> ●水覆蓋： ●綠覆蓋： 1. 防洪植栽7.0公里 ●其他措施： 1. 簡易灑水系統抑制 (7.5公頃)
