

濁水溪揚塵抑制 1080902~1080908周報表

- ▶ 第一區直立式防塵網佈設
- ▶ 第一區出海口水井打設
- ▶ 第二區簡易灑水系統
- ▶ 第三區便道鋪設級配
- ▶ 第五區溪州大橋上游撒播草種




108年度改善措施執行期程

實際進度

預定進度


改善措施		108年度											實際完成	
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		4
水利防制工法	水覆蓋			計畫發包		視汛期後灘地變化檢討	進場施作			施作				執行中
	5%		10%		30%	50%	70%	80%	100%					
	河道整理			計畫發包		視汛期後灘地變化檢討	進場施作			施作				300公尺
疏濬		施作											83萬m3	
30%		30%		50%		70%		80%		100%				
防災應變	其他措施	核定計畫			完成發包	施作						發包完成		
9.4%		5%		10%		80%		100%						
造林新植與撫育	灘地綠覆蓋					施作			施作				執行中	
	33%		5%		10%		80%		100%					
堤防培厚植栽	堤防培厚植栽	施作		完成造林								執行中		
		100%												

本周施作项目及位置

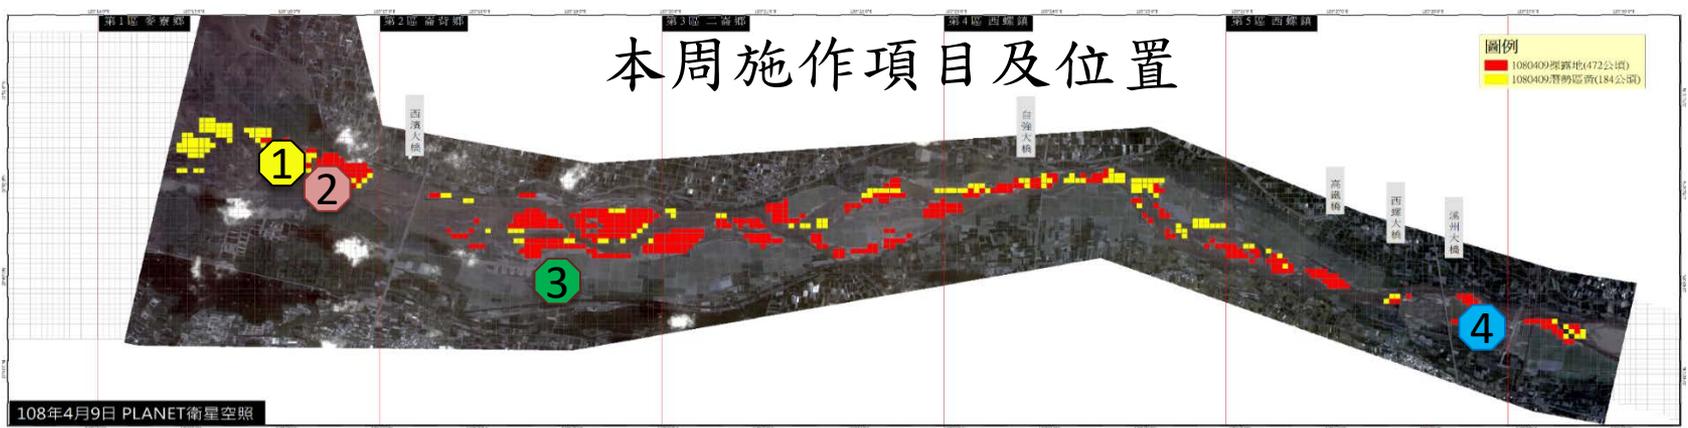

區域	施工位置	施工內容	目前進度
一	南岸麥寮	打井作業	11.0口
一	南岸麥寮	直立式防塵網	1.5公頃
二	南岸崙背	簡易灑水系統	6.0公頃
三	南岸二崙	便道級配鋪設	0.2公頃
五	溪州大橋上游	撒播草籽	21.0公頃

108年濁水溪揚塵抑制已完成項目及位置

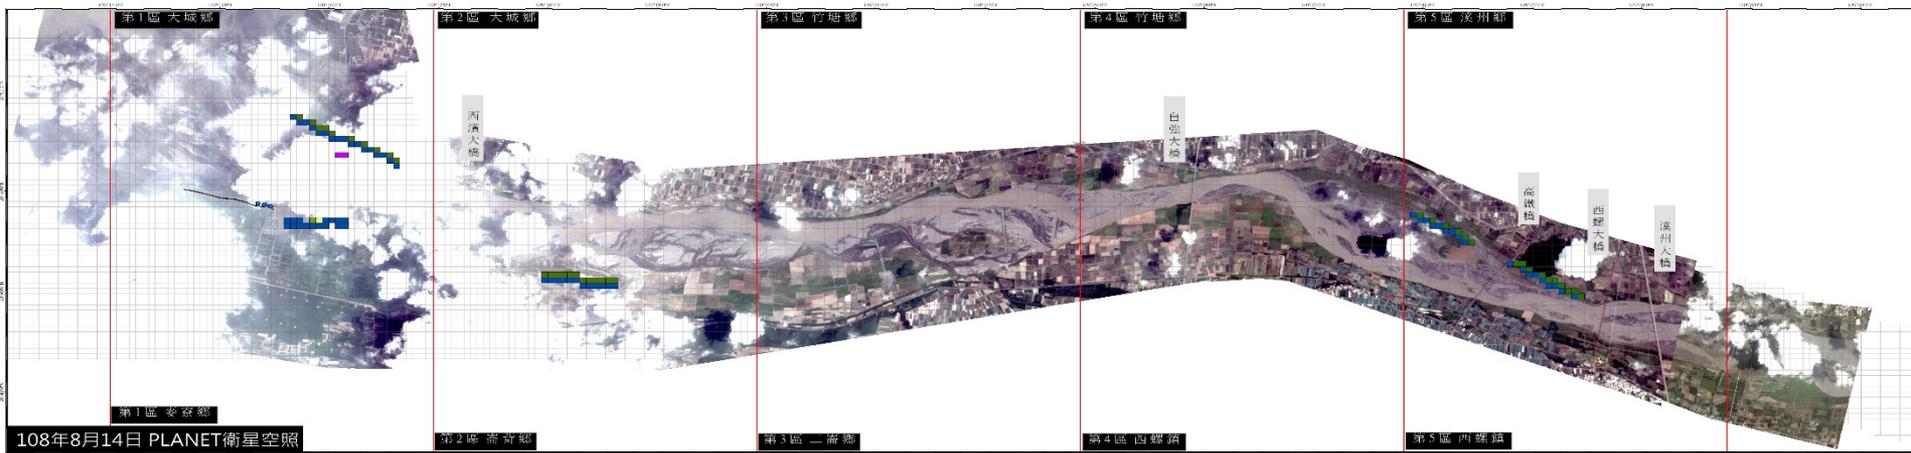

第一區	第二區	第三區	第四區	第五區
<ul style="list-style-type: none"> ● 水覆蓋： ● 綠覆蓋： ■ 防洪植栽6.4公里 ● 其他措施： ■ 簡易灑水系統抑制 (16.0公頃) ■ 三仙膠噴灑(2公頃) ■ 稻草鋪設(0.4公頃) ■ 直立式防塵網(1.5公頃) ● 出海口水井打設 (11.0口) ■ 便道鋪設級配(1.5公頃) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 水覆蓋： ● 綠覆蓋： ■ 防洪植栽7.2公里 ● 其他措施： ■ 簡易灑水系統抑制 (18公頃) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 水覆蓋： ● 綠覆蓋： ● 其他措施： ■ 便道鋪設級配 (0.2公頃) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 水覆蓋： ● 綠覆蓋： ● 其他措施： 	<ul style="list-style-type: none"> ● 水覆蓋： ● 綠覆蓋： ■ 防洪植栽7.0公里 ■ 草籽撒播21公頃 ● 其他措施： ■ 簡易灑水系統抑制 (7.5公頃)
