

濁水溪揚塵抑制

1080916~1080922周報表

- ▶ 第一區便道鋪設級配
- ▶ 第一區出海口水井打設
- ▶ 第二區便道施作
- ▶ 第二區攔水土堤施作
- ▶ 第二區防塵網施作
- ▶ 第五區灑水線施作
- ▶ 第五區攔水土堤施作
- ▶ 各區緊急應變作為



108年度改善措施執行期程

實際進度


預定進度

改善措施		108年度											實際完成	
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		4
水利防制工法	水覆蓋			計畫發包 50%		視汛期後灘地變化檢討 10%	進場施作			施作				執行中
	<p>5% 10%</p>													
水利防制工法	河道整理			計畫發包 50%		視汛期後灘地變化檢討 10%	進場施作			施作				300公尺
	<p>5% 10%</p>													
水利防制工法	疏濬												126萬m3	
	<p>50% 100%</p>													
	<p>30% 50% 70% 80%</p>													
防災應變	其他措施	核定計畫			完成發包	施作							執行中	
<p>100%</p>														
造林新植與撫育	灘地綠覆蓋					施作			施作				執行中	
	<p>5% 10% 80% 100%</p>													
造林新植與撫育	堤防培厚植栽	施作		完成造林								執行中		
<p>50% 50%</p>														

108年度改善措施分區項目及KPI達成率


改善措施		區域					KPI 達成率	108.9 KPI	備註
		第一區	第二區	第三區	第四區	第五區			
水利 防制 工法	水覆蓋(300公頃)	-	-				5%	10%	執行中
			150M			200M			
	河道整理(2.5KM)						12%	10%	執行中
						300公尺			
	河道疏濬及去化 土砂 (375萬方)(視實 際發包情形滾動 檢討)						33.6%	30%	執行中
						126萬方			
防災 應變	其他覆蓋(500公 頃)	-	-			-	14.5%	5%	執行中
		42.2公頃	18.0公頃	0.4公頃		12公頃	72.6公頃		
造林 新植 與撫 育	灘地綠覆蓋(50公頃)						100%	-	執行中
		5公頃	6公頃	15公頃		61公頃	87公頃		
	防洪林帶及行道樹 (15公里)	-	-			-	100%	100%	執行中
	7.5公里	7.2公里			7.0公里	21.7公里			

本周施作项目及位置

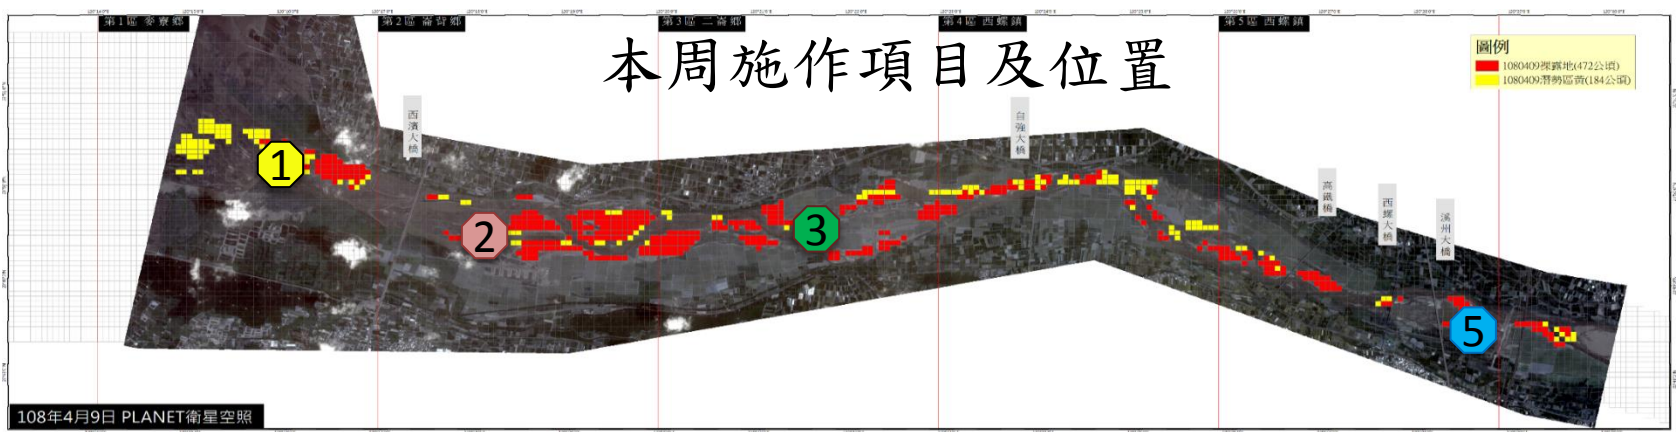

區域	施工位置	施工內容	目前進度
一	南岸麥寮	打井作業	16.0口
一	南岸麥寮	200公頃灑水線	20公頃
二	大庄	攔水土堤	150M
三	二崙清潔隊前	平鋪式防塵網	0.2公頃
五	高鐵下	防洪林帶植栽	0.5公頃
五	高鐵下	攔水土堤	200M
五	溪州大橋上游	撒播草籽	62.0公頃

108年濁水溪揚塵抑制已完成項目及位置

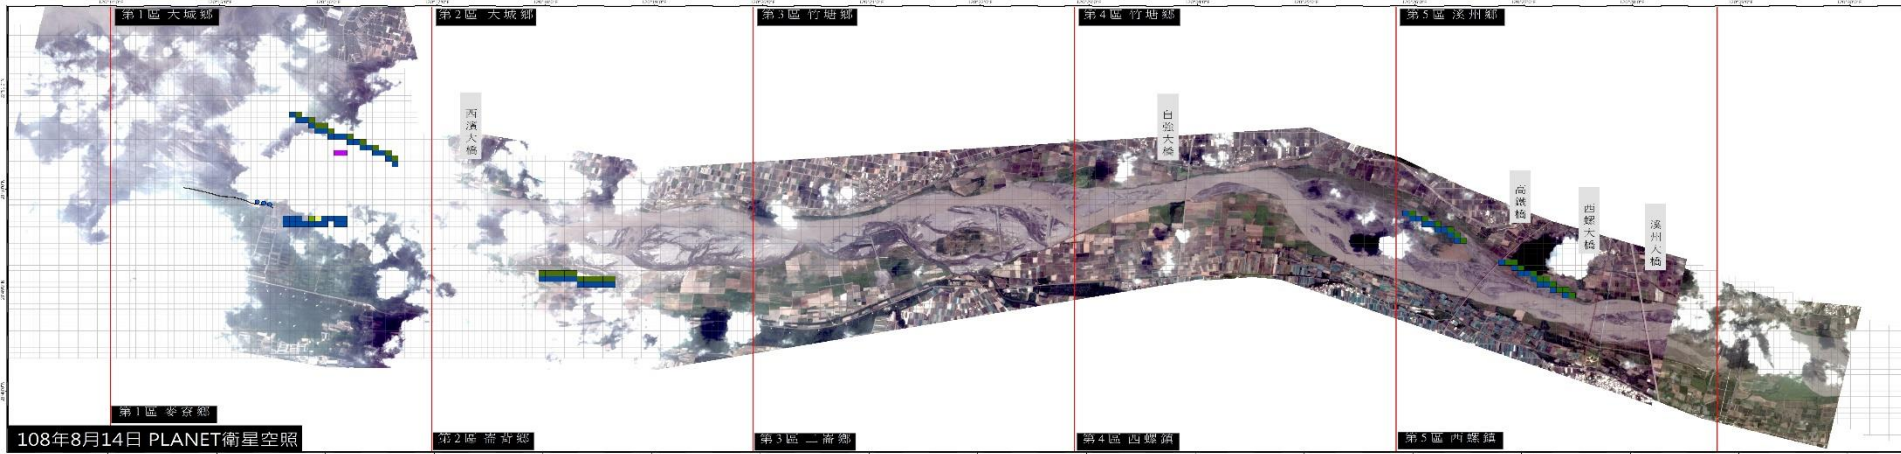

第一區

- 水覆蓋：
- 綠覆蓋：
- 防洪植栽7.5公里
- 綠覆蓋5公頃
- 其他措施：
- 簡易灑水系統抑制 (16.0公頃)
- 200公頃灑水系統 (20.0公頃)
- 三仙膠噴灑(2公頃)
- 稻草鋪設(0.4公頃)
- 直立式防塵網(1.5公頃)
- 出海口水井打設 (16.0口)
- 便道鋪設級配(2.3公頃)

第二區

- 水覆蓋：
- 蓄水池塘施工
- 綠覆蓋：
- 防洪植栽7.2公里
- 綠覆蓋6公頃
- 其他措施：
- 簡易灑水系統抑制 (18公頃)

第三區

- 水覆蓋：
- 綠覆蓋：
- 草籽撒播15公頃
- 其他措施：
- 平鋪防塵網(0.2公頃)
- 便道鋪設級配(0.2公頃)

第四區

- 水覆蓋：
- 綠覆蓋：
- 其他措施：

第五區

- 水覆蓋：
- 蓄水池塘施工
- 綠覆蓋：
- 防洪植栽7.0公里
- 草籽撒播61公頃
- 其他措施：
- 簡易灑水系統抑制 11.5公頃)
- 便道鋪設級配(0.5公頃)
