

濁水溪揚塵抑制 1080826~1080901周報表

- ▶ 第一區直立式防塵網佈設
- ▶ 第一區出海口水井打設
- ▶ 第二區簡易灑水系統佈設
- ▶ 第五區溪州大橋上游撒播草種




108年度改善措施執行期程

實際進度

預定進度


改善措施		108年度											實際完成	
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		4
水利防制工法	水覆蓋			計畫發包 50%		視汛期後灘地變化檢討 10%	進場施作 30% 50% 70%			施作 80%				執行中
	河道整理			計畫發包 50%		視汛期後灘地變化檢討 10%	進場施作 30% 50% 70%			施作 80%				300公尺
	疏濬	施作											83萬m3	
防災應變	其他措施	核定計畫 100%			完成發包	施作							發包完成	
造林新植與撫育	灘地綠覆蓋					施作			施作				執行中	
	堤防培厚植栽	施作		完成造林								執行中		

本周施作项目及位置

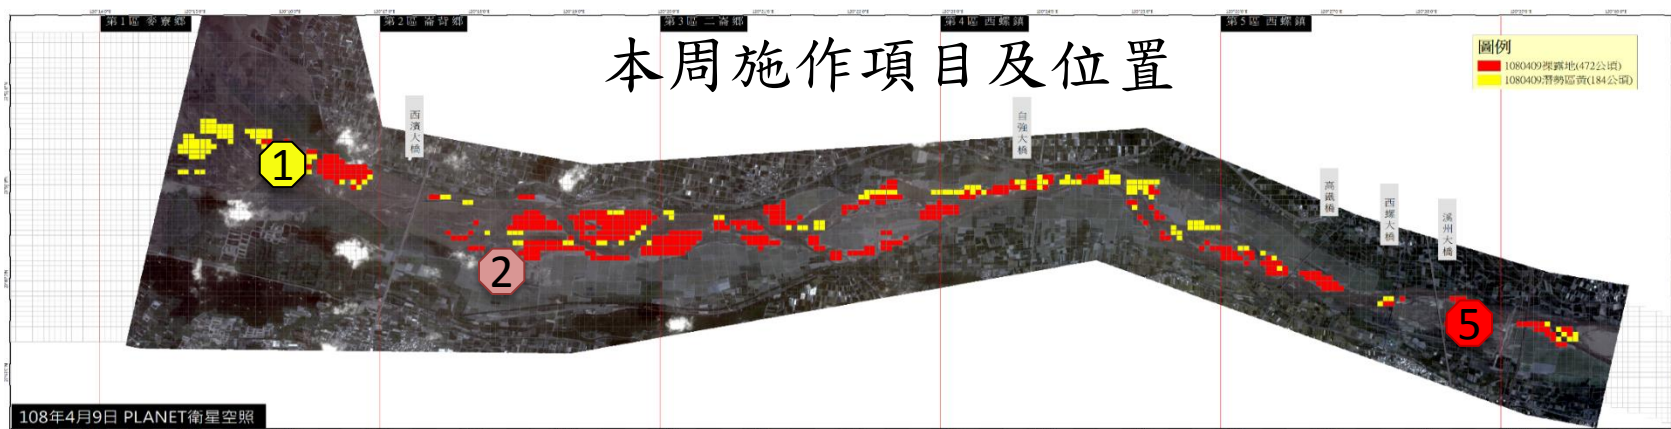

區域	施工位置	施工內容	目前進度
一	南岸麥寮	打井作業	6.0口
一	南岸麥寮	直立式防塵網	0.4公頃
二	南岸崙背	簡易灑水系統	2.0公頃
五	溪州大橋上游	撒播草籽	8.0公頃

108年濁水溪揚塵抑制已完成項目及位置

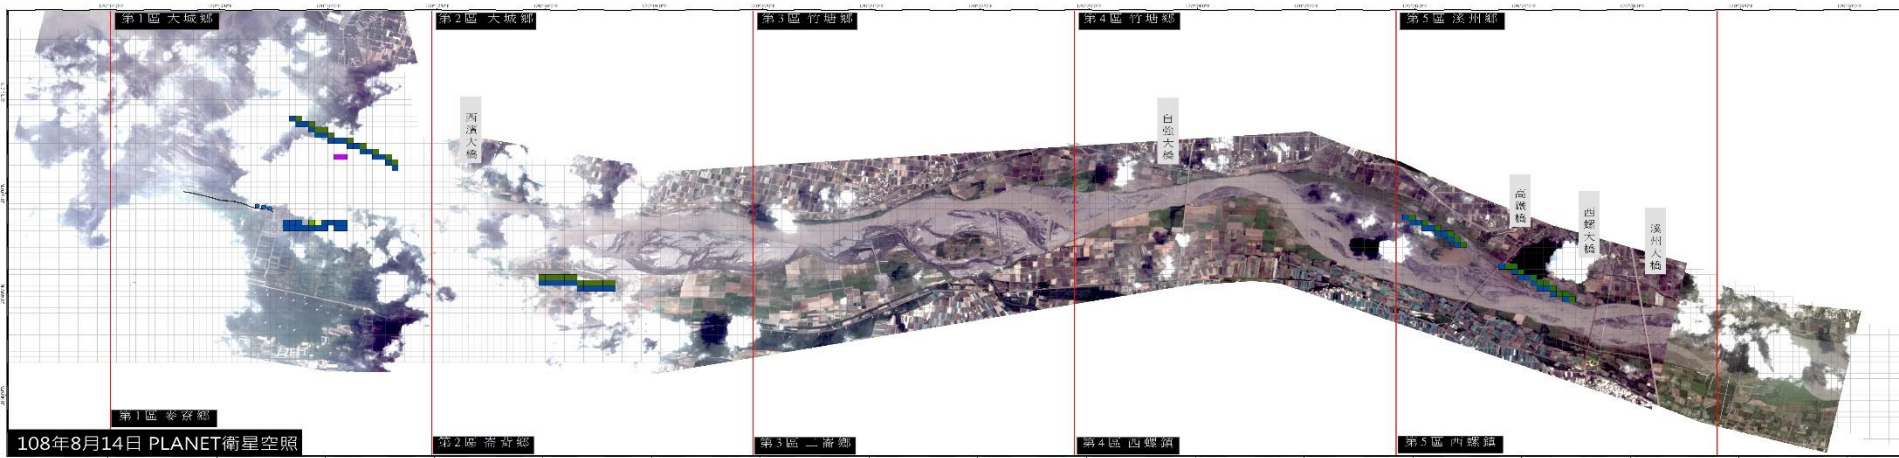

第一區	第二區	第三區	第四區	第五區
<ul style="list-style-type: none"> ● 水覆蓋： ● 綠覆蓋： ■ 防洪植栽6.0公里 ● 其他措施： ■ 簡易灑水系統抑制 (16.0公頃) ■ 三仙膠噴灑(2公頃) ■ 稻草鋪設(0.4公頃) ■ 直立式防塵網(0.4公頃) ● 出海口水井打設 (5.0口) ■ 便道鋪設級配(1.5公頃) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 水覆蓋： ● 綠覆蓋： ■ 防洪植栽7.2公里 ● 其他措施： ■ 簡易灑水系統抑制 (14公頃) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 水覆蓋： ● 綠覆蓋： ● 其他措施： 	<ul style="list-style-type: none"> ● 水覆蓋： ● 綠覆蓋： ● 其他措施： 	<ul style="list-style-type: none"> ● 水覆蓋： ● 綠覆蓋： ■ 防洪植栽7.0公里 ■ 草籽撒播8.0公頃 ● 其他措施： ■ 簡易灑水系統抑制 (7.5公頃)
