

濁水溪揚塵抑制

1081021~1081027周報表

- ▶ 第一區出海口水線佈設
- ▶ 第一區攔水土堤施作
- ▶ 第一區防塵網施作
- ▶ 第二區攔水土堤施作
- ▶ 第三區防塵網施作
- ▶ 第五區防塵網施作
- ▶ 第五區攔水土堤施作
- ▶ 各區緊急應變作為



108年度改善措施執行期程


實際進度

預定進度

改善措施		108年度												實際完成
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	
水利防制工法	水覆蓋			計畫發包		視汛期後灘地變化檢討	進場施作			施作				執行中
		50%					30%	50%	70%	80%	100%			
	河道整理			計畫發包		視汛期後灘地變化檢討	進場施作			施作				2300公尺
		92%					30%	50%	70%	80%	100%			
	疏濬	施作												126萬m3
		33.6%					50%			70%	80%	100%		
防災應變	其他措施	核定計畫			完成發包	施作								執行中
		32.16%					10%	80%	100%					
造林新植與撫育	灘地綠覆蓋						施作			施作				執行中
		100%					5%	10%	80%	100%				
	堤防培厚植栽	施作			完成造林									執行中
100%					2									


108年度改善措施分區項目及KPI達成率

改善措施		區域					KPI 達成率	108.10 KPI	備註
		第一區	第二區	第三區	第四區	第五區			
水利 防制 工法	水覆蓋(300公頃)	30公頃	80公頃			70公頃	60% 180公頃	30%	執行中
	河道整理(2.5KM)						92% 2300公尺	30%	執行中
	河道疏濬及去化 土砂 (375萬方)(視實 際發包情形滾動 檢討)						33.6% 126萬方	50%	執行中
防災 應變	其他覆蓋(500公 頃)	- 94.5公頃	- 18.0公頃	- 26.3公頃		- 22.0公頃	32.16% 160.8公頃	10%	執行中
	造林新植與撫育	- 5公頃	- 6公頃	- 61公頃	- 10公頃	- 61公頃	100% 143公頃	5%	執行中
造林 新植 與撫 育	灘地綠覆蓋(50公頃)	- 5公頃	- 6公頃	- 61公頃	- 10公頃	- 61公頃	100% 143公頃	5%	執行中
	防洪林帶及行道樹 (15公里)	- 7.5公里	- 7.2公里			- 11.8公里	100% 26.5公里	100%	執行中

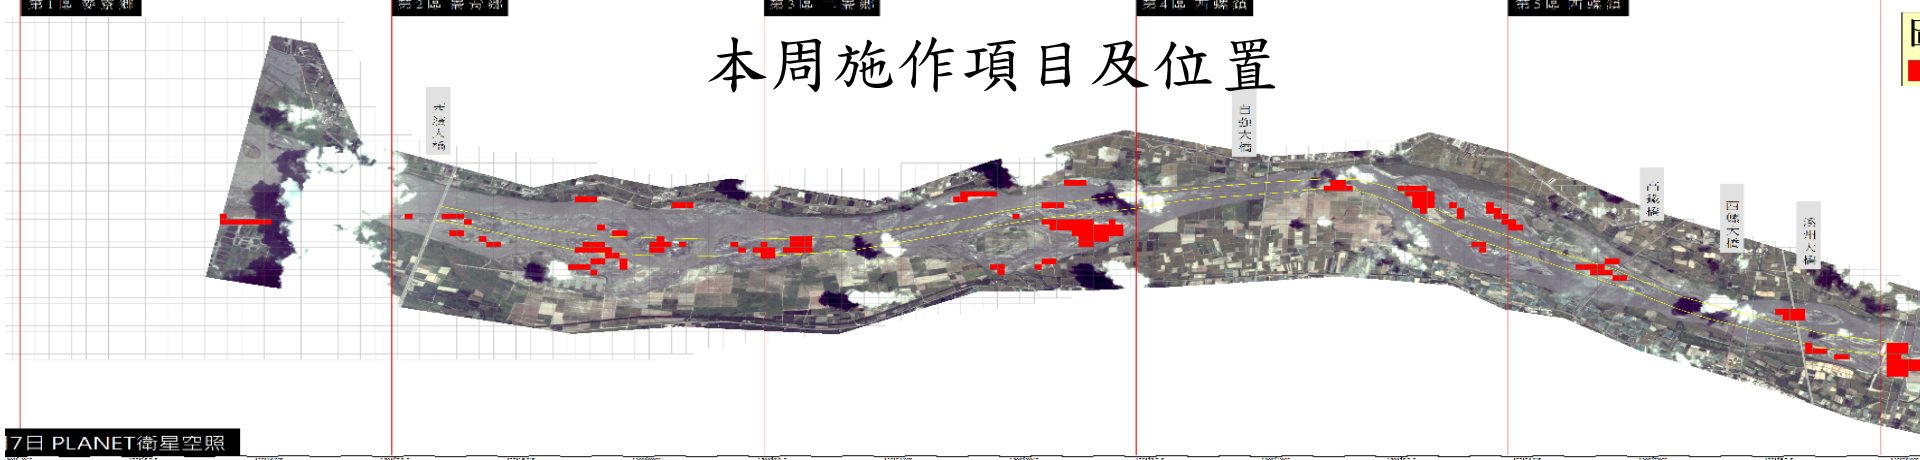

區域	施工位置	施工內容	目前進度
一	北岸大城	攔水土堤	3800M
一	南岸麥寮	200公頃灑水線	72公頃
一	南岸麥寮	平鋪式防塵網	0.3公頃
二	大庄	攔水土堤	3800M
三	二崙清潔隊前	平鋪式防塵網	26.1公頃
五	西螺橋下	攔水土堤	800M
五	中沙大橋下	平鋪式防塵網	11公頃

108年濁水溪揚塵抑制已完成項目及位置

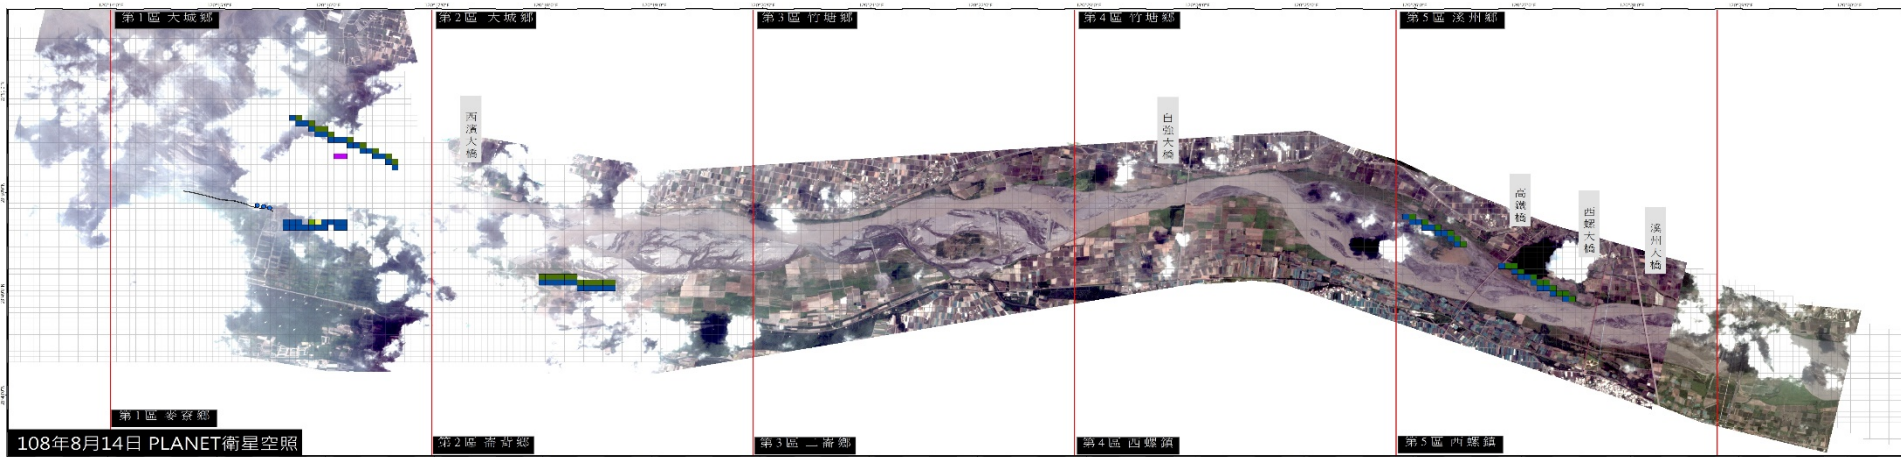

第一區	第二區	第三區	第四區	第五區
●水覆蓋： - 蓄水池塘30公頃 ●綠覆蓋： - 防洪植栽7.5公里 - 綠覆蓋 5公頃 ●其他措施： - 簡易灑水系統抑制 (16.0公頃) 200公頃灑水系統 (72.0公頃) - 三仙膠噴灑(2公頃) - 稻草鋪設(0.4公頃) - 直立式防塵網(1.5公頃) - 水井打設 (18口) - 便道鋪設級配(2.3公頃) - 平鋪防塵網(0.3公頃)	●水覆蓋： - 蓄水池塘80公頃 ●綠覆蓋： - 防洪植栽7.2公里 - 綠覆蓋 6公頃 ●其他措施： - 簡易灑水系統抑制 (18公頃)	●水覆蓋： ●綠覆蓋： - 草籽撒播 61公頃 ●其他措施： - 平鋪防塵網 (26.1公頃) - 便道鋪設級配 (0.2公頃)	●水覆蓋： ●綠覆蓋： - 草籽撒播10公頃 ●其他措施：	●水覆蓋： - 蓄水池塘70公頃 ●綠覆蓋： - 防洪植栽11.8公里 - 草籽撒播61公頃 ●其他措施： - 簡易灑水系統抑制 11.5公頃) - 便道鋪設級配(0.5公頃) - 平鋪防塵網(11.0公頃)
