

濁水溪揚塵抑制

1081104~1081110周報表

- ▶ 第一區出海口水線佈設
- ▶ 第一區攔水土堤施作
- ▶ 第一區防塵網施作
- ▶ 第二區攔水土堤施作
- ▶ 第三區防塵網施作
- ▶ 第五區防塵網施作
- ▶ 第五區攔水土堤施作
- ▶ 各區緊急應變作為



108年度改善措施執行期程


預定進度

實際進度

改善措施		108年度												實際完成	
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4		
水利 防制 工法	水覆蓋			計畫 發包		視汛 期後 灘地 變化	進場施作			施作				執行中	
		5%		10%		30%	50%	70%	80%	100%					
		100%													
	河道整理			計畫 發包		視汛 期後 灘地 變化	進場施作			施作				2300公 尺	
		5%		10%		30%	50%	70%	80%	100%					
		92%													
	疏濬	施作												128萬 m3	
		5%		10%		30%		50%		70%		80%			100%
		32.1%													
防災 應變	其 他 措 施	核定 計畫			完成 發包	施作								執行中	
		5%		10%		80%		100%							
		33.6%													
造林 新植 與撫 育	灘地綠覆蓋						施作			施作				執行中	
		5%		10%			80%			100%					
		100%													
	堤防培厚植栽	施作			完成 造林									執行中	
		100%													


108年度改善措施分區項目及KPI達成率

改善措施		區域					KPI 達成率	108.11K PI	備註
		第一區	第二區	第三區	第四區	第五區			
水利 防制 工法	水覆蓋(300公頃)	140公頃	100公頃			70公頃	100% 310公頃	50%	執行中
	河道整理(2.5KM)		300M	2000M			92% 2300公尺	50%	執行中
	河道疏濬及去化 土砂 (405萬方)(視實 際發包情形滾動 檢討)	47萬方	4.2萬方	79萬方			32.1% 130.2萬方	50%	執行中
防災 應變	其他覆蓋(500公 頃)	166.5公頃	18.0公頃	34.2公頃		23.0公頃	33.6% 169.7公頃	40%	執行中
造林 新植 與撫 育	灘地綠覆蓋(50公頃)	5公頃	6公頃	61公頃	10公頃	61公頃	100% 143公頃	10%	執行中
	防洪林帶及行道樹 (15公里)	7.5公里	7.2公里			11.8公里	100% 26.5 ³ 公里	100%	執行中

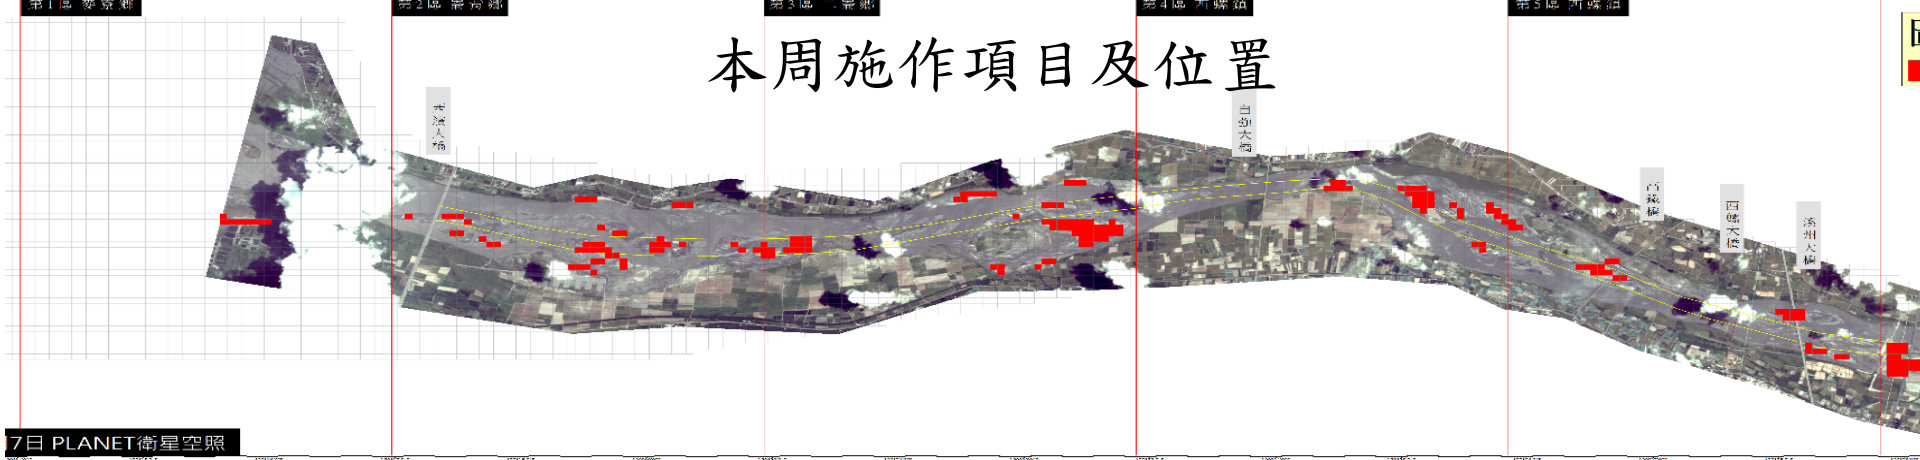

區域	施工位置	施工內容	目前進度
一	北岸大城	攔水土堤	800M
一	南岸麥寮	200公頃灑水線	144公頃
一	南岸麥寮	平鋪式防塵網	0.3公頃
二	大庄	攔水土堤	2700M
三	二崙清潔隊前	平鋪式防塵網	34.0公頃
五	中沙大橋下	平鋪式防塵網	11公頃

108年濁水溪揚塵抑制已完成項目及位置

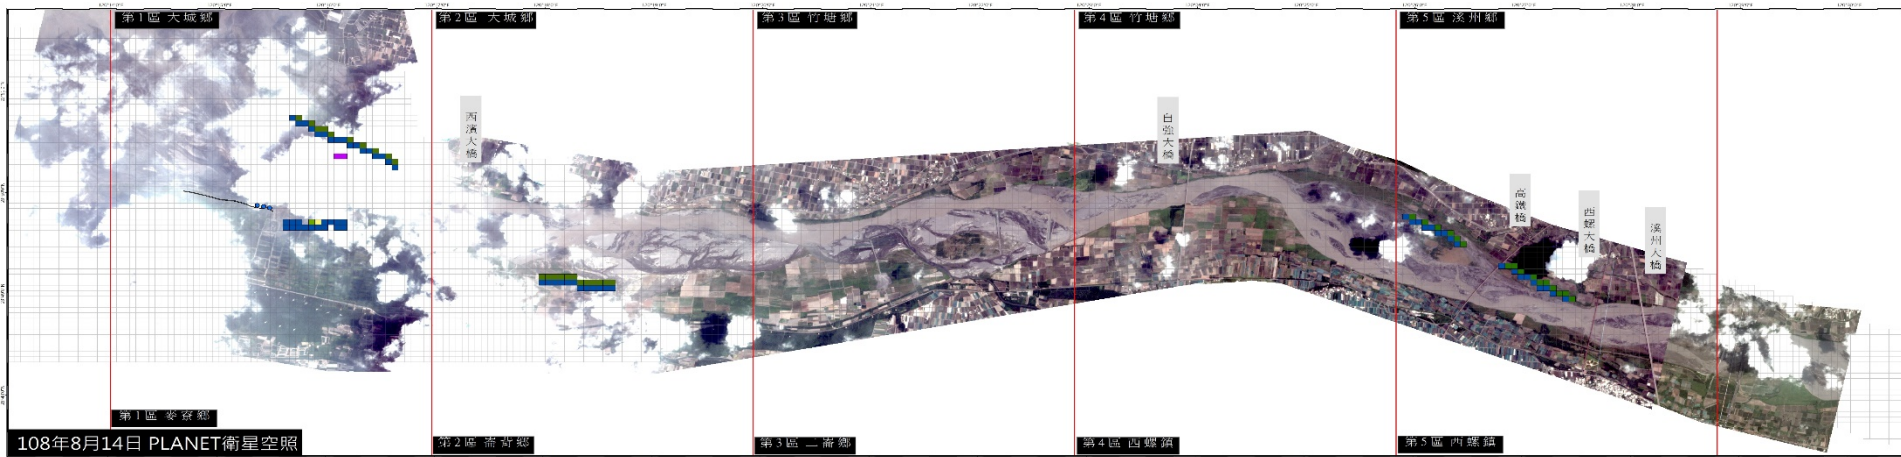

第一區	第二區	第三區	第四區	第五區
●水覆蓋： 蓄水池塘140公頃 去化土砂47萬方 ●綠覆蓋： 防洪植栽7.5公里 綠覆蓋 5公頃 ●其他措施： 簡易灑水系統抑制 (16.0公頃) 200公頃灑水系統 (144.0公頃) 三仙膠噴灑(2公頃) 稻草鋪設(0.4公頃) 直立式防塵網(1.5公頃) 水井打設 (18口) 便道鋪設級配(2.3公頃) 平鋪防塵網(0.3公頃)	●水覆蓋： 蓄水池塘100公頃 去化土砂4.2萬方 河道整理300M ●綠覆蓋： 防洪植栽7.2公里 綠覆蓋 6公頃 ●其他措施： 簡易灑水系統抑制 (18公頃)	●水覆蓋： 去化土砂79萬方 河道整理2000M ●綠覆蓋： 草籽撒播 61公頃 ●其他措施： 平鋪防塵網 (34.0公頃) 便道鋪設級配 (0.2公頃)	●水覆蓋： ●綠覆蓋： 草籽撒播10公頃 ●其他措施：	●水覆蓋： 蓄水池塘70公頃 ●綠覆蓋： 防洪植栽11.8公里 草籽撒播61公頃 ●其他措施： 簡易灑水系統抑制 11.5公頃) 便道鋪設級配(0.5公頃) 平鋪防塵網(11.0公頃)
