

濁水溪揚塵抑制

1080923~1080929周報表


- ▶ 第一區出海口水井打設
- ▶ 第二區攔水土堤施作
- ▶ 第三區防塵網施作
- ▶ 第五區攔水土堤施作
- ▶ 各區緊急應變作為



108年度改善措施分區項目及KPI達成率


改善措施		區域					KPI 達成率	108.9 KPI	備註
		第一區	第二區	第三區	第四區	第五區			
水利 防制 工法	水覆蓋(300公頃)					- 40公頃	13% 40公頃	10%	執行中
	河道整理(2.5KM)						72% 1800公尺	10%	執行中
	河道疏濬及去化 土砂 (375萬方)(視實 際發包情形滾動 檢討)						33.6% 126萬方	30%	執行中
防災 應變	其他覆蓋(500公 頃)	-	-	-	-	-	19.2%	5%	執行中
		62.2公頃	18.0公頃	3.8公頃		12公頃	96.2公頃		
造林 新植 與撫 育	灘地綠覆蓋(50公頃)	-	-	-	-	-	100%	-	執行中
		5公頃	6公頃	33公頃	10公頃	61公頃	115公頃		
	防洪林帶及行道樹 (15公里)	-	-			-	100%	100%	執行中
7.5公里	7.2公里			11.8公里	26.5 ³ 公里				

本周施作項目及位置

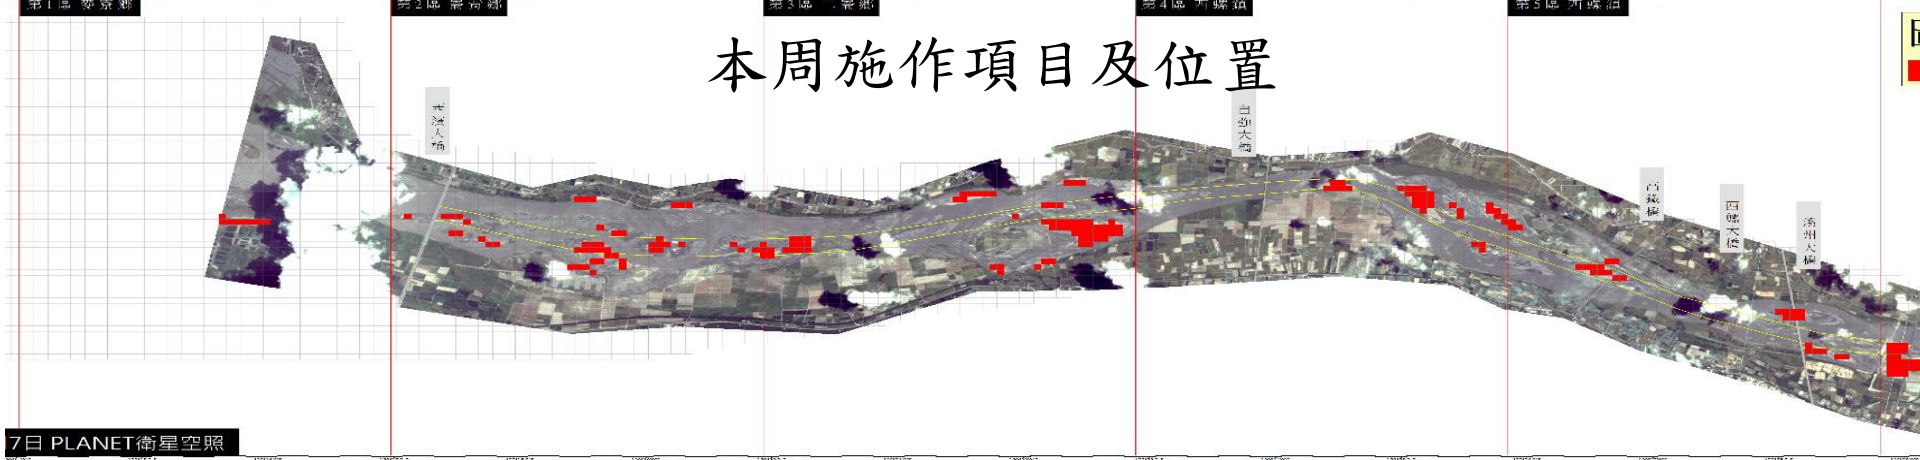

區域	施工位置	施工內容	目前進度
一	南岸麥寮	打井作業	18.0口
一	南岸麥寮	200公頃灑水線	40公頃
二	大庄	攔水土堤	800M
三	二崙清潔隊前	平鋪式防塵網	3.8公頃
三	二崙清潔隊前	草籽撒播	18公頃
五	高鐵下	攔水土堤	800M
五	西螺橋下	攔水土堤	800M

108年濁水溪揚塵抑制已完成項目及位置

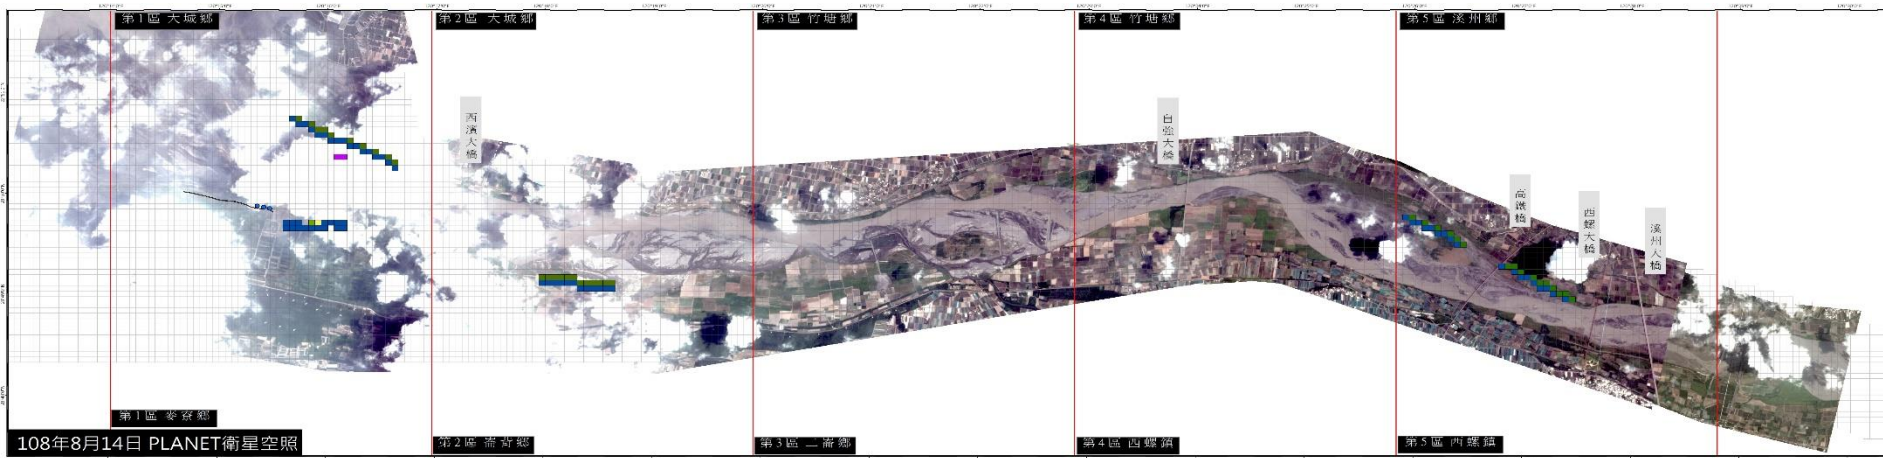

第一區	第二區	第三區	第四區	第五區
<ul style="list-style-type: none"> ● 水覆蓋： ● 綠覆蓋： ■ 防洪植栽7.5公里 ■ 綠覆蓋5公頃 ● 其他措施： ■ 簡易灑水系統抑制 (16.0公頃) ■ 200公頃灑水系統 (40.0公頃) ■ 三仙膠噴灑(2公頃) ■ 稻草鋪設(0.4公頃) ■ 直立式防塵網(1.5公頃) ● 出海口水井打設 (18口) ■ 便道鋪設級配(2.3公頃) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 水覆蓋： ● 綠覆蓋： ■ 防洪植栽7.2公里 ■ 綠覆蓋6公頃 ● 其他措施： ■ 簡易灑水系統抑制 (18公頃) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 水覆蓋： ● 綠覆蓋： ■ 草籽撒播33公頃 ● 其他措施： ■ 平鋪防塵網(3.8公頃) ■ 便道鋪設級配(0.2公頃) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 水覆蓋： ● 綠覆蓋： ■ 草籽撒播10公頃 ● 其他措施： 	<ul style="list-style-type: none"> ● 水覆蓋： ■ 蓄水池塘40公頃 ● 綠覆蓋： ■ 防洪植栽11.8公里 ■ 草籽撒播61公頃 ● 其他措施： ■ 簡易灑水系統抑制 11.5公頃) ■ 便道鋪設級配(0.5公頃)
