

濁水溪揚塵抑制

1080930~1081006周報表

- ▶ 第一區出海口水線佈設
- ▶ 第一區攔水土堤施作
- ▶ 第二區攔水土堤施作
- ▶ 第三區防塵網施作
- ▶ 第三區草籽撒播
- ▶ 第五區防塵網施作
- ▶ 第五區攔水土堤施作
- ▶ 各區緊急應變作為



108年度改善措施執行期程


實際進度

預定進度

改善措施		108年度												實際完成
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	
水利防制工法	水覆蓋			計畫發包		視汛期後灘地變化檢討	進場施作			施作				執行中
		13%					30%	50%	70%	80%	100%			
	河道整理			計畫發包		視汛期後灘地變化檢討	進場施作			施作				2300公尺
		92%					30%	50%	70%	80%	100%			
	疏濬	施作												126萬m3
		33.6%					50%			70%		80%		
防災應變	其他措施	核定計畫			完成發包	施作								執行中
		20.4%					10%	80%		100%				
造林新植與撫育	灘地綠覆蓋						施作			施作				執行中
		100%					5%	10%		80%			100%	
	堤防培厚植栽	施作			完成造林									執行中
100%					2									

108年度改善措施分區項目及KPI達成率


改善措施		區域					KPI 達成率	108.10 KPI	備註
		第一區	第二區	第三區	第四區	第五區			
水利 防制 工法	水覆蓋(300公頃)					- 70公頃	23% 70公頃	30%	執行中
	河道整理(2.5KM)						92% 2300公尺	30%	執行中
	河道疏濬及去化 土砂 (375萬方)(視實際 發包情形滾動 檢討)						33.6% 126萬方	50%	執行中
防災 應變	其他覆蓋(500公 頃)	-	-	-		-	20.5%	10%	執行中
		62.2公頃	18.0公頃	9.9公頃		13.7公頃	102.6公頃		
造林 新植 與撫育	灘地綠覆蓋(50公頃)	-	-	-	-	-	100%	-	執行中
		5公頃	6公頃	39公頃	10公頃	61公頃	121公頃		
	防洪林帶及行道樹 (15公里)	-	-			-	100%	5%	執行中
		7.5公里	7.2公里			11.8公里	26.5 ³ 公里		

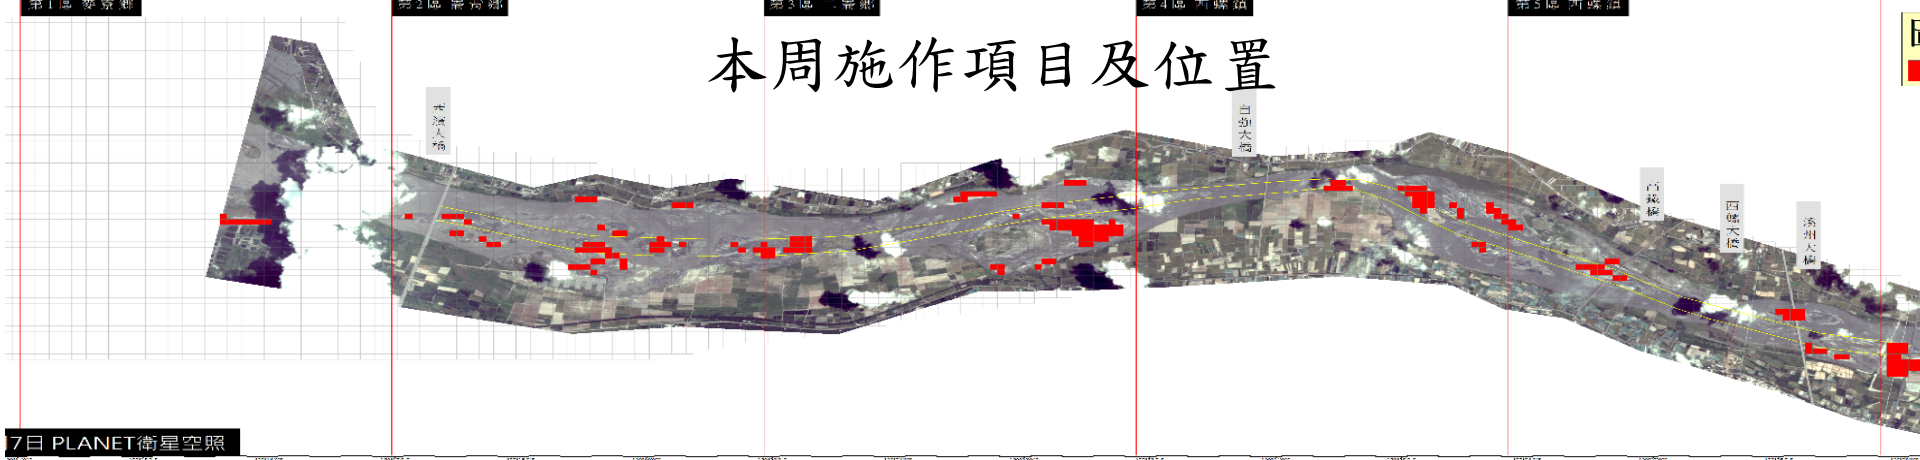

本周施作項目及位置

區域	施工位置	施工內容	目前進度
一	北岸大城	攔水土堤	350M
一	南岸麥寮	200公頃灑水線	40公頃
二	大庄	攔水土堤	800M
三	二崙清潔隊前	平鋪式防塵網	8.2公頃
三	二崙清潔隊前	草籽撒播	24公頃
五	高鐵下	攔水土堤	1600M
五	西螺橋下	攔水土堤	800M
五	中沙大橋下	平鋪式防塵網	1.7公頃

108年濁水溪揚塵抑制已完成項目及位置

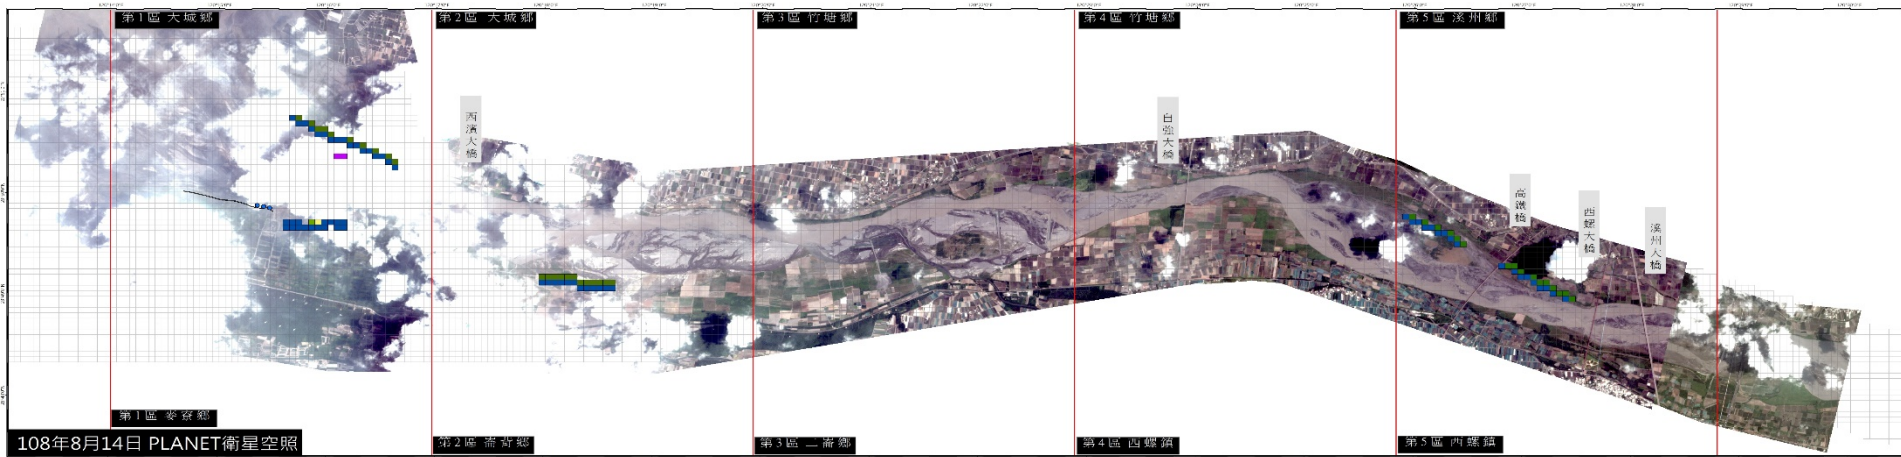

第一區	第二區	第三區	第四區	第五區
●水覆蓋： ●綠覆蓋： ■ 防洪植栽7.5公里 ■ 綠覆蓋 5公頃 ●其他措施： ■ 簡易灑水系統抑制 (16.0公頃) ■ 200公頃灑水系統 (40.0公頃) ■ 三仙膠噴灑(2公頃) ■ 稻草鋪設(0.4公頃) ■ 直立式防塵網(1.5公頃) ● 出海口水井打設 (18口) ■ 便道鋪設級配(2.3公頃)	●水覆蓋： ●綠覆蓋： ■ 防洪植栽7.2公里 ■ 綠覆蓋 6公頃 ●其他措施： ■ 簡易灑水系統抑制 (18公頃)	●水覆蓋： ●綠覆蓋： ■ 草籽撒播 39公頃 ●其他措施： ■ 平鋪防塵網(8.2公頃) ■ 便道鋪設級配 (0.2公頃)	●水覆蓋： ●綠覆蓋： ■ 草籽撒播10公頃 ●其他措施：	●水覆蓋： ■ 蓄水池塘70公頃 ●綠覆蓋： ■ 防洪植栽11.8公里 ■ 草籽撒播61公頃 ●其他措施： ■ 簡易灑水系統抑制 11.5公頃) ■ 便道鋪設級配(0.5公頃) ■ 平鋪防塵網(1.7公頃)
