#### 濁水溪揚塵抑制1081216~1081222周報表



崙背大庄培厚作業



麥寮大沙洲平舖防塵網

各區緊急應變作為




















## 本周施作項目及位置




區域	施工位置	施工內容	目前進度
_	崙背大庄	培厚	14.2萬方
	大沙洲	平鋪防塵網	4.2公頃

# 108年度改善措施執行期程

預定進度

實際進度

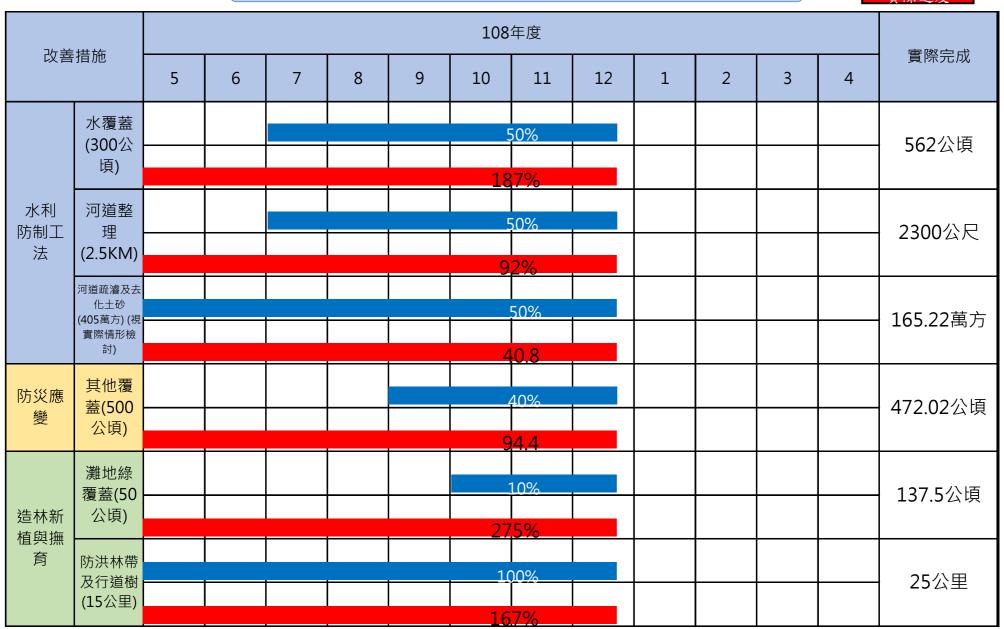

# 108年度改善措施分區項目及KPI達成率

改善措施				KPI達成	11月	備註			
		第一區	第二區	第三區	第四區	第五區	率	KPI	7年 元
水利 防制工 法	水覆蓋 (300公 頃)	140.0 公頃	192.0 公頃		50.0 公頃	180.0 公頃	187%	- 50%	
							562		
	河道整理		300.0 M	2000.0 M			92%	50%	
	(2.5KM)		300.0 101	2000.0 101			2300	3070	
	河道疏濬及去 化土砂 (405萬方) (視 實際情形檢 討)	68.6 苗	14.6 萬	82.0 萬			40.8%	- 50%	
		00.0 점					165.2		
防災應	其他覆 蓋(500 公頃)	305.7 公頃	49.9 公頃	35.2 公頃		81.2 公頃	94.4%	40%	
變							472		
造林新 植與撫 育	灘地綠 覆蓋(50 公頃)		4.0 公頃	61.0 公頃	10.0 公頃	61.0 公頃	275%	10%	
							137.5		
	防洪林帶 及行道樹 (15公里)	<mark>── 5道樹                                  </mark>	7.2 公里			11.8 公里	167%	- 100%	
			7.2 公主			11.0 Д圭	25		

### 各區空拍現況(更新至1208)

蓄水池塘施作完畢



第二區

第一區

蓄水池塘施作完畢



第三區

防塵網鋪設完畢



第四區


蓄水池塘施作完畢



第五區

蓄水池塘施作完畢





108年11月17日 PLANE	T衛星空頭	第2座曲号编		第3屆 、治 和	# 41	er on the sta	第2時 四	19等 6首	10000
第一區		第二區		第三區		第四區		第五區	
水覆蓋		水覆蓋		▲ 水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋	
蓄水池塘(公頃)	140	蓄水池塘(公頃)	192	蓄水池塘(公頃)	10	蓄水池塘(公頃)	50	蓄水池塘(公頃)	180
綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋	
北岸林帶植栽(公里)	6	I 防洪植栽(公里)	7.2	▮草籽撒播(公頃)	61	▮草籽撒播(公頃)	10	▮防洪植栽(公里)	11.8
大沙丘植栽(公里)	1.5	綠覆蓋 (公頃)	4	1				草籽撒播(公頃)	61
疏濬填池綠覆(公頃)	2.5			ì		i i		i	
大沙丘綠覆(公頃)	2			į				Ī	
林帶植栽(公頃)	4.2								
其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋	
	68.62	去化土砂(萬方)	14.6	去化土砂(萬方)	82	三仙膠(公頃)	26.1	三仙膠(公頃)	53.9
大沙丘水線(公頃)	20	河道整理(M)	300	河道整理(M)	2000			灑水系統(公頃)	7.5
200公頃灑水系統	200	灑水系統(公頃)	18	平鋪防塵網	35	I I		便道鋪設級配(公頃)	0.5
(公頃)		牡蠣殼鋪灑(公頃)	11.91	便道鋪設級配	0.2			平鋪防塵網(公頃)	19.3
三仙膠(公頃)	2	三仙膠(公頃)	20	■ 三仙膠(公頃)	6.23				
稻草鋪設(公頃)	0.4			! !		<u> </u>		I I	
疏濬填池鋪設稻草(公頃)	2.5			<u>i                                      </u>		<u>i</u>			
便道鋪設級配(公頃)	2.3			<u> </u>		<u> </u>			
平鋪防塵網(公頃)	4.5								
直立式防塵網(公頃)	8								
, ,	47.68								
` ,	11.21								
碎石級配(公頃)	7.12			<u> </u>					
其他覆蓋總計	305.71	其他覆蓋總計	49.91	▲ 其他覆蓋總計	35.2	其他覆蓋總計	26.1	其他覆蓋總計	81.2
