#### 濁水溪揚塵抑制1090106~1090112周報表



# 崙背大庄培厚作業

#### 各區緊急應變作為























區域	施工位置	施工內容	目前進度
	崙背大庄	培厚	21萬方

## 濁水溪揚塵改善措施執行期程

預定進度

實際進度

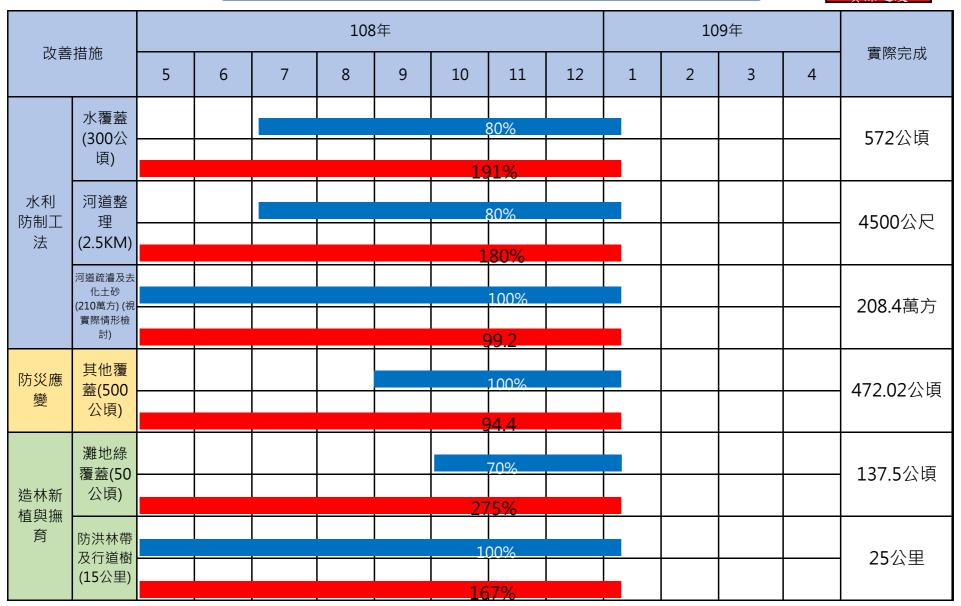

### 108年度改善措施分區項目及KPI達成率

小美	措施			KPI	109年	備註			
以音	打日川也	第一區	第二區	第三區	第四區	第五區	達成率	1月KPI	油 计
	水覆蓋 (300公 頃)	140.0 公頃	192.0 公頃	10.0 公頃	50.0 公頃	180.0 公頃	191%	- 80%	
							572		
水利防制工	   河道整   理		2000.0 M	2500.0 M			180%	- 80%	
法	(2.5KM)		2000.0 1				4500		
	河道疏濬及去 化土砂 (210萬方) (視		40.1 萬	82.6 萬		-	99.2%	- 100%	
	實際情形檢討)	03.7 ឝ					208.4		
防災應	其他覆 萘(500	其他覆 蓋(500 公頃) 305.7 公頃	49.9 公頃	35.2 公頃		81.2 公頃	94.4%	- 100%	
變							472		
			4.0 公頃	61.0 公頃	10.0 公頃	61.0 公頃	275%	70%	
造林新 植與撫							137.5		
育	防洪林帶及行道樹(15公里)	道樹 6.0 公里	7.2 公里			11.8 公里	167%	- 100%	
							25		

### 各區空拍現況(更新至0102)

第三區

防塵網鋪設完畢

第一區

蓄水池塘施作完畢



第四區

蓄水池塘施作完畢

第二區


蓄水池塘施作完畢



第五區

蓄水池塘施作完畢





_	108年11月17日 PLANET 衛星空川 第2		第2位高智源	第2四曲資源 第3回,常源 2000年		\$ 410	场 西埃 纳	1 102 204	- motors		
	第一區		第二區 水覆蓋		第三區水覆蓋		第四區		第五區		
	水覆蓋	Ī					水覆蓋		水覆蓋		
	蓄水池塘(公頃)	140	蓄水池塘(公頃)	192	蓄水池塘(公頃)	10	蓄水池塘(公頃)	50	蓄水池塘(公頃)	180	
	綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋		
	北岸林帶植栽(公里)	6	防洪植栽(公里)	7.2	草籽撒播(公頃)	61	草籽撒播(公頃)	10	防洪植栽(公里)	11.8	
	大沙丘植栽(公里)			4					草籽撒播(公頃) 61		
	疏濬填池綠覆(公頃)	2.5									
	大沙丘綠覆(公頃)	2					!				
	林帶植栽(公頃)	4.2			İ		İ		İ		
	其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋		
	去化土砂(萬方)	85.7	去化土砂(萬方)	40.1	去化土砂(萬方)	82.6	三仙膠(公頃)	26.1	三仙膠(公頃)	53.9	
	大沙丘水線(公頃)	20	河道整理(M)	2000	河道整理(M)	2500			麗水系統(公頃)	7.5	
	200公頃灑水系統	200	灑水系統(公頃)     18       牡蠣殼鋪灑(公頃)     11.91		平鋪防塵網	35			便道鋪設級配(公頃)	0.5	
	(公頃)	200			便道鋪設級配 0.2				平鋪防塵網(公頃)	19.3	
	三仙膠(公頃)	2	三仙膠(公頃)	20	三仙膠(公頃)	6.23					
	稻草鋪設(公頃)	0.4									
	疏濬填池鋪設稻草(公頃)	2.5									
	便道鋪設級配(公頃)	2.3									
	平鋪防塵網(公頃)	4.5									
	直立式防塵網(公頃)	8									
	三仙膠(公頃)	47.68									
	牡蠣殼鋪灑(公頃)	11.21									
	碎石級配(公頃)	7.12									
	其他覆蓋總計	305.71	其他覆蓋總計	49.91	其他覆蓋總計	35.2	其他覆蓋總計	26.1	其他覆蓋總計	81.2	
