




濁水溪揚塵抑制1090224~1090301周報表

➡ 各區緊急應變作為

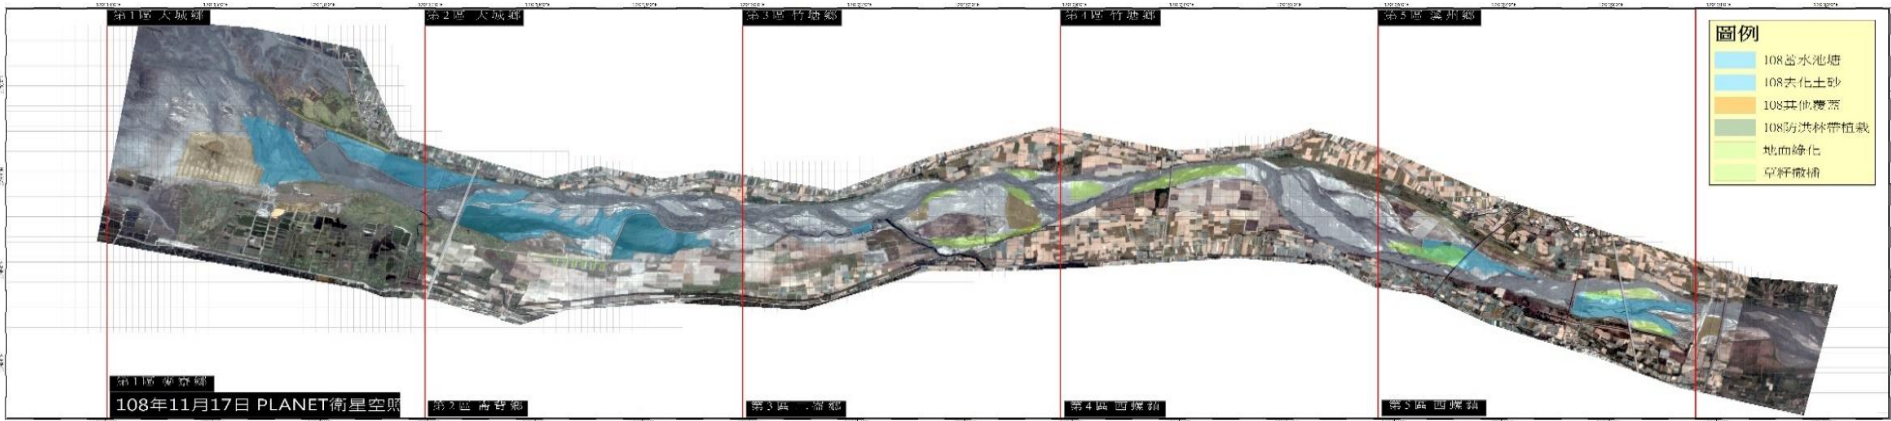

本周施作項目及位置

[illegible]

濁水溪揚塵改善措施執行期程

預定進度

實際進度

改善措施		108年								109年				實際完成	
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4		
水利 防制工 法	水覆蓋 (300公 頃)			80%										572公頃	
		191%													
	河道整 理 (2.5KM)			80%										4500公尺	
		180%													
	河道疏濬及去 化土砂 (210萬方)(視 實際情形檢 討)	100%												286.7萬方	
		136.5													
防災應 變	其他覆 蓋(500 公頃)					100%								676.55公頃	
		135.3													
造林新 植與撫 育	灘地綠 覆蓋(50 公頃)						70%								147.2公頃
		294%													
	防洪林帶 及行道樹 (15公里)	100%												26.1公里	
		174%													

108年度改善措施分區項目及KPI達成率

改善措施		區域					KPI 達成率	109年 2月KPI	備註
		第一區	第二區	第三區	第四區	第五區			
水利 防制工 法	水覆蓋 (300公 頃)	140.0 公頃	192.0 公頃	10.0 公頃	50.0 公頃	180.0 公頃	191%	80%	
							572		
	河道整 理 (2.5KM)		2000.0 M	2500.0 M			180%	80%	
							4500		
	河道疏濬及去 化土砂 (210萬方) (視 實際情形檢 討)	155.0 萬	49.1 萬	82.6 萬			136.5%	100%	
							286.7		
防災應 變	其他覆 蓋(500 公頃)	321.2 公頃	69.3 公頃	148.4 公頃		137.6 公頃	135.3%	100%	
							676.55		
造林新 植與撫 育	灘地綠 覆蓋(50 公頃)	6.0 公頃	9.2 公頃	61.0 公頃	10.0 公頃	61.0 公頃	294%	70%	
							147.2		
	防洪林帶 及行道樹 (15公里)	7.0 公里	7.2 公里			11.9 公里	174%	100%	
							26.1		

各區空拍現況(更新至0205)

第一區

蓄水池塘施作完畢



第二區

蓄水池塘施作完畢



第三區

防塵網鋪設完畢



第四區


蓄水池塘施作完畢



第五區

蓄水池塘施作完畢



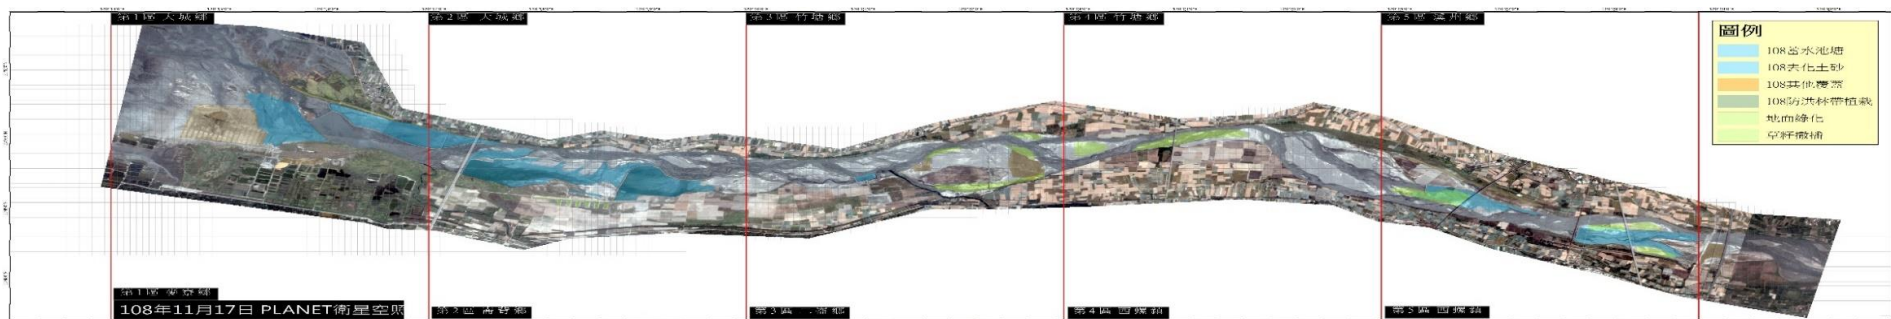

第一區		第二區		第三區		第四區		第五區	
水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋	
蓄水池塘(公頃)	140	蓄水池塘(公頃)	192	蓄水池塘(公頃)	10	蓄水池塘(公頃)	50	蓄水池塘(公頃)	180
綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋	
林帶植栽(公頃)	7	防洪植栽(公頃)	7.2	草籽撒播(公頃)	61	草籽撒播(公頃)	10	防洪植栽(公頃)	11.9
大沙丘植栽(公頃)	1.5	綠覆蓋 (公頃)	9.2					草籽撒播(公頃)	61
疏濬填池綠覆(公頃)	2.5								
大沙丘綠覆(公頃)	2								
林帶植栽(公頃)	4.2								
其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋	
去化土砂(萬方)	155	去化土砂(萬方)	49.1	去化土砂(萬方)	82.6	三仙膠(公頃)	26.1	三仙膠(公頃)	53.9
大沙丘水線(公頃)	20	河道整理(M)	2000	河道整理(M)	2500	稻草鋪設(農民)公頃	20	灑水系統(公頃)	11.9
200公頃灑水系統(公頃)	216	灑水系統(公頃)	18	平鋪防塵網	35			便道鋪設級配(公頃)	0.5
		牡蠣殼鋪灑(公頃)	10.12	便道鋪設級配	0.2			平鋪防塵網(公頃)	19.3
三仙膠(公頃)	2	三仙膠(公頃)	20	三仙膠(公頃)	6.23			稻草鋪設(農民)公頃	52
稻草鋪設(公頃)	2.5	稻草鋪設(農民)公頃	21	稻草鋪設(農民)公頃	107				
便道鋪設級配(公頃)	3.35	碎石級配鋪設	0.2						
疏濬簡易灑水佈設(公頃)	2								
平鋪防塵網(公頃)	4.5								
直立式防塵網(公頃)	8								
三仙膠(公頃)	49.7								
牡蠣殼鋪灑(公頃)	10								
碎石級配(公頃)	3.15								
其他覆蓋總計	321.2	其他覆蓋總計	69.32	其他覆蓋總計	148.43	其他覆蓋總計	46.1	其他覆蓋總計	137.6
