

工程變更設計會勘紀錄

111 年 05 月 11 日

工 程 名 稱	卑南溪德高段疏濬土石採售分離作業計畫-工程標				壹、會勘情形： 略。	貳、結論： 1. 本案經本局及廠商人員現勘達成共識，因汛期已至，為疏導水流及保護堤防安全，本工程可將疏濬作業區大塊石搬運至海端四號堤防堤腳整平堆置。 2. 本案概估需新增使用 2 部 300 型開挖機（1 部疏濬區、1 部於海端四號堤腳堆置整平塊石）、3 部 21 噸運輸車輛、鋪設運輸便道 2 條（寬約 8 公尺、長約 500 公尺，相關配置詳附圖）。施工日數需約 14 工作天，合計約需 120 萬元，詳附表。（不含原疏濬區開挖機費用、此費用將依契約原單價及實作數量結算）。 3. 因原契約項目中並未編列上述堆置整平之怪手及運輸車輛，將由承辦單位擇期辦理契約變更新增項目及議價事宜。 4. 請主辦單位儘速依「工程契約變更單價編列及議價處理原則」等相關規定辦理後續作業。
執 行 單 位	經濟部水利署 第八河川局		工程編號	111-I-01020-021-000		
承 攬 廠 商	東捷營造有限公司		契約金額	9,150,000		
第 一 次 修 正 金 額		第 二 次 修 正 金 額				
第 三 次 修 正 金 額		第 四 次 修 正 金 額				
預 定 進 度	84.94%	實 際 進 度	81.76%			
進 度 超 前	%	進 度 落 後	3.18%			
會 勘 單 位 及 出 席 人 員						
東捷營造有限公司： 張順利						
經濟部水利署第八河川局： 馮懿真 陳水序						

「卑南溪德高段疏濬土石採售分離作業計畫-工程標」工程變更設計現場會勘紀錄

一、時間：111 年 5 月 11 日（星期三）上午 10 時 30 分整

二、地點：德高疏濬工區

三、主持人：湯懿真

四、紀錄：陳水厚

五、會勘單位：

東捷營造有限公司：詔順利

經濟部水利署第八河川局：

陳水厚

工程變更設計現場會勘

德高疏濬工區



德高疏濬工區



德高疏濬工區




工程變更設計現場會勘

德高疏濬工區



德高疏濬工區

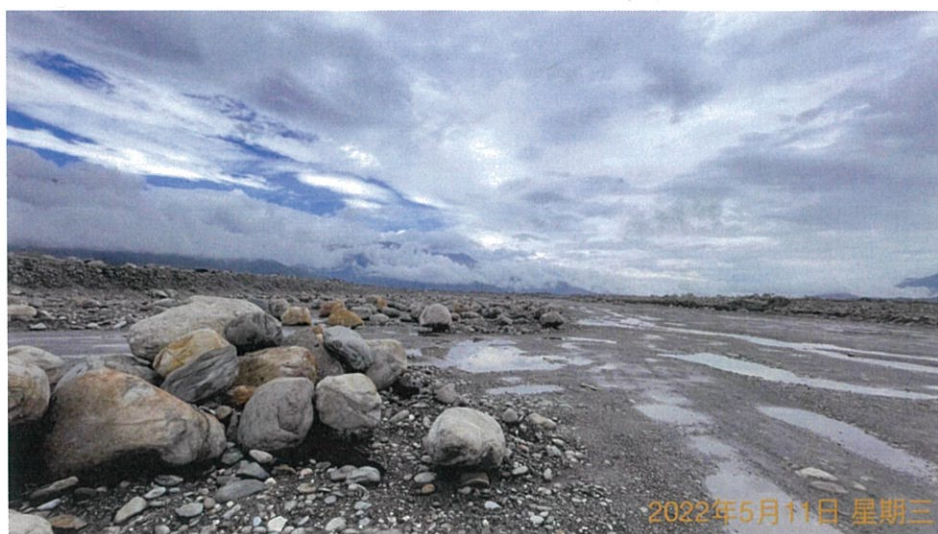


德高疏濬工區



大石塊區域堆置示意圖

為您的地圖撰寫說明。

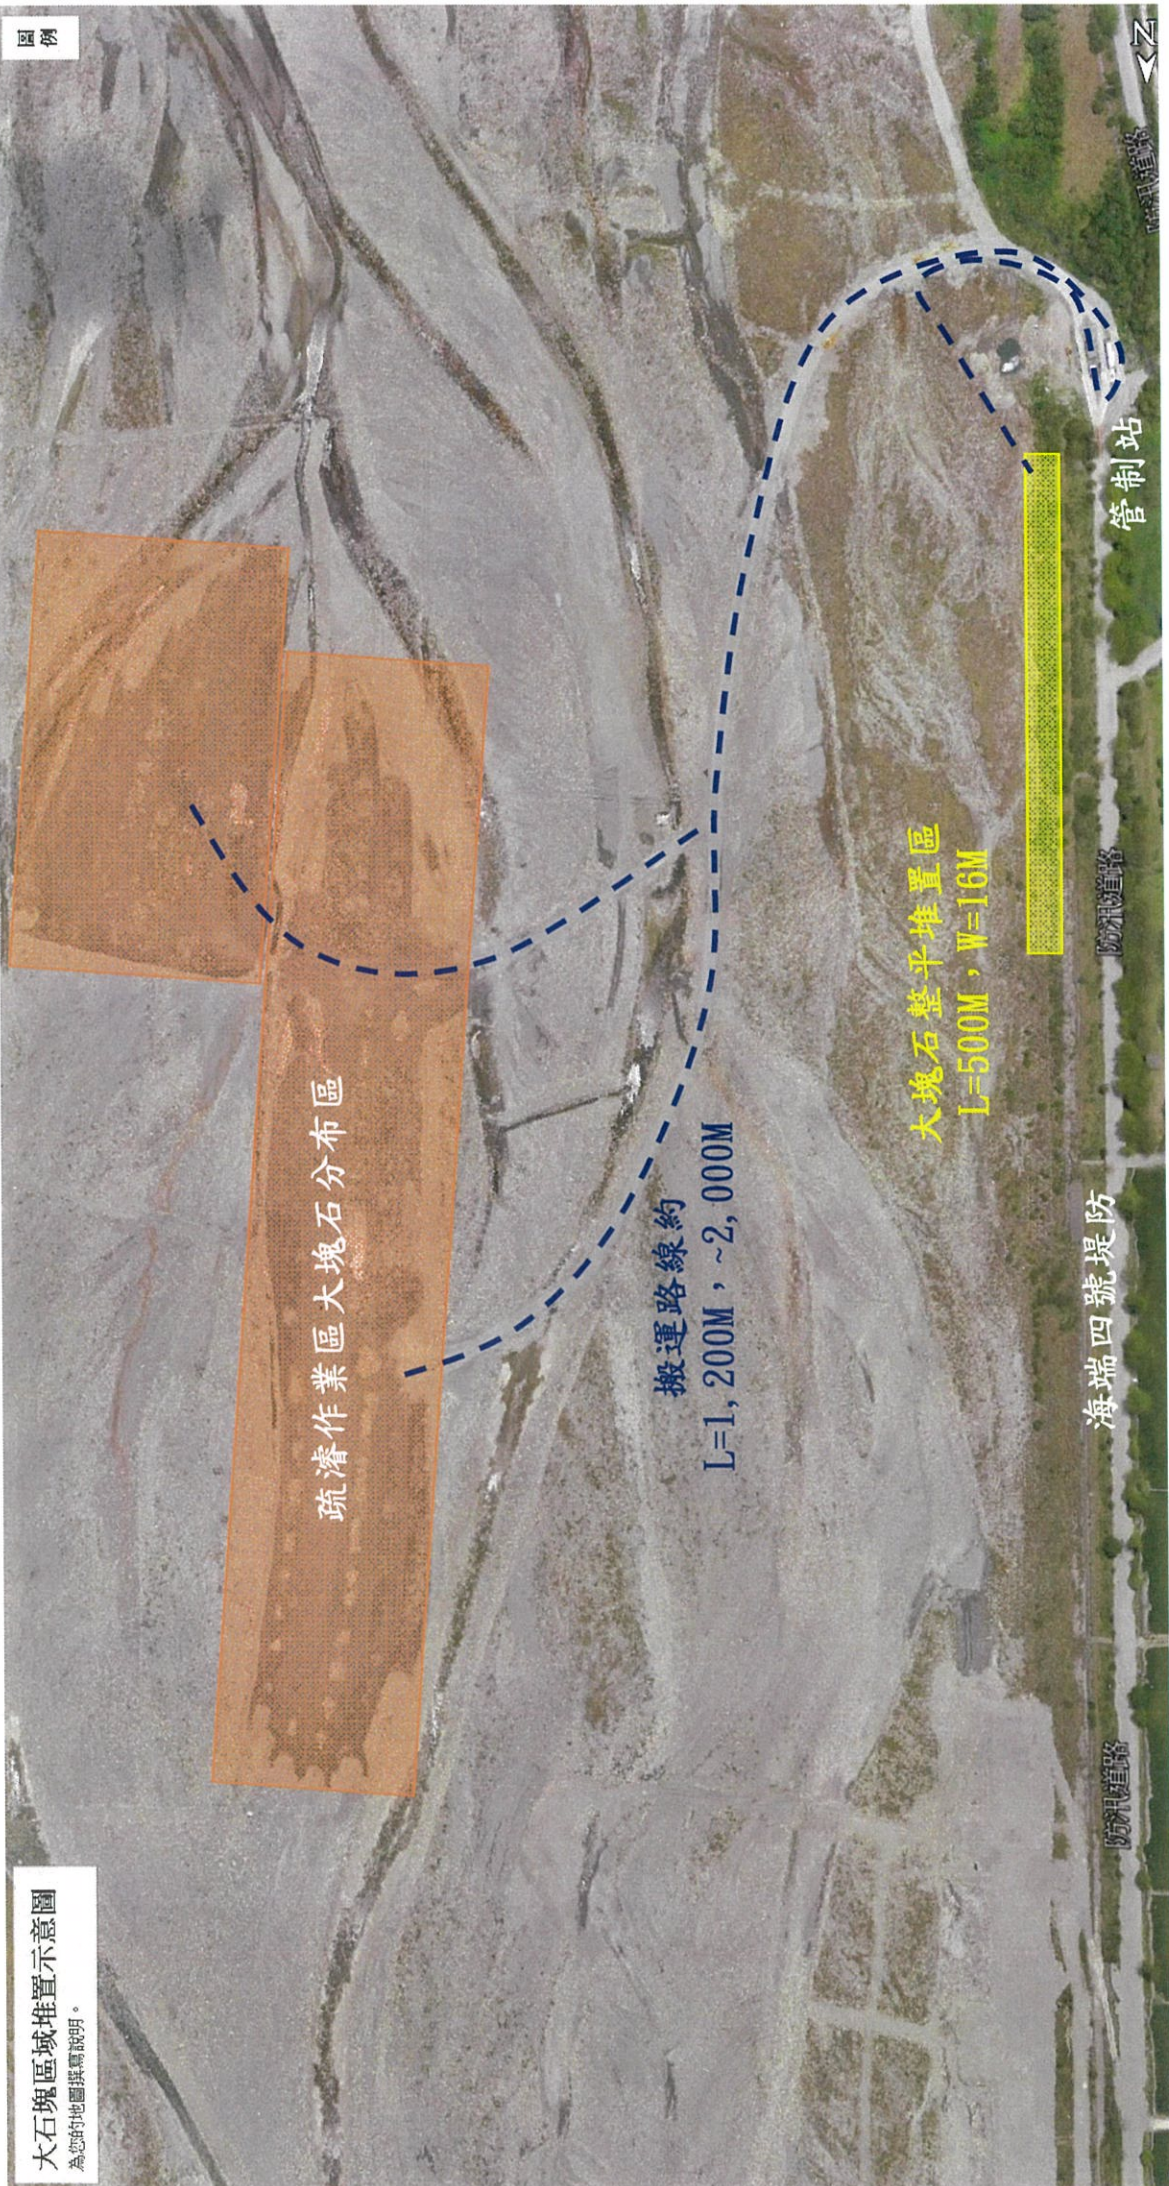

圖例

大石塊堆置示意圖 備註：主辦工程司可以依現況調整，並以實作數量結算。

預估變更設計增加金額

施工機具標準名稱	規格	每小時費率 元/小時	小時/天	天	台	元	備註
開挖機，履帶式， 1.20~1.29m ³ ，總重30 噸	總重30公噸，挖 斗1.2 m ³	1,850	12	14	1	310,800	新增工項
傾卸貨車，總重 20~20.9t	21公噸 (8m ³)	1,150	12	14	3	579,600	新增工項
河床運輸便道設施費	148.71	M/元	1,000	M		148,710	既有工項

小計 1,039,110

廠商管理什費 111,893
營業稅 57,550

合計 1,208,553 元

備註：依據水利工程工資率分析參考手冊-常用施工機械費率分析表試算。
