

## 生態保育措施抽查紀錄表

編號：

C2-208-01013


工程名稱	曾文南化聯通管統包工程 A2 標		
分項工程名稱	水管橋分段工程		
檢查位置	水管橋	檢查日期	11 年 4 月 12 日
檢查結果	○檢查合格	×有缺失需改正	/無此檢查項目
措施	抽査項目	實際抽查情形	抽查結果
迴避	溪流兩岸為可能的爬蟲類等物種棲息環境，應保全溪流兩岸植生環境及重要樹種，以提供良好繁殖場域。	無破壞轉殖種	○
	保護稀有植物、老樹或指標物種。	無影響老樹	○
縮小	施工便道之設置，避開有生態保全對象或生態敏感性較高之區域。	避開敏感區	○
	跨河構造物施工應避免完全阻斷河道水流，造成下游斷流。	設引水道	○
減輕	盡量縮小施工(含施工便道)範圍，減少對生態物種等棲地影響。	盡量縮小	○
	水管橋落墩需與曾文一號橋平行，且減少落墩數，縮小渦流沖刷所影響河床棲地範圍。	平行舊橋放	○
補償	於不涉及工區範圍之生態敏感區域，以黃色警示線作標示圍繞，避免工程施工時干擾到生態環境。		
	漿砌塊石構造建議採不滿漿施作，保留粗糙表面及石頭間縫隙，以利小型動物攀爬及植物附著。		
	保留工區河床既有塊石，減少開挖或擾動，且塊石不運出河道。	土石不外運	○
複查人員職稱：	水道中區隔工程施作區域，避免施工行為造成下游水質濁度大幅增加。	區隔工程	○
	工區採適當導流水措施或設置臨時沉砂池，避免河川濁度驟升。	設引水道	○
備註：	1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3. 本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。		

監造現場人員：  
張揚平 4/12

監造主任：  
黃慶祥 4/18

## 查(檢)驗照片紀錄

工程名稱：曾文南化聯通管統包工程 A2 標

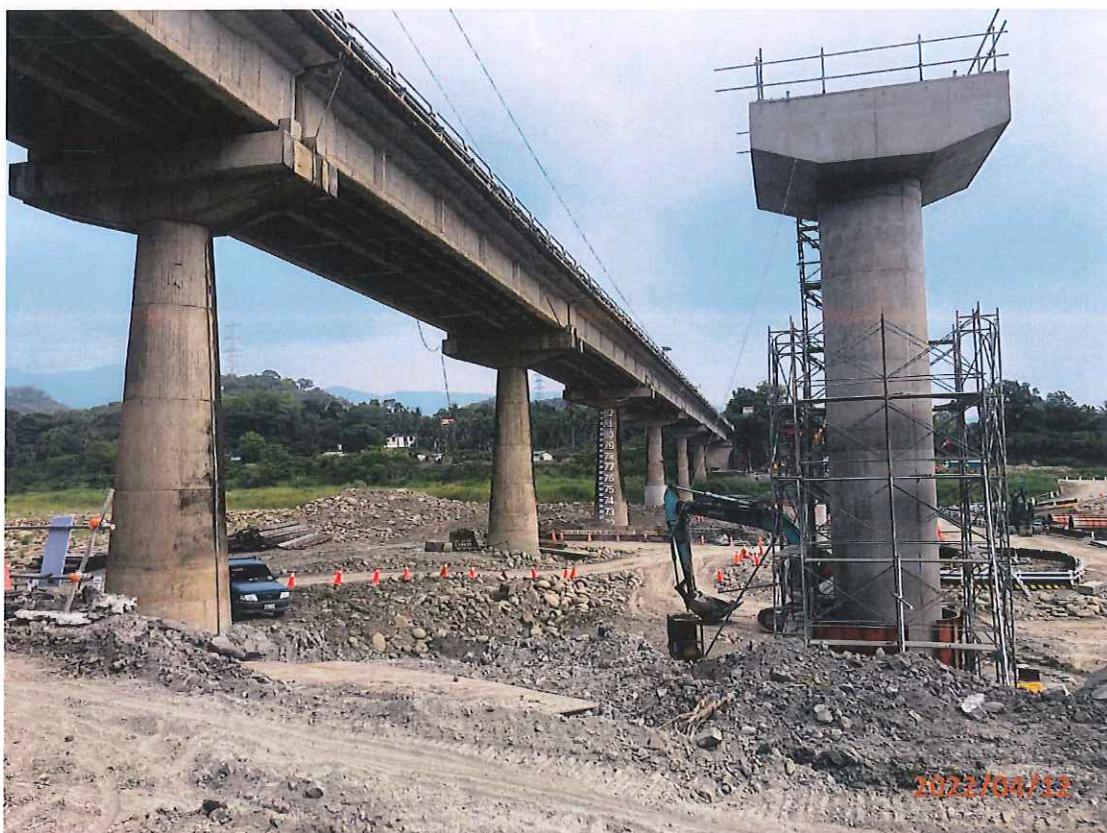

說明：新設橋墩平行舊有橋敦



說明：開設導水引道
