

生態保育措施抽查紀錄表

編號：

C2-208-01-009

工程名稱	曾文南化聯通管統包工程 A2 標		
分項工程名稱	水管橋分項工程		
檢查位置	水管橋工區	檢查日期	110 年 12 月 7 日
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 <input type="radio"/> 無此檢查項目		
措施	抽 查 項 目	實際抽查情形	抽查結果
迴避	溪流兩岸為可能的爬蟲類等物種棲息環境，應保全溪流兩岸植生環境及重要樹種，以提供良好繁殖場域。	減少影響	○
	保護稀有植物、老樹或指標物種。	保全老樹	○
	施工便道之設置，避開有生態保全對象或生態敏感性較高之區域。	避開敏感區	○
	跨河構造物施工應避免完全阻斷河道水流，造成下游斷流。	開闢引道	○
縮小	盡量縮小施工(含施工便道)範圍，減少對生態物種等棲地影響。	盡量縮小	○
	水管橋落墩需與曾文一號橋平行，且減少落墩數，縮小渦流沖刷所影響河床棲地範圍。	落墩平行	○
減輕	於不涉及工區範圍之生態敏感區域，以黃色警示線作標示圍繞，避免工程施工時干擾到生態環境。		
	漿砌塊石構造建議採不滿漿施作，保留粗糙表面及石頭間縫隙，以利小型動物攀爬及植物附著。		
	保留工區河床既有塊石，減少開挖或擾動，且塊石不運出河道。	均保留	○
	水道中區隔工程施作區域，避免施工行為造成下游水質濁度大幅增加。	工區無影響河道	○
	工區採適當導流水措施或設置臨時沉砂池，避免河川濁度驟升。	無影響河道	○
補償	於既有綠帶區栽種苗木或撒播草籽，並定期灑水，加速植被及自然棲地復育。		

缺失複查結果：

已完成改善 (檢附改善前中後照片)

未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善

複查日期： 年 月 日

複查人員職稱：

簽名：

備註：

1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確 (例：磚砌完成後須不透光) 或量化尺寸 (例：磚縫 7mm~10mm)。

2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。

3. 本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。

監造現場人員：

張瑞璋 1/7

監造主任：


趙慶坤 12/13

查(檢)驗照片紀錄

工程名稱：曾文南化聯通管統包工程 A2 標



說明：開闢引道減少下游生態影響

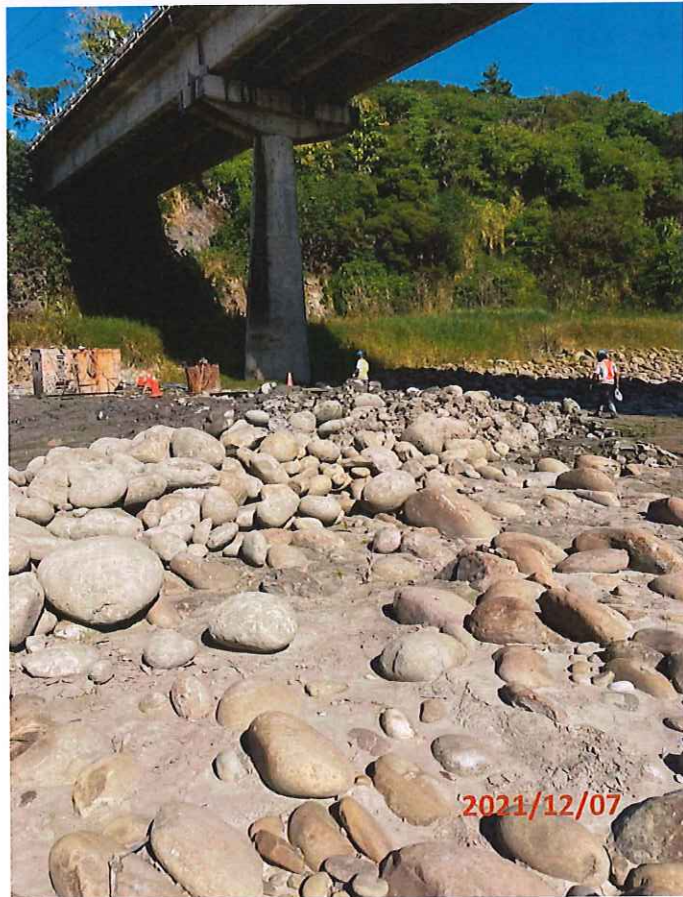

說明：土石不外運
