


# 揚塵防治 週報表

115/01/26~115/02/01





114年8月18日 PLANT 衛星空拍

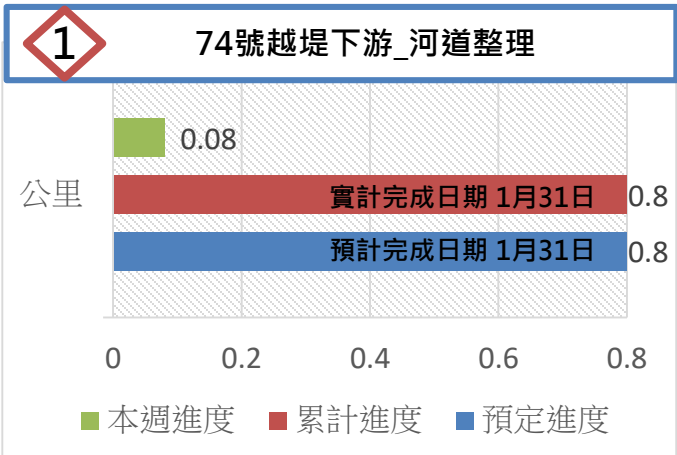



# 各區 空拍現況


第一區

7號越堤路下游



第二區

西濱大橋上游

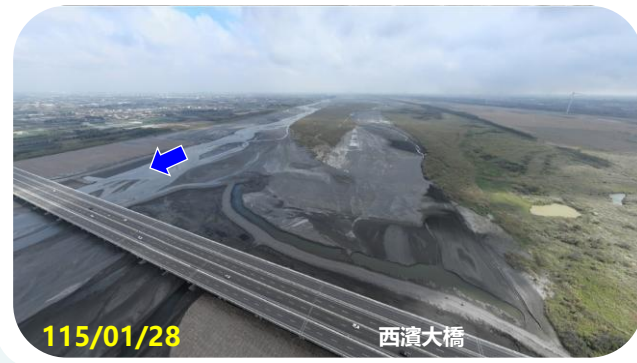

第三區

大義崙排水下游



第四區

自強大橋上下游



第五區

西螺大橋 上下游



114年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:114年5月至115年4月

- 抑制面積
- 進度



## 其他覆蓋

- 目標值 : 300 公頃
- 已完成 : 522.7公頃
- 達成率 : 174.2%



## 水覆蓋

- 目標值 : 400公頃
- 已完成 : 455 公頃
- 達成率 : 113.7 %



## 河道整理

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 3.5公里
- 達成率 : 87.5%



## 防洪植栽


- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 6公里
- 達成率 : 150 %



## 綠覆蓋

- 目標值 : 250 公頃
- 已完成 : 357公頃
- 達成率 : 142.8%



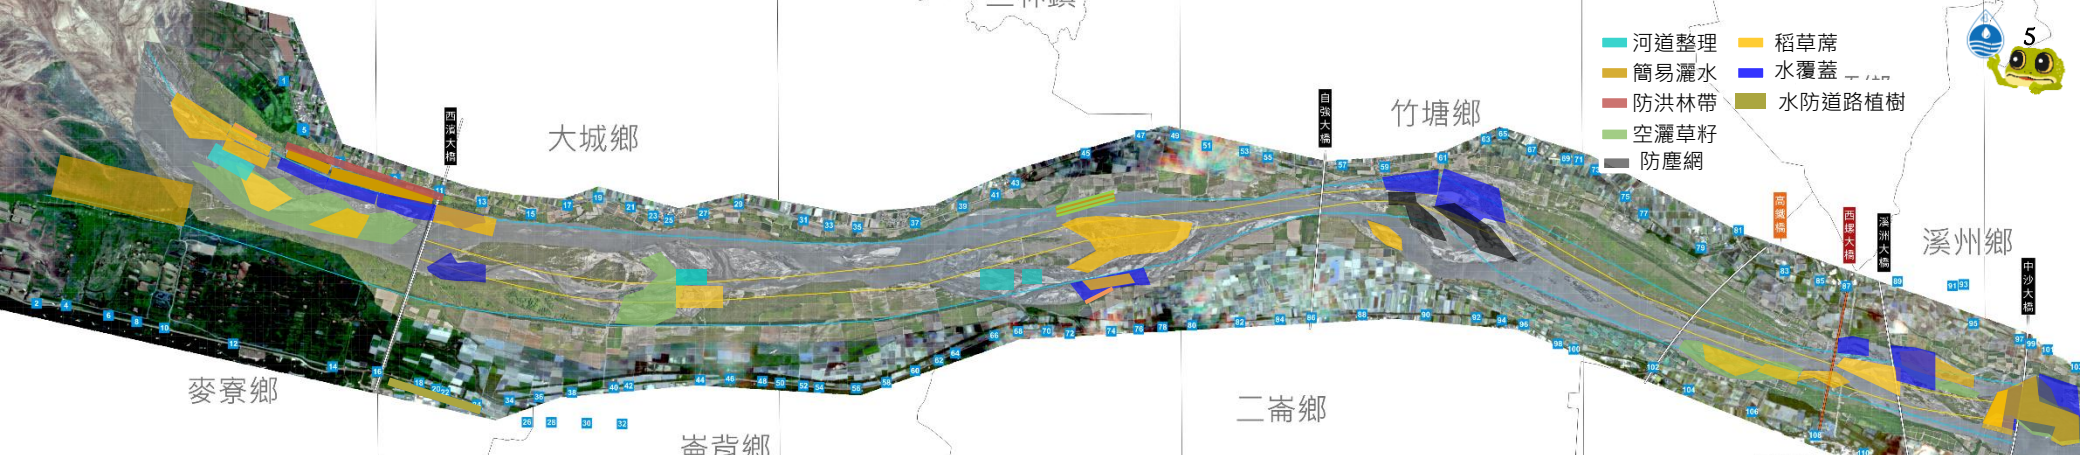

| 水覆蓋                                                                                                                                                                                                                                                           | 水覆蓋                                                    | 水覆蓋                                                                                                      | 水覆蓋                                                                          | 水覆蓋                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) 西濱下游北岸(9號至13號越堤)_蓄水池60公頃<br>2) 西濱下游北岸7號越堤_蓄水池40公頃<br>3) 西濱下游北岸5號越堤_蓄水池40公頃                                                                                                                                                                                 | 1)西濱大橋上游南岸_蓄水池50公頃                                     | 1) 74號越堤路段_蓄水池30公頃                                                                                       | 1)61號越堤路段_蓄水池60公頃<br>2)59號越堤路段_蓄水池30公頃                                       | 1) 中沙大橋上游_蓄水池50公頃<br>2) 中沙大橋下游_蓄水池30公頃<br>3) 溪州大橋上游北岸_蓄水池45公頃<br>4) 西螺大橋上游北岸_蓄水池20公頃                                                                                                                                            |
| 河道整理                                                                                                                                                                                                                                                          | 河道整理                                                   | 河道整理                                                                                                     | 河道整理                                                                         | 河道整理                                                                                                                                                                                                                            |
| 1) 3-5號越堤路段_河道整理0.8公里                                                                                                                                                                                                                                         | 1) 40號越堤_河道整理1.5公里                                     | 1) 74號越堤下游河中低灘地_河道整理0.4公里<br>2) 74號越堤下游_河道整理0.8公里                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 綠覆蓋                                                                                                                                                                                                                                                           | 綠覆蓋                                                    | 綠覆蓋                                                                                                      | 綠覆蓋                                                                          | 綠覆蓋                                                                                                                                                                                                                             |
| 1) 西濱大橋下游_空灑草籽80公頃                                                                                                                                                                                                                                            | 1) 44號越堤路段_空灑草籽60公頃                                    |                                                                                                          |                                                                              | 1) 中沙大橋上游至高鐵橋上游_空灑草籽217公頃                                                                                                                                                                                                       |
| 防洪植栽                                                                                                                                                                                                                                                          | 防洪植栽                                                   | 防洪植栽                                                                                                     | 防洪植栽                                                                         | 防洪植栽                                                                                                                                                                                                                            |
| 1) 5-11號越堤_防洪林帶2公里<br>2) 3-5號越堤路段A區_防洪林帶0.4公里                                                                                                                                                                                                                 | 1) 雷厝堤防_水防道路植栽2公里                                      | 1) 43-45號越堤_防洪林帶1.2公里<br>2) 74號越堤下游培厚區_防洪林帶0.4公里                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 其他覆蓋                                                                                                                                                                                                                                                          | 其他覆蓋                                                   | 其他覆蓋                                                                                                     | 其他覆蓋                                                                         | 其他覆蓋                                                                                                                                                                                                                            |
| 1) 7號越堤_簡易灑水設施6.4公頃<br>2) 5-11號越堤_簡易灑水設施9.6公頃<br>3) 0-22號水線更換11公頃<br>4) 7號越堤路段上下游_鋪設稻草蓆40公頃<br>5) 5號越堤路段下游低灘地_鋪設稻草36.5公頃<br>6) 西濱大橋下游河中灘地_稻草蓆鋪設14公頃<br>7) 1-3號越堤路段_稻草蓆鋪設8公頃<br>8) 5號越堤路段下游低灘地_稻草蓆鋪設5公頃<br>9) 3-5號越堤路段A區_簡易灑水系統3.2公頃<br>10)3號越堤下游低灘地_稻草蓆鋪設16公頃 | 1) 40號越堤路上游低灘地_鋪設稻草蓆20公頃<br>2) 西濱上游北岸(13號越堤)_鋪設稻草蓆10公頃 | 1) 43-45號越堤_簡易灑水設施9.6公頃<br>2) 74號越堤路段低灘地_鋪設稻草蓆90公頃<br>3) 76號越堤路段低灘地_鋪設稻草蓆10公頃<br>4) 74號越堤下游培厚區_簡易灑水1.4公頃 | 1) 61號越堤路段低灘地_鋪設防塵網60公頃<br>2) 59號越堤路段低灘地_鋪設防塵網8公頃<br>3) 自強大橋上游南岸低灘地_鋪設稻草蓆8公頃 | 1)西螺大橋下游南岸低灘地_鋪設稻草蓆6公頃<br>2)高鐵大橋上游南岸低灘地鋪設稻草蓆20公頃<br>3)中沙大橋上游河中低灘地鋪設防塵網20公頃<br>4) 溪州大橋下游北岸低灘地_鋪設稻草蓆10公頃<br>5)西螺大橋上游低灘地_鋪設稻草蓆24公頃<br>6)中沙大橋上游低灘地_鋪設稻草蓆40公頃<br>7)高鐵橋上游低灘地_鋪設稻草蓆20公頃<br>8)西螺大橋下游南岸_鋪設稻草蓆10公頃<br>9)中沙至天然氣管橋_鋪設稻草蓆6公頃 |
