

新悅營造股份有限公司 函

受文者:經濟部水利署第四河川局

住址:台中市霧峰區四德北路 85 巷 3~10 號

發文日期:107 年 4 月 2 日

承辦人:蘇靖茹

發文字號:新悅字第 1070402001 號

電話:04-23396169

傳真:04-23308139

主旨:本公司承攬 貴局「107 濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分」有關地磅
管制站設備、界樁施設及工區運輸便道等設施已施作完成，敬請貴局派員
協助辦理查驗，以利進工。

說明:依本工程契約書補充說明書辦理。

廠商:



負責人:

107. 4. 5
管理課

疏濬工區教育訓練簽到表

疏濬工區：四河內因砂區南岸。

日期:

[illegible]







新悅營造股份有限公司 函

受文者:經濟部水利署第四河川局
發文日期:107年4月2日
發文字號:新悅字第1070402001號

住址:台中市霧峰區四德北路85巷3-10號
承辦人:蘇靖茹
電話:04-23396169
傳真:04-23308139

主旨:本公司承攬貴局「107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分」有關地磅管制站設備、界樁施設及工區運輸便道等設施已施作完成，敬請貴局派員協助辦理查驗，以利進工。

說明:依本工程契約書補充說明書辦理。

廠商:



負責人:

107. 11. 3
管理課

經濟部水利署第四河川局
施工中請驗申請書

工程名稱：107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分


工務所主任：

正工程師林泓合

請驗項目	工區內河床運輸便道查驗			
擬辦	☒ 第二層決行 ☐ 第一層決行		擬派 副工程師 陳建文 管理課長 施陽東	檢驗具報
檢 驗	依規定進行產品及施工檢驗，項目如下：			
	名 稱	檢 驗 項 目	檢 驗 情 形	備 註
	工區內河床運輸便道	A段： 0k+000~0k+069 B段： 0k+000~1k+232 C段： 0k+000~0k+160.4 0k+168.4~0k+177	符合契約規定工區內河床便道路寬皆大於或等於8m，詳附件。	
檢驗結果	☒ 合格。 ☐ 不合格。			
批 示	查驗人員：副工程師 陳建文 工務所：正工程師 林泓合			
	☒ 第二層簽章 管理課長 施陽東	局長 白烈煌 副局長 局長		

附註說明：1. 請按照契約書、施工規範、補充說明書及其他規定填寫。
 2. 施工中視導或查核結果有缺失需改善者，採「一層決行」。
 3. 施工中視導或查核結果無施工缺失者，採「二層決行」。

107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分

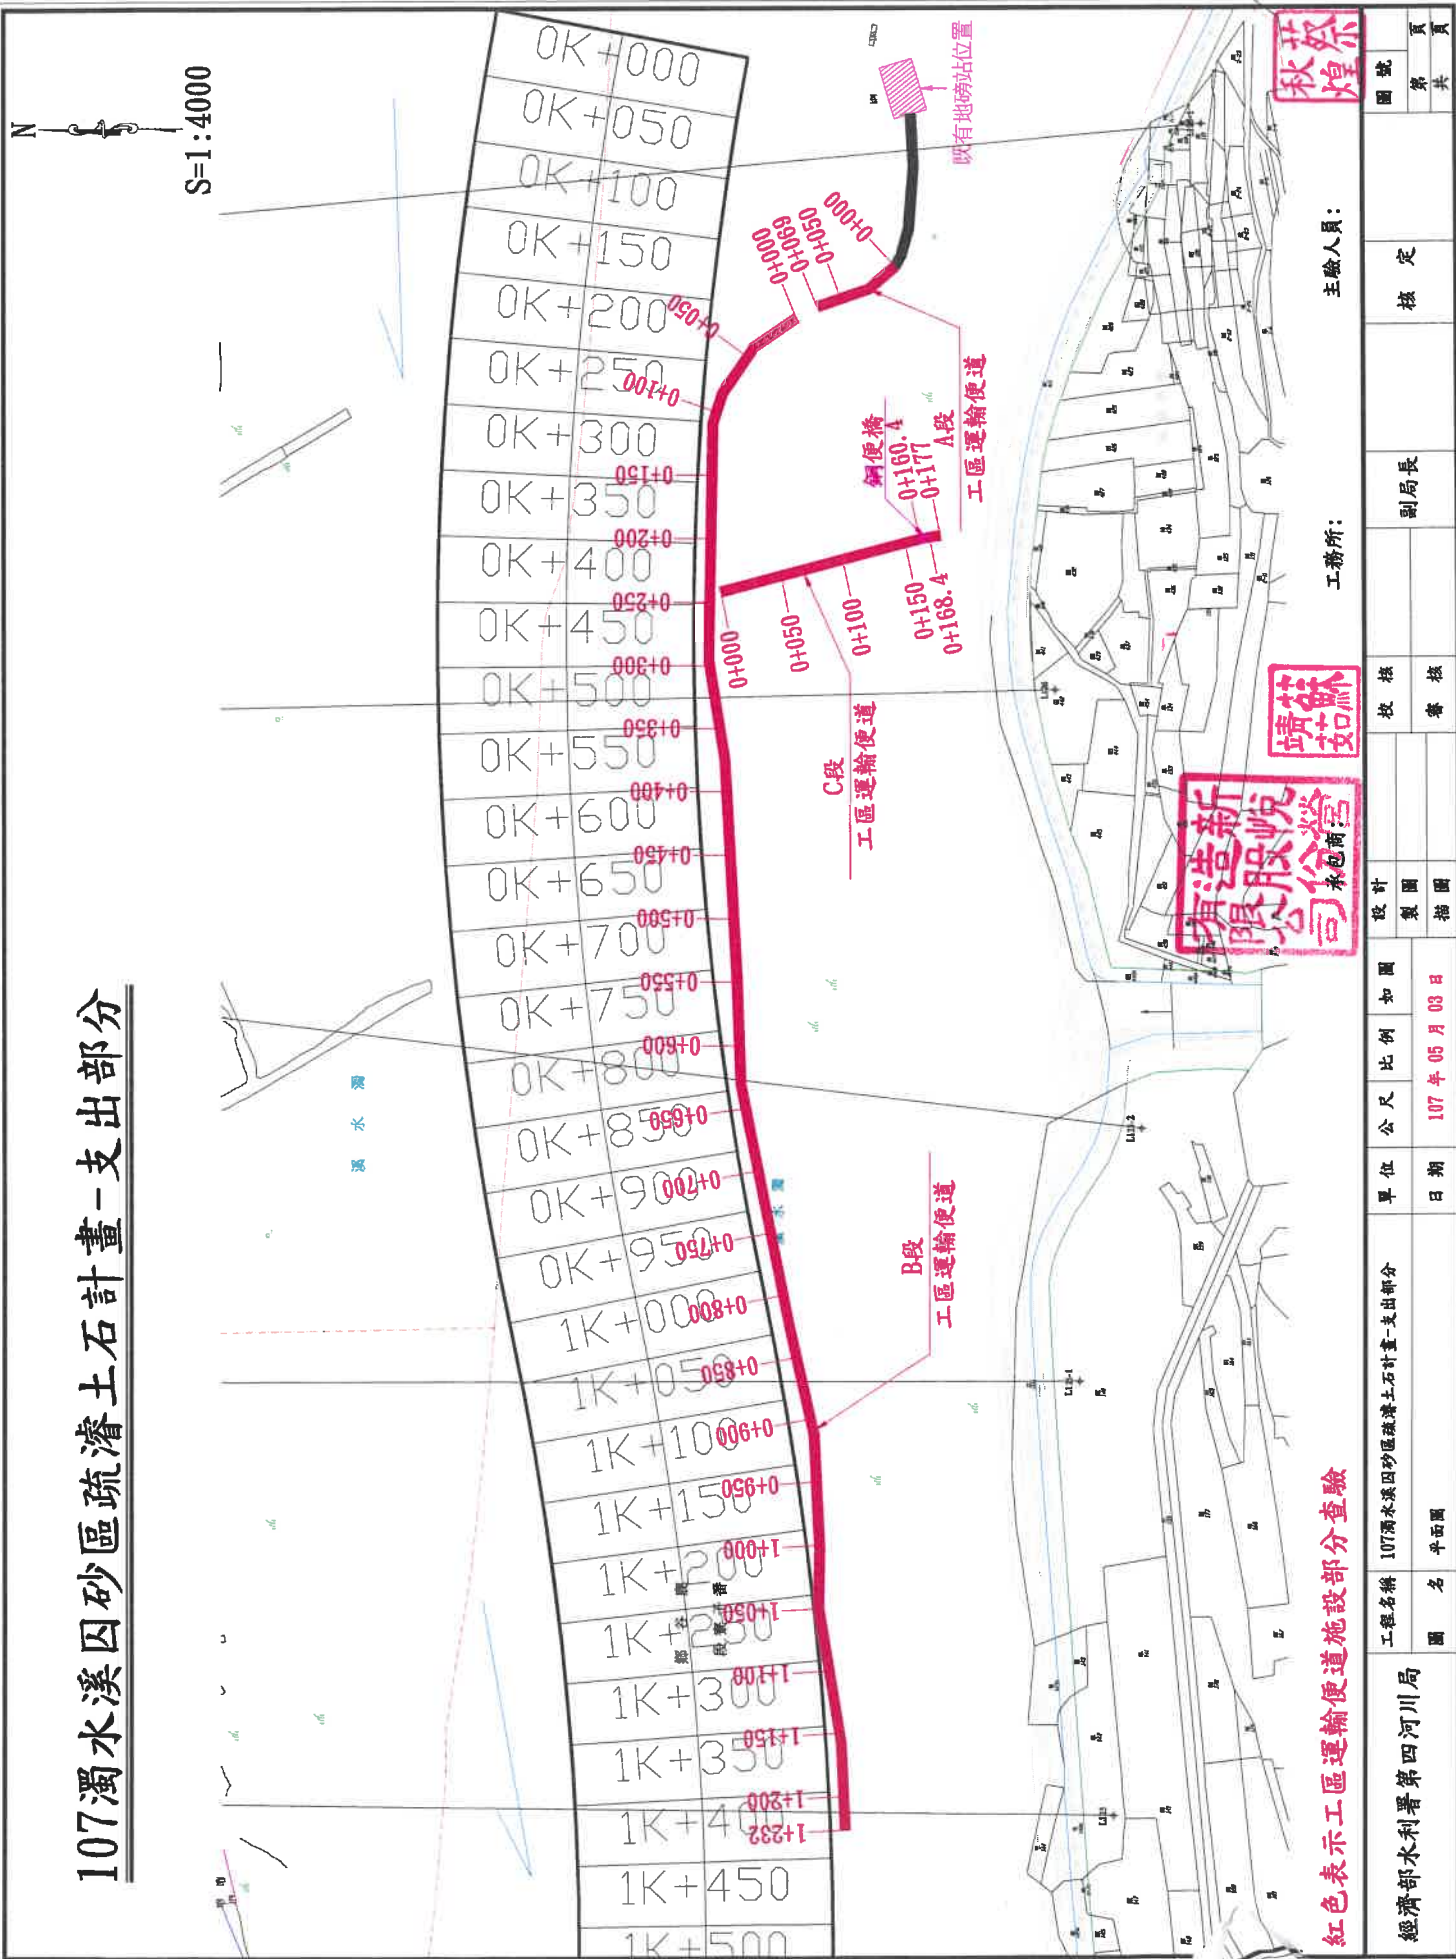

紅色表示工區運輸便道施設部分查驗

主驗人員: 工務所:

工程名稱	107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分	單位	公尺	比例	如圖	設計	校核	圖號	頁數
圖名	平面圖	日期	107年05月03日	審核	副局長	核定	頁數	共	共

經濟部水利署第四河川局 運輸便道施設計算表

計畫名稱：107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分

共 2 頁第 1 頁

工程地點： 南投縣

107 年 05 月 03 日

樁 號	距 離	運輸便道施設					
		寬 度	平均寬度	面 積 (平方公尺)			
A段							
OK+000	0.00	5.00					
OK+050	50.00	8.00	6.50	325.00			
OK+069	19.00	8.00	8.00	152.00			
小 計				477.00			
B段							
OK+000	0.00	8.00					
OK+050	50.00	8.00	8.00	400.00			
OK+100	50.00	8.00	8.00	400.00			
OK+150	50.00	8.00	8.00	400.00			
OK+200	50.00	8.00	8.00	400.00			
OK+250	50.00	8.00	8.00	400.00			
OK+300	50.00	8.00	8.00	400.00			
OK+350	50.00	8.00	8.00	400.00			
OK+400	50.00	8.00	8.00	400.00			
OK+450	50.00	8.00	8.00	400.00			
OK+500	50.00	8.00	8.00	400.00			
OK+550	50.00	8.00	8.00	400.00			
OK+600	50.00	8.00	8.00	400.00			
OK+650	50.00	8.00	8.00	400.00			
OK+700	50.00	8.00	8.00	400.00			
OK+750	50.00	8.00	8.00	400.00			
OK+800	50.00	8.00	8.00	400.00			
OK+850	50.00	8.00	8.00	400.00			
OK+900	50.00	8.00	8.00	400.00			
OK+950	50.00	8.00	8.00	400.00			
1K+000	50.00	8.00	8.00	400.00			
1K+050	50.00	8.00	8.00	400.00			
1K+100	50.00	8.00	8.00	400.00			
1K+150	50.00	8.00	8.00	400.00			
1K+200	50.00	8.00	8.00	400.00			
1K+232	32.00	8.00	8.00	256.00			
小 計				9856.00			
本 頁 小 計			=	10333.00	M ²		

廠商：



技師：



