

經濟部水利署

施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：觀音湖內埤生態廊道營造工程施工階段自主檢核表

檢查日期：113 年 2 月 6 日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態 保 育 措 施	1	施工過程工區內所有既有喬木之必要修枝，是否依據『高雄市景觀樹木修剪作業規範』與『高雄市樹木景觀與安全管理自治條例總說明』辦理。	☒	☐	☐	是
	2	停車格的空間規劃是否與既有喬木保持一定距離，可避免影響其後續生長情形。	☐	☒	☐	緣石距喬木過近 已排定改善. 列管中
	3	所有樹穴與樹穴座椅規劃處，喬木是否生長良好。	☐	☐	☒	尚未施工
	4	新設停車場是否有設置透水陰井收集停車場之地表雨水。	☒	☐	☐	是
	5	施工便道是否優先使用既有道路或裸露地環境。	☒	☐	☐	優先使用既有道路
	6	新闢施工便道寬度是否依據施工計畫書之施設寬度施設。	☒	☐	☐	是
	7	施做工區(含施工便道)是否提前擾動，使動物離開施做工區後再進行工程施做。	☒	☐	☐	是
	8	施工道路是否每日進行灑水或其他方式降低揚塵量。	☒	☐	☐	是
	9	工區內施工便道是否每50-100公尺設置一處橫越施工道路之減速丘或土堆(高度至少5公分以上)，確實降低車輛於工區內之速度，減少動物路殺狀況發生。(依據監造計畫書納入)	☒	☐	☐	已設置2處減速丘
	10	是否避免於晨昏時段野生動物活動旺盛期間(8:00前, 17:00後)施工。	☒	☐	☐	施工時間 08:00~17:00
	11	施工期間是否每日將民生廢棄物集中帶離。	☒	☐	☐	每日清除
	12	材料或土方是否優先暫置於現有裸露地或人為使用空間。	☒	☐	☐	堆置既有空地
	13	建物(服務站、廁所、六角休憩亭與蝴蝶長廊)部分，外牆、欄杆或頂部是否種植懸垂類或爬藤類植物，增加綠化面積、固碳效益	☐	☐	☒	非執行時間
	14	步道兩側植被補植複層植栽(灌木、草皮)，增加步道兩側隱蔽性與生物使用懸空步道下方生態通道之意願。	☐	☐	☒	非執行時間
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			☒ 是	異常狀況說明：緣石距喬木過近，恐影響喬木後續生長。 解決對策：重新規劃設計，現有影響喬木之緣石調整位置，並持續監測喬木生長狀況。		
			☐ 否			

施工廠商方 生態背景人員	無	工地主任 (工地負責人)	
(簽章+日期)		(簽章+日期)	

填表說明：

- 「實際檢查情形」請說明檢查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項。)
- 檢查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
- 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。



生態友善措施自主檢核照片

拍攝日期：113.02.06

工程名稱：觀音湖內埤生態廊道營造工程

1/2




說明

設置陰井



說明

材料暫置於現有裸露地



生態友善措施自主檢核照片

拍攝日期：113.02.06


工程名稱：觀音湖內埤生態廊道營造工程

2/2



說明

廢棄物集中處理

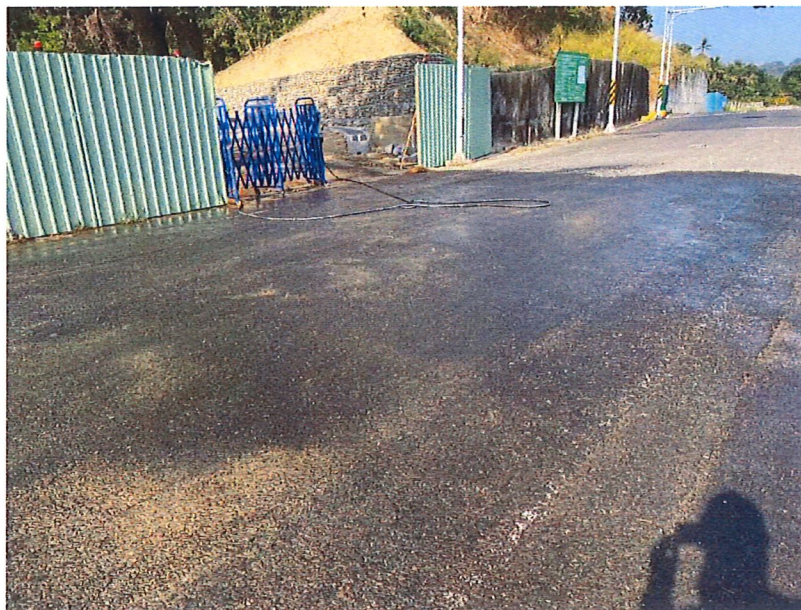

說明

灑水避免揚塵

