

# 綠川水環境改善工程計畫



臺中市政府水利局

106年8月21日



# 綠川現況





綠川周邊具豐富遊憩資源，  
可分為人文歷史、都市文化  
與生活等類別，使綠川呈現  
人文歷史與文化創意氛圍

綠川周邊多為混凝土河堤；部分河段因違章民宅貼近河岸，環境維護管理不善與凌亂，影響視覺與使用效益；民權路下游至長春公園段整體缺乏連續性綠地，無法提供生物棲息，景觀生態效益較低。



# 綠川一期——水質改善三部曲

## 旱溪餘水引流工程

- 範圍：精武路地下道東西側
- 藉旱溪餘水補注綠川污水截流後之基流量
- 餘水取水量：8,640CMD (0.1cms)

105年5月16日開工  
預計106年完工

9,000  
萬元

## 綠川污水截流工程

- 範圍：精武路~民權路(1.320m)
- 將精武路至民權路河段兩岸城鎮污水截流至福田水資中心處理
- 設計最大截流量：24,000CMD

105年7月8日開工  
預計106年完工

7,500  
萬元

## 綠川現地處理工程

- 於建國臨時市場及干城公園設置礮間淨化設施
- 礮間設施處理綠川上游城鎮污水(設計最大處理水量24,000CMD)

105年12月開工  
107年初完工

3.4  
億元

## 綠川排水環境營造

- 雙十路至民權路
- 透過開蓋及環境營造，在確保防洪機能目標下，採空間多元化利用，打造水與綠的生態環境

105年11月開工 107年初完工

2.8  
億元



施工前



綠川加蓋段



施工中



破除混凝土渠底



新砌砌石護岸



加蓋河段施工



工程定期督導

完工後



# 綠川民權路至信義南街段

## 綠川污水截流工程


- 計畫範圍：民權路-信義南街
- 將民權路、民生路及復興路沿岸雨水排水污水就近截流至鄰近主次幹管內

## 綠川水環境景觀營造工程

- 都市環境與綠川軸線共存共榮
- 舒適人行休憩空間營造
- 都市夜間浪漫風情(光環境營造)
- 既有護岸更新，綠意植生護岸營造
- 分段執行計畫：
  1. 復興路-愛國街
  2. 民權路-復興路
  3. 長春公園段

## 結合綠空鐵道，發展都市藍綠帶歷史文化休憩軸線

- 都市環境與綠川軸線的共存共榮
  - ✓ 自然緩坡
  - ✓ 階梯式花台
- 文創綠意植生護岸
- 舒適人行休憩空間
- 都市夜間浪漫風情(光環境營造)
- 綠色護岸營造

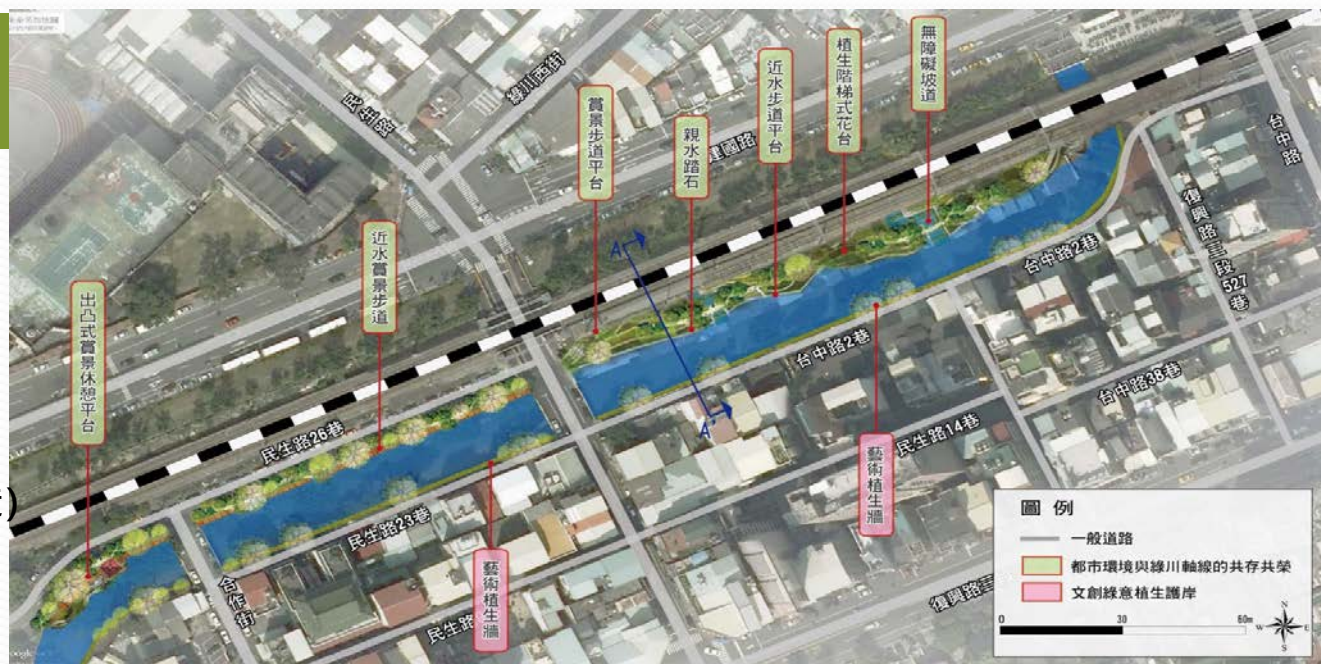

合作街

## 長春公園 入口意象

配合水利局開蓋工程，此區保留

綠川沿線上方及兩側既有喬木保留

## 長春國民運動中心

信義南街

綠川河道示意綠石

生態砌石河道

景觀親水踏石

景觀跨橋

植生親水休憩空間

休憩賞景平台

綠川文化解說導覽牌

親水植生緩草坡

散步道

溜冰場

### 圖例

- 綠川脈絡印象空間打造
- 綠川文化歷史解說強化
- 長春公園活水景觀休憩機能導入

0 20 40m




## 長春國民運動中心

正義街



## 重現綠川脈絡連結性及環境風貌， 發揮水綠環境的休憩及教育價值

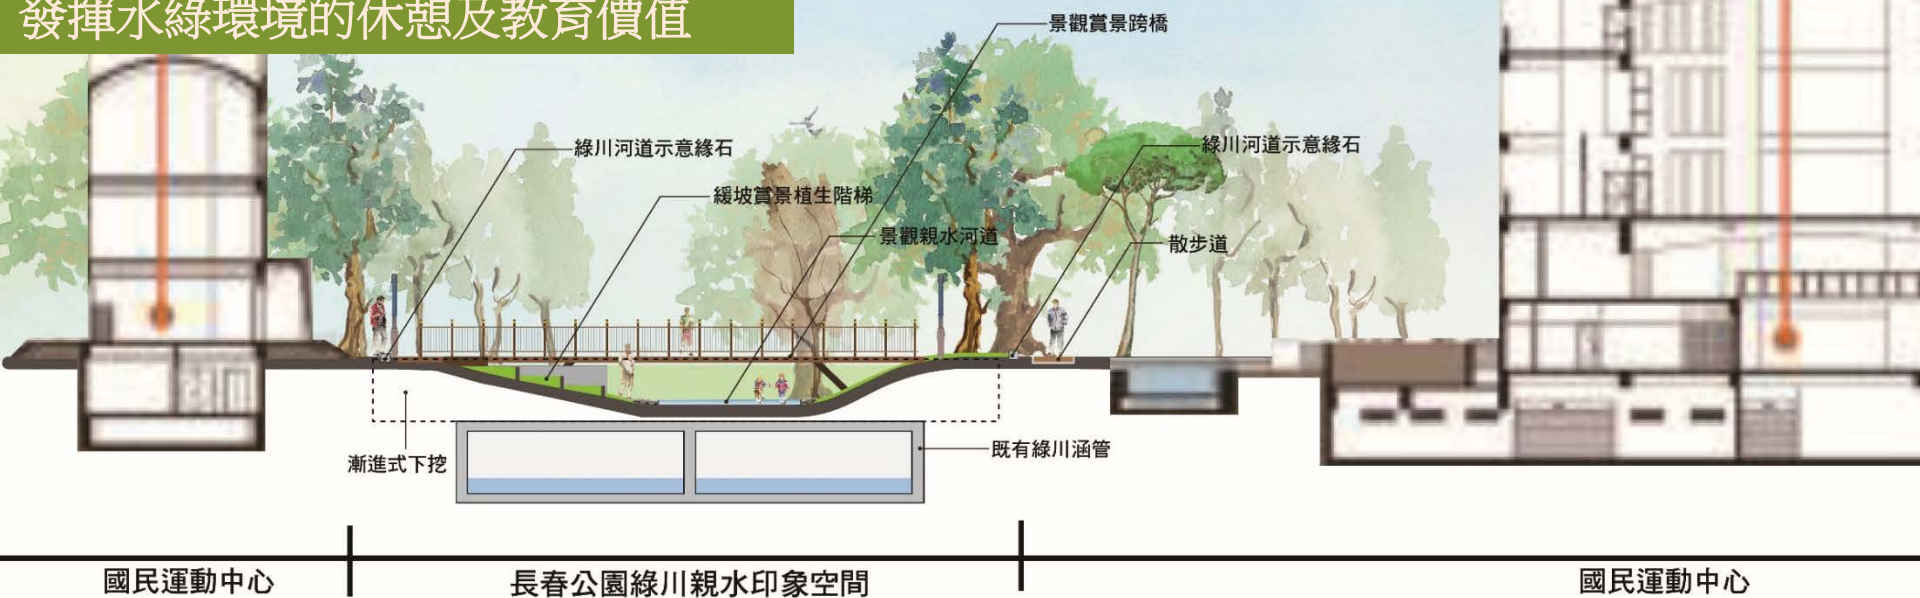

# 綠川信義南街至大明路路段

## 綠川污水截流工程

- 範圍：信義南街至大明路
- 污水截流至現地處理設施處理


## 綠川現地處理工程

- 暫定於健康公園設置現地處理設施
- 礮間設施處理綠川城鎮污水(設計最大處理水量20,000CMD)

## 綠川排水水環境營造

- 信義南街至大明路
- 打造人文水岸與城市意象為目標
- 完成河道疏浚、護岸整治、水岸步道、親水近水環境等工程



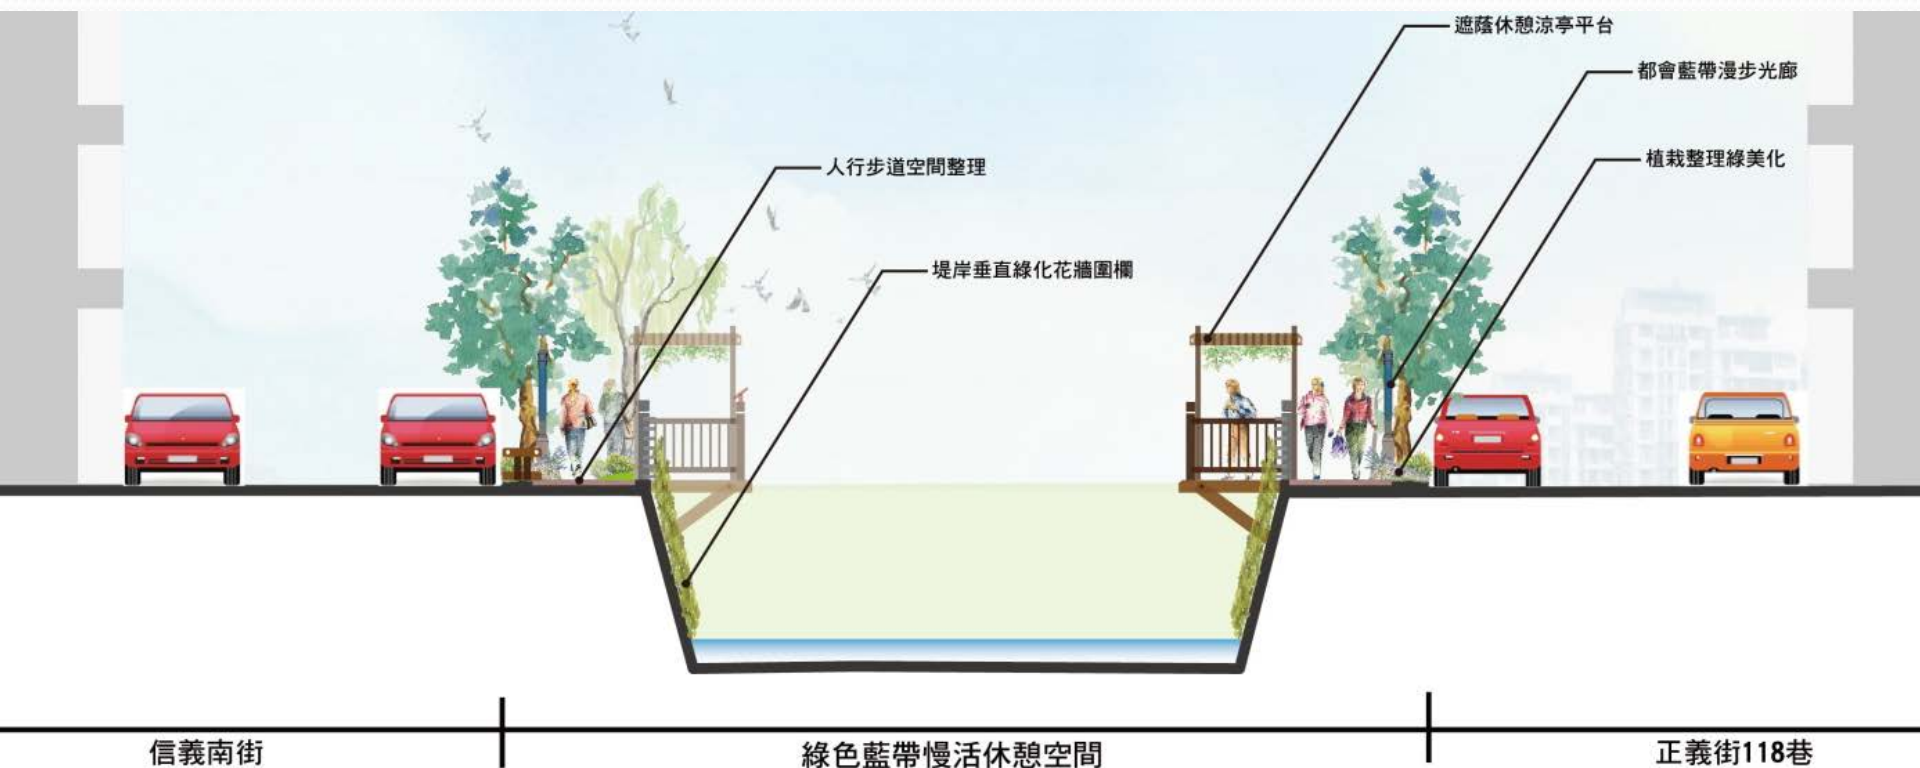

人行空間鋪面



水岸休憩平台



欄杆



綠色護岸



都會藍帶漫步光廊

## 工程亮點

- 綠川全河段提供優質的近水空間，達到市民親近水域、提升城市意象雙重目標
- 配合「綠空鐵道軸線計畫」完整串聯中區再生計畫及南區生活圈，形塑綠川新軸線
- 打造綠川脈絡印象空間，再現綠川河道意象
- 沿綠川水岸設置自行車道南向延伸至旱溪，串連大康橋計畫，形塑水園道
- 提升台中市南區居住生活品質

# 預期效益

- 預計於綠川2,800公尺河段間進行截流工程、設置1處現地處理水質淨化系統，並進行2,800公尺河段兩岸進行低衝擊開發人行空間改善，並預期達到下列效益：



- 預計處理水量至少達 $Q=20,000\text{CMD}$ 以上，目標將綠川下游水質由嚴重污染降至輕度污染，解決水質不佳、異味問題，以提升周遭環境之生活品質。
- 設置低衝擊開發人行空間，以減輕都市地表逕流、加強土壤保水及達到簡易過濾淨化效果。



# 計畫期程規劃

[illegible]
