


濁水溪揚塵抑制1091116~1091122周報表



➔ 第二區大庄培厚填方



## 本周施作項目及位置

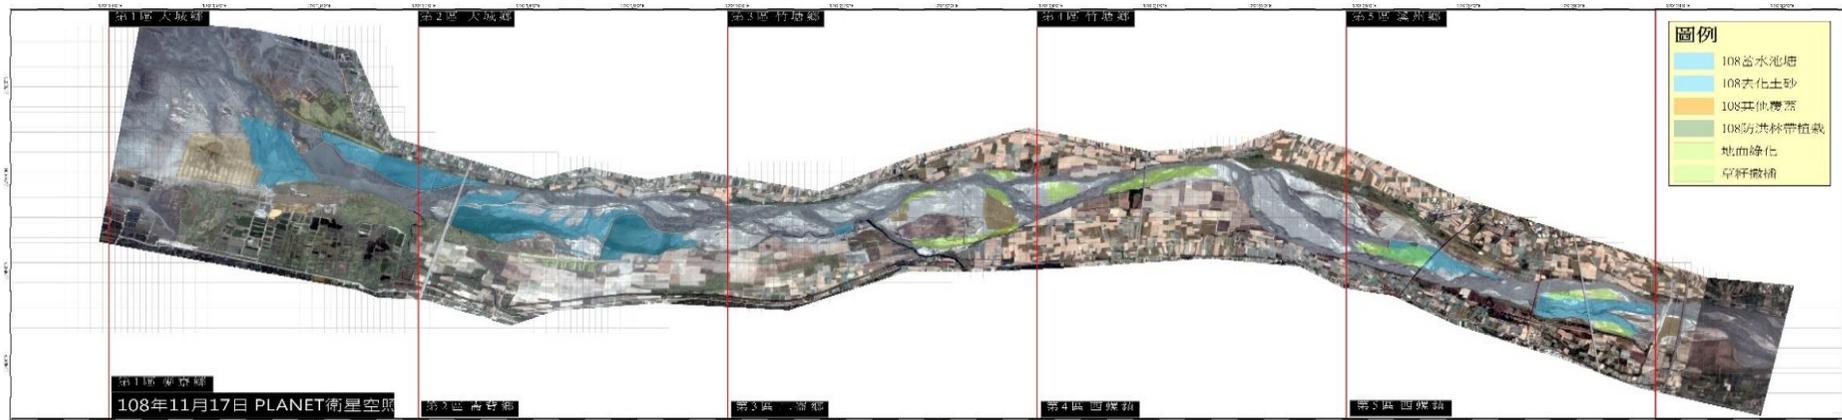

區域	施工位置	施工內容	目前進度
二	大庄42號	培厚填方	5.6萬方(56%)

## 各區空拍現況(更新至1020)

第一區

灑水線開啟



第二區

西濱大橋上游蓄水池塘



第三區

74號越堤稻草蓆鋪設



第四區

高鐵橋下游蓄水池塘



第五區

中沙橋下稻草蓆覆蓋



# 濁水溪揚塵改善措施執行期程

預定進度

實際進度

改善措施		109年							110年				實際完成	
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		4
水利 防制工 法	水覆蓋 (300公 頃)	100%												302公頃
		100.7%												
	河道整 理 (2.5KM)	100%											1.8公里	
		72.0%												
	河道疏濬及 去化土砂 (85萬方)(視 實際情形檢 討)	100%											123.41萬 方	
		145.2%												
防災應 變	其他覆 蓋(500 公頃)	100%											125.4公頃	
		25.1%												
造林新 植與撫 育	灘地綠 覆蓋(50 公頃)												78公頃	
		156%												
	防洪林帶 及行道樹 (15公里)	100%											27.5公里	
		183%												

## 109年度改善措施分區項目及進度達成率

改善措施		區域					進度達成率	109年11月預定進度	備註
		第一區	第二區	第三區	第四區	第五區			
水利防制工法	水覆蓋(300公頃)	50.0 公頃	150.0 公頃	0.0 公頃	0.0 公頃	102.0 公頃	100.7%	100%	
							302		
	河道整理(2.5KM)		0.0 KM	1.2 KM		0.6 KM	72.0%	100%	
							1.8		
	河道疏濬及去化土砂(85萬方)(視實際情形檢討)	47.8 萬	5.6 萬	51.37 萬		18.6 萬	145.2%	100%	
							123.41		
防災應變	其他覆蓋(500公頃)	47.4 公頃	11.4 公頃	45.0 公頃	0.0 公頃	21.6 公頃	25.1%	100%	
							125.4		
造林新植與撫育	灘地綠覆蓋(50公頃)	0.0 公頃	10.0 公頃	60.0 公頃	0.0 公頃	8.0 公頃	156%	100%	
							78		
	防洪林帶及行道樹(15公里)	2.0 公里	18.0 公里			7.5 公里	183%	100%	
							27.5		



第一區		第二區		第三區		第四區		第五區	
水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋	
蓄水池塘(公頃)	50	蓄水池塘(公頃)	150	蓄水池塘(公頃)		蓄水池塘(公頃)		蓄水池塘(公頃)	102
綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋	
防洪植栽(公里)	2	防洪植栽(公里)	14	草籽撒播(公頃)	60	草籽撒播(公頃)		防洪植栽(公里)	7.5
大沙丘植栽(公里)		綠覆蓋(公頃)	10	防洪植栽(公里)	6	防洪植栽(公里)		草籽撒播(公頃)	8
疏濬填池綠覆(公頃)									
大沙丘綠覆(公頃)									
林帶植栽(公頃)									
其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋	
去化土砂(萬方)	47.84	去化土砂(萬方)	5.6	去化土砂(萬方)	51.37	三仙膠(公頃)		去化土砂(萬方)	18.6
灑水線(公頃)	2	河道整理(公里)		河道整理(公里)	1.2	稻草鋪設(農民)公頃		灑水系統(公頃)	6
200公頃灑水系統(公頃)	20	灑水系統(公頃)	10	稻草蓆鋪設	42			便道鋪設級配(公頃)	
三仙膠(公頃)		牡蠣殼鋪灑(公頃)		便道鋪設級配				稻草蓆鋪設(公頃)	15
稻草鋪設(公頃)	11.1	三仙膠(公頃)		灑水線佈設(公頃)	3			稻草鋪設(農民)公頃	
便道鋪設級配(公頃)	1.3	稻草鋪設(公頃)	0.1	稻草鋪設(農民)公頃				河道整理(公里)	0.6
疏濬簡易灑水佈設(公頃)		碎石級配鋪設(NO.40越堤路下)	1.3						
平鋪防塵網(公頃)	13								
直立式防塵網(公頃)									
三仙膠(公頃)									
牡蠣殼鋪灑(公頃)									
碎石級配(公頃)									
其他覆蓋總計	47.4	其他覆蓋總計	11.4	其他覆蓋總計	45	其他覆蓋總計	0	其他覆蓋總計	21.6
