


# 揚塵防治 週報表

110/07/12~110/07/18

# 本週工項進度及位置 110/07/12~110/07/18

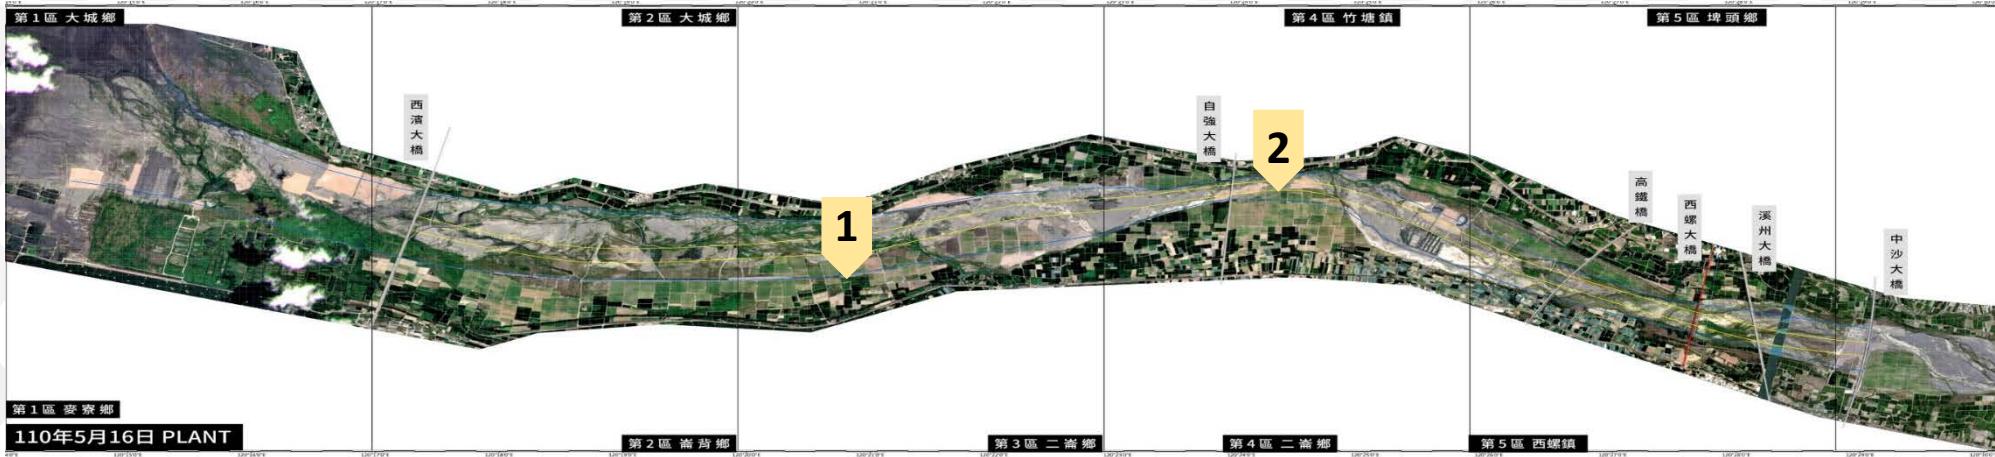

1

## 第三區 河道整理

### 58號越堤河道整理(複式斷面)

公里



0 0.25 0.5 0.75 1

■ 本週完成數量 ■ 累計完成數量 ■ 預定數量

2

## 第四區 河道整理

### 自強橋上游河道整理

公里





0 0.25 0.5 0.75 1

■ 本週完成數量 ■ 累計完成數量 ■ 預定數量



# 各區空拍現況

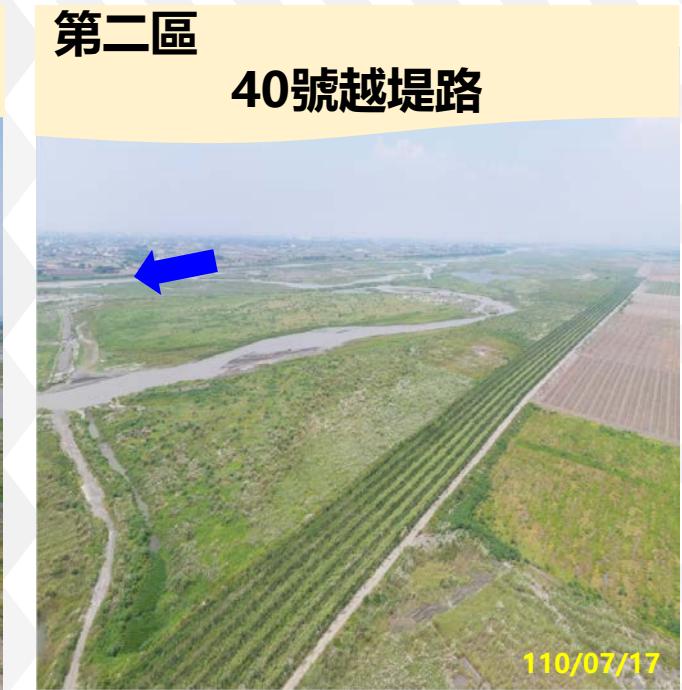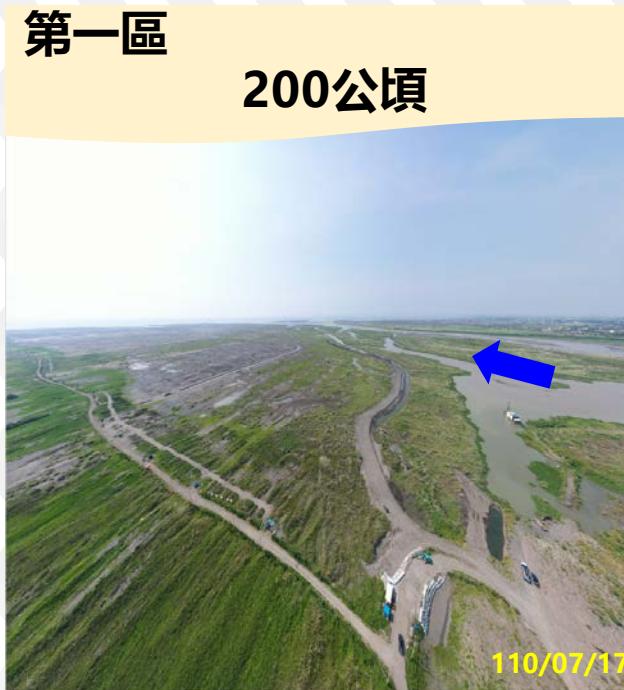

第三區  
自橋大橋下游



第四區  
高鐵橋下游疏濬作業




第五區  
西螺大橋上游



# 110年辦理情形：抑制面積及進度



# 揚塵抑制措施

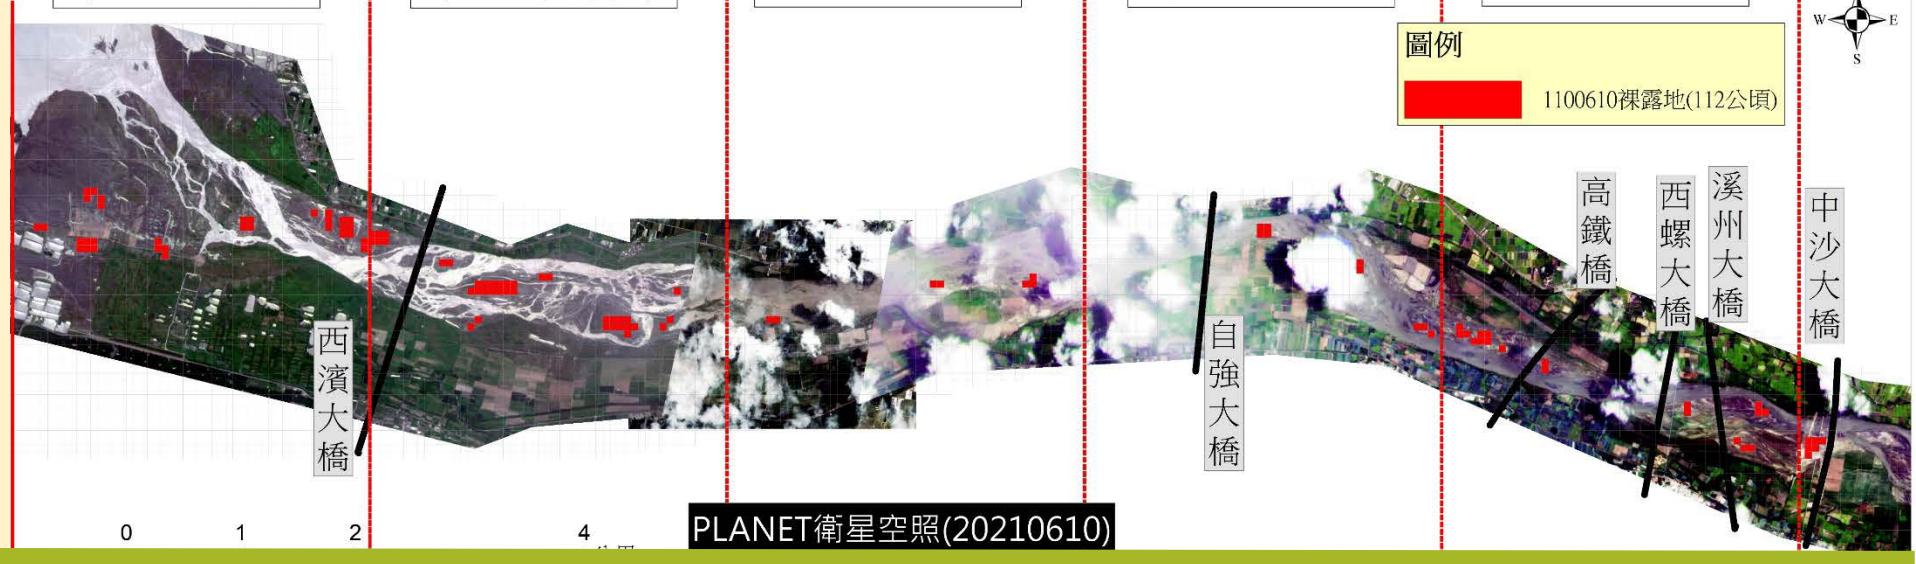

水  
覆  
蓋

河  
道  
整  
理

綠  
覆  
蓋

其  
他  
覆  
蓋

1) 河道整理培厚0.9公里

1) 河道整理0.162公里

1) 防洪林帶0.6公里

1) 稻草蓆鋪設86.5公頃  
2) 簡易灑水設施0.9公頃  
3) 碎石級配0.9公頃
