

後龍溪銅鑼護岸防災減災工程 施工階段 生態檢核作業

工程簡介

為因應每逢颱風豪雨，河水挾帶的砂石沉澱淤積河道，造成河床增高，使河床水位抬升，遇洪水來臨時影響到橋梁、堤防等結構的安全，故對此河段再辦理河道整理。

生態保育對策

組成生態背景及工程專業之跨領域團隊



工程位置及緣起說明(109/06/17)




工程施作內容變更說明(109/06/17)



河道沿岸溪濱植被覆蓋率低

工程友善措施及施工注意事項

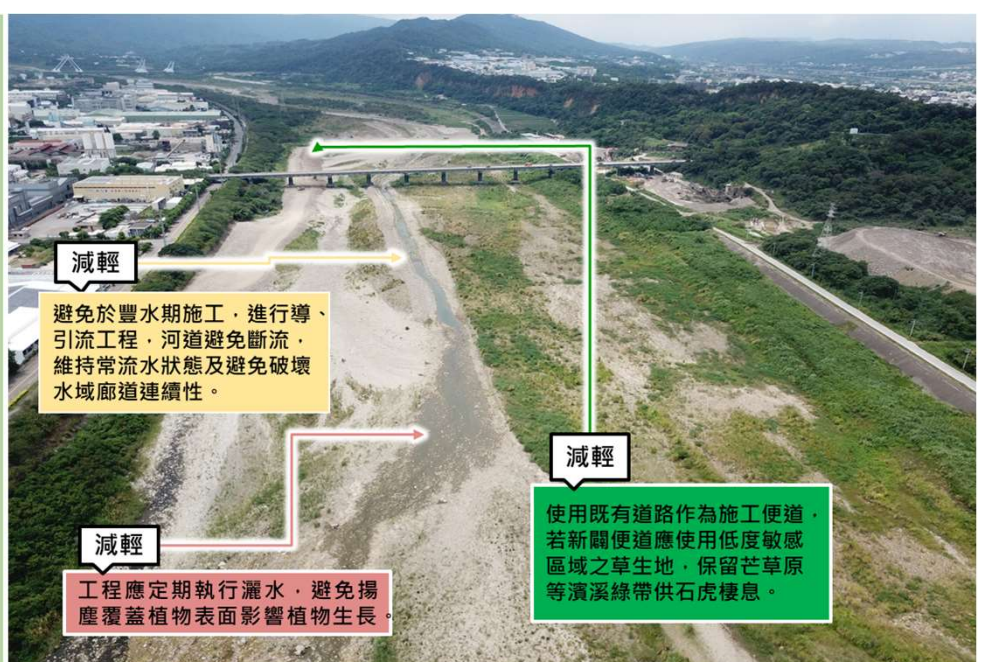

減輕

避免於豐水期施工，進行導、引流工程，河道避免斷流，維持常流水狀態及避免破壞水域廊道連續性。

減輕

使用既有道路作為施工便道，若新闢便道應使用低度敏感區域之草生地，保留芒草原等溪濱綠帶供石虎棲息。

減輕

工程應定期執行灑水，避免揚塵覆蓋植物表面影響植物生長。


保育措施

- | | |
|---|--|
| ☒ 不擾動工區外次生林 | ☐ 重要樹木遷移 |
| ☐ 裸露土覆蓋 | ☐ 清除垃圾 |
| ☐ 半半施工 | ☐ 限制工程開挖 |
| ☐ 隔音降噪機具 | ☒ 定時工區灑水 |
| ☐ 生態廊道設置 | ☐ 灑播草籽 |
| ☒ 迴避棲地 | ☐ 施工時程調整 |

關注物種



臺灣間爬岩鰕(特)



石虎(保 I)



臺灣破傘菊(特)



槭葉牽牛



經濟部水利署第二河川局
The 2nd River Management Office WRA
