

C-05

經濟部水利署
施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：112 年度羅東溪柯仔林堤防(北成橋段)歲修工程

抽查日期：113 年 2 月 26 日

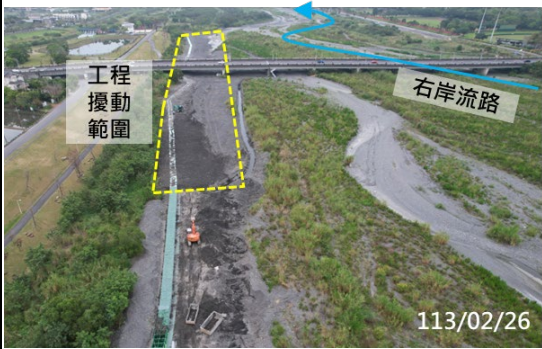
項目	項次	檢查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	(迴避)工程迴避右岸流路。	☒	☐	☐	工程範圍限於左岸，未影響右岸流路。  圖 1 工程未擾動右岸流路
	2	(減輕)主流路設置擋水土堤，擋水後等候 2-3 天，再行擾動主流路。	☐	☐	☒	適逢枯水期，開工至本次抽查主流路均無水，尚無擾動主流路水域生物的問題，故未施做擋水土堤。  圖 2 主流路無水
	3	(減輕)工程擾動範圍限於石籠開挖面 10m 寬、向左岸 2m 寬、向右岸 5m 寬，及假設工程範圍，依圖說範圍施作不可超出。	☒	☐	☐	工程擾動範圍限於施工前會勘確認之範圍，部分完工段順平與原流路相鄰。

						圖 3 工程擾動範圍未超出	
	4	(減輕)擾動高灘地的施工便道限制 1 條 3m寬，不可超出或新增。	☒	☐	☐	施工便道僅開設 1 條，大約 3m 寬。 	圖 4 橫向施工便道僅設 1 條約 3m 寬
生態保全對象	5	(迴避)迴避北成橋上游相思樹 1 棵 (325444.858,273094 2.048)，確保施工不造成不損傷。	☒	☐	☐	工程為迴避該相思樹調整石籠線形，確實迴避、保留良好。 	圖 5 相思樹保留良好
是否發生環境異常狀況？		☐ 是	異常狀況說明：				
		☐ 否	解決對策：				
