


濁水溪揚塵抑制

1070704~1070710周報表

- ▶ 七月份河道內普遍濕潤無裸露地揚塵現象，現階段施作**長效型抑制工法**。
- ▶ 本周主要施作工項『**河道整理去除沙源**』、『**種植防風林**』因連日強降雨便道積水暫停。
- ▶ 『**北岸一處、南岸三處設置稻草暫置場**』，儲存抑制揚塵所需稻草。

揚塵防治施工報告

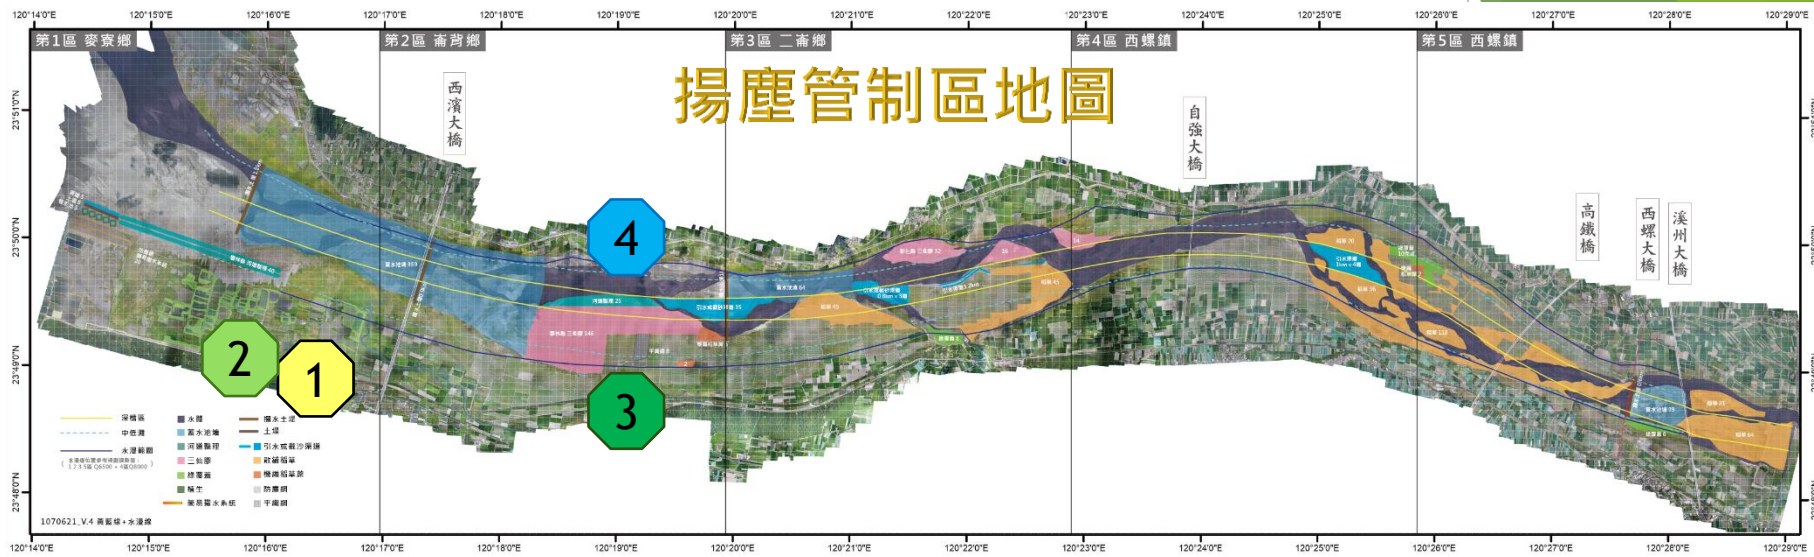

區域	施工位置	施工內容	目前進度
1	新吉堤防疏濬區	疏濬	完成 22.3萬方去除沙源
2	新吉堤防	堤前培厚植栽 1公里	完成0.5公里，去除沙源4萬方
3	大庄堤防	堤前培厚植栽 2公里	便道施作
4	下山腳堤防	河道整理及抽砂	便道施作

揚塵防治施工照片

