


濁水溪揚塵抑制

1070711~1070717周報表

- ▶ 七月份河道內普遍濕潤無裸露地揚塵現象，現階段施作長效型抑制工法，主要以『河道整理去除沙源』、『種植防風林』，並同時為未來9月份至隔年3月份揚塵好發期預先規畫因應作為。

揚塵防治施工報告

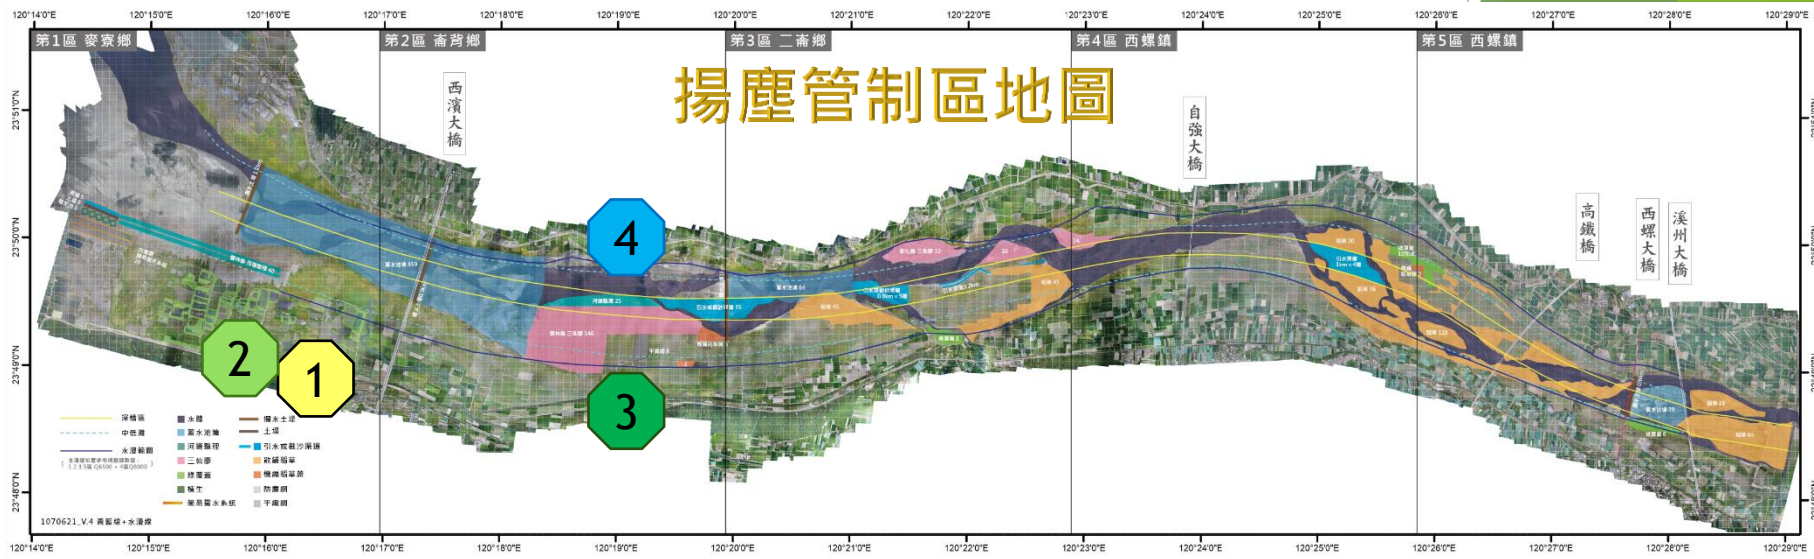

區域	施工位置	施工內容	目前進度
1	新吉堤防疏濬區	疏濬	完成 23.2萬方去除沙源
2	新吉堤防	堤前培厚植栽 1公里	完成0.6公里，去除沙源4.5萬方
3	大庄堤防	堤前培厚植栽 2公里	施工便道施作
4	下山腳堤防	河道整理及抽砂	施工便道施作

揚塵防治施工照片

