

# 濁水溪揚塵抑制


## 1070725~1070801周報表

▶ 八月份河道內普遍濕潤無裸露地揚塵現象，現階段施作**長效型抑制工法**。

本周主要施作『**河道整理去除沙源**』、『**種植防風林**』，並於大庄堤防**44號**越堤路前河床裸露地施作『**平鋪式防塵網及稻草蓆**』。

為規畫**9月份**至隔年**3月份**揚塵好發期因應作為，本局於本周間取得最新空照圖資，配合圖資比對迅速分析河道裸露地的**變異處**加強控管，以利日後進行抑制作業，。

# 揚塵防治施工報告

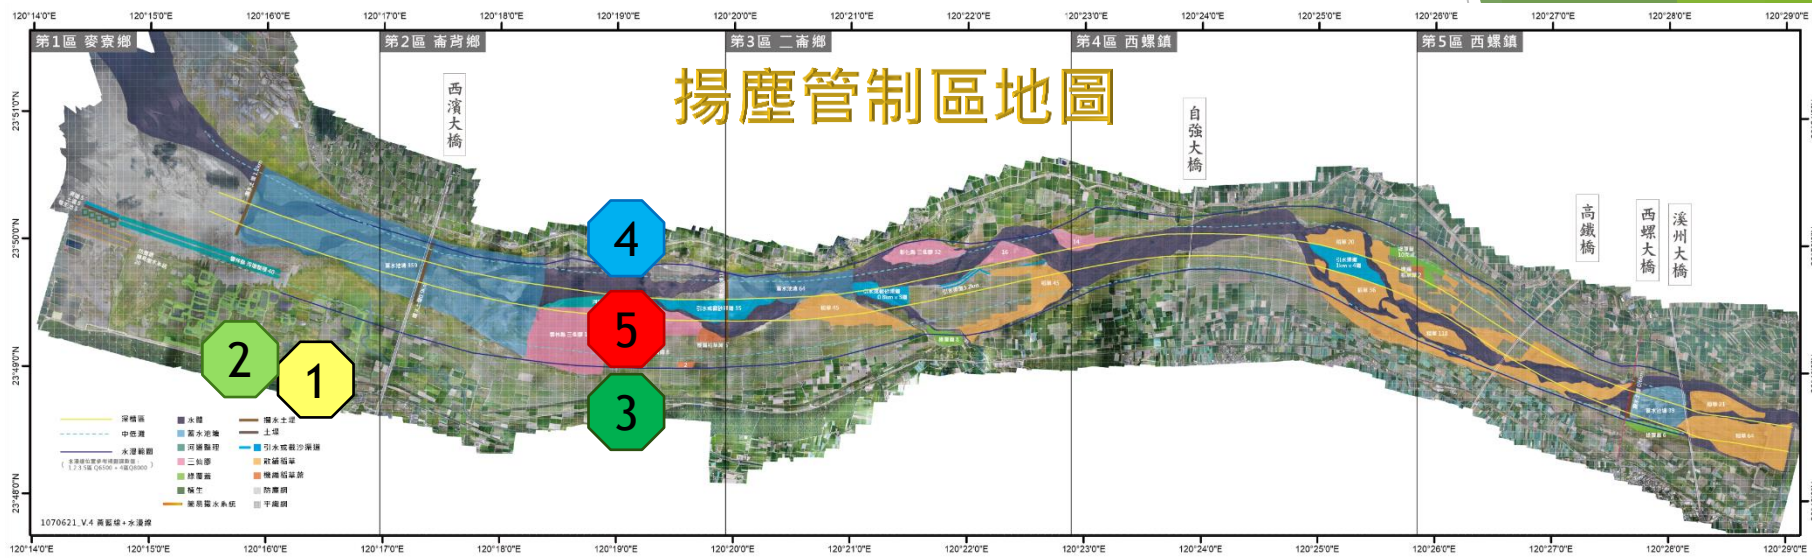

區域	施工位置	施工內容	目前進度
1	新吉堤防疏濬區	疏濬完畢	完成 24.6萬方去除沙源
2	新吉堤防	堤前培厚植栽 1公里	完成0.8公里，去除沙源6萬方
3	大庄堤防	堤前培厚植栽 2公里	完成0.3公里，去除沙源3萬方
4	下山腳堤防	河道整理及抽砂	抽砂，去除沙源3千方
5	大庄堤防前	佈設防塵網及稻草蓆	已完成4.9公頃，預計施作8公頃

# 揚塵防治施工照片

