

# 濁水溪揚塵抑制

## 1070906~1070912周報表


- ▶ 九月份進入揚塵好發季節，配合環保局各管制區進入待命狀態，如達揚塵警戒時啟動緊急應變措施(各區加派灑水車灑水等)。
- ▶ 本周彰化縣政府收集稻草**665**公噸累計進場**490**公噸，大庄堤防培厚便道修復完成開始培厚，累計去化土砂數量約**13**萬立方。

# 107年度揚塵改善措施第三季執行期程

截至9/12日止

改善措施		本季度			目前進度	辦理機關
		7	8	9		
水利 防制 法	水覆蓋	計畫發包		視汛期後灘地變化檢討	已完成發包	四河局
	河道整理	計畫發包		視汛期後灘地變化檢討	已完成發包	四河局
造林 新與 撫育	堤防培厚植栽4公里		完成造林		已完成2.9公里	四河局
防災 應變	稻草	計畫核定及發包	收集稻草	進場鋪設	完成發包	四河局 農糧署 地方政府
	三仙膠		完成發包	施作	鋪設防塵網及稻草蓆7公頃 <sub>2</sub>	四河局 環保署 地方政府
	灑水					
環境清理						

# 揚塵防治施工報告

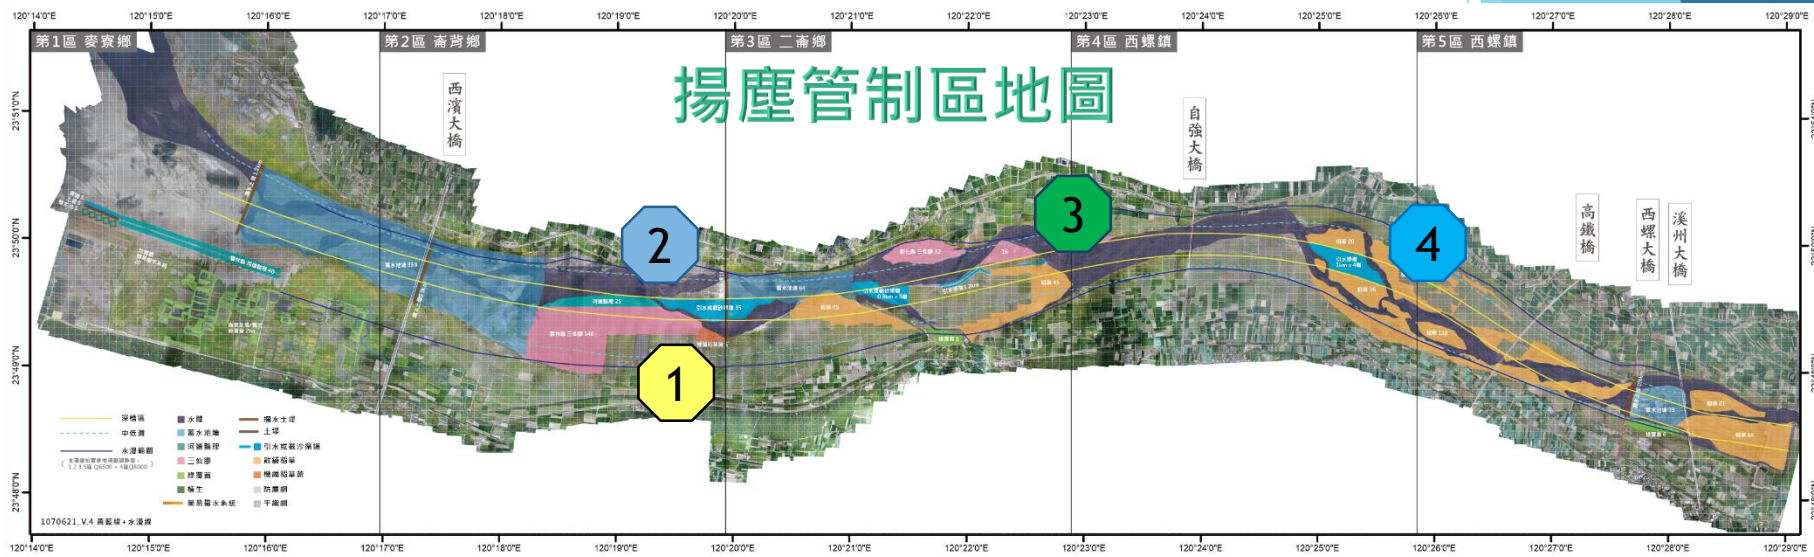

區域	施工位置	施工內容	目前進度
1	大庄堤防	堤前培厚植栽 2公里	完成1.8公里，去除沙源13萬方
2	下山腳堤防	河道整理及抽砂	去除沙源3.9萬方，場地整理
3	竹塘暫置場	彰化縣稻草收集	進場490公噸
4	北岸竹塘	便道打設	便道施作中

# 本周揚塵防治工程照片





# 107/9/7麥寮地方說明會記要



107/09/07下午於麥寮福安宮舉辦揚塵改善說明會，主要向麥寮區民眾介紹目前揚塵改善工程施作情形與未來預計施作方向與規劃，亦與麥寮民眾交換意見，評估納入未來揚塵施作方向。

# 創新工法：無人機噴灑三仙膠

107/09/11於高鐵橋上游裸露地辦理無人機噴灑三仙膠試噴作業。

