

濁水溪揚塵抑制

1070913~1070919周報表


- ▶ 九月份進入揚塵好發季節，配合環保局各管制區進入待命狀態(平日2台灑水車)，如達揚塵警戒時啟動緊急應變措施(各區加派灑水車灑水等)。
- ▶ 本周彰化縣政府收集稻草**665**公噸累計進場**674**公噸，大庄堤防培厚便道修復完成開始培厚，累計去化土砂數量約**14.7**萬立方，開始佈設灑水線。

107年度揚塵改善措施第三季執行期程

截至9/19日止

改善措施		本季度			目前進度	辦理機關
		7	8	9		
水利防制法	水覆蓋	計畫發包		視汛後灘地變化檢討	已完成發包	四河局
	河道整理	計畫發包		視汛後灘地變化檢討	已完成發包	四河局
造林新與撫育	堤防培厚植栽4公里		完成造林		已完成2.9公里	四河局
防災應變	稻草	計畫核定及發包	收集稻草	進場鋪設	完成發包	四河局農糧署 地方政府
	三仙膠		完成發包	施作	鋪設防塵網及稻草蓆7公頃 ₂	四河局環保署 地方政府
	灑水					
環境清理						

揚塵防治施工報告

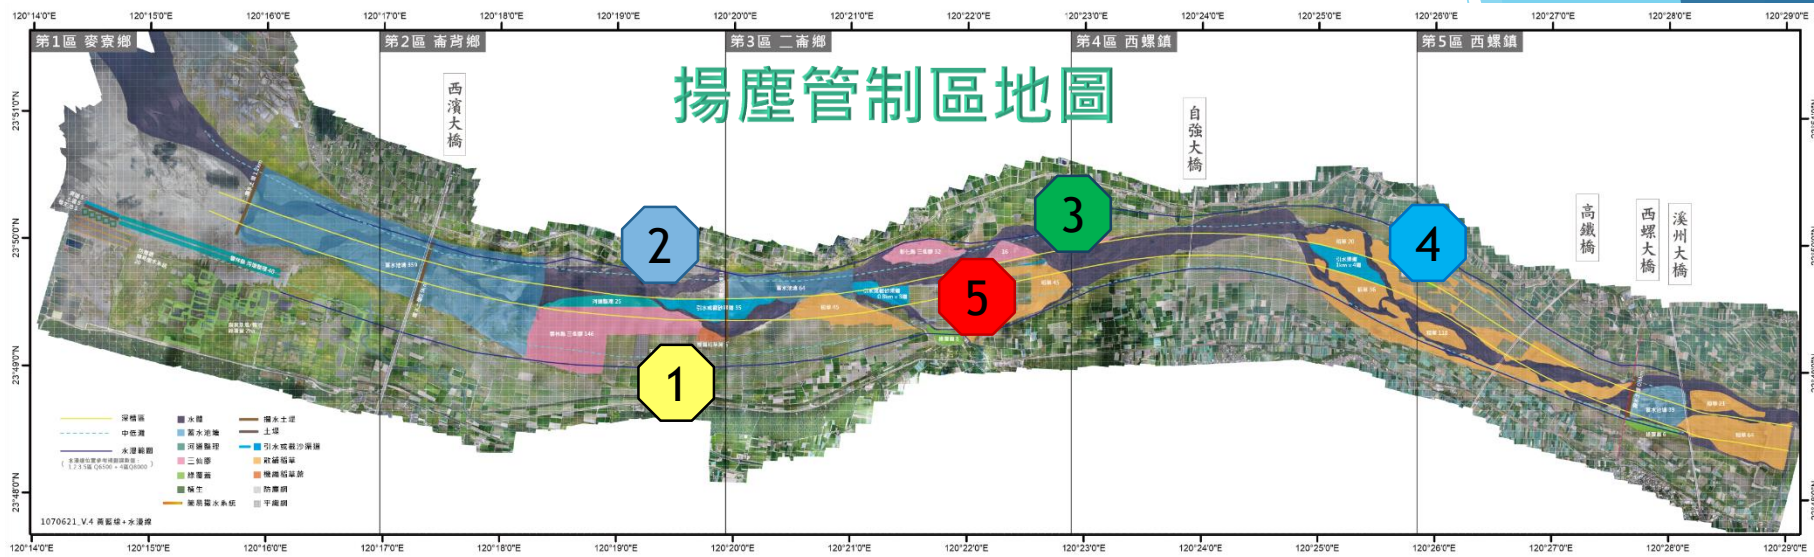

區域	施工位置	施工內容	目前進度
①	大庄堤防	堤前培厚植栽 2公里	完成2.3公里，去沙14.7萬方
②	下山腳堤防	河道整理及抽砂	去除沙源4.4萬方，場地整理
③	竹塘暫置場	彰化縣稻草收集	進場674公噸，收集完畢
④	北岸竹塘	便道打設	便道施作中
⑤	二崙暫置場	雲林縣稻草收集	進場139公噸，預計進場1085噸

本周揚塵防治工程照片

