

濁水溪揚塵抑制

1071018~1071024周報表


- ▶ 配合環保局各管制區進入緊戒狀態 (各區1台灑水車)，並加強三仙膠噴灑、簡易灑水系統灑水等
- ▶ 加速大庄堤防河道整理及溪州大橋蓄水池塘、西濱大橋蓄水池塘施作。

107年度揚塵改善措施第四季執行期程

截至10/24日止

改善措施		本季度			目前進度	辦理機關
		10	11	12		
水利 防制 工法	水覆蓋	進場施作			施工中	四河局
	河道整理	進場施作			機具進場	四河局
造林 新植 與撫 育	堤防培厚植栽4公里	已完成			已完成4.7公里	四河局
防災 應變	稻草	已完成			進場約1100公噸	四河局 農糧署 地方政府
	三仙膠	進場施作			簡易灑水系統5.6公里	四河局 環保署 地方政府
	灑水					
環境清理						

揚塵防治施工報告

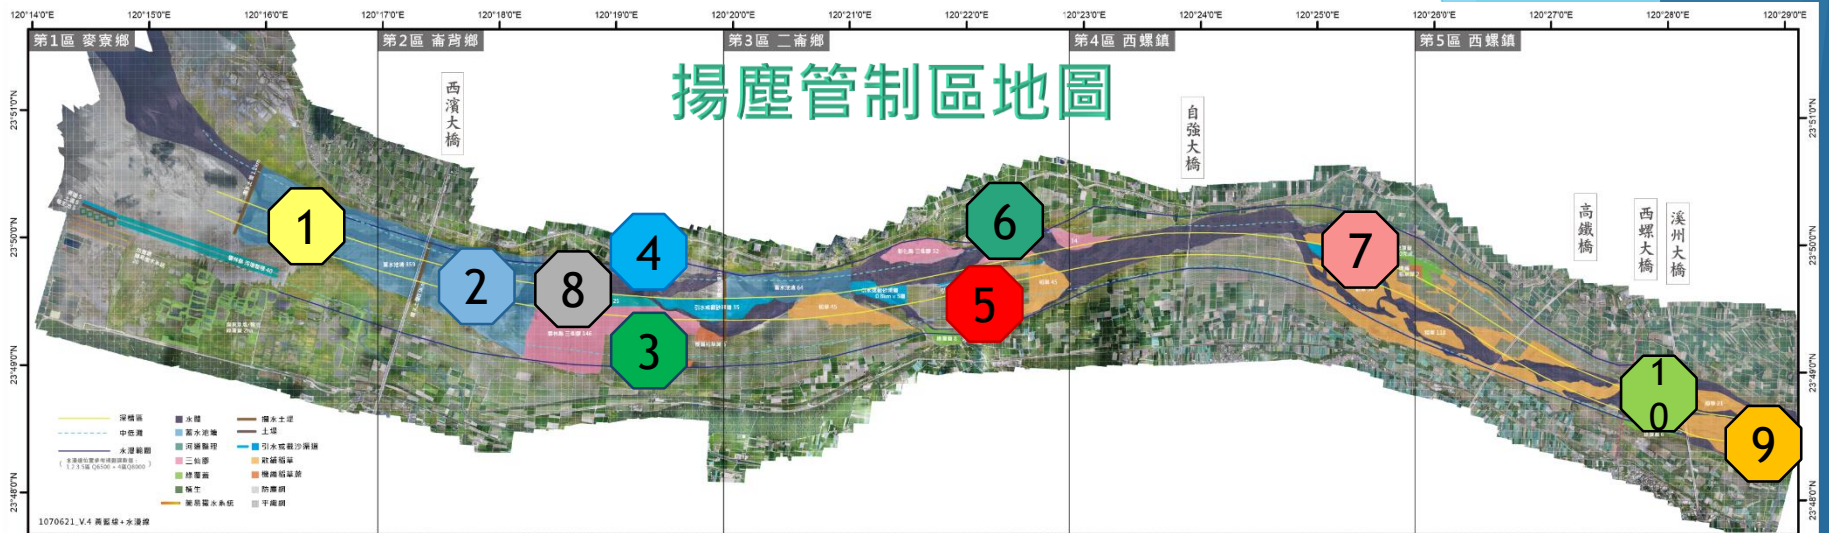

區域	施工位置	施工內容	目前進度
①	西濱大橋下游	蓄水池塘	機具進場
②	西濱大橋上游	蓄水池塘	機具進場
③	大庄堤防前	簡易灑水系統	完成0.1公里
④	下山腳堤防	河道整理及抽砂	去除沙源6.7萬方，場地整理
⑤	二崙暫置場前	稻草鋪設	機具進場中
⑥	二崙暫置場前	簡易灑水系統	材料進場
⑦	北岸竹塘	稻草鋪設	機具進場中
⑧	大庄堤防	河道整理	機具進場便道整理
⑨	溪州大橋上游	三仙膠噴灑	隔三日執行3公頃噴灑
⑩	溪州大橋上游	蓄水池塘	機具進場

本周揚塵防治工程照片

