

濁水溪揚塵抑制

1071112~1071118周報表


- ▶ 配合環保局各管制區進入緊戒狀態(依一、二區共5台灑水車)，並加強簡易灑水系統灑水等。
- ▶ 本周完成崙背40號簡易灑水系統5.5公里。
- ▶ 加速大庄堤防河道整理
- ▶ 本周完成溪州大橋蓄水池塘、西螺大橋蓄水池塘、西濱大橋上游蓄水池塘施作。
- ▶ 於麥寮出海口施作引水渠道浸潤砂源。

107年度揚塵改善措施第四季執行期程

截至11/18日止

改善措施		本季度			目前進度	辦理機關
		10	11	12		
水利 防制 工法	水覆蓋	進場施作			施工中	四河局
	河道整理	進場施作			施工中	四河局
造林 新植 與撫 育	堤防培厚植栽4公里	已完成			已完成4.7公里	四河局
防災 應變	稻草	已完成			進場約1100公噸	四河局 農糧署 地方政府
	三仙膠	進場施作			簡易灑水系統15公里	四河局 環保署 地方政府
	灑水					
環境清理						

揚塵防治施工報告

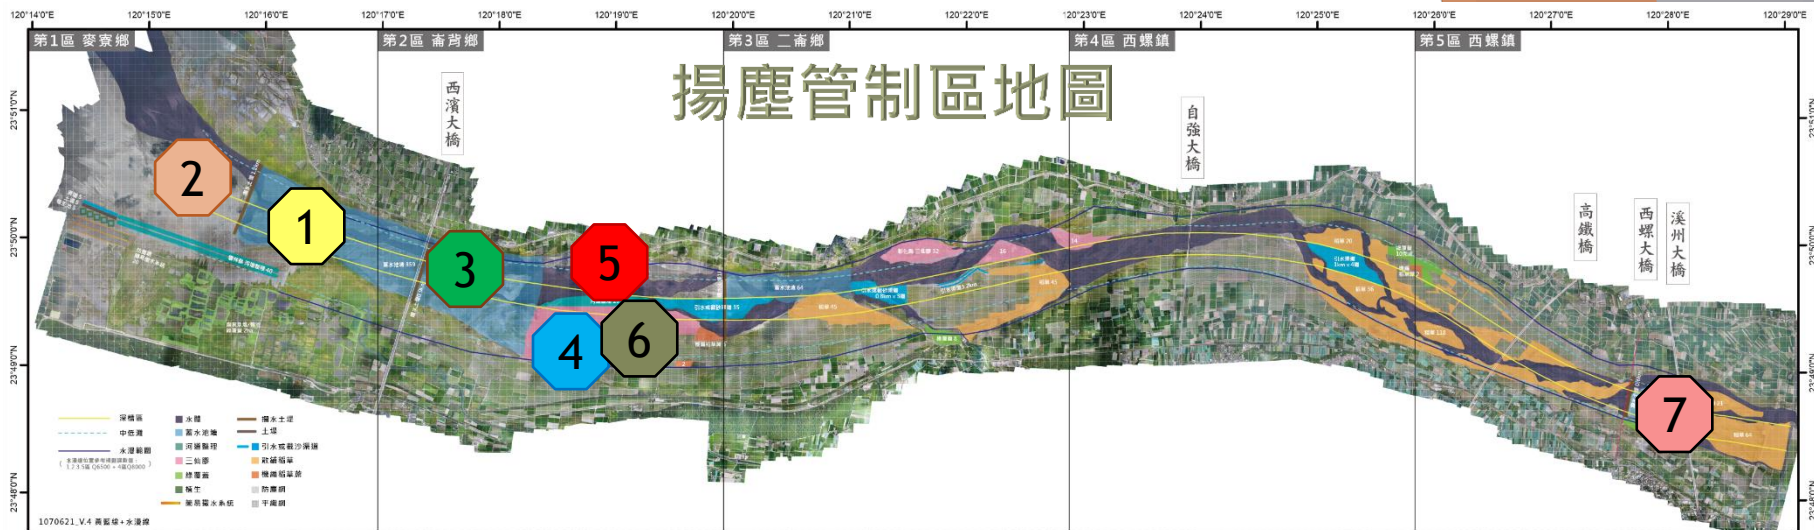

區域	施工位置	施工內容	目前進度
①	西濱大橋下游	蓄水池塘	施工中
②	西濱大橋下游	引水渠道	施工中，完成1公里
③	西濱大橋上游	蓄水池塘	施作完畢，維護中
④	大庄40號越堤	簡易灑水系統	完成5.5公里
⑤	下山腳堤防	河道整理及抽砂	去除沙源8.3萬方
⑥	大庄堤防	河道整理	施工中，完成150000方
⑦	溪州大橋上游	蓄水池塘	施作完畢，維護中

本周揚塵防治工程照片

