

# 濁水溪揚塵抑制

## 1071119~1071125周報表


- ▶ 配合環保局各管制區進入緊戒狀態(依一、二區共5台灑水車)，並加強簡易灑水系統灑水等。
- ▶ 本周進行田頭堤防段蓄水池塘施設。
- ▶ 加速大庄堤防河道整理
- ▶ 本周持續進行西濱大橋下游蓄水池塘施作。
- ▶ 於麥寮出海口施作引水渠道浸潤砂源。

# 107年度揚塵改善措施第四季執行期程

截至11/25日止

| 改善措施                |           | 本季度  |    |    | 目前進度                           | 辦理機關               |
|---------------------|-----------|------|----|----|--------------------------------|--------------------|
|                     |           | 10   | 11 | 12 |                                |                    |
| 水利<br>防制<br>工法      | 水覆蓋       |      |    |    | 施工中<br>已完工二處<br>西螺、麥寮1處        | 四河局                |
|                     | 河道整理      | 進場施作 |    |    | 施工中                            | 四河局                |
| 造林<br>新植<br>與<br>撫育 | 堤防培厚植栽4公里 | 已完成  |    |    | 已完成4.7公里                       | 四河局                |
| 防災<br>應變            | 稻草        | 已完成  |    |    | 鋪設完成                           | 四河局<br>農糧署<br>地方政府 |
|                     | 三仙膠<br>灑水 | 進場施作 |    |    | 簡易灑水系統15條、<br>統佈里應急噴水車、<br>公膠水 | 四河局<br>環保署<br>地方政府 |
|                     | 環境清理      |      |    |    |                                |                    |

# 揚塵防治施工報告

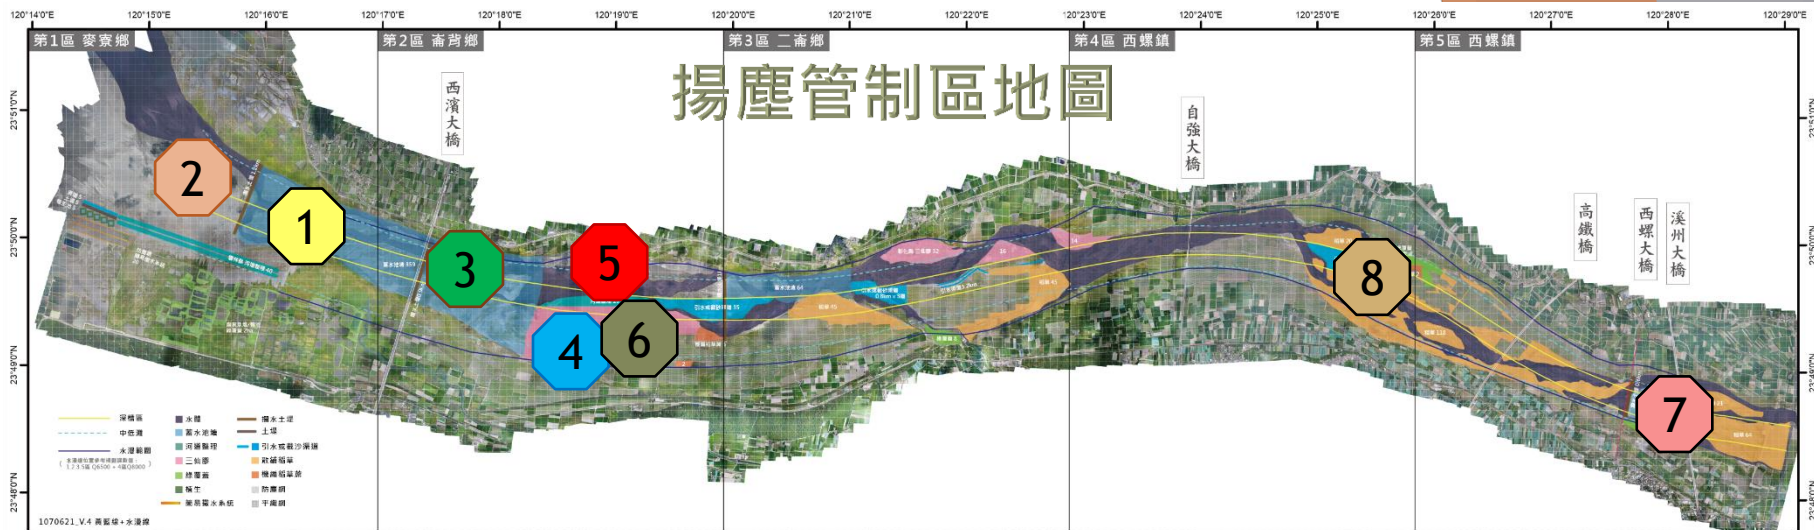

| 區域 | 施工位置    | 施工內容    | 目前進度          |
|----|---------|---------|---------------|
| 1  | 西濱大橋下游  | 蓄水池塘    | 施工中           |
| 2  | 西濱大橋下游  | 引水渠道    | 施工中，完成2公里     |
| 3  | 西濱大橋上游  | 蓄水池塘    | 施作完畢，維護中      |
| 4  | 大庄40號越堤 | 簡易灑水系統  | 完成5公里         |
| 5  | 下山腳堤防   | 河道整理及抽砂 | 去除沙源10.5萬方    |
| 6  | 大庄堤防    | 河道整理    | 施工中，完成188000方 |
| 7  | 溪州大橋上游  | 蓄水池塘    | 施作完畢，維護中      |
| 8  | 田頭堤防    | 蓄水池塘    | 施工中           |

# 本周揚塵防治工程照片

