

濁水溪揚塵抑制

1080128~1080203周報表


- ▶ 配合環保局各管制區進入緊戒狀態(依一、二區共5台灑水車)，並加強簡易灑水系統灑水等。
- ▶ 大庄河道整理灑水線佈設4.8公里已完成
- ▶ 本周持續進行各區蓄水池塘維護。

108年度揚塵改善措施第一季執行期程

截至02/03日止

改善措施		本季度			目前進度	辦理機關
		1	2	3		
水利 防制 工法	水覆蓋	進場施作			施工中 已完成西螺、 西濱二處	四河局
	河道整理	進場施作			施工完畢， 完成53萬方	四河局
造林 新與 撫育	堤防培厚植栽4公里	已完成			已完成4.7公 里	四河局
防災 應變	稻草	已完成			鋪設完成	四河局 農糧署 地方政府
	三仙膠	進場施作			簡易灑水系統 20仙灑灑 灑設計三噴 路、急道 公膠應車 水	四河局 環保署 地方政府
	灑水					
環境清理						

揚塵防治施工報告

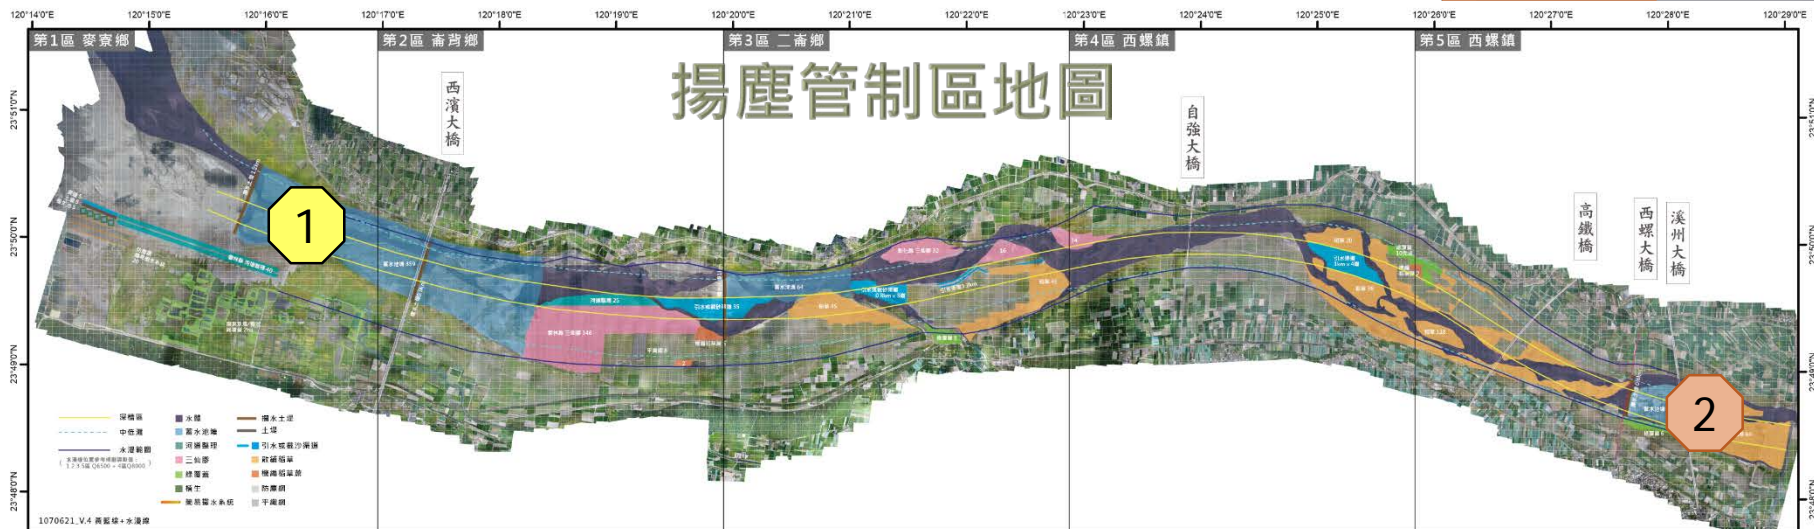

區域	施工位置	施工內容	目前進度
1	西濱大橋上下游	蓄水池塘	維護中
2	溪州大橋上下游	蓄水池塘	維護中

本周揚塵防治工程照片

