

濁水溪揚塵抑制

10800429~1080505周報表

- ▶ 本周各區有零星降雨。
- ▶ 本周於第二區南岸培厚區進行簡易灑水系統佈設。
- ▶ 本周0502吳政務委員領隊至麥寮鄉公所舉辦第五次揚塵中央與地方共同治理平台會議。


108年度改善措施執行期程

實際進度

預定進度

改善措施		108年度											備註	
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		4
水利防制工法	水覆蓋			計畫發包		視汛期後灘地變化檢討	進場施作			施作				1080401開工三案待發包
		5%		5%	10%	30%	50%	70%	80%	100%				
	河道整理			計畫發包		視汛期後灘地變化檢討	進場施作			施作				執行中
		5%		5%	10%	30%	50%	70%	80%	100%				
	疏濬	施作											執行中	
		10%	10%		30%		50%		70%		80%		100%	
造林新植與撫育	堤防培厚植栽	施作			完成造林									1080401開工三案待發包
		5%	10%	80%	100%									
	灘地綠覆蓋						施作			施作			1080401開工三案待發包	
		5%					5%	10%	80%		100%			
防災應變	其他措施	核定計畫			完成發包	施作							1080401開工三案待發包	
		5%	10%		30%		50%		70%		80%		100%	
	灑水	核定計畫			完成發包	施作							1080401開工三案待發包	
		5%	10%		30%		50%		70%		80%		100%	

揚塵防治施工報告

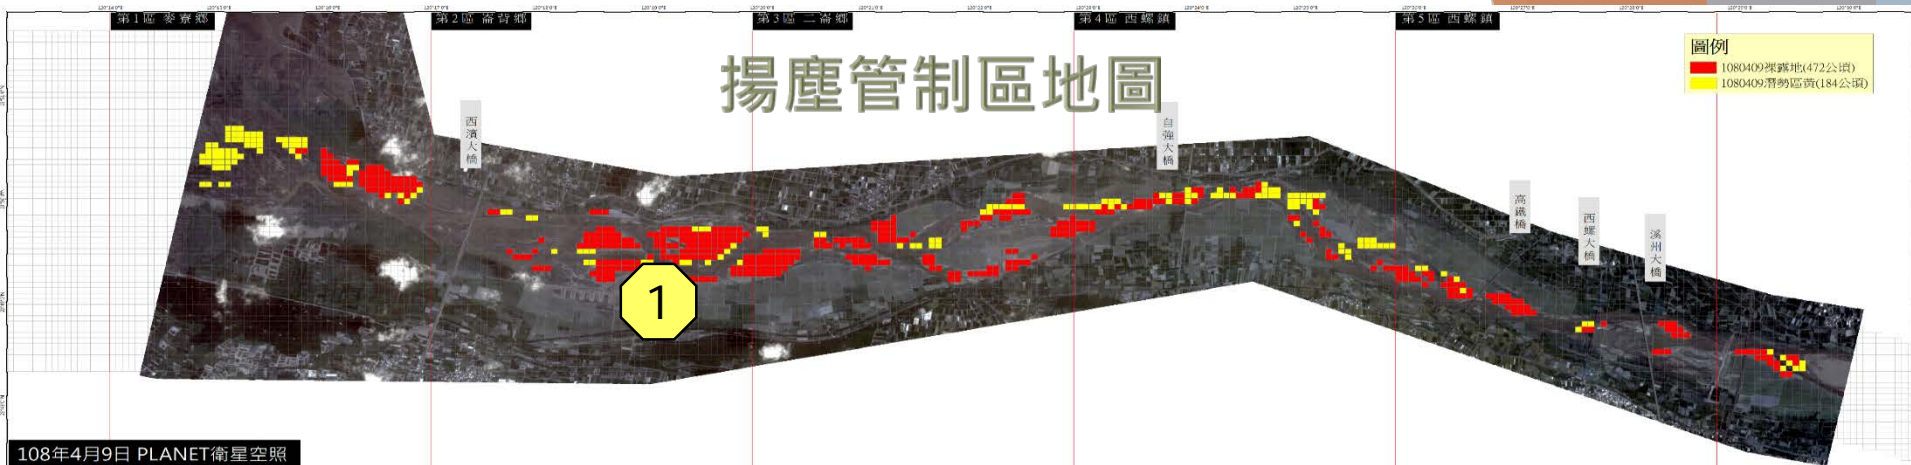

區域	施工位置	施工內容	目前進度
①	大庄堤防前	簡易灑水系統	施工中

本周揚塵防治工程照片

