

環境概況(二工區)

- ◆ 計畫範圍內主要為道路及分隔島，分隔島上的草地及樹木能提供給周圍鳥類、兩生類、爬蟲類及蝶類等物種棲息與利用。
- ◆ 計畫區南側多為草生地及草澤地，可提供周圍鳥類(如鵲鴝科、秧雞科及環頸雉)覓食、躲藏與繁殖。



保全對象(二工區)

生態議題
及保全對象

南側草生地及草澤地

[迴避] 工程範圍南側之既有草生地及草澤地，可提供周圍鳥類(如鵲鴒科、秧雞科及環頸雉)覓食、躲藏與繁殖，均以原地保留處理，避免因施工減少可利用之棲地。

保育對策

保全對象



小白鷺



鷹斑鵲



高蹺鵲




生態議題(二工區)

生態議題
及保全對象

保育對策

樹木移植111株

[減輕]開工前確實執行臺南市樹木移植施工要領，妥善選定移植地點，並維護其後續生長，確保移植存活率。如發現樹木在假植期或種植期間有潛伏之傷害，或移植時因操作不慎引起之損傷，或發生嚴重之病蟲害，或已呈現枯萎、死亡者，應無條件補植。

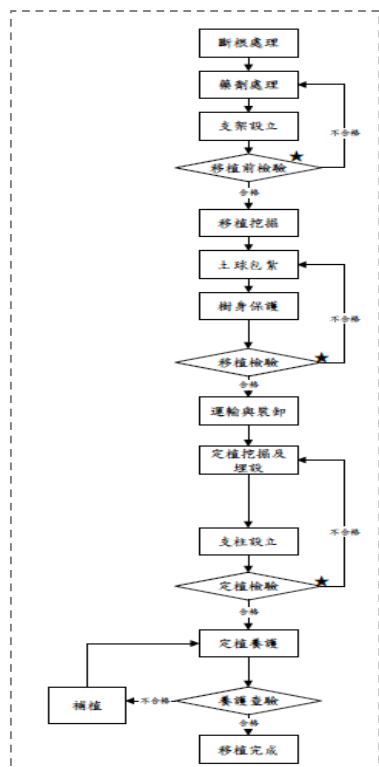

✓ 本計畫樹木移植計畫流程



友善措施(二工區)

抑制揚塵

[減輕]載運開挖粒料之車輛機具，應具備密閉車斗或使用覆蓋物緊密覆蓋，並定時對施工道路及車輛進行灑水降低揚塵量。

降低施工噪音

[減輕]施工中避免使用老舊機具及車況低劣之運輸車，並避免高分貝機具同時施工。

限制車速

[減輕]施工車輛於工區周邊速限每小時30km以下，降低野生動物路殺可能性。

植生補植

[補償]新植草種採原生種或非入侵種類。

施工時間限制

[迴避]避免晨昏時段野生動物活動旺盛期間施工。

環境衛生

[減輕]施工期間產生之工程及民生廢棄物應集中、加蓋處理，並帶離現場。

