揚塵防治 週報表

114/04/07~114/04/13

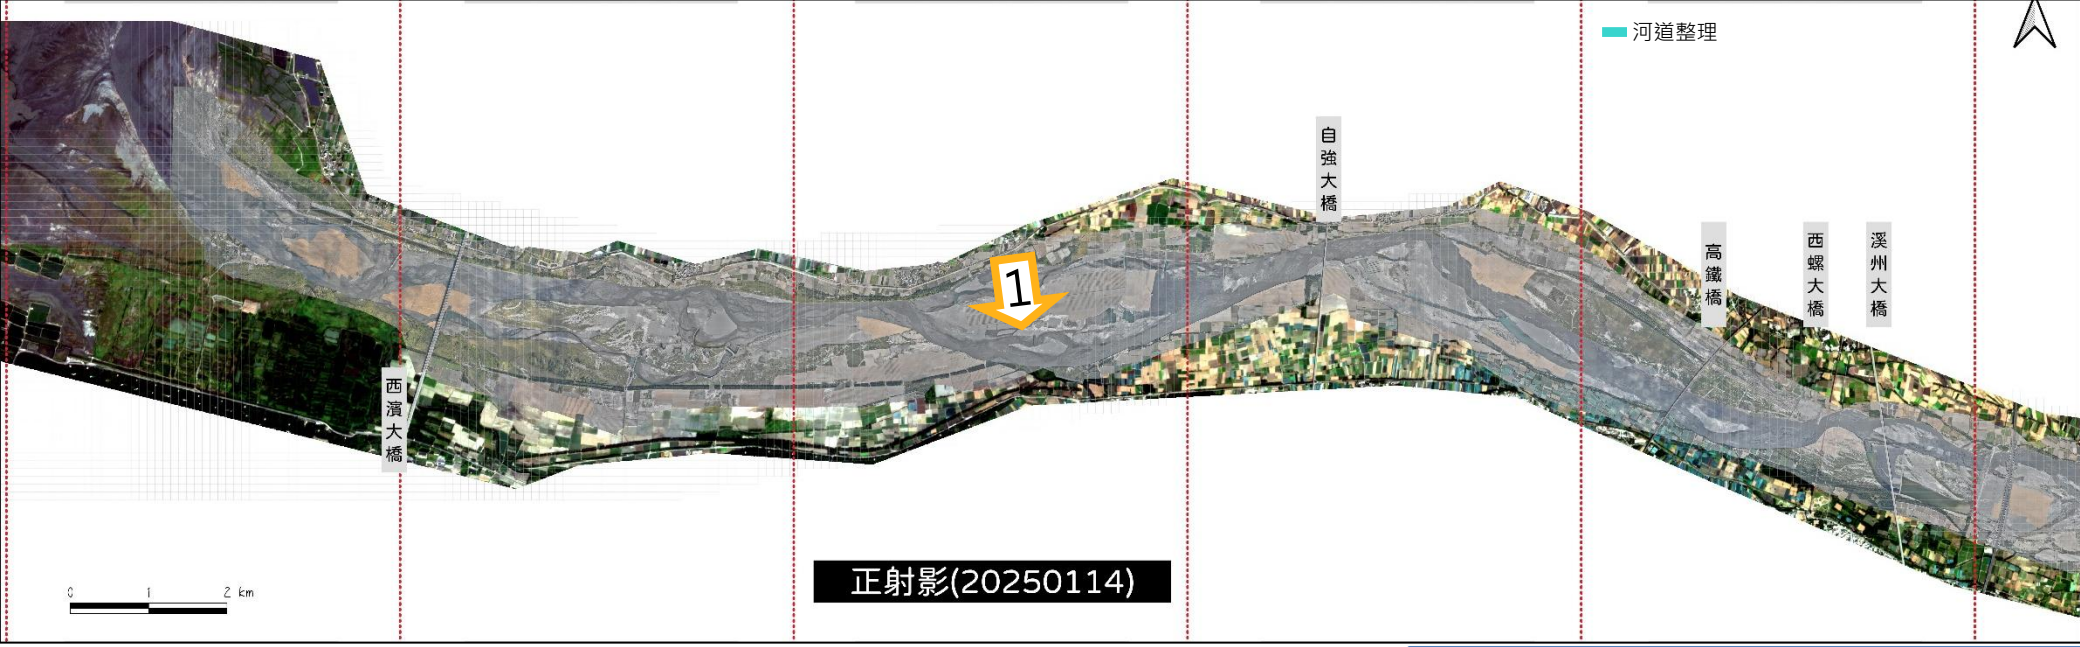
河道整理
西濱大橋
自強大橋
高鐵橋
西螺大橋
溪州大橋
1
0 1 2 km
正射影(20250114)

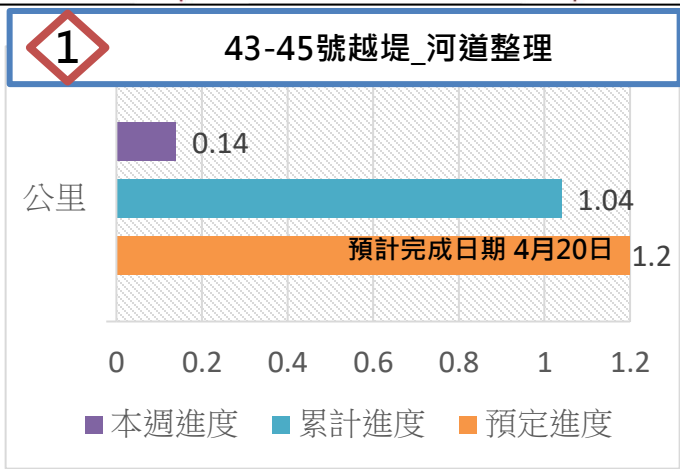
1
43-45號越堤_河道整理
公里
0.14
1.04
預計完成日期 4月20日
1.2
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
本週進度
累計進度
預定進度

各區 空拍現況

第一區 麥寮 出海口

第二區 西濱大橋 上游

第三區 跨河電塔 下游

第四區 自強大橋 下游

第五區 西螺大橋 上下游

113年度
揚塵KPI進度管制

執行期程:113年5月至114年4月

- 抑制面積
- 進度

其他覆蓋

- 目標值 : 300 公頃
- 已完成 : 631 公頃
- 達成率 : 210.3%

水覆蓋

- 目標值 : 400 公頃
- 已完成 : 485 公頃
- 達成率 : 121.3 %

河道整理

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 4.14公里
- 達成率 : 103.5%

防洪植栽

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 6 公里
- 達成率 : 150%

綠覆蓋

- 目標值 : 250 公頃
- 已完成 : 600公頃
- 達成率 : 240%

揚塵抑制措

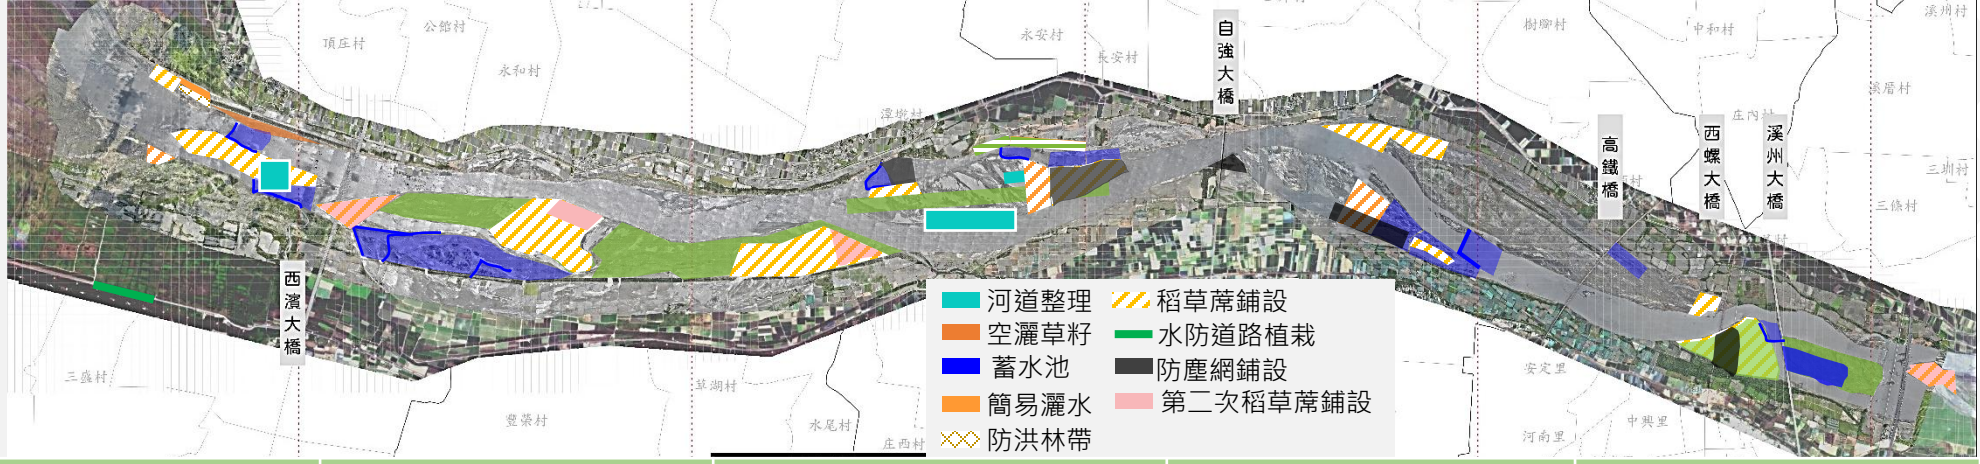

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
1) 西濱下游南岸_蓄水池50公頃 2) 西濱大橋下游北岸(7號越堤)_蓄水池20公頃	1)西濱大橋上游南岸_蓄水池120公頃 2)20號越堤路段_蓄水池20公頃 3)42號越堤路段_蓄水池20公頃	1) 51號越堤路段A區_蓄水池30公頃 2) 51號越堤路段B區_蓄水池30公頃 3) 51號越堤路段第三階段_蓄水池10公頃 4) 39號越堤路段_蓄水池30公頃	1)94號越堤路段_蓄水池塘30公頃 2)94號越堤路第二階段_蓄水池塘20公頃 3)96號越堤路_蓄水池塘40公頃	1) 高鐵橋下_蓄水池塘20公頃 2) 溪州大橋上游_蓄水池塘30公頃 3) 溪州大橋下游_蓄水池15公頃
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
1) 西濱大橋下游北岸_河道整理0.6公里 **2) 9號越堤_河道整理0.8公里**		1) 跨河電塔北岸_河道整理1.2公里 2) 跨河電塔下游段_河中灘地H區0.5公里 **3) 43-45號越堤_河道整理1.04公里**		
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
1) 西濱大橋下游南北岸_空灑草籽29公頃	1) 西濱大橋上游南岸_空灑草籽119公頃	1) 68-44號越堤路段_空灑草籽142公頃 2) 51號越堤路段河中灘地_空灑草籽200公頃		1) 西螺大橋上游南岸_空灑草籽55公頃 2) 溪州大橋上游南岸_空灑草籽55公頃
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
1) 5號越堤路段_培厚區_防洪林帶0.6公里 2) 12號越堤路段_水防道路植栽2公里		1) 51號越堤路段_培厚區_防洪林帶1.2公里 2) 49號越堤路段_培厚區_防洪林帶2.2公里		
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 西濱大橋下游北岸_簡易灑水3公頃 2) 5-7號越堤高灘地_稻草蓆鋪設28公頃 3) 10號越堤路段高灘地_稻草蓆鋪設3公頃 4) 西濱大橋下游河中灘地_稻草蓆鋪11公頃 5) 7號越堤路段河道灘地_稻草蓆鋪42公頃	1) 44-40號越堤路段_稻草蓆覆蓋56公頃 2) 西濱大橋南岸灘地_稻草蓆鋪設20公頃 3) 西濱大橋上游南岸灘地_稻草蓆鋪設24公頃 4) 西濱大橋上下游低灘地_稻草蓆33公頃 5) 44號越堤路段低灘地_稻草蓆鋪9公頃	1) 51號越堤路_培厚區_簡易灑水6公頃 2) 大義崙排水_稻草蓆鋪設47公頃 3) 跨河電塔上游_稻草蓆覆蓋32公頃 4) 跨河電塔下游河中灘地E區_稻草蓆鋪設27公頃。 5) 跨河電塔下游河道灘地(2)_稻草蓆鋪15公頃 6) 49號越堤路段_簡易灑水系統11公頃 7) 39號越堤路段_防塵網9公頃 8) 64號越堤路段低灘地_稻草蓆13公頃 9) 39號越堤路段河中灘地_稻草蓆13公頃	1)自橋大橋上游右岸_稻草蓆鋪設35公頃。 2)跨河電塔上游河道灘地(1)_防塵網鋪設37公頃。 3)跨河電塔上游河道灘地(1)_防塵網鋪設3公頃。 4)自強大橋上游北岸 _稻草蓆10公頃 5)94號越堤路段低灘地_稻草蓆13公頃 6)63-67號越堤路段低灘地_稻草蓆20公頃 7)92號越堤路河中灘地_防塵網鋪設20公頃 8)自強大橋橋下_防塵網鋪設6公頃	1)西螺大橋上游南岸_稻草蓆鋪設16公頃 2)西螺大橋下游北岸_稻草蓆鋪設7公頃 3)中沙大橋上游河中灘地_稻草蓆鋪設10公頃 4)西螺大橋上游南岸_稻草蓆鋪設(第二次)14公頃 5)溪州大橋上游低灘地_防塵網鋪設8公頃 6)中沙大橋上游低灘地_稻草蓆鋪設30公頃
