揚塵防治 週報表

114/06/02~114/06/08

西濱大橋
2
1
自強大橋
高鐵橋
西螺大橋
溪州大橋
0 1 2 km
衛星空照(20250205)

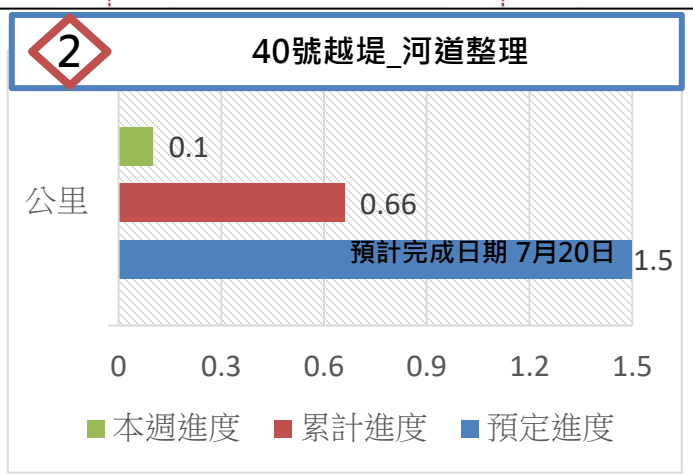
2
40號越堤_河道整理
公里
0.1
0.66
預計完成日期 7月20日
1.5
0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5
本週進度 累計進度 預定進度

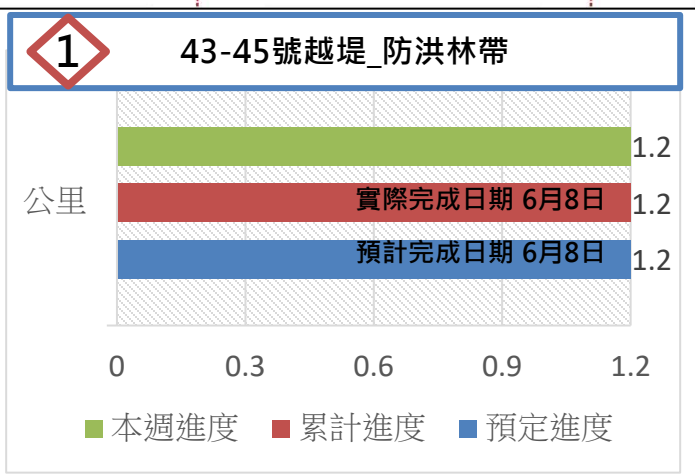
1
43-45號越堤_防洪林帶
公里
1.2
實際完成日期 6月8日
1.2
預計完成日期 6月8日
1.2
0 0.3 0.6 0.9 1.2
本週進度 累計進度 預定進度

各區 空拍現況

第一區 麥寮 出海口

第二區 40號越堤路段 下游

第三區 跨河電塔 下游

第四區 自強大橋 上游

第五區 西螺大橋 上下游

114年度
揚塵KPI進度管制

執行期程:114年5月至115年4月

- 抑制面積
- 進度

其他覆蓋

- 目標值 : 300 公頃
- 已完成 : 16 公頃
- 達成率 : 5.3 %

水覆蓋

- 目標值 : 400公頃
- 已完成 : - 公頃
- 達成率 : - %

河道整理

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 0.66公里
- 達成率 : 16.5%

防洪植栽

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 1.2 公里
- 達成率 : 30%

綠覆蓋

- 目標值 : 250 公頃
- 已完成 : -公頃
- 達成率 : -%

營造複式斷面規劃圖

複式斷面	年度	107-109	110-112	113	114	115	合計
	KPI(公里)	8	12	4	4	4	32
	實際完成	8	12.23	4	-	-	24.23

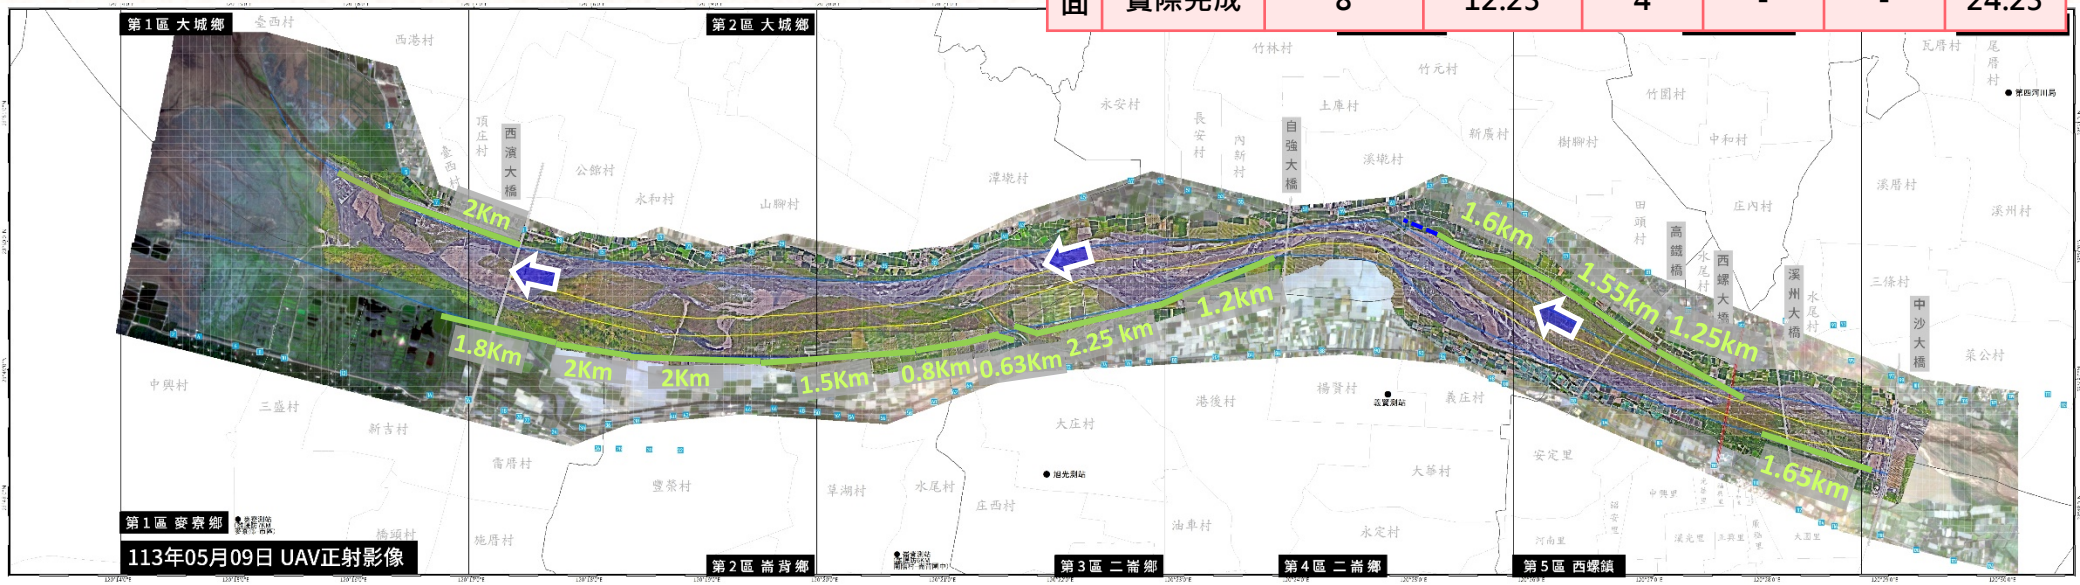

- **114年營造複式斷面進度管控** ➢ **執行進度說明：**

KPI　/ 4.0 公里

已完成 / 0 公里

達成率 / 0 %

- 本(114)年度計畫相關案件目前正陸續辦理公告上網與簽約作業中，本分署將擬訂於6月中召開工作會議初步討論複式斷面規劃與施作期程，並俟契約簽訂完成後，依進度辦理複式斷面營造作業。

水防道路植栽規劃圖

水防道路植栽	年度	110	111	112	113	114	115	合計
	KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
	實際完成	1	2.3	2	2	-	-	7.3

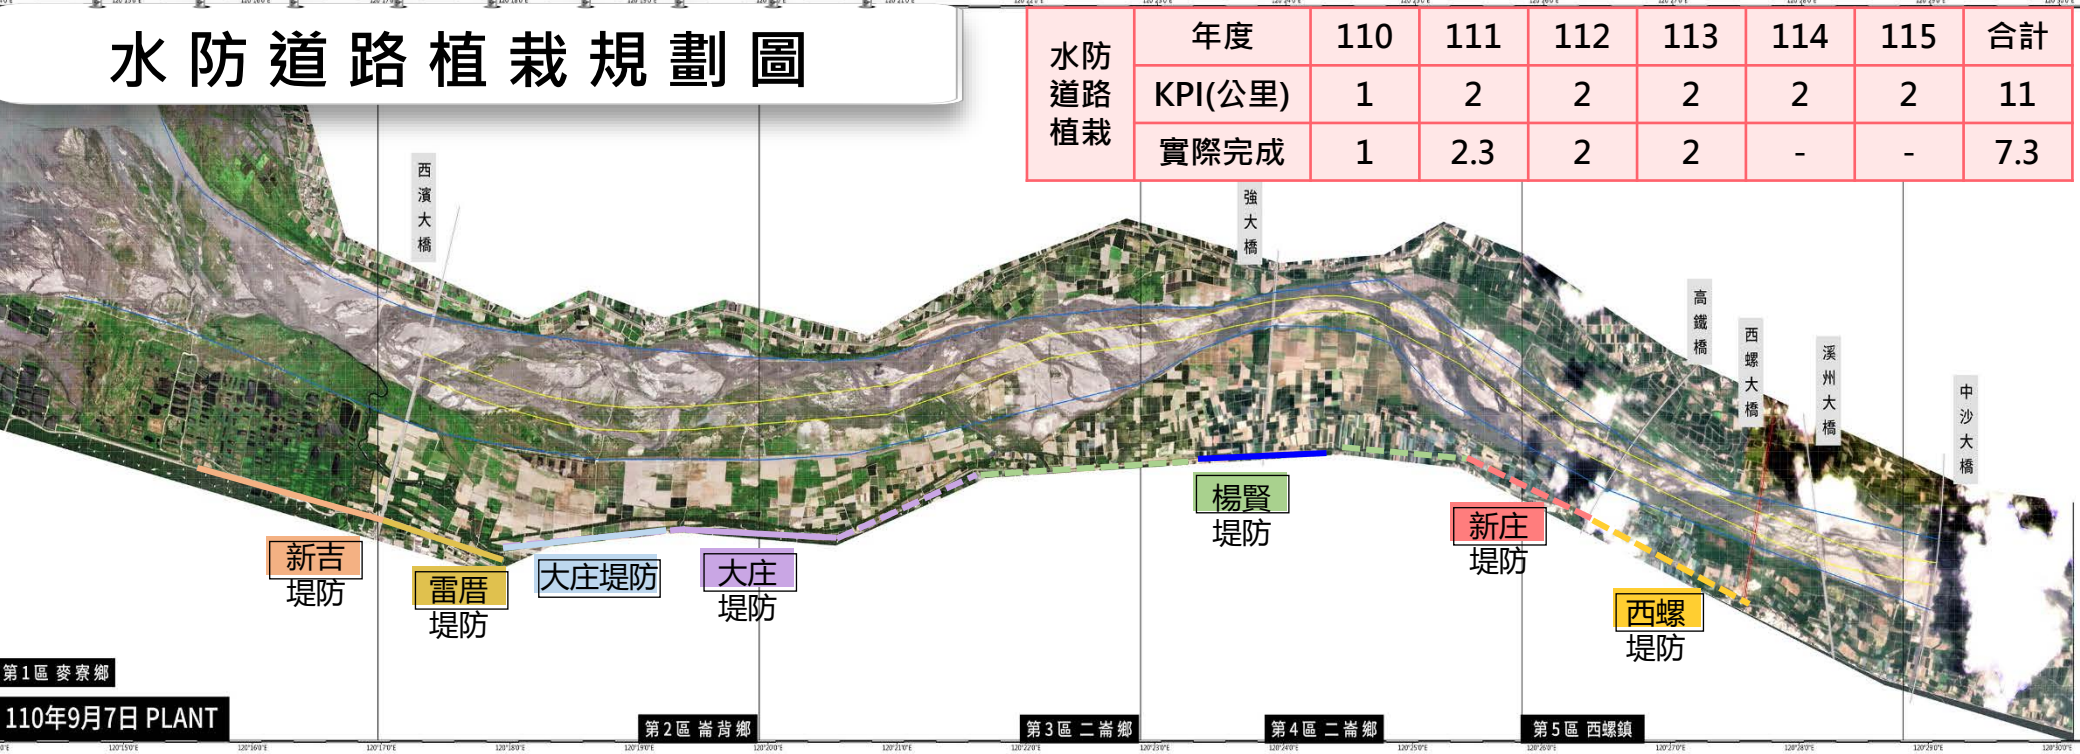

- **114年水防道路植栽進度管控**

KPI　/ 2公里 ➢ 執行進度說明：

已完成 / 0公里

達成率/ 0 %

- 本(114)年度計畫相關案件目前正陸續辦理公告上網與簽約作業中，本分署將擬訂於6月中召開工作會議初步討論水防道路植栽與施作期程，並俟契約簽訂完成後，依進度辦理水防道路植栽作業。

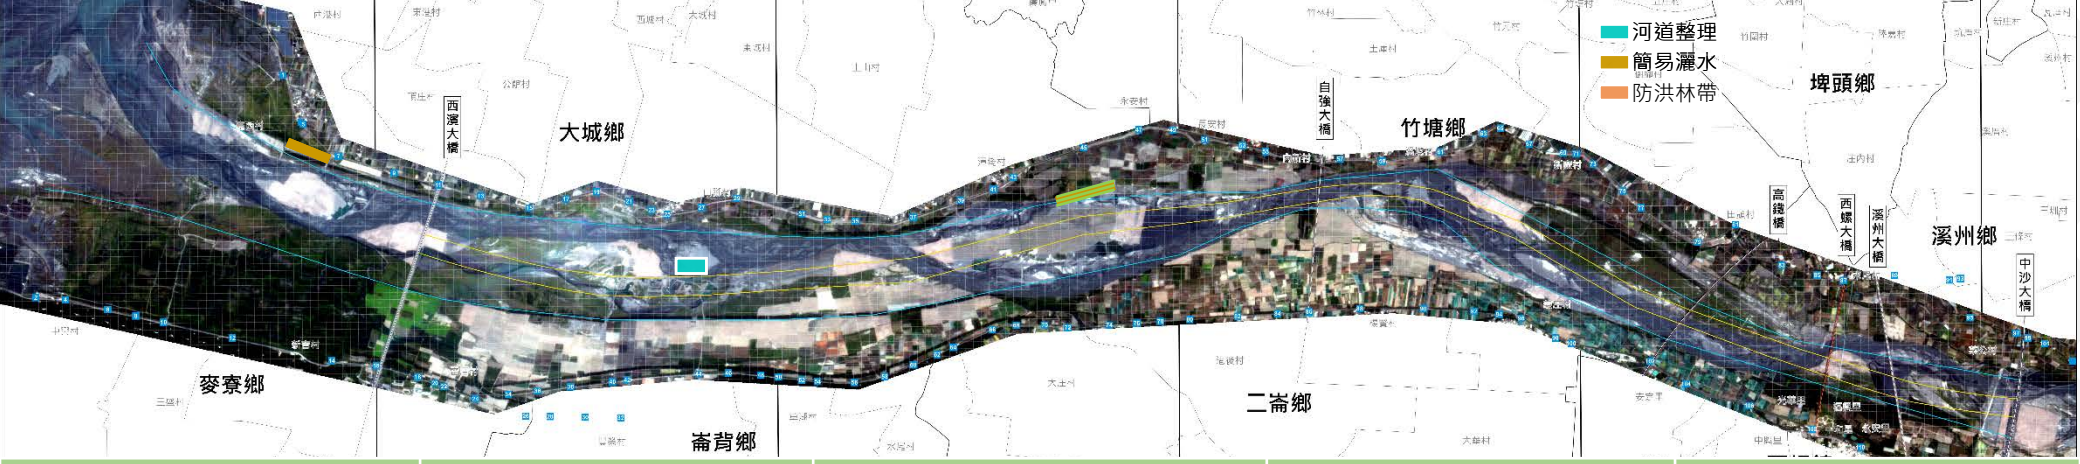

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
	1) 40號越堤_河道整理0.66公里			
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
		1) 43-45號越堤_防洪林帶1.2公里		
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 7號越堤_簡易灑水設施6.4公頃		1) 43-45號越堤_簡易灑水設施9.6公頃		
