
濁水溪揚塵防制及改善第三期行動方案
週報表

115/10/26~115/11/01



115 年 10 月 裸露地判識面積 447 公頃

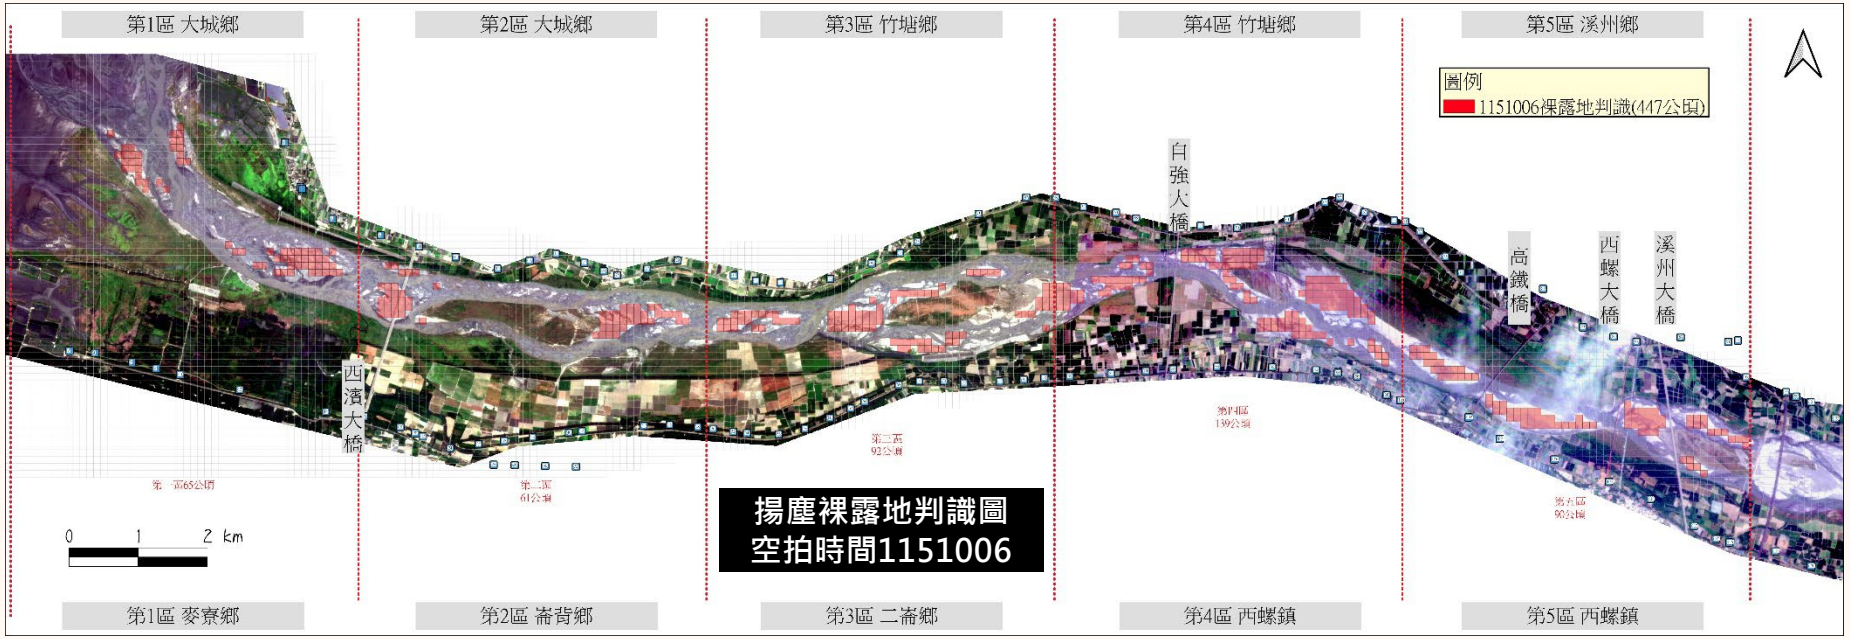


揚塵裸露地判識圖
空拍時間1151006

65公頃	61公頃	92公頃	139公頃	90公頃


113年度 裸露地變化



114年度 裸露地變化

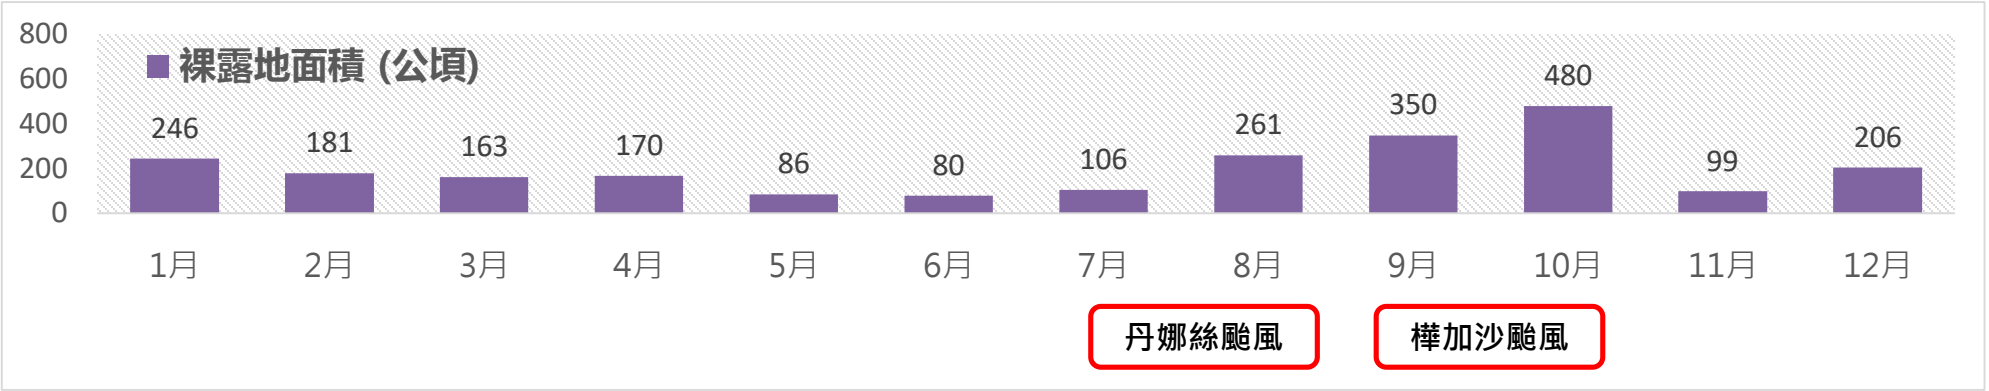

115年度 裸露地變化

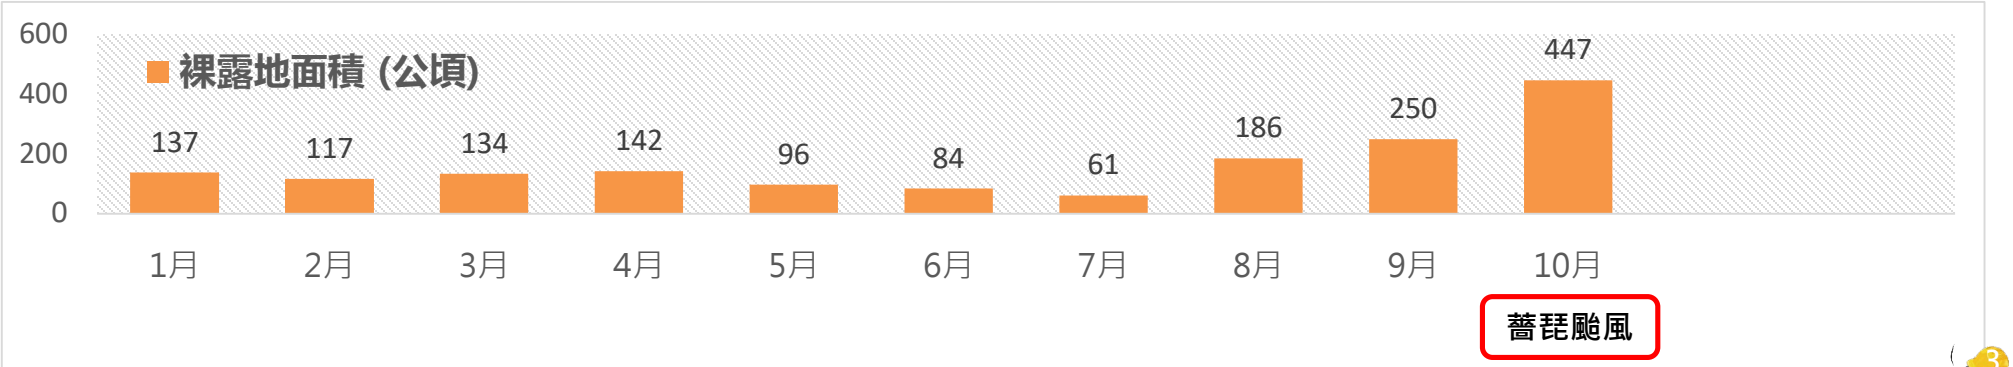


第三期行動方案(113-115年) 歷年辦理情形

	水覆蓋	綠覆蓋	其他覆蓋	河道整理	防洪林帶
KPI目標值 1,200 公頃	400公頃	250公頃	300公頃	4公里(80公頃)	4公里(20公頃)
115年度 實際施作 557.1 公頃 115年5月至116年4月	已完成 230 公頃 達成率 57.5%	已完成 261 公頃 達成率 104.4%	已完成 40 公頃 達成率 13.3%	已完成 0.845 公里 達成率 21.1%	已完成 3.8 公里 達成率 95%
114年度 實際施作 1,425 公頃 114年5月至115年4月	已完成 455 公頃 達成率 113.7 %	已完成 357 公頃 達成率 142.8 %	已完成 532.6 公頃 達成率 177.5 %	已完成 4.055 公里 達成率 101.3 %	已完成 6 公里 達成率 150 %
113年度 實際施作 1,802 公頃 113年5月至114年4月	已完成 485 公頃 達成率 121.3 %	已完成 600 公頃 達成率 240 %	已完成 631 公頃 達成率 210.3 %	已完成 4.3 公里 達成率 107.5 %	已完成 6 公里 達成率 150 %

- 後續將依「濁水溪揚塵防制及改善行動方案」與縣府及相關部會分工，持續加強巡視及監控河道內水位變化及裸露灘地分佈狀況，滾動調整防制量能與改善策略。

營造複式斷面規劃

複式斷面	年度	107-109	110-112	113	114	115	合計
	KPI(公里)	8	12	4	4	4	32
	實際完成	8	12.23	4	4	1.8	30.03

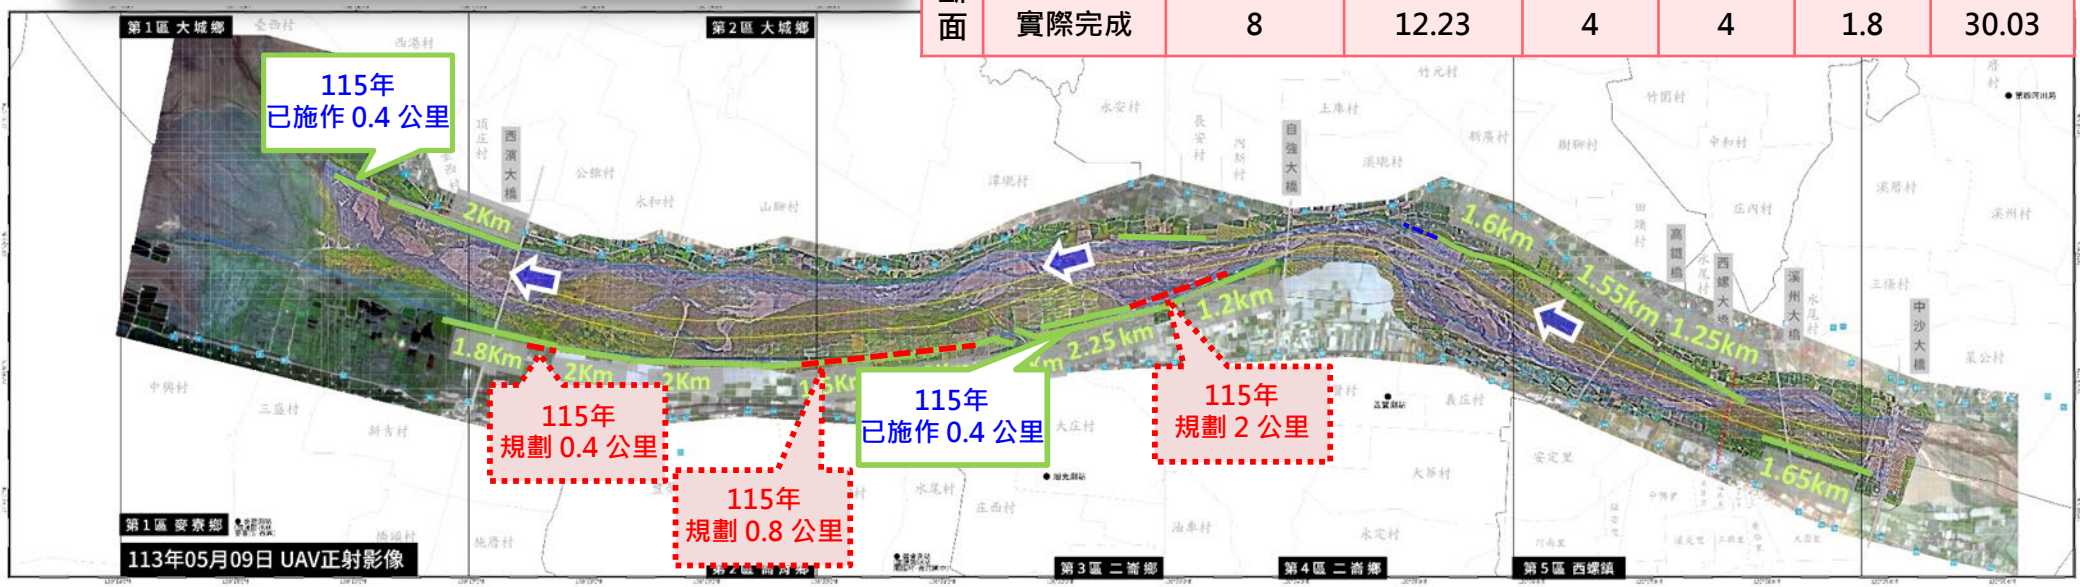

115年 營造複式斷面進度管控

KPI / 4.0 公里

已完成 / 1.8 公里

達成率 / 45 %

目標值	115年5月-8月	115年9月-12月	總計
	0.8公里	3.2公里	4公里
實際值	0.8公里	1公里	1.8公里

規劃說明

■ 第一區：下海墘堤防3-5號越堤(規劃0.4公里)，已於07月24日完成。

依本分署115年9月1日第9次工作會議，依河道現況與灘地裸露風險，調整內容如下：


(1) 第二區：大庄堤防40號越堤(規劃0.4公里)，已於09月30日完成土方培厚。

(2) 第二區：大庄堤防44號至52號越堤(規劃0.8公里，原規劃第四區自強大橋上游左岸，因疏濬案件已培厚灘地遭沖毀，故改於44號至52號越堤原複式斷面復原區域)，預計11月底完成土方培厚。

(3) 第三區：楊賢堤防74號越堤(規劃2公里)，已於10月11日完成1公里防洪林帶栽植作業，剩餘1公里規劃於12月上旬完成土方培厚。

水防道路植栽規劃

水防道路植栽	年度	110	111	112	113	114	115	合計
	KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
	實際完成	1	2.3	2	2	2	2	11.3

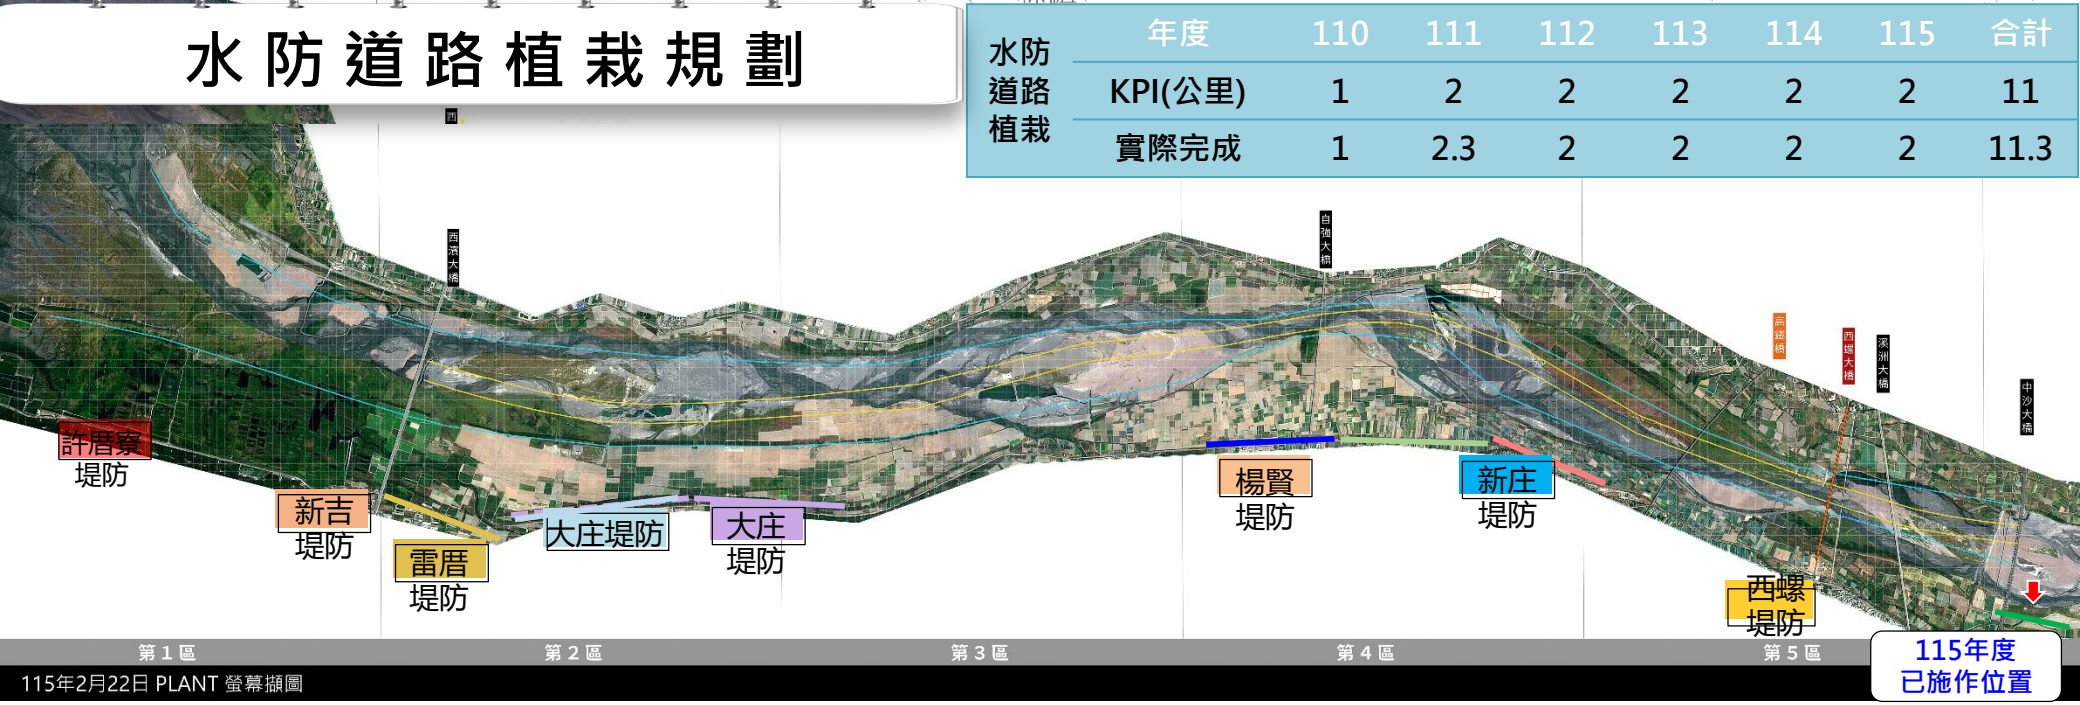

115年 水防道路植栽進度管控

KPI / 2 公里

已完成 / 2 公里

達成率 / 100 %

目標值	115年5月-8月	總計
	2 公里	2 公里
實際值	2 公里	2 公里

辦理情形說明

(1) 第五區：西螺堤防118至124號越堤(規劃2公里)，已於8月18日完成水防道路植樹作業。

(2) 110-115年合計6年11公里水防道路植樹目標值，已全數完成，實際執行11.3公里。



各區 空拍現況

第一區 麥寮 出海口 0號井



第二區 40號越堤 下游



第三區 跨河電塔下游




第四區 自強大橋 上游



第五區 西螺大橋 上下游




本週執行進度

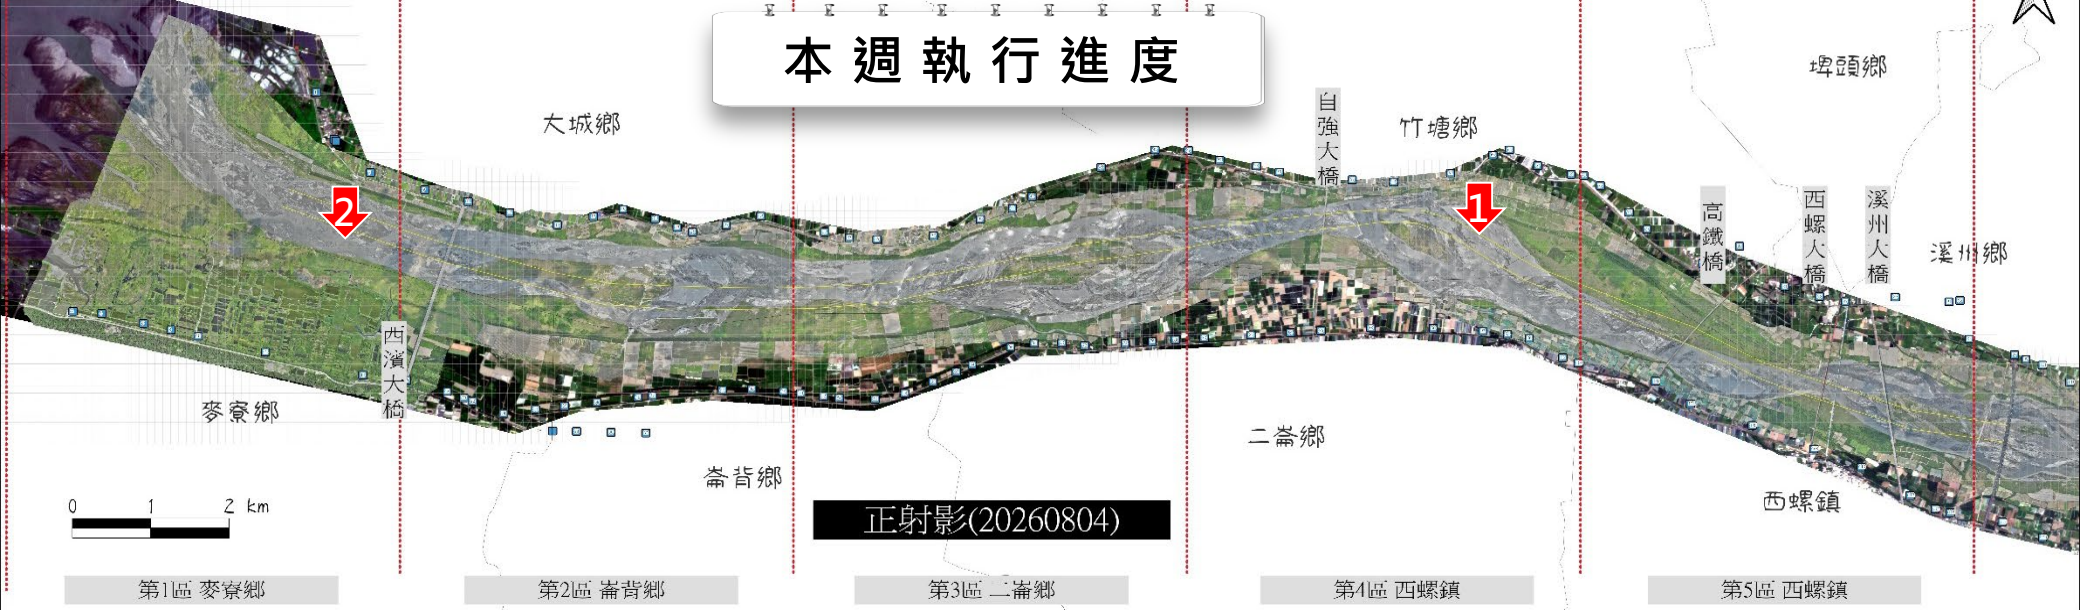


薔琵颱風過後
現地巡查

2 7號越堤路上游_稻草蓆

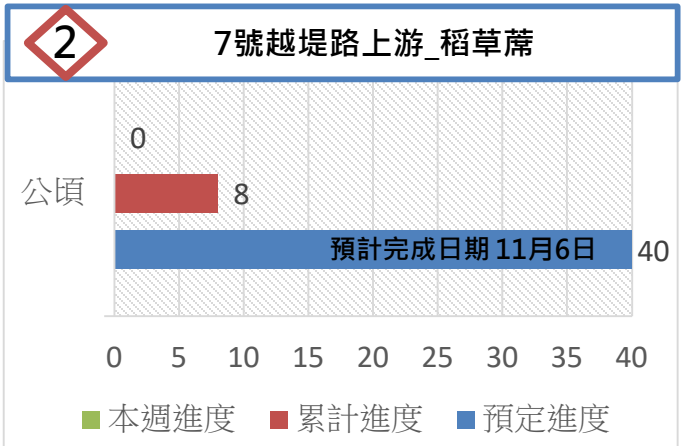




1 61號越堤路上游_稻草蓆

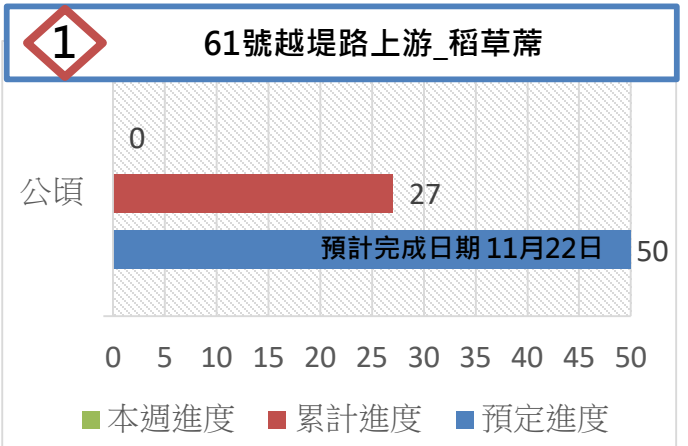



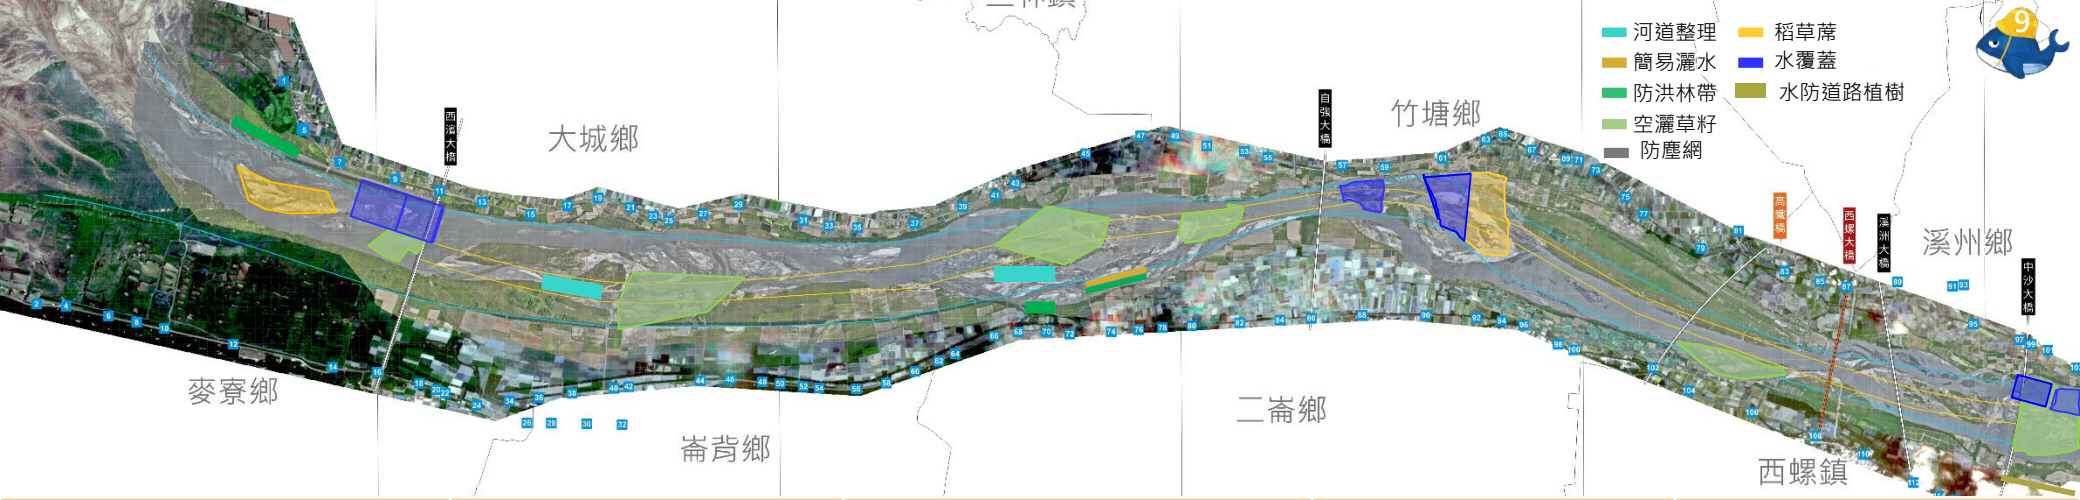

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
1) 11號越堤路上游A_蓄水池塘20公頃 2) 9號越堤路上游_蓄水池塘40公頃			1) 61號越堤路段_蓄水池塘60公頃 2)57號越堤_蓄水池塘50公頃	1) 中沙大橋至西螺大橋A_蓄水池塘30公頃 2) 中沙大橋至西螺大橋B_蓄水池塘30公頃
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
	1) 40號越堤路段_河道整理0.4公里(8公頃)	1) 74號越堤路上游_河道整理0.445公里(8.9公頃)		
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
1) 西濱大橋下游_空灑草籽11公頃	1) 42號越堤路上游_空灑草籽46公頃	1) 大義崙排水上游_空灑草籽33公頃	1) 自強大橋下游_空灑草籽50公頃	1) 中沙大橋上游_空灑草籽97公頃 2) 高鐵橋上游_空灑草籽24公頃
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
1) 3-5號越堤路培厚B區_防洪林帶植栽0.4公里(2公頃)		1) 74號越堤路下游培厚B區_防洪林帶植栽0.4公里(2公頃) 2) 74號越堤上下游_培厚防洪林帶1公里(5公頃)		1) 西螺堤防118至124號越堤_水防道路植栽2公里(0.2公頃)
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 7號越堤路上游_稻草蓆鋪設8公頃		1) 74號越堤路段上下游_水線布設5公頃	1) 61號越堤路上游_稻草蓆27公頃	
