濁水溪揚塵防制及改善第三期行動方案
週報表

115/11/09~115/11/15





各區 空拍現況

第一區 麥寮 出海口 0號井



第二區 40號越堤 下游



第三區 跨河電塔下游





第四區 自強大橋 上游





第五區 西螺大橋 上下游

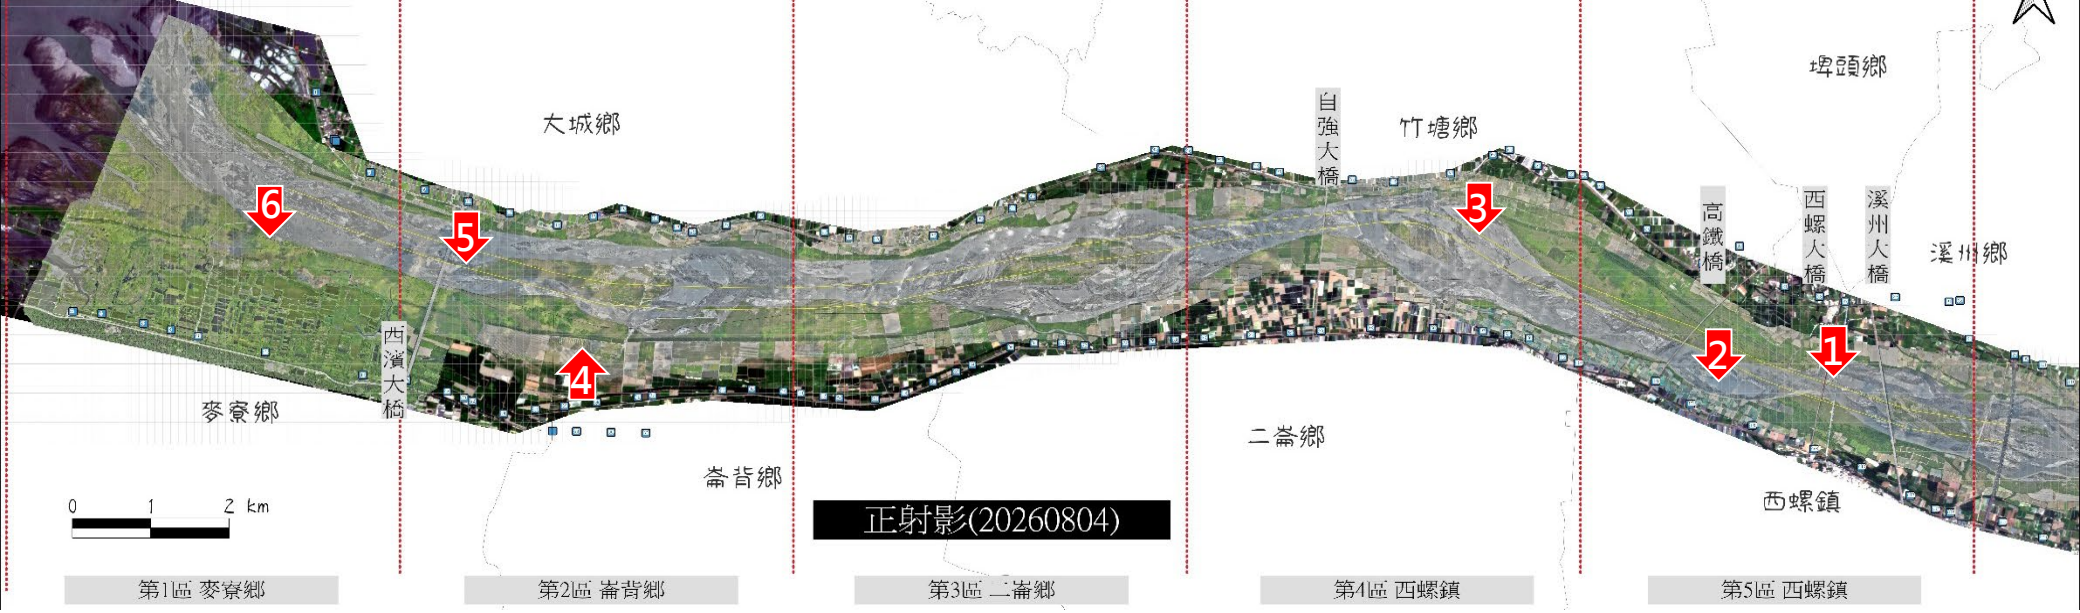


大城鄉
竹塘鄉
埤頭鄉
溪州鄉
麥寮鄉
崙背鄉
二崙鄉
西螺鎮
自強大橋
高鐵橋
西螺大橋
溪州大橋
西濱大橋
1
2
3
4
5
6
0 1 2 km
正射影(20260804)
第1區 麥寮鄉
第2區 崙背鄉
第3區 二崙鄉
第4區 西螺鎮
第5區 西螺鎮

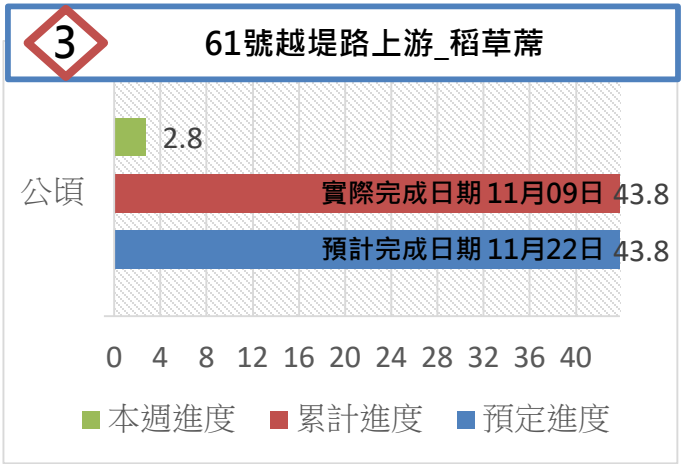

3
61號越堤路上游_稻草蓆
公頃
2.8
實際完成日期 11月09日 43.8
預計完成日期 11月22日 43.8
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
本週進度 累計進度 預定進度

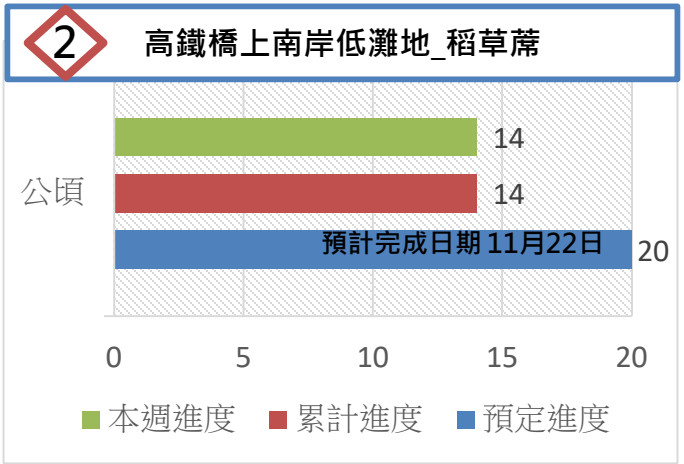

2
高鐵橋上南岸低灘地_稻草蓆
公頃
14
14
預計完成日期 11月22日 20
0 5 10 15 20
本週進度 累計進度 預定進度

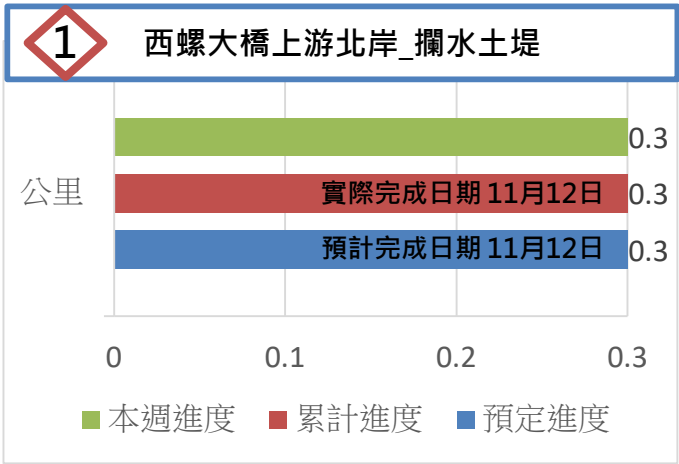
1
西螺大橋上游北岸_攔水土堤
公里
0.3
實際完成日期 11月12日 0.3
預計完成日期 11月12日 0.3
0 0.1 0.2 0.3
本週進度 累計進度 預定進度






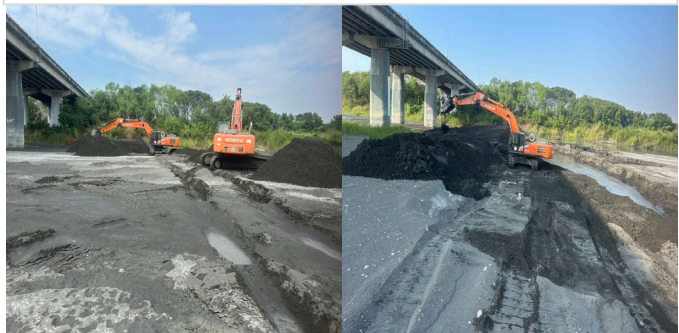

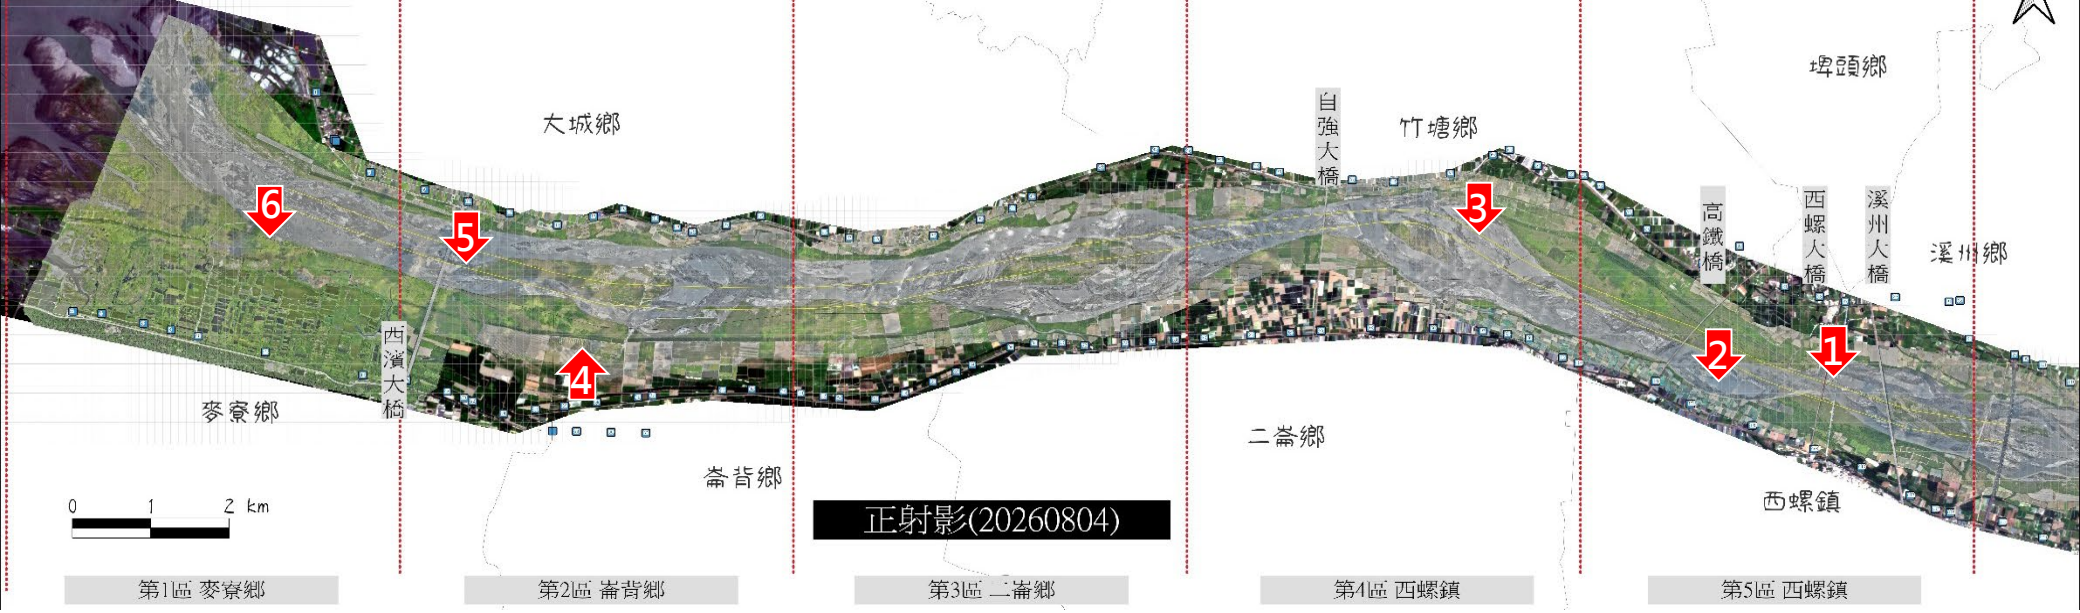


6 許厝寮堤防10號越堤_疏濬河道整理

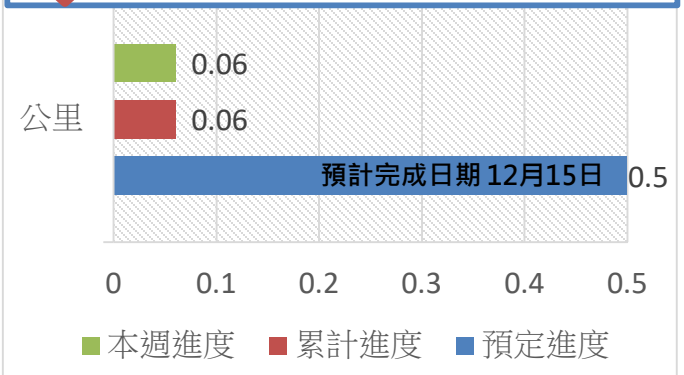





5 下海墘堤防13號越堤_稻草蓆鋪設

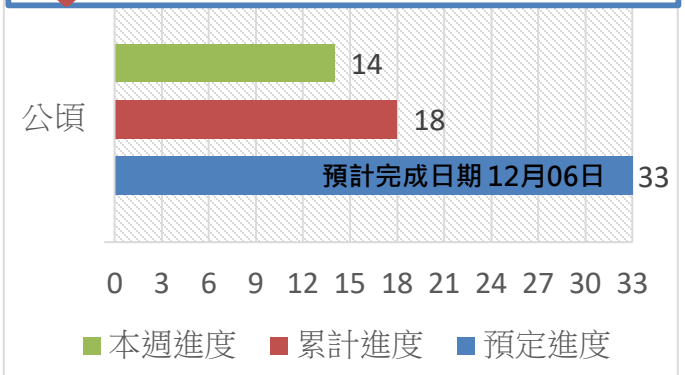




4 大庄堤防40號越堤_防洪林帶

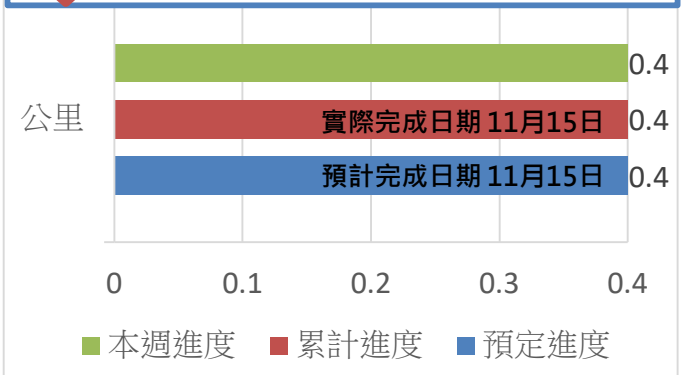

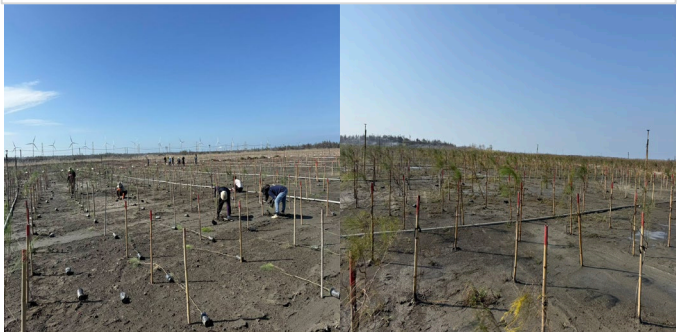

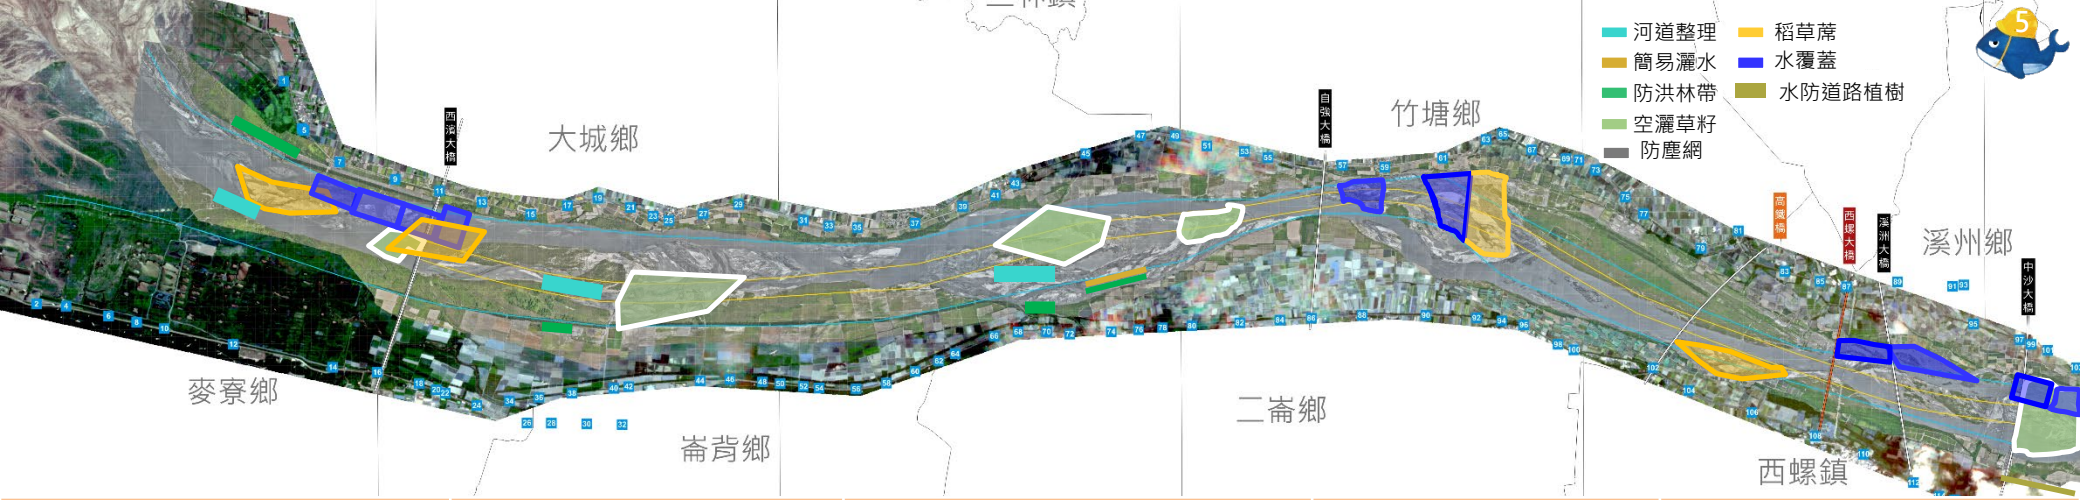

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
1) 11號越堤路上游A_蓄水池塘20公頃 2) 9號越堤路上游_蓄水池塘40公頃 3) 下海墘堤防9號越堤_蓄水池30公頃(災後復原) 4) 下海墘堤防7號越堤_蓄水池40公頃(災後復原)	1) 下海墘堤防13號越堤_蓄水池塘30公頃		1) 61號越堤路段_蓄水池塘60公頃 2)57號越堤_蓄水池塘50公頃	1) 中沙大橋至西螺大橋A_蓄水池塘30公頃 2) 中沙大橋至西螺大橋B_蓄水池塘30公頃 3) 中沙大橋上游北岸_蓄水池塘30公頃(災後復原) 4) 天然氣管橋上游北岸_蓄水池30公頃(災後復原) 5) 溪州大橋上游北岸_蓄水池30公頃 6) 西螺大橋上游北岸_蓄水池30公頃
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
1) 許厝寮堤防10號越堤_疏濬河道整理0.06公里(1.2公頃)	1) 40號越堤路段_河道整理0.4公里(8公頃)	1) 74號越堤路上游_河道整理0.445公里(8.9公頃)		
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
1) 西濱大橋下游_空灑草籽11公頃	1) 42號越堤路上游_空灑草籽46公頃	1) 大義崙排水上游_空灑草籽33公頃	1) 自強大橋下游_空灑草籽50公頃	1) 中沙大橋上游_空灑草籽97公頃 2) 高鐵橋上游_空灑草籽24公頃
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
1) 3-5號越堤路培厚B區_防洪林帶植栽0.4公里(2公頃)	1) 大庄堤防40號越堤_防洪林帶植栽0.4公里(4公頃)	1) 74號越堤路下游培厚B區_防洪林帶植栽0.4公里(2公頃) 2) 74號越堤上下游_培厚防洪林帶1公里(5公頃)		1) 西螺堤防118至124號越堤_水防道路植栽2公里(0.2公頃)
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 7號越堤路上游_稻草蓆鋪設8公頃	1) 下海墘堤防13號越堤_稻草蓆鋪設18公頃	1) 74號越堤路段上下游_水線布設5公頃	1) 61號越堤路上游_稻草蓆43.8公頃	1)高鐵橋上南岸低灘地_稻草蓆14公頃
