揚塵防治 週報表

110/07/05~110/07/11

本週工項進度及位置 110/07/05~110/07/11

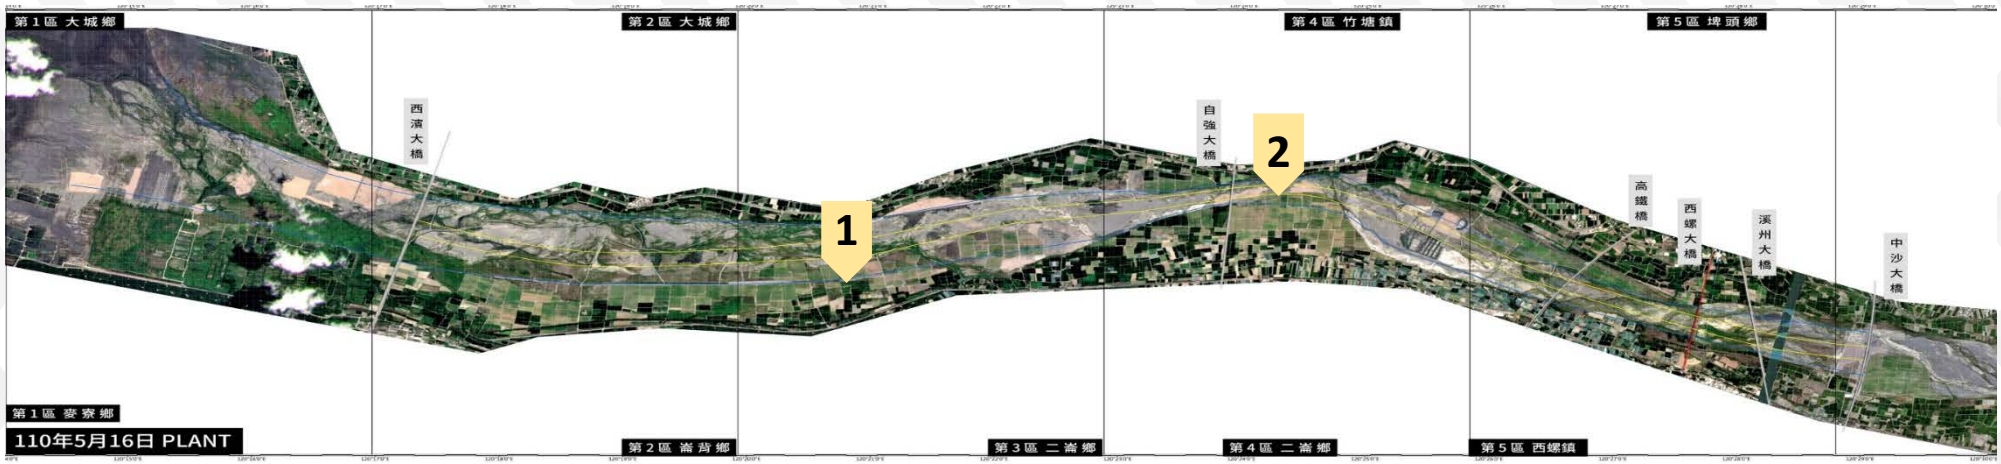

1

第三區 河道整理

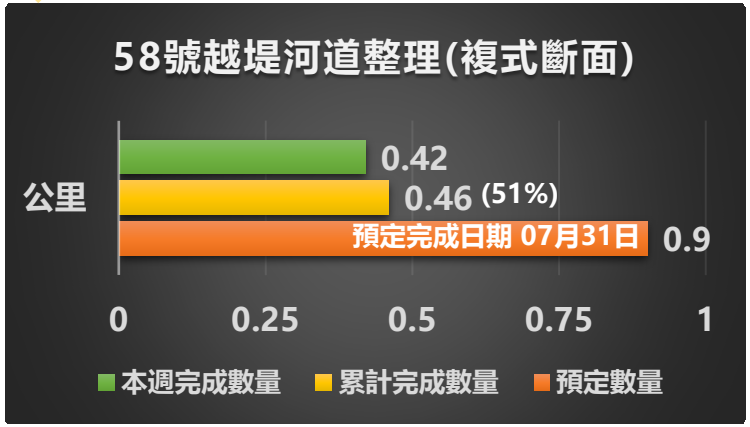

2

第四區 河道整理

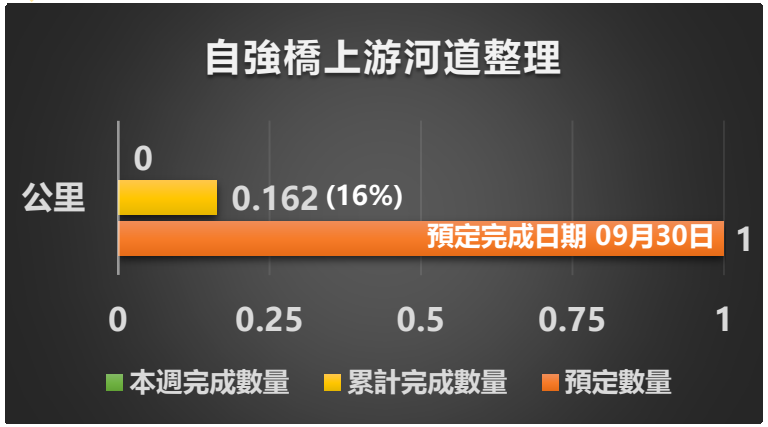

各區空拍現況

第一區
200公頃

第二區
58號越堤路

第三區
自橋大橋下游

第四區
高鐵橋下游疏濬作業

第五區
西螺大橋上游

110年辦理情形：抑制面積及進度

水覆蓋

達成率 %

KPI	已完成
400 公頃	公頃

河道整理

達成率 25%

KPI	已完成
2.5 公里	0.622公里

綠覆蓋

達成率 %

KPI	已完成
50 公頃	公頃

其他覆蓋

達成率 19.6%

KPI	已完成
450公頃	88.3公頃

防洪植栽

達成率 15%

KPI	已完成
4 公里	0.6公里

揚塵抑制措施

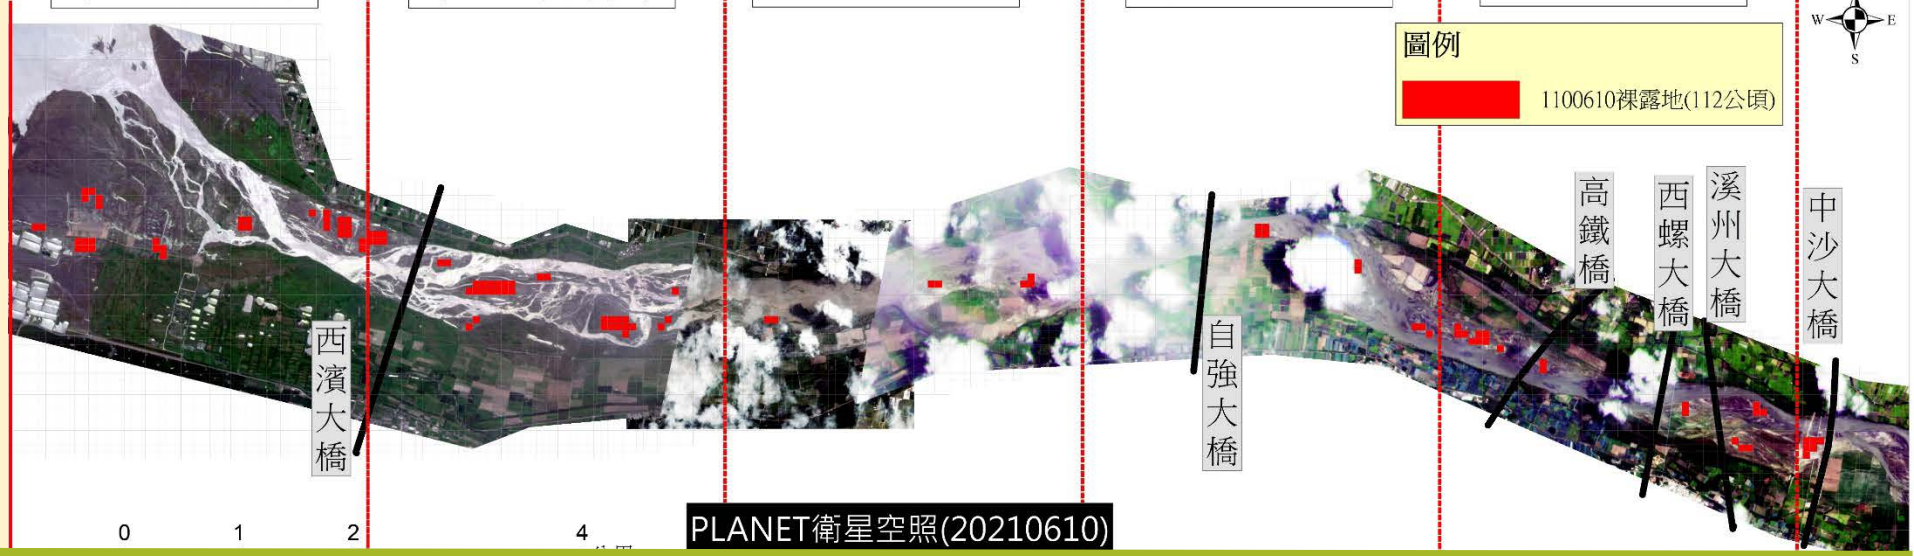

水覆蓋				
河道整理		1) 河道整理培厚0.46公里	1) 河道整理0.162公里	
綠覆蓋	1) 防洪林帶0.6公里			
其他覆蓋	1) 稻草蓆鋪設86.5公頃 2) 簡易灑水設施0.9公頃 3) 碎石級配0.9公頃			
