揚塵防治 週報表

112/01/23~112/01/29

各區揚塵緊急應變措施

1/24日發布揚塵警報

水線系統　灑水車　高揚程泵浦

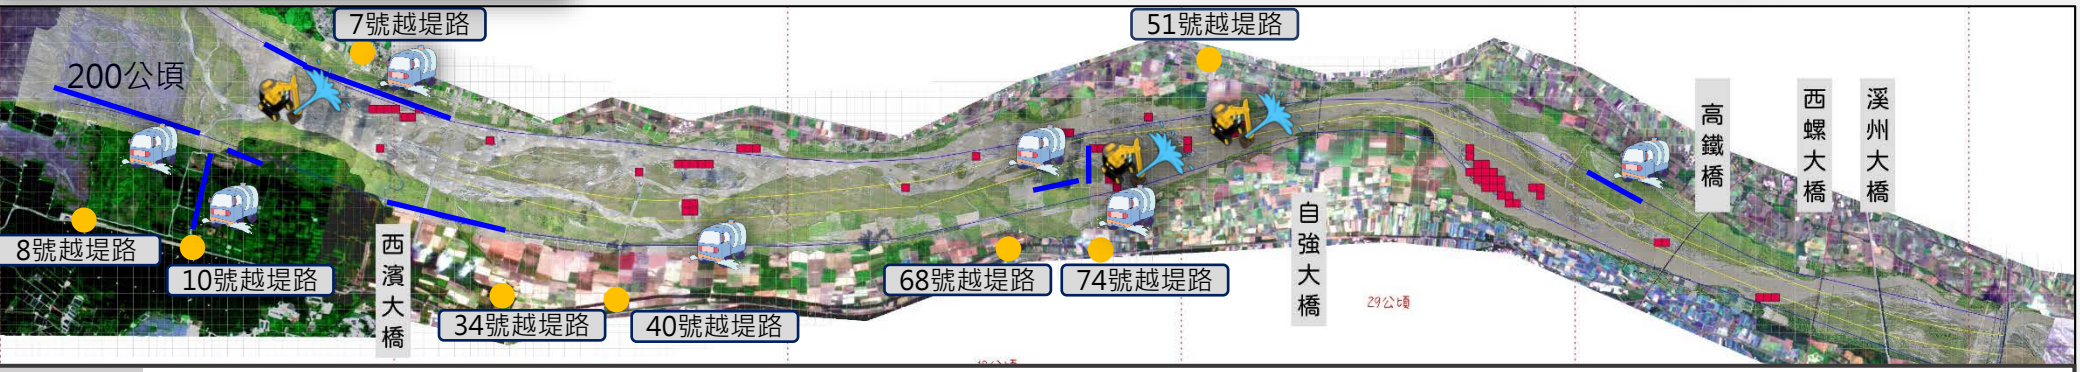

第一區

1. 7 號越堤段培厚植栽區水線噴灑(裕昇營造)
2. 7 號越堤段堤前便道灑水車1 台灑水(裕昇營造)
3. 7 號越堤段低灘地高揚程泵浦1 台噴水(裕昇營造)
4. 7 號越堤段低灘地增派挖土機1 台灑水(裕昇營造)
5. 200 公頃大沙洲水線噴灑(大吉昌營造)
6. 200 公頃大沙洲與20公頃大沙丘灑水車12台灑水(大吉昌營造)
6. 20公頃大沙丘水線噴灑(大吉昌營造)
7. 16號越堤段培厚區水線噴灑(裕昇營造)

第二區

1. 34 號越堤段培厚植栽區水線噴灑(裕昇營造)
2. 40號至68號越堤段堤前便道灑水車1台灑水(裕昇營造)

第三區

1. 74 號越堤段堤前便道灑水車3 台灑水(福興營造)
2. 74 號越堤段低灘地高揚程泵浦1 台噴水(益揚營造)
3. 74 號越堤段低灘地增派挖土機1台灑水(益揚營造)
4. 74號越堤段培厚區水線噴灑(裕昇營造)

第四區

1. 51號越堤段低灘地高揚程泵浦1 台噴水(益揚營造)
2. 高鐵橋下游北岸疏濬培厚灘地便道灑水車1 台灑水(益揚營造)
3. 高鐵橋下游北岸防洪林帶區水線噴灑(益揚營造)

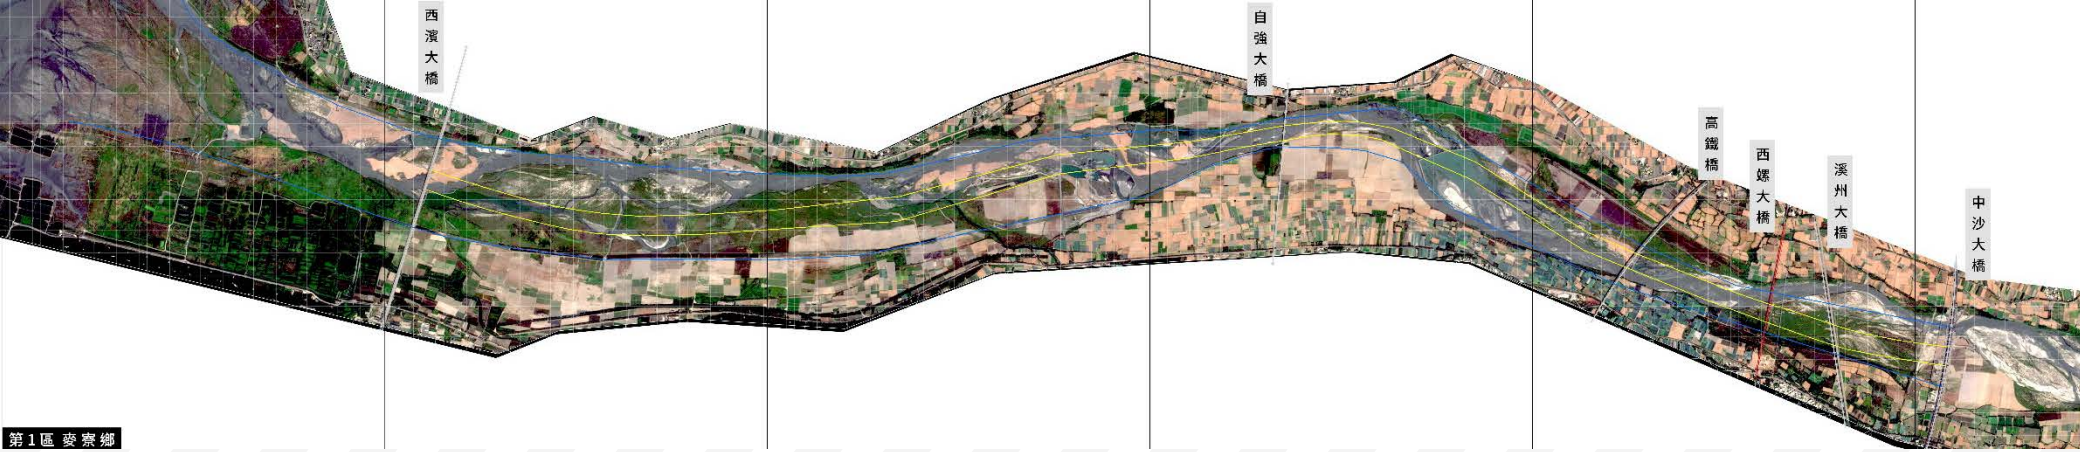

本週無施工

各區空拍現況

第一區
出海口 0號井

第二區
西濱大橋上游

第三區
大義崙排水上游

第四區
94號越堤段下游

第五區
高鐵橋下游

111年度
揚塵KPI進度管制

執行期程:111年5月至112年4月

- 抑制面積
- 進度

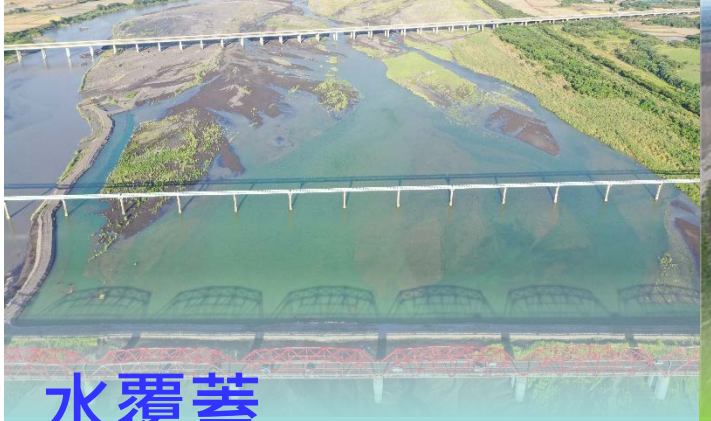

水覆蓋

- 目標值 : 400 公頃
- 已完成 : 470 公頃
- 達成率 : 117.5 %

防洪植栽

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 7.4 公里
- 達成率 : 185 %

其他覆蓋

- 目標值 : 450 公頃
- 已完成 : 321.3 公頃
- 達成率 : 71.4 %

河道整理

- 目標值 : 2.5 公里
- 已完成 : 2.76公里
- 達成率 : 110.4 %

綠覆蓋

- 目標值 : 50 公頃
- 已完成 : 265 公頃
- 達成率 : 530 %

營造複式斷面規劃圖

複式斷面	年度	107-109	110	111	112	合計
	KPI(公里)	8	2	6	4	20
	實際完成	8	2.13	6.05	-	16.18

- **112年營造複式斷面進度管控**

KPI　/ 4公里
已完成 / 0km
達成率/ 0%

➢ 執行進度說明：

預計於112年2月下旬召開局內工作進度檢討會議，並依會議結論規劃本(112)年度複式斷面項目進場期程。

水防道路植栽規劃圖

水防道路植栽	年度	110	111	112	113	114	115	合計
	KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
	實際完成	1	2.3	-	-	-	-	3.3

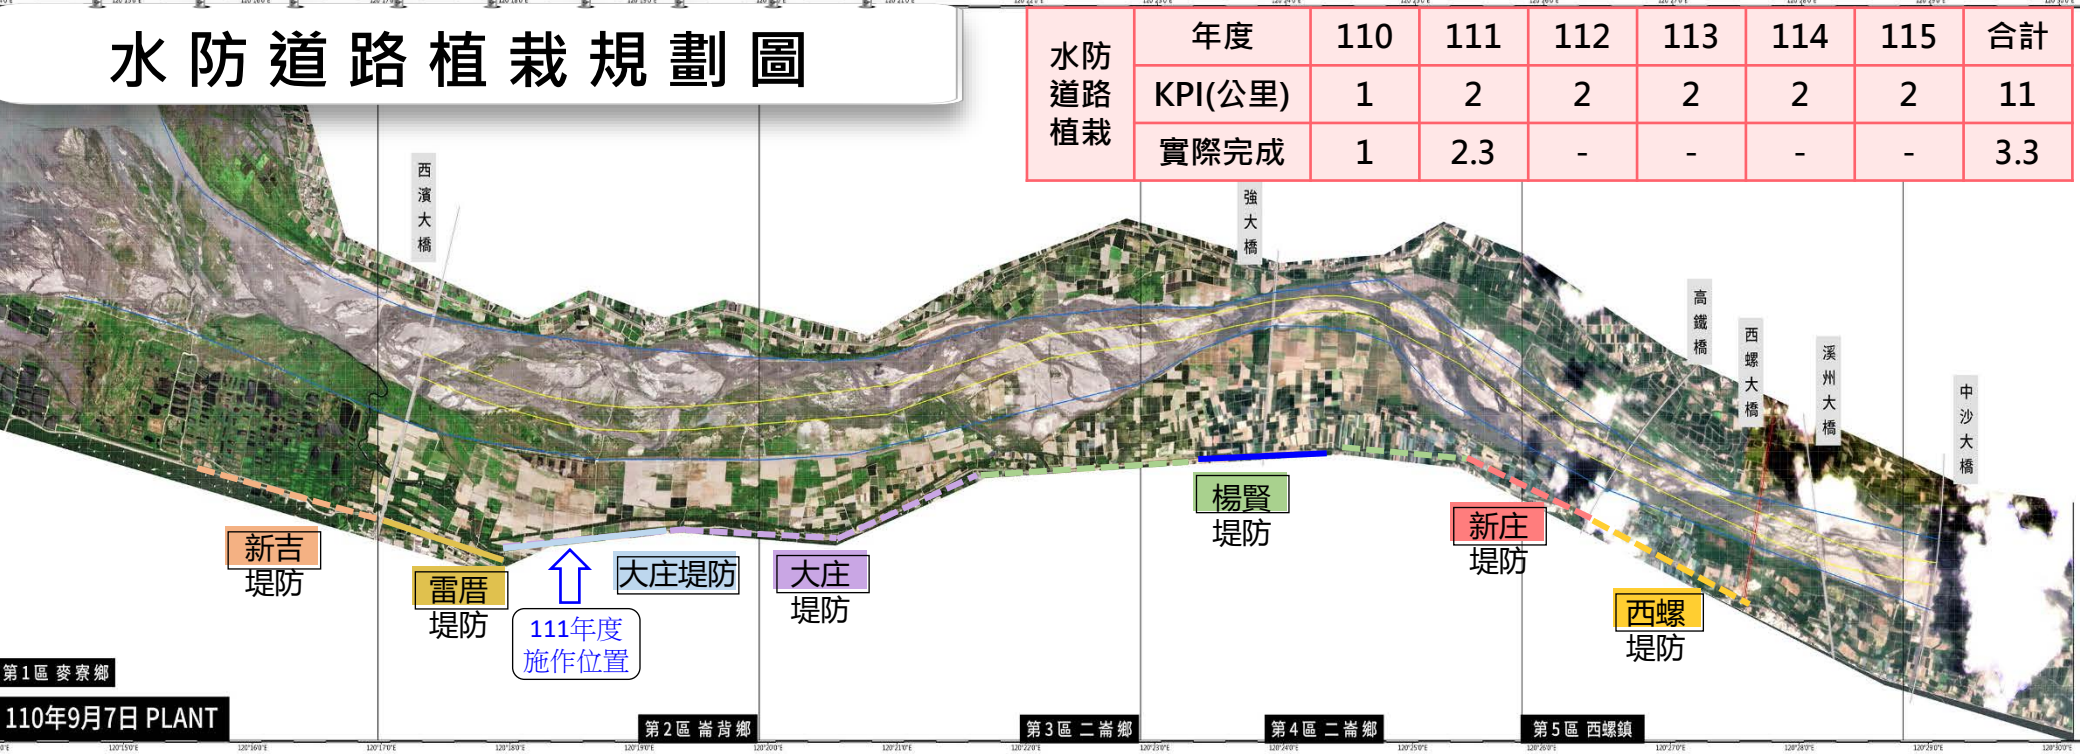

- **112年水防道路植栽進度管控**

KPI　/ 2公里
已完成 / 0公里
達成率/ 0%

➢ 執行進度說明：

預計於112年2月下旬召開局內工作進度檢討會議，並依會議結論規劃本(112)年度水防道路植栽項目進場期程。

揚塵抑制措施

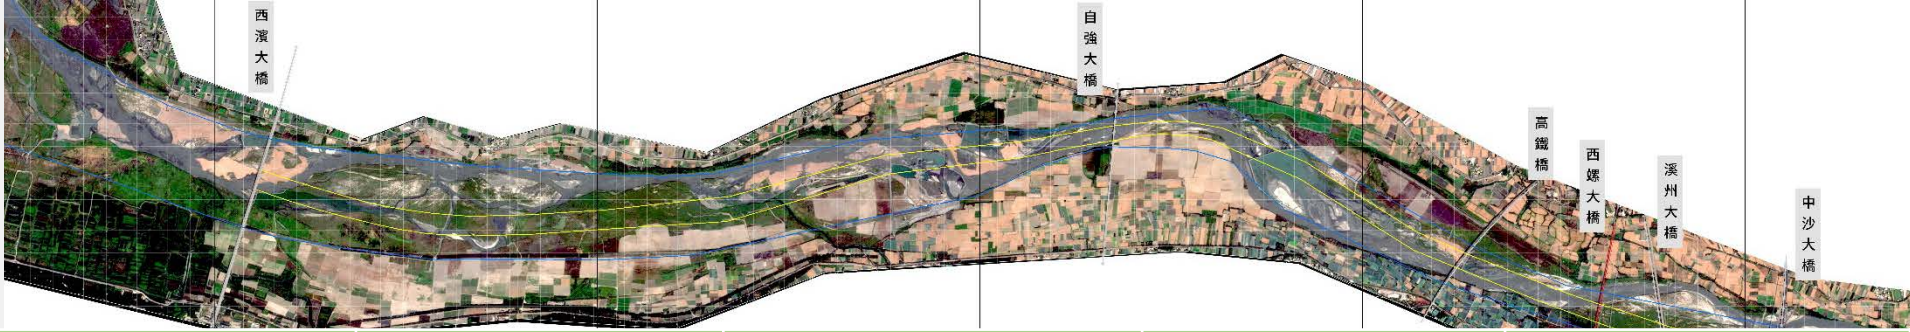

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
	1) 西濱下游北岸 _ 50公頃 2) 西濱大橋上游南岸_180公頃	1) 跨河電塔下游南岸_30公頃	1)51號越堤段A_20公頃 2)51號越堤段B_60公頃 3)94號越堤段_100公頃	1) 高鐵橋上游北岸_30公頃
河道整理	**河道整理**	**河道整理**	**河道整理**	**河道整理**
	1) 河道整理0.56公里	1) 河道整理1.4公里 2) 74號越堤段0.8公里		
綠覆蓋	**綠覆蓋**	**綠覆蓋**	**綠覆蓋**	**綠覆蓋**
1) 西濱下游北岸_地面綠化_4公頃 2) 西濱下游至200公頃河中灘地_空灑草籽_80公頃	1) 西濱上南岸_地面綠化_2公頃	1) 51號越堤段下游北岸至74號越堤段下游南岸_空灑草籽55公頃	1) 高鐵下游北岸疏濬暫置區_地面綠化3公頃 2) 自強大橋上游_空灑草籽50公頃 3) 高鐵下游北岸至51號越堤段上游北岸_空灑草籽20公頃	1) 西螺大橋下游_空灑草籽25公頃 2) 西螺大橋下游北岸至高鐵下游北岸_空灑草籽26公頃
防洪植栽	**防洪植栽**	**防洪植栽**	**防洪植栽**	**防洪植栽**
1) 西濱下北岸_植栽_1.45公里	1) 大庄堤防堤段水防道路側植樹1.3公里 2) 西濱上南岸_植栽_1.8公里	1) 74號越堤段下游A_複式斷面植栽0.6公里 2) 74號越堤至跨河電塔_植栽_0.85公里 3) 74號越堤段下游B_複式斷面植栽0.8公里	1) 高鐵下游北岸疏濬暫置區_防洪林帶0.6公里	
其他覆蓋	**其他覆蓋**	**其他覆蓋**	**其他覆蓋**	**其他覆蓋**
1) 22號井旁_防塵網7公頃 2) 西濱下北岸_水線10.5公頃 3) 20公頃_水線0.8公頃 4) 西濱下南岸_水線7.4公頃 5) 西濱下北岸(增設)_水線1.5公頃 6) 200公頃大沙洲維護便道_碎石級配_1公頃 7) 站體6號至12號北側灘地_防塵網_10公頃 8) 200公頃大沙洲東北側低灘地_稻草蓆_14公頃 9) 9號越堤段河道灘地 _稻草蓆_25公頃 10)10號越堤路便道_簡易灑水線0.9公頃 11)西濱大橋橋下灘地_稻草蓆31.3公頃 12)7號越堤段河道灘地_防塵網5公頃 13)站體13號至18號水井灘地_防塵網11公頃	1) 下山腳堤防27號越堤段A_稻草蓆2公頃 2) 下山腳堤防27號越堤段B_稻草蓆5公頃 3) 下山腳堤防27號越堤段C_稻草蓆4公頃 4) 40號越堤段便道_碎石級配0.9公頃 5) 西濱大橋下方_稻草蓆_13公頃 6) 44號越堤段上游河道灘地_防塵網4公頃	1) 74號越堤段上游南岸_稻草蓆8公頃 2) 74號越堤段下游南岸_稻草蓆12公頃 3) 74號越堤段複式斷面A_簡易灑水線 _ 6公頃 4) 74號越堤段上游南岸B_稻草蓆9公頃 5) 大義崙上游_稻草蓆18公頃 6) 51號越堤段跨河電塔下北岸_稻草蓆_14公頃 7) 跨河電塔北岸下游_稻草蓆_4公頃 8) 74號越堤上游至跨河電塔_簡易灑水線6.8公頃 9) 大義崙上游至74號越堤_簡易灑水設施5.2公頃 10)跨河電塔上游南岸低灘地_稻草蓆8公頃	1)高鐵橋下游北岸_水線4.2公頃 2)高鐵下游北岸疏濬暫置區_稻草蓆_3公頃 3)61號越堤段北岸_防塵網6公頃 4)51號越堤段上游河道灘地(A+B)_稻草蓆11公頃 5)51號越堤段上游北岸低灘地(C)_稻草蓆4公頃	1)高鐵橋上游北岸_稻草蓆10公頃 2)高鐵橋下游北岸_稻草蓆7公頃 3)西螺大橋下游北岸_稻草蓆9公頃 4)中沙大橋上游低灘地_稻草蓆17.8公頃 5)西螺大橋下游北岸_稻草蓆4公頃
