參 品質查證

施工抽查作業-現場抽查情形

[以刷毛步道工程施工抽查作業為例]

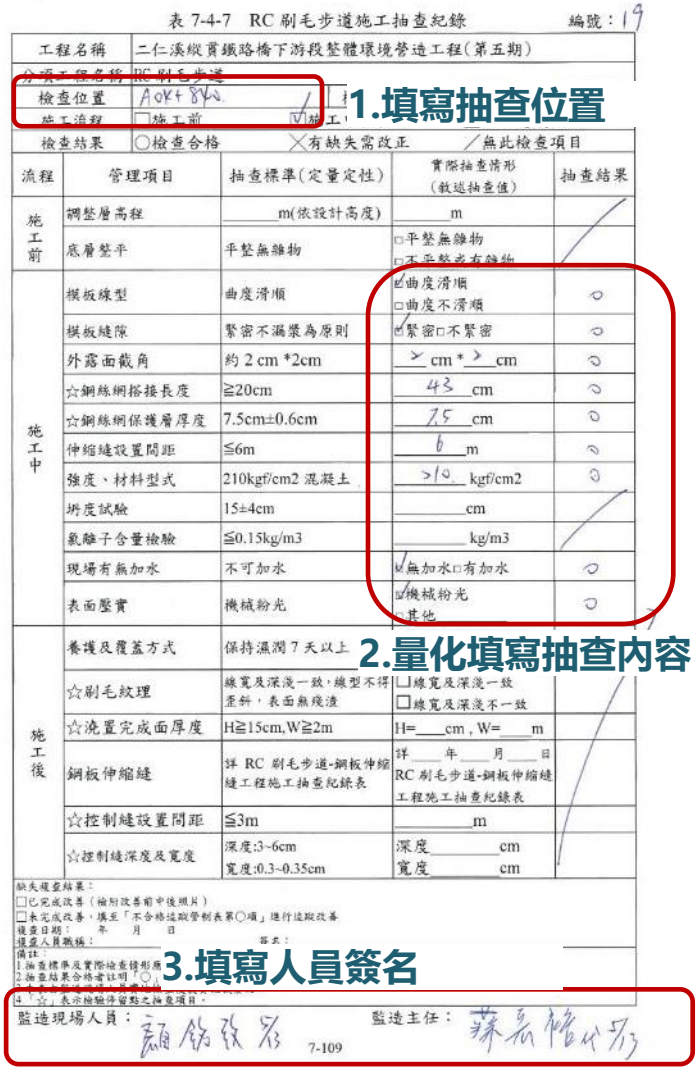

表 7-4-7 RC 刷毛步道施工抽查紀錄 編號：19

工程名稱	二仁溪縱貫鐵路橋下游段整體環境營造工程(第五期)			
分項工程名稱	RC 刷毛步道			
檢查位置	A0K+8K			
施工流程	□施工前	☑施工		
檢查結果	○檢查合格	×有缺失需改正	／無此檢查項目	
流程	管理項目	抽查標準(定量定性)	實際抽查情形(敘述抽查值)	抽查結果
施工前	調整層高程	____m(依設計高度)	____m	／
	底層整平	平整無雜物	□平整無雜物 □不平整或有雜物	／
施工中	模板線型	曲度滑順	☑曲度滑順 □曲度不滑順	○
	模板縫隙	緊密不漏漿為原則	☑緊密□不緊密	○
	外露面截角	約 2 cm *2cm	＞cm * ＞cm	○
	☆鋼絲網搭接長度	≧20cm	43 cm	○
	☆鋼絲網保護層厚度	7.5cm±0.6cm	7.5 cm	○
	伸縮縫設置間距	≦6m	6 m	○
	強度、材料型式	210kgf/cm2 混凝土	＞10 kgf/cm2	○
	坍度試驗	15±4cm	____cm	／
	氯離子含量檢驗	≦0.15kg/m3	____kg/m3	／
	現場有無加水	不可加水	☑無加水□有加水	○
	表面壓實	機械粉光	☑機械粉光 □其他	○
施工後	養護及覆蓋方式	保持濕潤 7 天以上		／
	☆刷毛紋理	線寬及深淺一致，線型不得歪斜，表面無殘渣	□線寬及深淺一致 □線寬及深淺不一致	／
	☆澆置完成面厚度	H≧15cm,W≧2m	H=____cm，W=____m	／
	鋼板伸縮縫	詳 RC 刷毛步道-鋼板伸縮縫工程施工抽查紀錄表	詳____年____月____日 RC 刷毛步道-鋼板伸縮縫工程施工抽查紀錄表	／
	☆控制縫設置間距	≦3m	____m	／
	☆控制縫深度及寬度	深度:3~6cm 寬度:0.3~0.35cm	深度____cm 寬度____cm	／

缺失複查結果：
□已完成改善（檢附改善前中後照片）
□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善
複查日期： 年 月 日
複查人員職稱： 簽名：
備註：
1.抽查標準及實際抽查情形原
2.抽查結果合格請註明「○」
4.「☆」表示檢驗停留點之抽查項目。

監造現場人員： 顏銘發 監造主任： 蘇嘉偉

7-109

1.填寫抽查位置

2.量化填寫抽查內容
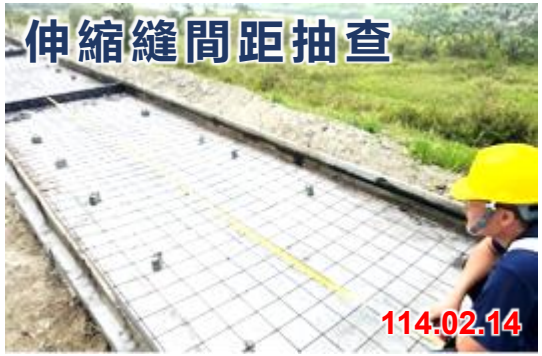
3.填寫人員簽名
