107年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析
-環境監測季報告-
(107年7月至107年9月)
定稿

委託機關：經濟部水利署中區水資源局

執行單位：艾奕康工程顧問股份有限公司

中 華 民 國 107 年 11月

107年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析

-環境監測季報告-(107年7月至107年9月)(定稿)

中華民國107年11月

廉潔、效能、便民

經濟部水利署中區水資源局
地址：台中市霧峰區峰堤路195號
總機：(04)23320579
傳真：(04)23320484

檔　　號：
保存年限：

經濟部水利署中區水資源局　函

地址：41351臺中市霧峰區吉峰里峰堤路195號
聯 絡 人：許涵硯
聯絡電話：05-5261977　#121
電子信箱：yafajoy@wracb.gov.tw
傳　真：　05-5267386

受文者：艾奕康工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國107年11月19日
發文字號：水中湖字第10733053030號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

AECOM Taiwan 收文章
收文日期：107.11.19　附件簽收：
收文流水號：R00622551　□轉發高雄
計畫案號：60563405

主旨：所送「107年度湖山水庫營運階段環境監測及檢討分析」環境監測第3季季報告修訂稿，備查，請按契約規定提送定稿本至本局憑辦，請查照。

說明：復貴公司107年11月9日艾奕康北環字第1071109005號 函。

正本：艾奕康工程顧問股份有限公司
副本：電2018-11-19 交12:25:33章

摘 要

摘要

一、空氣品質

(一)固定測站

本季於棋山國小、梅林國小、引水隧道出口處(庫區端)、引水隧道入口處(桶頭端)、桶頭國小、瑞竹國小、玉當山進行 24 小時空氣品質監測，本季各測站除桶頭國小之 O_3 8 小時有超標之情形，其於測站均符合空氣品質標準。另於環差中承諾玉當山測站之總懸浮微粒(TSP)測值部分，本季之玉當山測值可符合環差承諾(承諾值 202μg/m^3)。

(二)移動測站

1. 24 小時監測值

本季於樣仔坑回春寺、北勢坑溪民宅及第一取出水工等測站進行 24 小時空氣品質監測。監測成果顯示，除 8 月北勢坑溪民宅之 O_3 8 小時有超標之情形，其餘測值均符合空氣品質標準。

2. 1 小時監測值

本季於工區上下風處進行 1 小時空氣品質監測，監測成果均符合相關空品標準。

3.即時監測值

本季 PM_{10} 測值介於 10～114μg/m^3 之間、$PM_{2.5}$ 測值則介於 5.5～70.4μg/m^3 之間。

二、噪音振動

本季已於玉當山、引水隧道入口(桶頭端)、引水隧道出口(庫區端)、棋山國小、桶頭國小、梅林國小及瑞竹國小進行 24 小時噪音振動監測。監測成果顯示，噪音於引水隧道入口(桶頭端)夜間時段(超標比例為 28%)、引水隧道出口(庫區端)全日時段(日晚夜超標比例分別為 32%、56%及 56%)、瑞竹國小夜間時段(超標比例為 30%)及玉當山全日時段(日晚夜超標比例分別為 29%、21%及 38%)有超過環境音量標準，超標成因與當季環境狀況(主要為水流聲及蟲鳴聲)及鄰近居民活動有關，其餘測站均可符合環境音量標準。振動方面，本季各測站日間及夜間振動位準均低於日本振動規制法施行規則之參考基準，亦低於人體可感受閾值(55dB)。

本季營建噪音均符合噪音管制標準，振動測值均符合日本噪音振動規制法施行細則之建設作業參考基準。

三、水質水量

(一)河川水質

本季於梅林溪流域 5 測站(北勢坑溪上游、土地公坑溪上游、南勢坑溪上游 2 處、梅林溪壩址下游測站)及清水溪流域 6 測站(全仔社橋、社興橋、鹿窟三號橋、瑞草橋及桶頭攔河堰上、下游測站)進行監測。

本季懸浮固體於南勢坑溪之2測站及清水溪流域之6測站有超標情形，其中清水溪流域於草嶺地區上游之3測站，歷年超標比例介於 32.0~48.0%之間，草嶺地區下游至桶頭地區 3 測站之歷年超標比例則介於 64.0~80.0%之間，顯示後者流域之懸浮固體易有超標情況發生。另在總磷則於南勢坑溪上游引水隧道出口上、下游、梅林溪壩址下游、全仔社橋、社興橋、鹿窟三號橋、瑞草橋、桶頭吊橋及桶頭橋有超標情，歷次超標比例為：15.5%、45.5%、41.2%、28.0%、52.0%、36.0%、28.0%、44.5%及 41.3%。

而梅林溪流域及清水溪流域均屬乙類水體，其懸浮固體及總磷水質標準分別為 25mg/L 及 0.05mg/L。本季梅林溪流域及清水溪流域均有測站之懸浮固體及總磷未符合標準，由於本季監測時序(7~9月)屬夏季，午後對流旺盛常有降雨發生，且檢視採樣前地區之雨量觀測站，均於採樣前幾日有午後降雨紀錄，因此本季受降雨沖刷導致懸浮固體測值升高，另由於流域周邊(尤以清水溪流域更為明顯)亦有許多農業行為，易於降雨期間受雨水沖刷而將非點源污染沖刷至水體中，因此造成總磷亦同時有升高情況發生。

另本季南勢坑溪上游(引水隧道出口下游)之 9 月生化需氧量(2.9mg/L)略有超過乙類水體水質標準(2.0mg/L)，檢視歷次監測結果，雖曾有超過法規情況發生，惟近期測值均能符合法規標準，推測本次應屬偶發事件，後續將會持續觀察測值變動情形。

(二)工地水質水量

工地水質監測項目包含水溫、pH、溶氧量、生化需氧量、化學需氧量、懸浮固體、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、凱氏氮、總氮、氨氮、總磷、油脂、真色色度、流量。而本季工地現場除綠美化工程(第二期)外均已完工，惟綠美化工程無放流水產生，故無法執行工地水質水量之監測。

(三)地面水質

本季於水庫水質 2 測站(湖山壩址及湖南壩址)及河川水質 2 測站(梅林溪(壩址下游)及桶頭攔河堰上游(桶頭吊橋))進行監測，除桶頭攔河堰上游(桶頭吊橋)之大腸桿菌群略有高於飲用水水源水質標準外，其餘測站測值均能符合保護人體健康基準及飲用水水源

水質標準，由於上述測站屬本計畫之上游水質背景測站，且河道兩旁仍有民宅，因此可能會受到生活污水排入之影響。另比對環保署水質測站(桶頭攔河堰)測值，其近期測值介於<10~2.7x10^{4}CFU/100mL，亦有部分測值超過法規標準，顯示上游水質有受沿線居民活動影響之虞。

另本計畫團隊於107第2季開始增作透明度檢測，並參照環保署用於評估水庫水質優養程度的指標「卡爾森指數，Carlson trophic state index(CTSI)」，進行庫區水質評定，經計算本季湖山壩址CTSI指標值為48.06，而湖南壩址CTSI指標值為52.30，水庫優氧化程度介於普養~優養狀態(CTSI<40為貧養狀態，40≦CTSI≦50為普養狀態，CTSI>50則為優養狀態)。

四、交通量

本季路段監測於雲214鄉道(雲55鄉道交會口至玉當山段)、149縣道(投52鄉道交會口至158甲縣道交會口)及材料運輸道路(台3省道交會口至光復路)進行車流量及行車速率之監測；而路口監測則於台3省道與雲214鄉道路口、台3省道與149縣道路口、台3省道與雲55鄉道路口及台3省道與雲67-1路口進行路口延滯及車輛類型監測。

由監測結果顯示，各路段及路口之晨、昏峰之道路服務水準僅雲214縣道為C級，屬尚可情形，其餘路段及路口皆介於A~B級，道路交通狀況良好，與過往相較並無異常。

五、水域生物

(一)河川水域生物

清水溪部份：本季由於水域面積、水流量與水流速都明顯增加，使得水體較為混濁，以致魚類與底棲生物(水生昆蟲與蝦蟹螺貝類)皆較為減少。浮游植物與附著性藻類則呈現穩定狀態，但因水流量與水流速都明顯增加的緣故，故清水溪三處測站皆未監測到浮游動物。此外，桶頭吊橋測站雖監測到保育類的埔里中華爬岩鰍，其數量則與上一季(107年第2季)相比略微減少，而桶頭橋下游測站本季則未監測到埔里中華爬岩鰍。三處測站9月蜻蜓的數量為歷年監測以來最多的一次。三處測站各項生物指數計算結果大致介於輕度至中度污染之間。

雷公坑溪部份：本季雷公坑溪上游測站之棲地環境穩定，但由於水域面積與水流量都明顯增加，因此魚類、浮游植物與浮游動物的種數或數量略微減少。然而，本季蜻蜓的種數與數量為歷年監測以來較少的一季，僅監測1種3隻次，以往可監測約5~8種數，10~20隻次，由於棲地環境呈現穩定無變動的狀態，推估僅為數量上自然的變動，後續將持續監測種數與數量的變化。其他各項水生生物的

種數或數量大致都呈現穩定的狀態。本季雷公坑溪下游測站由於恢復為有水的狀態，各項水生生物的種數與數量呈現穩定的狀態。由各項生物指數計算結果可知，雷公坑溪兩處測站大至為輕度至中度污染之間。

梅林溪部份：本季五河局於梅南橋測站之河道景觀工程已完工，並且恢復為有水的狀態，但由於棲地環境已經出現明顯改變，故本季監測到魚類的種數與數量都較為減少，水生昆蟲群聚組成也已有明顯的差異，其他水生生物(如蝦蟹螺貝類、浮游植物、附著性藻類與浮游動物)多維持穩定的狀態。後續將持續監測追蹤棲地環境之變動對水生生物所造成的影響。

(二)水庫區水域生物

本季湖南(第一)取出水工及湖山(第二)取出水工附近測站之水位，與較上一季(107 年第 2 季)相比，有升高趨勢；其兩處測站監測到的魚類有 2 種臺灣特有種(臺灣鬚鱲與粗首馬口鱲)，外來種魚類仍以尼羅口孵非鯽為主。另外，湖山(第二)取出水工附近測站首次以原生種(粗首馬口鱲)為優勢種，湖南(第一)取出水工附近測站無優勢種。2 處測站之水生昆蟲的科數與數量仍舊較為偏少，蝦蟹螺貝類種數與數量也都維持穩定的狀態。浮游植物方面，2 處測站的種數都是歷次監測以來最多的一季，藻類優養指數(ATSI)分別為中養與優養的狀態，而隱鞭藻的數量較上一季明顯減少，顯示水質優養化的現象有明顯好轉，但仍須留意水質變化情形。本季附著性藻類種數與數量與歷次結果相比大致維持穩定的狀態，而 GI 與 SI 的計算結果也都為輕度至中度污染之間。浮游動物方面，水庫區內 2 處測站的種數與數量與歷年相比大致穩定的狀態。本季蜻蜓的種數與數量呈現較為稀少的狀態。

本季引水隧道出口附近測站監測到的魚類皆為臺灣特有種魚類(臺灣鬚鱲、明潭吻鰕虎、短吻紅斑吻鰕虎)；水生昆蟲的科數與數量則維持穩定；蝦蟹螺貝類種數雖維持穩定，惟數量是歷次監測最少的一季，應是受到引水時水流量較大所致；浮游植物與附著性藻類呈現穩定的狀態，且 GI 與 SI 的計算結果皆為輕度至中度污染的狀態；本季未監測到浮游動物，由於該測站的浮游動物原本就屬稀少，推估應是引水時水流量大且流速快所導致；蜻蜓的種數與數量也大致維持穩定。

(三)魚道效益評估

本季魚道共監測到 4 科 10 種 137 隻次魚類，蝦蟹類則有 1 科 2 種 45 隻次。桶頭攔河堰魚道監測中，單向籠未監測到魚類或蝦蟹類，僅電氣法監測到臺灣白甲魚、臺灣石魚賓、何氏棘魞、臺灣間爬岩鰍與埔里中華爬岩鰍，係所有測站中監測到最多爬岩鰍的測站。上季首次在魚道中監測到棲地未受阻隔的重要指標物種—「臺灣白甲魚」本季亦持續發現該魚種。本季固床工魚道也監測到埔里

中華爬岩鰍，但僅有 1 隻次。值得注意的是，固床工上方及固床工下方監測到的豐度有漸減的趨勢，由於目前現有資料仍不足以解釋其現況，後續將持續監測以確認其變化情形。本季桶頭攔河堰魚道上方測站、桶頭攔河堰魚道下方測站、桶頭固床工上方測站及桶頭固床工下方測站相似度均介於 42.5%~68.9%之間。以歷次監測的資料分析，清水溪的棲地環境若能維持穩定，四處測站(桶頭攔河堰上方與下方測站、桶頭固床工上方與下方測站)的物種組成相似度應可維持在 50%以上，顯示具有魚道的桶頭攔河堰及固床工，對於水生生物並無太大的縱向性阻隔。

六、陸域動物

水庫集水區部分：本季鳥類數量為歷年同季最高，整體來看，物種數及數量有逐漸增加趨勢。檢視資料，於近幾年種數及數量均較 99 年度前增加，可能與水庫集水區近幾年擾動減少，環境較穩定，較適宜鳥類活動；本季哺乳類種類為歷年同季最高，檢視物種組成，因監測到較多隱蔽性物種所致。但由於監測路線曾變更，物種組成略有改變；兩棲類種數與去年同季相同為歷年同較最高，且主要優勢物種亦無太大變化；爬蟲類尚在波動範圍內，無明顯差異，且主要優勢物種亦無太大變化；蝴蝶類尚在波動範圍內，數量雖有持續回升，但仍不及 102 年第 4 季之前之數量。本季監測共記錄 5 種珍貴稀有保育類(臺灣獼猴、松雀鷹、大冠鷲、領角鴞、黃嘴角鴞)，保育類物種及棲地環境尚屬穩定。

引水工程區部分:本季鳥類物種數及數量均在歷年波動範圍內，並無明顯異常，後續尚需再持續觀察及比對；哺乳類物種數及數量均於歷季波動範圍內，目前工程均已施工完畢，但物種及數量尚未回復，另外，107 年第 1 季監測時於引水工程區測站 1、2 有記錄明顯的人為整地，造成動物稍遠離，雖至目前為止未再進行工程，但現地仍以裸地為主，漸有草本植物生長，將持續監測；兩棲類種數穩定，歷年同季數量有逐漸下降趨勢，除番婆夾坑溪於過往曾有較大變動，且並無明顯恢復外，近期可能因 107 年第 1 季於引水工程區測站 1、2 有明顯的人為整地，而本區域測站多屬水量不穩區域，尤其番婆夾坑溪除豐水期有少量水流外，其餘季次多為乾涸，因土石不穩常有波動造成兩棲類較不適應，應與環境擾動後，適宜的棲地仍少有關；爬蟲類種數及數量尚在歷季波動範圍內，歷年同季數量略有下降，可能因 107 年第 1 季監測時於引水工程區測站 1、2 有記錄明顯的人為整地，測站 3 土石不穩常有波動造成爬蟲類較不適應，應與環境擾動後，適宜的棲地仍少有關；蝴蝶類種類及數量均尚在歷年同季波動範圍內，歷年同季數量有逐漸下降趨勢，本季物種數與數量均於歷季波動範圍內，但物種數與數量中等偏低，可能因 107 年第 1 季監測時於引水工程區測站 1、2 的人為整地尚未恢復有關，另外，引水工程區測站 3 則因土石較不穩常有變動，河床上植物生長不良，造成蝴蝶類較少接近活動。本季監測共記錄 5 種珍貴稀有保育類(臺灣獼

猴、大冠鷲、鳳頭蒼鷹、黃嘴角鴞、領角鴞)，保育類種類以鳥類為主，因部分測站周遭樹林擾動較少，且棲地保持完整，保育類物種種數記錄尚屬穩定。

自然生態保留及復育區部分：本季鳥類數量為歷年同季最高，整體來看，物種數及數量有逐漸增加趨勢，應與環境較穩定，較適宜鳥類活動有關；哺乳類物種數及數量為歷年同季最高，紀錄較多隱蔽性較高之物種(臺灣野豬、長尾鼠耳蝠、絨山蝠)及臺灣獼猴數量較多所致；兩棲類尚屬穩定，主要呈現季節性波動；爬蟲類尚屬穩定，主要呈現季節性波動；蝴蝶類種數及數量均在歷年波動範圍內，並無明顯異常。本季監測共記錄 4 種珍貴稀有保育類(臺灣獼猴、大冠鷲、領角鴞、黃嘴角鴞)，保育類物種及棲地環境尚屬穩定。

七、陸域植物

水庫集水區：幽情谷周圍曾有多數植被因工程期間階段性工作而受到影響，造成物種數明顯減少，後續則無擾動尚屬穩定，草本植被已恢復原有覆蓋情形，其中以五節芒拓殖最為迅速，而受關注的物種－岩生秋海棠與圓葉布勒德藤生長情形亦為良好。監測有記錄環保署「植物生態評估技術規範」所公告環評等級為 3 之臺灣地區稀特有植物圓葉布勒德藤 1 種。

引水工程區：工程開挖裸地已逐漸被植被覆蓋；深挖之溪谷亦逐漸隨著自然崩塌被周圍卵石掩蓋，植被則因地形易坍塌而尚未明顯生長，環境慢慢趨於自然化。另有記錄環保署「植物生態評估技術規範」所公告環評等級為 3 之臺灣地區稀特有植物圓葉布勒德藤 1 種。

自然生態保留及復育區：由於綠美化工程斷續施工，因此以步道兩旁變化較大。106 年第 1 季因為綠美化工程影響而調整的測站 6，目前因無人為擾動生長呈現穩定。另有記錄環保署「植物生態評估技術規範」所公告環評等級為 1 之臺灣地區稀特有植物臺灣羅漢果和為等級 3 之圓葉布勒德藤共 2 種，而臺灣萍蓬草自 107 年第 2 季因缺水無紀錄，本季目前亦無紀錄。本季植物監測到種數(407 種)，為歷年來最高。

另外，本季氣溫高且降雨量較穩定，適宜各種植物生長，因此本季小花蔓澤蘭覆蓋面積較上一季略增，但生長較旺盛的區域仍以引水工程區的番婆夾坑溪、水庫集水區的維修道路旁及部分的自然保留區步道旁為主，目前尚無嚴重危害或大面積覆蓋，但仍應持續注意。

八、監測超過法規標準時之採行對策及成效(異常狀況處理)

1.空氣品質

除 7 月桶頭國小及 8 月北勢坑溪民宅之 O_3 8 小時有超標之情形，其餘均符合標準。經比對鄰近環保署斗六及竹山空品測站，同時段之 O_3 8 小時亦有超標或偏高之情形，判斷大環境影響造成測值超標之原因。

2.環境噪音

除引水隧道入口(桶頭端)、引水隧道出口(庫區端)、玉當山及瑞竹國小外，其餘均可符合環境音量標準。

根據現場紀錄顯示，引水隧道出口(庫區端)之現場環境噪音主要為水流聲；引水隧道入口(桶頭端)及瑞竹國小之現場環境噪音源於夜間主要為蟲鳴聲；玉當山於日間時段之均能音量有超標狀況，主要噪音源為鄰近居民之廟會活動，晚間及夜間則主要為蟲鳴之聲音，判斷此乃造成監測值超標之原因。

3.地面水質

除桶頭攔河堰上游(桶頭吊橋)之大腸桿菌群略有高於飲用水水源水質標準外，其餘測站測值均能符合保護人體健康基準及飲用水水源水質標準，由於上述測站屬本計畫之上游水質測站，因此水質易受上游水質之影響，導致略有偏高情況發生。

4.河川水質

針對本季南勢坑溪上游兩站(引水隧道出口上、下游)與清水溪流域各測站懸浮固體均有超標情況，清水溪流域超標主要因採樣前幾日明顯有降雨情形，且由於清水溪流域地質脆弱，導致受雨水沖刷易使水體懸浮固體測值升高；另引水隧道出口上游水質受降雨影響，懸浮固體亦有升高情況發生，而下游測站水質除持續受上游水質影響外，因該河道亦承接引水道之水源，於採樣期間引水道之上游 (桶頭地區)同時有降雨情形，因此引水道水流明顯偏高(115.2~2022.6 m^3/min)，因此受水流持續沖刷及上游水質影響，導致測值有超標情況發生。由歷次數據顯示，懸浮固體於降雨後常有異常偏高之情形發生。

針對總磷測值常有不符合乙類水體水質標準之情形，分析主要污染來源係為鄰近農田使用之肥料，且降雨後易受雨水沖刷導致磷分溶入水體而被測得。

目錄

目錄

頁　次

湖山水庫工程計畫施工階段環境監測內容辦理情形說明 計-1

環境監測當日施工情形及使用機具情形 工-1

前言 前-1

第一章　監測內容概述 1-1

1.1　工程進度 1-1
1.2　監測情形概述 1-1
1.3　監測計畫概述 1-2
1.4　監測位址 1-2
1.5　品保/品管作業措施概要 1-27

第二章　監測結果數據分析 2-1

2.1　空氣品質 2-1
2.2　噪音振動 2-40
2.3　水質水量 2-54
2.4　交通量 2-102
2.5　水域生物 2-111
2.6　陸域動物 2-188
2.7　陸域植物 2-234

第三章 檢討與建議 3-1

3.1　監測結果檢討與因應對策 3-1
3.2　監測結果異常現象因應對策 3-19

參考文獻 參-1

附錄

附錄一　檢測執行單位之認證資料及技師簽認資料
附錄二　品保/品管查核記錄
附錄三　本季原始數據
附錄四　歷次比較分析表
附錄五　監測作業情形相片記錄
附錄六　監測現地現況照片
附錄七　前次審查意見及辦理情形

表目錄

頁　次

表 1.1-1　本計畫工程預定進度及實際進度彙整.....1-1
表 1.2-1　本季環境監測結果摘要.....1-3
表 1.3-1　湖山水庫工程本季試營運期間環境監測計畫.....1-10
表 1.5-1　樣品保存方法及期限.....1-44
表 1.5-2　採樣作業準則.....1-45
表 1.5-3　採樣至運輸過程中注意事項.....1-46
表 1.5-4　空氣品質分析項目之檢測方法.....1-47
表 1.5-5　噪音監測分析項目之檢測方法.....1-48
表 1.5-6　水質分析項目之檢測方法.....1-49
表 1.5-7　溪流魚類特性表.....1-54
表 1.5-8　IBI 選用矩陣及其評分標準.....1-55
表 1.5-9　IBI 選用矩陣及其評分等級.....1-56
表 1.5-10　水生昆蟲科級生物指標評估法指數表.....1-56
表 1.5-11　河川附著藻類腐水度指數表.....1-58
表 1.5-12　貧養、普養和優養之藻群.....1-59
表 2.1-1　空氣品質監測地點背景資料說明.....2-6
表 2.1-2　本季空氣 $PM_{2.5}$ 及 PM_{10} 即時監測風向對應測站.....2-7
表 2.1-3　本季空氣品質固定測站監測結果表.....2-8
表 2.1-4　本季空氣品質移動測站 24 小時監測結果表.....2-9
表 2.1-5　本季空氣品質移動測站 1 小時監測結果表.....2-10
表 2.1-6　本季空氣 $PM_{2.5}$ 即時測站即時監測結果表.....2-11
表 2.1-7　本季空氣 PM_{10} 即時測站即時監測結果表.....2-17
表 2.2-1　環境噪音振動監測地點背景資料說明.....2-43
表 2.2-2　道路邊地區環境音量標準.....2-44
表 2.2-3　一般地區環境音量標準.....2-44
表 2.2-4　日本振動規制法施行規則之基準值.....2-44
表 2.2-5　本季各測站噪音監測結果.....2-45
表 2.2-6　本季各測站振動監測結果.....2-45
表 2.2-7　本季各測站營建噪音監測結果.....2-46
表 2.2-8　本季各測站營建振動監測結果.....2-46
表 2.3-1　本季河川水質監測結果比較表.....2-63
表 2.3-2　本季地面水質監測結果比較表.....2-65
表 2.4-1　本季各路段交通量監測成果表.....2-105
表 2.4-2　本季各路口交通量監測成果表.....2-106
表 2.5-1　本季水域生物監測時間一覽表－河川.....2-151
表 2.5-2　9 月湖山水庫魚道監測不同方式捕獲之魚類及蝦類.....2-154
表2.5-3　本年度1~2季湖山水庫魚道監測捕獲之魚類及蝦類之數量

.....2-155
表2.6-1　本季水庫集水區陸域動物監測時間一覽表.....2-207
表2.6-2　本季引水道區陸域動物監測時間一覽表.....2-208
表2.6-3　水庫集水區陸域動物測線及測站變更位置後之分析比較表
.....2-209
表2.7-1　本季環境監測計畫生態監測行程表-陸域植物 2-246
表3.2-1　上季監測之異常狀況及處理情形.....3-19
表 3.2-2　本季監測之異常狀況及處理情形.....3-20

圖目錄

頁 次

圖 1.1-1 本計畫工程預定進度及實際進度圖.....1-2
圖 1.4-1 本季湖山水庫工程空氣品質監測測站位置圖(固定測站)...1-15
圖 1.4-2 本季湖山水庫工程空氣品質監測測站位置圖(移動測站)...1-16
圖 1.4-3 本季湖山水庫工程空氣品質監測測站位置圖(即時監測測站)
.....1-17
圖 1.4-4 本季湖山水庫工程噪音振動監測點位置圖.....1-18
圖 1.4-5 本季湖山水庫工程地面水質監測樣區位置圖 1-19
圖 1.4-6 本季湖山水庫工程交通量監測測站位置圖.....1-21
圖 1.4-7 本季生態監測測站位置圖(水域生物).....1-22
圖 1.4-8 本季生態監測測站位置圖(陸域動物-庫區端、湖本對照區)
.....1-23
圖 1.4-9 本季生態監測測站位置圖(陸域動物-攔河堰、引水路).....1-24
圖 1.4-10 本季生態監測測站位置圖(陸域植物-庫區端) 1-25
圖 1.4-11 本季生態監測測站位置圖(陸域植物-攔河堰、引水路)...1-26
圖 1.5-1 採樣作業流程圖 1-28
圖 1.5-2 採樣作業流程 1-42
圖 1.5-3 樣品採集至分析作業流程.....1-43
圖 2.1-1 本季固定測站及移動測站 PM_{10} 及 $PM_{2.5}$ 24 小時值與鄰近環保署測值比對圖 2-23
圖 2.1-2 本季固定及移動-測站 O_3 最大 8 小時值與鄰近環保署測值比對圖.....2-24
圖 2.1-3 歷次空氣品質總懸浮微粒 TSP 24 小時值監測成果圖(固定測站).....2-25
圖 2.1-4 歷次空氣品質 TSP 監測成果圖(移動測站).....2-26
圖 2.1-5 歷次空氣品質懸浮微粒 PM_{10} 日平均值監測成果圖(固定測站)
.....2-27
圖 2.1-6 歷次空氣品質 PM_{10} 監測成果圖(移動測站).....2-28
圖 2.1-7 歷次空氣品質總懸浮微粒 $PM_{2.5}$ 24 小時值監測成果圖(固定測站) 2-29
圖 2.1-8 歷次空氣品質二氧化硫 SO_2 小時平均值監測成果圖(固定測站)
.....2-30
圖 2.1-9 歷次空氣品質 SO_2 監測成果圖(移動測站).....2-31
圖 2.1-10 歷次空氣品質二氧化氮 NO_2 小時平均值監測成果圖(固定測站) 2-32
圖 2.1-11 歷次空氣品質 NO_2 監測成果圖(移動測站) 2-33
圖 2.1-12 歷次空氣品質一氧化碳 CO 平均值監測成果圖(固定測站)
.....2-34

圖 2.1-13 歷次空氣品質 CO 監測成果圖(移動測站) 2-35
圖 2.1-14 歷次空氣品質 THC 最大小時平均值監測成果圖(固定測站) 2-36
圖 2.1-15 歷次空氣品質 THC 監測成果圖(移動測站).....2-37
圖 2.1-16 歷次空氣品質臭氧 O_3 最大 8 小時值監測成果圖(固定測站) 2-38
圖 2.1-17 歷次空氣品質 O_3 監測成果圖(移動測站).....2-39
圖 2.2-1 本季噪音均能音量 $L_{日}$ 比較圖 2-47
圖 2.2-2 本季噪音均能音量 $L_{晚}$ 比較圖.....2-47
圖 2.2-3 本季噪音均能音量 $L_{夜}$ 比較圖.....2-48
圖 2.2-4 本季日間 L_{v10} 振動監測結果比較圖.....2-48
圖 2.2-5 本季夜間 L_{v10} 振動監測結果比較圖.....2-49
圖 2.2-6 各測站歷年噪音監測結果.....2-50
圖 2.2-7 各測站歷年振動監測結果.....2-52
圖 2.3-1 本季河川水質水溫監測結果比較圖.....2-67
圖 2.3-2 本季河川水質 pH 監測結果比較圖 2-67
圖 2.3-3 本季河川水質生化需氧量監測結果比較圖.....2-68
圖 2.3-4 本季河川水質化學需氧量監測結果比較圖.....2-68
圖 2.3-5 本季河川水質溶氧量監測結果比較圖 2-69
圖 2.3-6 本季河川水質懸浮固體監測結果比較圖.....2-69
圖 2.3-7 本季河川水質總磷監測結果比較圖.....2-70
圖 2.3-8 本季河川水質總氮監測結果比較圖.....2-70
圖 2.3-9 本季河川水質油脂監測結果比較圖.....2-71
圖 2.3-10 本季河川水質導電度監測結果比較圖.....2-71
圖 2.3-11 本季河川水質濁度監測結果比較圖.....2-72
圖 2.3-12 本季河川水質流量監測結果比較圖.....2-73
圖 2.3-13 歷年河川水質水溫監測成果.....2-73
圖 2.3-14 歷年河川水質 pH 值監測成果.....2-74
圖 2.3-15 歷年河川水質生化需氧量監測成果.....2-75
圖 2.3-16 歷年河川水質化學需氧量監測成果.....2-76
圖 2.3-17 歷年河川水質溶氧量監測成果.....2-77
圖 2.3-18 歷年河川水質懸浮固體監測成果.....2-78
圖 2.3-19 歷年河川水質總磷監測成果.....2-79
圖 2.3-20 歷年河川水質總氮監測成果.....2-80
圖 2.3-21 歷次工地水質水溫監測結果比較圖.....2-81
圖 2.3-22 歷次工地水質 pH 值監測結果比較圖.....2-81
圖 2.3-23 歷次工地水質溶氧量監測結果比較圖.....2-82
圖 2.3-24 歷次工地水質生化需氧量監測結果比較圖.....2-82
圖 2.3-25 歷次工地水質化學需氧量監測結果比較圖.....2-83
圖 2.3-26 歷次工地水質懸浮固體監測結果比較圖.....2-83

圖 2.3-27 歷次工地水質硝酸鹽氮監測結果比較圖.....2-84
圖 2.3-28 歷次工地水質亞硝酸鹽氮監測結果比較圖.....2-84
圖 2.3-29 歷次工地水質凱氏氮監測結果比較圖.....2-85
圖 2.3-30 歷次工地水質總氮監測結果比較圖.....2-85
圖 2.3-31 歷次工地水質氨氮測結果比較圖.....2-86
圖 2.3-32 歷次工地水質總磷監測結果比較圖.....2-86
圖 2.3-33 歷次地面水質 pH 監測成果比較圖.....2-87
圖 2.3-34 歷次地面水質水溫監測成果比較圖.....2-88
圖 2.3-35 歷次地面水質溶氧監測成果比較圖.....2-89
圖 2.3-36 歷次地面水質生化需氧量監測成果比較圖.....2-90
圖 2.3-37 歷次地面水質化學需氧量監測成果比較圖.....2-91
圖 2.3-38 歷次地面水質大腸桿菌群監測成果比較圖.....2-92
圖 2.3-39 歷次地面水質氨氮監測成果比較圖.....2-93
圖 2.3-40 歷次地面水質懸浮固體監測成果比較圖.....2-94
圖 2.3-41 歷次地面水質總氮監測成果比較圖.....2-95
圖 2.3-42 歷次地面水質總有機碳監測成果比較圖.....2-96
圖 2.3-43 歷次地面水質總磷監測成果比較圖.....2-97
圖 2.3-44 歷次地面水質砷監測成果比較圖.....2-98
圖 2.3-45 歷次地面水質錳監測成果比較圖.....2-99
圖 2.3-46 歷次地面水質鋅監測成果比較圖.....2-100
圖 2.3-47 歷次地面水質葉綠素-a 監測成果比較圖.....2-101
圖 2.4-1 歷年雲 214 鄉道尖峰小時服務水準.....2-107
圖 2.4-2 歷年 149 縣道尖峰小時服務水準.....2-107
圖 2.4-3 歷年材料運輸道路尖峰小時服務水準.....2-108
圖 2.4-4 歷年台 3 省道-雲 55 鄉道路口平均延滯服務水準.....2-108
圖 2.4-5 歷年台 3 省道-149 縣道路口平均延滯服務水準.....2-109
圖 2.4-6 歷年台 3 省道-雲 214 鄉道路口平均延滯服務水準.....2-109
圖 2.4-7 歷年台 3 省道-雲 67-1 鄉道路口平均延滯服務水準.....2-110
圖 2.5-1 歷次魚類監測結果比較.....2-156
圖 2.5-2 歷年同季魚類監測結果比較.....2-158
圖 2.5-3 歷次水生昆蟲監測結果比較.....2-160
圖 2.5-4 歷次同季水生昆蟲監測結果比較.....2-162
圖 2.5-5 歷次蝦蟹螺貝監測結果比較.....2-164
圖 2.5-6 歷次同季蝦蟹螺貝監測結果比較.....2-166
圖 2.5-7 歷次浮游植物監測結果比較.....2-168
圖 2.5-8 歷次同季浮游植物監測結果比較.....2-170
圖 2.5-9 歷次附著性藻類監測結果比較.....2-172
圖 2.5-10 歷次同季附著性藻類監測結果比較.....2-174
圖 2.5-11 歷次浮游動物監測結果比較.....2-176

圖 2.5-12 歷次同季浮游動物監測結果比較.....2-178
圖 2.5-13 歷次蜻蜓類監測結果比較.....2-180
圖 2.5-14 歷次同季蜻蜓類監測結果比較.....2-182
圖 2.5-15 湖山水庫桶頭攔河堰魚道效益評估監測樣點測站 2-184
圖 2.5-16 桶頭攔河堰魚道監測單向籠放置位置及單向籠示意圖 .2-184
圖 2.5-17 107 年 9 月魚道監測現況.....2-185
圖 2.5-18 歷次魚道上方、魚道下方、固床工上方及固床工下方各次監測游泳性魚類與底棲性魚類比例及魚類數量變化 2-186
圖 2.5-19 歷次魚道各樣站之物種組成相似度變化(紅線為豪雨後調查) 2-187
圖 2.6-1 水庫集水區優勢物種圖 2-210
圖 2.6-2 水庫集水區與自然生態保留及復育區陸域動物保育類分布圖 2-211
圖 2.6-3 引水工程區陸域動物保育類分布圖.....2-212
圖 2.6-4 水庫集水區歷年哺乳類監測種數及數量比較分析圖 2-213
圖 2.6-5 水庫集水區歷年兩棲類監測種數及數量比較分析圖 2-213
圖 2.6-6 水庫集水區歷年爬蟲類監測種數及數量比較分析圖 2-214
圖 2.6-7 水庫集水區歷年鳥類監測種數及數量比較分析圖 2-214
圖 2.6-8 水庫集水區歷年蝴蝶類監測種數及數量比較分析圖 2-215
圖 2.6-9 水庫集水區歷年同季哺乳類監測種數及數量比較分析圖2-216
圖 2.6-10 水庫集水區歷年同季兩棲類監測種數及數量比較分析圖 2-216
圖 2.6-11 水庫集水區歷年同季爬蟲類監測種數及數量比較分析圖 2-217
圖 2.6-12 水庫集水區歷年同季鳥類監測種數及數量比較分析圖 .2-217
圖 2.6-13 水庫集水區歷年同季蝴蝶類監測種數及數量比較分析圖 2-218
圖 2.6-14 引水工程區歷年哺乳類監測種數及數量比較分析圖 2-219
圖 2.6-15 引水工程區歷年兩棲類監測種數及數量比較分析圖 2-219
圖 2.6-16 引水工程區歷年爬蟲類監測種數及數量比較分析圖 2-220
圖 2.6-17 引水工程區歷年鳥類監測種數及數量比較分析圖 2-220
圖 2.6-18 引水工程區歷年蝴蝶類監測種數及數量比較分析圖 2-221
圖 2.6-19 引水工程區歷年同季哺乳類監測種數及數量比較分析 .2-222
圖 2.6-20 引水工程區歷年同季兩棲類監測種數及數量比較分析 .2-222
圖 2.6-21 引水工程區歷年同季爬蟲類監測種數及數量比較分析 .2-223
圖 2.6-22 引水工程區歷年同季鳥類監測種數及數量比較分析圖 .2-223
圖 2.6-23 引水工程區歷年同季蝴蝶監測種數及數量比較分析圖 .2-224
圖 2.6-24 自然生態保留及復育區歷年哺乳類監測種數及數量比較分析 2-225
圖 2.6-25 自然生態保留及復育區歷年兩棲類監測種數及數量比較分析

.....2-225
圖 2.6-26 自然生態保留及復育區歷年爬蟲類監測種數及數量比較分析
.....2-226
圖 2.6-27 自然生態保留及復育區歷年鳥類監測種數及數量比較分析圖
.....2-226
圖 2.6-28 自然生態保留及復育區歷年蝴蝶監測種數及數量比較分析圖
.....2-227
圖 2.6-29 自然生態保留及復育區歷年同季哺乳類監測種數及數量比較
分析.....2-228
圖 2.6-30 自然生態保留及復育區歷年同季兩棲類監測種數及數量比較
分析.....2-228
圖 2.6-31 自然生態保留及復育區歷年同季爬蟲類監測種數及數量比較
分析.....2-229
圖 2.6-32 自然生態保留及復育區歷年同季鳥類監測種數及數量比較分
析圖.....2-229
圖 2.6-33 自然生態保留及復育區歷年同季蝴蝶類監測種數及數量比較
分析圖.....2-230
圖 2.6-34 湖山水庫水位升高後陸域生物測站變更(105 年 7 月後)2-231
圖 2.7-1 歷期水庫集水區植物監測結果比較分析圖.....2-247
圖 2.7-2 歷期引水工程區植物監測結果比較分析圖.....2-248
圖 2.7-3 歷期自然生態保留及復育區植物監測結果比較分析圖 ...2-249
圖 3.1-1 本計畫水質測站上游空拍探勘結果.....3-2
圖 3.1-2 本計畫水質測站上游土地利用現況.....3-3
圖 3.1-3 歷年小花蔓澤蘭覆蓋度變化.....3-18

湖山水庫工程計畫施工階段環境監測內容辦理情形說明

湖山水庫工程計畫施工暨營運階段環境監測內容辦理情形說明

類別	環評報告、環調報告及環差報告調查或監測內容			目前監測內容			調整說明
	項目	地點	頻率	監測項目	監測地點	監測頻率	
空氣品質	1.TSP 2.PM_{10} 3.$PM_{2.5}$ 4.SO_2 5.NO_2 6.O_3 7.風向、風速、溫度、溼度	1.玉當山 2.棋山國小 3.桶頭國小 4.梅林國小 5.瑞竹國小 6.引水隧道出入口(桶頭端、隧道端) 7.工區周圍三處(上風一處、下風二處) 8.環球技術學院	・玉當山、棋山國小、桶頭國小、梅林國小、瑞竹國小及引水隧道出入口：施工期間每季一次，每次連續24小時監測。 ・工地周圍為移動測站，每月一次。 ・環球技術學院：下游連接管路聯外道路「完成前」每季一次，每次連續24小時監測。	1.TSP＊ 2.PM_{10}＊ 3.$PM_{2.5}$＊ 4.CO 5.NO_2＊ 6.SO_2＊ 7.O_3＊ 8.THC 9.風向、風速、溫度、溼度＊ 10.PM_{10}、$PM_{2.5}$即時監測＊	一、固定測站： 1.棋山國小＊ 2.梅林國小＊ 3.玉當山＊ 4.桶頭國小＊ 5.瑞竹國小＊ 6.引水隧道入口＊ 7.引水隧道出口＊ 二、移動測站： (一)24hr測站：湖山水庫工地周圍3站。 ・樸仔坑回春寺 ・北勢坑溪民宅 ・第一取出水工 (二)1hr測站：工地周圍3處(上風1處，下風2處)＊ 三、PM_{10}、$PM_{2.5}$即時監測：施工區域下風處不定時、不定點選擇3處測定＊	一、固定測站每季一次 二、移動測站每月一次 三、PM_{10}、$PM_{2.5}$即時監測每日進行	1.環球技術學院測站因應聯外道路完工，故自100年第1季起停止監測。 2.配合本工程第3次環差之規定，故自100年第2季起，新增引水隧道出入口(包含桶頭端及庫區端)2站進行監測。 3.配合本工程第5次環差之規定，自102年第4季起新增部分測站之$PM_{2.5}$監測項目。 4.移動測站中，原幽情谷附近測站配合大壩工區之工進，自104年起改於第一取出水工附近進行監測。
	PM_{10}、$PM_{2.5}$即時監測	工區下風3處	每日進行				
噪音振動	1.噪音： L_{eq}、L_{max}、L_x、$L_{日}$、$L_{晚}$、$L_{夜}$ 2.振動： Lv_{eq}、Lv_{max}、Lv_{10}、Lv_x 3.低頻噪音	1.玉當山 2.棋山國小 3.桶頭國小 4.梅林國小 5.環球技術學院 6.瑞竹國小 7.引水隧道出入口(桶頭端、隧道端)	・玉當山、棋山國小、桶頭國小、梅林國小、瑞竹國小及引水隧道出入口：施工期間每季一次，每次連續24小時。 ・環球技術學院：下游連接管路聯外道路「完成前」每季一次，每次連續24小時監測。 ・梅林國小另於下游連接管路施工期間監測低頻噪音，每季一次。	噪音＊： L_{eq}、L_{max}、L_x、$L_{日}$、$L_{晚}$、$L_{夜}$ 振動＊： Lv_{eq}、Lv_{max}、Lv_{10}、Lv_x	環境噪音振動： 1.棋山國小＊ 2.玉當山＊ 3.梅林國小＊ 4.桶頭國小＊ 5.瑞竹國小＊ 6.引水隧道入口＊ 7.引水隧道出口＊	每季測定一次，每次24小時連續測定	1.環球技術學院測站因應聯外道路完工，故自100年第1季起停止監測。另為掌握本計畫清水溪工區於施工前之背景現況，故亦自100年第1季起新增桶頭吊橋站進行監測。 2.配合本工程第3次環差之規定，故自100年第2季起，新增引水隧道出入口(包含桶頭端及庫區端)2站進行監測。 3.依照本工程第1次環境影響差異分析報告之承諾，自100年第4季起至104年底於梅林國小實施低頻噪音監測。
營建噪音振動	1.噪音： L_{eq}、L_{max} 2.振動： Lv_{eq}、Lv_{max}	工地周圍(三處)	工地噪音每二週一次，尖峰時間視狀況增加監測頻率	噪音＊： L_{eq}、L_{max} 振動＊： Lv_{eq}、Lv_{max}	湖山水庫工地周圍3站＊	每2週一次；每次10分鐘	
工地水質水量	1.工區放流水質 2.隧道放流水質	工區放流水質： 1.原水產生點 2.污水放流口 隧道放流水質： 1.引水隧道入口 2.引水隧道出口	工區放流水每月1次 隧道放流水於引水隧道動工後每季1次	1.流量＊ 2.水溫＊ 3.pH值＊ 4.BOD_5＊ 5.DO＊ 6.SS＊ 7.總磷＊ 8.總氮＊ 9.油脂＊ 10.COD＊ 11.真色色度＊ 12.氨氮＊ 13.大腸菌群＊	工區放流水質： 1.原水產生點(洗車台入流水)＊ 2.工地污水放流口(洗車台出流水)＊ 隧道放流水質： 1.引水隧道入口(桶頭端)放流口＊ 2.引水隧道出口(庫區端)放流口＊	工區放流水質每月一次 隧道放流水質每季一次	隧道放流水質已配合相關工程動工，自101年第2季起執行監測。後自105年起，因引水隧道工程完工，已無隧道工區之排放水，故本監測計畫之隧道放流水已無法監測。 另在工區放流水部分，因106年5、6月二水工工區停工，故暫移至工務所進行相關採樣。

類別	環評報告、環調報告及環差報告調查或監測內容			目前監測內容			調整說明
	項目	地點	頻率	監測項目	監測地點	監測頻率	
	3.暴雨初期逕流水 SS	於沉砂池上、下游進行採樣	施工期間共執行 3 次				已於 101 年第 2 季完成 3 次監測。
河川水質	流量、水溫、pH 值、SS、DO、COD、BOD_5、總氮、總磷、油脂、殘留農藥	1.清水溪桶頭攔河堰上、下游(桶頭吊橋及桶頭橋) 2.土地公坑溪上游、南勢坑溪上游、北勢坑溪 3.梅林溪壩址下游	施工期間 1.每月一次 2.殘留農藥每半年一次	1.流量＊ 2.水溫＊ 3.pH 值＊ 4.SS＊ 5.DO＊ 6.COD＊ 7.BOD_5＊ 8.總氮＊ 9.總磷＊ 10.油脂＊ 11.殘留農藥＊ 12.導電度	1.土地公坑溪上游(幽情谷)＊ 2.清水溪桶頭攔河堰上、下游(桶頭吊橋及桶頭橋)＊ 3.南勢坑溪上游 2 處(引水隧道出口上、下游)＊ 4.梅林溪(壩址下游)＊ 5.北勢坑溪上游＊ 6.全仔社橋 7.社興橋 8.鹿窟三號橋 9.清水溪橋(瑞草橋)	河川水質每月一次，另殘留農藥每半年一次	1.有關「南勢坑溪上游(引水隧道出口下游)」測站，係 105 年起調整新增之監測點位。 2.106 年起新增清水溪上游「全仔社橋」、「社興橋」、「鹿窟三號橋」及「清水溪橋」。 3.106 年 7 月因清水溪橋鄰近道路土石坍塌無法通行，測站自 7 月起移至瑞草橋執行。
地面水質	流量、水溫、pH 值、SS、DO、COD、BOD_5、總氮、殘留農藥、總磷、葉綠素 a	1.湖山壩址 2.湖南壩址 3.梅林溪壩址下游 4.桶頭攔河堰上游桶頭吊橋	營運期間 1.每季一次 2.殘留農藥按豐枯水期每半年一次	1.pH 11.總磷 2.水溫 12.重金屬(銀、砷、鎘、六價鉻、銅、汞、錳、鉛、硒及鋅) 3.溶氧量 4.生化需氧量 5.化學需氧量 6.大腸桿菌群 7.氨氮 13.葉綠素 a 8.懸浮固體 14.殘餘農藥 9.總氮 15.透明度 10.總有機碳	1.湖山壩址 2.湖南壩址 3.梅林溪壩址下游 4.桶頭攔河堰上游桶頭吊橋	每季 1 次，另殘留農藥每半年一次	1.本監測項目係於蓄水階段開始時，自 105 年第 2 季開始監測，另於 105 年 8 月起調整頻率為每月 1 次；自 106 年 2 月起改為每季 1 次。 2.自 107 年第 2 季起水庫水質增測透明度。
交通量	車輛類型、數目及流量道路服務水準、路口延滯	1.梅林國小附近(雲 214 線) 2.環球技術學院(岩山路) 3.台 3 線與雲 67-1 道路路口 4.台 3 線與榴南路路口 5.149 縣道(投 52 交會口~158 甲縣道交會口)	1.梅林國小附近、149 縣道每季一次 2.環球技術學院、台 3 線及榴南路口於下游連接管路聯外道路(材料運輸道路)「完成前」每季一次 3.台 3 線及雲 67-1 路口：下游連接管路聯外道路(材料運輸道路)「完成後」每季一次	一、路段： 1.車輛類型、數目及流量道路服務水準＊ 2.速率(僅監測上、下午尖峰時段) 二、路口： 1.車輛類型、數目及流量道路服務水準＊ 2.路口延滯＊	一、路段： 1.雲 214 鄉道(雲 55 交會口~玉當山)＊ 2.149 縣道(投 52 交會口~158 甲縣道交會口)＊ 3.材料運輸道路(台 3 省道~光復路) 二、路口及延滯： 1.台 3 省道與雲 214 鄉道路口 2.台 3 省道與 149 縣道路口 3.台 3 省道與雲 55 鄉道路口 4.台 3 省道與雲 67-1 路口＊	每季一次，每次連續 24 小時監測	1.依照環差之規劃，自 100 年第 1 季起因聯外道路已完工通車，故停止環球技術學院(岩山路)、台 3 線及榴南路口之監測。 2.原「運輸道路(台 3 省道、雲 67-1 交會口至光復路口)」及「台 3 省道雲 67-1(運輸道路)路口」等 2 測站因該道路進行相關工程無法執行監測，105 年第 2 季恢復監測。 3.106 年起停止監測「梅林溪南岸聯絡道路」。 4.107 年起「材料運輸道路」已更名為「水庫路」。
水域生物	1.魚類 2.水生昆蟲 3.蝦蟹螺貝類 4.浮游動植物 5.附著性藻類 6.蜻蜓	1.清水溪(桶頭攔河堰上、下游及桶頭橋固床工下游共 3 站) 2.梅林溪 3.雷公坑溪(引水路上、下游)	每季一次，另清水溪每年 2、5、9 月各增作一次	1.魚類＊ 2.水生昆蟲＊ 3.蝦蟹螺貝類＊ 4.浮游動植物＊ 5.附著性藻類＊ 6.蜻蜓＊	1.清水溪(桶頭攔河堰上、下游及桶頭橋固床工下游共 3 站)＊ 2.梅林溪＊ 3.雷公坑溪(引水路上、下游)＊	每季一次，另清水溪每年 2、5、9 月各增作一次	1.配合第 3 次環差之規定，自 100 年第 2 季起新增蝦蟹螺貝類、浮游動植物及附著性藻類等監測項目。 2.配合第 4 次環差之規定，自 101 年第 2 季起新增蜻蜓監測項目、新增桶頭橋固床工下游測站，且配合新公告之技術規範調整動物監測之努力量。
					1.湖山壩址(第二取出水工附近) 2.湖南壩址(第一取出水工附近) 3.引水隧道出口附近測站	每季 1 次，並進行三重複次數努力量	本監測項目係於蓄水階段開始時，自 105 年第 2 季開始監測。

類別	環評報告、環調報告及環差報告調查或監測內容			目前監測內容			調整說明
	項目	地點	頻率	監測項目	監測地點	監測頻率	
	魚道效益	1.桶頭攔河堰 2.桶頭橋固床工	每半年 1 次(豐枯水期各一次)	魚道效益＊	1.桶頭攔河堰＊ 2.桶頭橋固床工＊	每季一次	1.本監測項目係於蓄水階段開始時，自 105 年第 2 季開始監測。 2.自 107 年 3 月增加監測頻率為每季 1 次
陸域動物	1.哺乳類 2.兩棲類 3.鳥類 4.爬蟲類 5.蝴蝶類	1.水庫集水區域 2.攔河堰及引水路 500m 範圍 3.引水隧道上方兩側 200m 範圍	每季一次，另於每年 4~6 月進行每月 3 次八色鳥之錄放反應法監測	1.哺乳類＊ 2.兩棲類＊ 3.爬蟲類＊ 4.鳥類＊ 5.蝴蝶類＊	1.水庫集水區 38 個測站＊ 2.攔河堰與引水路周邊 500 公尺範圍，以及引水隧道上方兩側 200 公尺範圍內共 10 個測站＊	每季一次	配合第 3 次環差之規定，自 100 年第 2 季起新增蝴蝶類監測。配合第 4 次環差之規定，自 101 年第 2 季起配合新公告之技術規範調整動物監測之努力量。配合第 5 次環差之規定，自 102 年第 2 季起八色鳥之監測於每年 4~6 月間每月進行監測，該次監測均包含 3 次錄放反應法監測，以符合合約及技術規範規定之 3 重複努力量之要求。
	八色鳥	本計畫區域及鄰近環境	每年 4～6 月間，每月進行 3 次錄放反應法之監測	八色鳥	1.水庫集水區 38 測站 2.湖本對照區 10 測站 3.攔河堰、引水路周邊 500 公尺、引水隧道上方兩側 200 公尺範圍等共計 10 測站	每年 4~6 月間，每月一次監測(每次均含 3 次錄放反應法)	
陸域植物	植物生態	1.水庫集水區域 2.攔河堰及引水路 500m 範圍 3.引水隧道上方兩側 200m 範圍	每季一次	植物生態＊	1.水庫計畫區域範圍內共 5 測站＊: ・水庫集水區 2 個測站 ・自然生態保留及復育區 3 個測站 2.攔河堰、引水路周邊 500 公尺、引水隧道上方兩側 200 公尺範圍內共 4 測站＊	每季一次	配合第 3 次環差之規定，自 100 年第 2 季起新增攔河堰及引水路沿線影響範圍之陸域植物監測。

註：「＊」表現行監測內容中屬環評報告、環調報告及環差報告調查規定之應辦理之內容。

環境監測當日施工情形及使用機具情形

環境監測當日施工情形及使用機具情形

施工日期	施工情形	施工機具	環境監測項目
107.07.02	-	-	•生態監測
107.07.03	-	-	•生態監測
107.07.04	-	-	•生態監測
107.07.05	-	-	•生態監測
107.07.06	-	-	•生態監測
107.07.07	•周邊環境整理及綠美化工程(第二期)	-	•空氣品質
107.07.09	•周邊環境整理及綠美化工程(第二期)	-	•生態監測
107.07.10	•周邊環境整理及綠美化工程(第二期)	-	•河川水質 •生態監測
107.07.11	•周邊環境整理及綠美化工程(第二期)	-	•生態監測
107.07.12	-	-	•空氣品質 •噪音振動 •營建噪音振動 •生態監測
107.07.13	-	-	•空氣品質 •交通量 •噪音振動 •生態監測
107.07.17	•周邊環境整理及綠美化工程(第二期)	-	•生態監測
107.07.18	•周邊環境整理及綠美化工程(第二期)	-	•生態監測
107.07.19	•周邊環境整理及綠美化工程(第二期)	-	•空氣品質 •河川水質 •生態監測
107.07.20	•周邊環境整理及綠美化工程(第二期)	-	•生態監測
107.07.24	-	-	•營建噪音振動

施工日期	施工情形	施工機具	環境監測項目
107.08.01	-	-	•空氣品質
107.08.02	-	-	•空氣品質
107.08.03	•周邊環境整理及綠美化工程(第二期)	-	•營建噪音振動
107.08.20	-	-	•營建噪音振動
107.08.22	-	-	•河川水質
107.08.23	-	-	•河川水質

前言

前言

壹、依據

本監測計畫乃依據下表所列各報告之環境監測計畫據以執行。

核定時間	核定(備查)文號	報告名稱
89.05.17	(89)環署綜字第0026821號函	雲林縣湖山、湖南水庫環境影響評估報告書(後依行政院環保署於92.11.28環署綜字第0920084264號函同意變更計畫名稱為「湖山水庫」)
98.04.21	環署綜字第0980030921A號函	湖山水庫工程計畫第2次環境影響差異分析報告
98.09.18	環署綜字第0980078150C號函	湖山水庫工程計畫環境影響差異分析報告
100.04.26	環署綜字第1000029769B號函	湖山水庫工程計畫第3次環境影響差異分析報告
101.03.20	環署綜字第1010021238B號函	湖山水庫工程計畫第4次環境影響差異分析報告
102.08.27	環署綜字第1020067776號函	湖山水庫工程計畫第5次環境影響差異分析報告

一、湖山水庫工程計畫環境影響差異分析報告

於97年10月提送環保署審查，98年6月24日審查通過，並於98年9月18日環署綜字第0980078150C號函同意備查。主要變更內容包括：

(一)大壩工程：依據經濟部「水利建造物檢查及安全評估技術規範—蓄水、引水建造物篇」之第一級水庫標準辦理設計，並配合實測地形修正壩體斷面設計並加強耐震、增設戲台等；另配合修正壩體填方量，區外材料採取改商購，取消原環評報告從梅林溪及尖山坑溪取料規劃。

(二)溢洪道工程：依據經濟部「水利建造物檢查及安全評估技術規範—蓄水、引水建造物篇」保護最高標準，設計條件改採可能最大洪水(PMF)，並修正消能型式。

(三)取出水工工程：局部調整取水塔位置以順暢入流狀況。

二、湖山水庫工程計畫第 2 次環境影響差異分析報告

依據前述環差報告 97 年 10 月環保署初審決議，於 97 年 11 月另提第 2 次環差報告送審，97 年 12 月 29 日通過，並於 98 年 4 月 21 日環署綜字第 0980030921A 號函同意備查。

主要內容為變更施工開挖面積，由「每次開挖面積約在 150 ~ 800m^2 間」修改為「開挖裸露面積參據環保署 96 年 10 月修正發布之營建工程空氣污染防制設施管理辦法及其執行手冊規定，採行有效抑制粉塵之防制設施」。

三、湖山水庫工程計畫第 3 次環境影響差異分析報告

於 99 年 6 月提送環保署，100 年 2 月 9 日審查通過，並於 100 年 4 月 26 日環署綜字第 1000029769B 號函同意備查。

主要變更內容為工程技術可行與環境條件改變，變更引水路線，由原沿清水溪左岸布設方式，改以明渠、暗管及隧道引水至庫區南勢坑溪。

四、湖山水庫工程計畫第 4 次環境影響差異分析報告

於 100 年 8 月提送環保署，101 年 2 月 8 日審查通過，101 年 3 月 20 日環署綜字第 1010021238B 號函同意備查。

主要變更內容為考量原堰址施工開挖將影響桶頭吊橋之基礎，並為減少沉砂池挖方，爰往下游移動約 40 公尺；型式變更縮減攔河堰量體、減少堰體磨損，並加強消能，同時配合堰型設置適當魚道型式；前次引水路線大幅縮短，可減少水頭摩擦損失，堰頂高程可配合調降 2 公尺；增設桶頭橋固床工以減少攔河堰下游之沖刷，減緩河床坡降，減少沖刷、穩固河床。

五、湖山水庫工程計畫第 5 次環境影響差異分析報告

於 101 年 12 月提送環保署，102 年 6 月 3 日審查通過，102 年 8 月 27 日環署綜字第 1020067776 號函同意備查。

為降低未來營運期間水庫之供水風險、提升營運管理可靠度，故將於水庫完工前將湖山導水隧道保留並改建為具備援性質之第二出水工，此變更亦有助節省後續營運期間另行增建出水工之經費支出。

貳、監測執行期間

本期湖山水庫工程計畫之環境監測自 107 年 1 月展開，預計至 107 年 12 月止。湖山水庫之監測作業依據工程進度不同，分為施工前、施工期間(含停工期間)及試營運期間，分述如下：

1. 施工前：湖山水庫工程環境監測，係於 92 年 4 月起先進行施工前環境監測。

2. 施工期間(含停工期間)：後依據經濟部水利署中區水資源局 93 年 4 月 22 日水中工字第 09306001350 號函要求，自 93 年 4 月起開始執行施工期間環境監測，惟當時工程因用地問題而停工，後工程重新發包，自 95 年第 2 季開始重新動工，故本報告將 92 年監測期定義為「施工前」，93 年第 2 季至 95 年第 1 季定義為「停工期間」。

3. 試營運期間：自 105 年 5 月起，為配合湖山水庫蓄水安全檢查作業，相關監測工作即同步執行施工及營運期間之項目，故自 105 年 5 月起之監測期定義為試營運期間。

叁、執行監測單位

- 計畫綜整/數據分析/報告撰寫：艾奕康工程顧問(股)公司
- 空氣品質、噪音振動、水質、交通量：台灣檢驗科技股份有限公司
- 水域生物：嘉南藥理大學
- 陸域生物(含八色鳥)：民享環境生態調查有限公司

第一章　監测内容概述

第一章　監測內容概述

1.1 工程進度

湖山水庫工程共可分為水庫工程、引水工程及配合工程等項目，截至 107 年 9 月 30 日止，本工程實際完成之工項及進度如表 1.1-1 及圖 1.1-1 所示，其中已完工的部分包含導水路工程、大壩工程、溢洪道與取出水工工程、第二取出水工-取水塔工程、取水塔操作及維護機房工程、攔河堰工程、引水路工程、聯外道路工程、左岸遷建道路工程、下游河道整治第一、二、三期工程、下游橋樑改建工程(梅南橋、梅林橋及玉當山橋)、下游連接管路第一至四段工程、下游連接管路穩壓池及附屬工程、管理中心興建工程、周邊環境整理及綠美化工程(第一期)、湖山水庫營管安全設施工程(土木標)等，而本季持續施工之工程則有周邊環境整理及綠美化工程(第二期)，計畫整體進度已達 99.99%。

1.2 監測情形概述

茲將本季環境品質監測結果及異常情形之因應對策，簡要說明於表 1.2-1。各項環境因子監測結果與數據分析，依序詳載於第二章，檢討與建議則於第三章詳述之，原始數據參閱附錄三。

表 1.1-1　本計畫工程預定進度及實際進度彙整

工　程　項　目		預定進度(%)	完成進度(%)
水庫工程	導水路工程	—	已完工
	大壩工程	—	已完工
	溢洪道與取出水工工程	—	已完工
	第二取出水工取水塔工程	—	已完工
	取水塔操作及維護機房工程	—	已完工
引水工程	攔河堰工程	—	已完工
	引水路工程	—	已完工
配合工程	聯外道路工程、左岸遷建道路工程、下游河道整治工程(第一、二、三期)、下游橋樑改建工程(梅南橋、梅林橋及玉當山橋)、下游連接管路工程(第一段、二段、三段、四段、穩壓池)	—	已完工
	管理中心興建工程(建築、裝修)	—	已完工
	周邊環境整理及綠美化工程(第一期)	—	已完工
	周邊環境整理及綠美化工程(第二期)	90.00	91.72
	湖山水庫營管安全設施工程(土木標)	—	已完工
總　進　度			99.99

註 1：工項統計至 9 月底止。

註 2：工作面面積為：料源開挖區 0 公頃、大壩填築區 0 公頃、土方暫置區 0 公頃，未超出環境影響差異分析之承諾值(料源開挖區 7 公頃、大壩填築區 5 公頃、土方暫置區 2 公頃)

註 3：裸露面面積為：料源開挖區 0 公頃、大壩填築 0 公頃、土方暫置區 0 公頃、施工道路區 0 公頃，未超出環境影響差異分析之承諾值(料源開挖區 22 公頃、大壩填築區 20 公頃、土方暫置區 12 公頃、施工道路區 3 公頃)

工程項目 \ 日期			107年1月	107年2月	107年3月	107年4月	107年5月	107年6月	107年7月	107年8月	107年9月	107年10月	107年11月	107年12月	預定完工日期
水庫工程	導水路工程	(已完工)													
	大壩工程	(已完工)													
	溢洪道及取出水工工程	(已完工)													
	第二取出水工-取水塔工程	(已完工)													
	取水塔操作及維護機房工程	(已完工)													
引水工程	攔河堰工程	(已完工)													
	引水路工程	(已完工)													
配合工程	聯外道路工程	(已完工)													
	左岸遷建道路工程	(已完工)													
	下游河道整治(第一、二期、三期)	(已完工)													
	下游橋樑改建(梅南橋、梅林橋及玉當山橋)	(已完工)													
	下游連接管路工程(第一段、二段、三段、四段、穩壓池)	(已完工)													
	管理中心興建工程(建築、裝修)	(已完工)													
	湖山水庫營管安全設施工程(土木標)	(已完工)													
	周邊環境整理及綠美化工程(第一期)	(已完工)													
	周邊環境整理及綠美化工程(第二期)	預定進度90.00%, 實際91.72%													2018/12/31
計畫總進度		預定進度100%, 實際99.99%													2018/12/31

註： 表示預定完工日期　　表示進度統計日期

圖 1.1-1　本計畫工程預定進度及實際進度圖

1.3 監測計畫概述

湖山水庫施工期間環境監測計畫之執行概述說明如表 1.3-1，其內容涵蓋監測類別、項目、地點、頻率、方法、執行監測單位與執行監測時間等。

另為提升評估效益及加強說明水質與當地水域環境之關聯性，107年第 1 季開始，進行庫區及引水上下游之水質與同區域水域生物同步監測(水域生物監測期間執行相關水質監測)，以本季監測時程為例，詳如下表：

	水質(監測日 7/19)	水域生物(監測日 7/17~20)	效益
同步監測測站	1.水庫水質 4 測站： 湖山壩址、湖南壩址、梅林溪壩址下游、桶頭攔河堰上游(桶頭吊橋) 2.河川水質 4 測站： 土地公坑溪上游(庫區內幽情谷)、南勢坑溪上游 2 處(引水隧道出口上、下游)、桶頭攔河堰下游(桶頭橋)	1.水庫 3 測站： 湖山壩址、湖南壩址、引水隧道出口附近測站 2.河川水質 2 測站： 桶頭吊橋及桶頭橋	可直接掌握庫區水質情形及本工程計畫引水之上下游水質變化狀況

註：配合地面水質頻度為每季 1 次及河川水質每月 1 次，選定每季第 1 個月執行同步。

1.4 監測位址

湖山水庫工程施工期間各項環境因子監測類別之監測位址如表 1.3-1 及圖 1.4-1~圖 1.4-9 所示。

表 1.2-1　本季環境監測結果摘要

監測類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
空氣品質	1.TSP　2.PM_{10} 3.$PM_{2.5}$　4.CO 5.NO_2　6.SO_2 7.O_3　8.THC 9.風向、風速 溫度、溼度	• 本季監測結果除 7 月桶頭國小、8 月北勢坑溪民宅之 O_3 8 小時有超標之情形，其餘均符合空氣品質標準。	• 桶頭國小及北勢坑溪民宅之 O_3 8 小時超標情形，比對鄰近同時段之環保署斗六空品站(60ppb 及 58ppb)與竹山空品站(65ppb 及 62ppb)均有超標或偏高，顯示臭氧濃度偏高與大環境之影響有關。
環境噪音振動	噪音： L_{eq}、L_{max}、L_x 振動： Lv_{eq}、Lv_{max}、Lv_x	• 本季噪音於引水隧道入口(桶頭端)、引水隧道出口(庫區端)、玉當山及瑞竹國小有超標狀況，其餘測值均能符合相關之音量標準。 • 各測站日間及夜間 Lv_{10} 振動位準均符合日本振動規制法施行規則之參考基準，亦低於人體感受閾值 55 dB。	• 根據現場紀錄顯示，引水隧道出口(庫區端)之現場環境噪音源主要為水流聲。 • 引水隧道入口(桶頭端)及瑞竹國小之現場環境噪音源於夜間主要為蟲鳴聲。 • 玉當山於日間時段之均能音量有超標狀況，經現場監測錄音資料分析，主要噪音源為鄰近居民之廟會活動，晚間及夜間則主要為蟲鳴之聲音，判斷此乃造成監測值超標之原因。
營建噪音振動	噪音：L_{eq}、L_{max} 振動：Lv_{eq}、Lv_{max}	• 本季營建噪音監測成果均可符合日本振動規制法施行細則之建設作業參考基準。	—
河川水質水量	• 水溫 • pH 值 • 生化需氧量 • 溶氧量 • 懸浮固體 • 總磷、總氮 • 流量、油脂 • 化學需氧量 • 導電度 • 濁度 • 葉綠素 a • 殘留農藥	• 河川水質於梅林溪及清水溪流域皆有部份測站懸浮固體及總磷測項超標。	• 針對本季南勢坑溪上游兩站(引水隧道出口上、下游)與清水溪流域各測站懸浮固體均有超標情況，清水溪流域超標主要因本季適逢夏季，採樣前幾日午後有降雨情形，且由於清水溪流域地質脆弱，導致受雨水沖刷易使水體懸浮固體測值升高；另引水隧道出口上游水質受降雨影響，懸浮固體亦有升高情況發生，而下游測站水質除持續受上游水質影響外，因該河道亦承接引水道之水源，於採樣期間引水道之上游 (桶頭地區)同時有降雨情形，因此引水道水流量明顯偏高(115.2~2,022.6 m^3/min)，因此受水流持續沖刷及上游水質影響，導致測值有超標情況發生。由歷次數據顯示，懸浮固體於降雨後常有異常偏高之情形發生。 • 針對總磷測值常有不符合乙類水體水質標準之情形，分析主要污染來源係為鄰近農田使用之肥料，且降雨後易受雨水沖刷導致磷分溶入水體而被測得；另本季南勢坑溪上游(引水隧道出口下游)之 9 月生化需氧量(2.9mg/L)略有超過乙類水體水質標準(2.0mg/L)，檢視歷次監測結果，雖曾有超過法規情況發生，惟近期測值均能符合法規標準，推測本次應屬偶發事件，後續將會持續觀察測值變動情形。

表 1.2-1　本季環境監測結果摘要(續 1)

監測類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
工地 水質水量	・水溫・pH 值・懸浮固體 ・生化需氧量 ・總磷　・總氮・流量 ・油脂　・化學需氧量 ・真色色度・氨氮 ・溶氧量・大腸桿菌群	・本季工地現場除綠美化工程(第二期)外均已完工，惟綠美化工程無放流水產生，故無法執行工地水質水量之監測。	—
地面水質	・pH・水溫・溶氧量 ・生化需氧量 ・化學需氧量 ・大腸桿菌群 ・氨氮・懸浮固體 ・總氮・總有機碳 ・總磷・重金屬 ・葉綠素 a・殘餘農藥 ・透明度(註 1)	・除桶頭攔河堰上游(桶頭吊橋)之大腸桿菌群略有高於飲用水水源水質標準外，其餘測站測值均能符合保護人體健康基準及飲用水水源水質標準， ・湖山壩址 CTSI 指標值為 48.06 而湖南壩址 CTSI 指標值為 52.30，水庫優氧化程度介於普養~優養狀態。	・ 由於桶頭吊橋測站屬本計畫之上游水質背景測站，且河道兩旁仍有民宅，因此可能會受到生活污水排入之影響。另比對環保署水質測站(桶頭攔河堰)測值，其近期測值介於<10~2.7×10^{4}CFU/100mL，亦有部分測值超過法規標準，顯示上游水質有受沿線居民活動影響之虞。
交通量	路段： ・路段交通量 ・行車速率 路口： ・路口交通量 ・路口延滯	・在行車速率方面以 7:00～9:00 及 17:00~19:00 為晨、昏峰時段進行分析，雲 214 鄉道於晨峰往東之總旅行速率 26.4km/hr 為最低。149 縣道於晨峰往南之 35.9km/hr 為最低。材料運輸道路於昏峰往西北之 43.0km/hr 為最低。 ・在交通量方面雲 214 鄉道晨、昏尖峰道路服務水準均為 C 級。149 縣道晨、昏峰道路服務水準介於 A~B 級。材料運輸道路晨、昏尖峰道路服務水準均為 B 級。 ・在路口交通量方面主要以台 3 與雲 214 鄉道路口昏峰時段來自林內方向之交通量最大。 ・在路口延滯方面台 3 與雲 55 鄉道路口之晨、昏峰服務水準均為 B 級。台 3 與 149 縣道路口之晨、昏峰服務水準均為 A 級。台 3 與雲 214 鄉道路口之晨、昏峰服務水準為 A 級。台 3 省道及雲 67-1 路口晨、昏峰服務水準均為 B 級。	—

註 1：為瞭解地面水質狀況(壩址內水質)，並計算「卡爾森指數，Carlson trophic state index(CTSI)」，本計畫於 107 年第 2 季起增測透明度。

註 2：卡爾森指數(CTSI)，當 CTSI<40 為貧養狀態，40≦CTSI≦50 為普養狀態，CTSI>50 則為優養狀態；本季地面水質調查時間為 7 月 19 日，查詢「台灣地區主要水庫蓄水量報告表」資料，湖山水庫公告有效容量為 5,085 萬立方公尺，當日水位高為 184.91 公尺，有效蓄水量為 1096.53 萬立方公尺，其總蓄水量約為 21.56%。

表 1.2-1　本季環境監測結果摘要(續 2)

監測類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
水域生物	‧魚類 ‧水生昆蟲 ‧蝦蟹螺貝類 ‧浮游植物 ‧附著性藻類 ‧浮游動物 ‧蜻蜓類	•桶頭吊橋測站 魚類在 7 月共監測到 3 科 5 種 31 隻次，9 月共監測到 4 科 9 種 35 隻次，監測到的魚類大多為臺灣特有種魚類，保育類有埔里中華爬岩鰍。 水生昆蟲 7 月共監測到 6 目 6 科 8 種 110 隻次，9 月監測到 2 目 3 科 4 種 18 隻次。 蝦蟹螺貝類 7 月監測到 3 目 4 科 5 種 24 隻次，9 月監測到 1 目 2 科 2 種 2 隻次，本季臺灣特有種有假鋸齒米蝦。 浮游植物 7 月監測 1 門 14 種 52,000 細胞數/公升，9 月監測到 1 門 16 種 52,000 細胞數/公升。 附著藻類 7 月監測到 2 門 33 種 3,379,200 細胞數/100 平方公分，9 月監測到 2 門 37 種 5,043,200 細胞數/100 平方公分。 浮游動物本季未監測到。 蜻蜓類 7 月監測到 4 科 10 種 35 隻次，9 月共監測到 3 科 9 種 108 隻次，臺灣特有種有短腹幽蟌。 •桶頭橋測站 魚類在 7 月共監測到 2 科 4 種 17 隻次，9 月共監測到 1 科 1 種 6 隻次，監測到的魚類皆為臺灣特有種魚類，未監測到保育類。 水生昆蟲 7 月共監測到 3 目 4 科 4 種 47 隻次，9 月共監測到 2 目 3 科 3 種 31 隻次。 蝦蟹螺貝類 7 月監測到 1 目 2 科 2 種 16 隻次，9 月監測到 1 目 1 科 1 種 2 隻次，本季臺灣特有種有假鋸齒米蝦。 浮游植物 7 月監測到 1 門 15 種 124,800 細胞數/公升，9 月監測到 1 門 16 種 39,000 細胞數/公升。 附著藻類 7 月監測到 2 門 28 種 1,971,200 細胞數/100 平方公分，9 月監測到 2 門 33 種 4,480,000 細胞數/100 平方公分。 浮游動物本季未監測到。 蜻蜓類 7 月監測到 1 科 1 種 1 隻次，9 月則監測到 4 科 8 種 70 隻次，臺灣特有種有短腹幽蟌。	本季各測站除了梅南橋測站與雷公坑溪下游測站重新恢復有水的狀態外，其他測站因進入雨季期間，水流量明顯的增加而沖刷且水體較為混濁，而使得魚類與底棲生物的種數或數量較為減少。此外，桶頭橋下游測站棲地也因大水沖刷而有所改變，原有棲地的水流下切，形成較深的深流。但是本季被大水沖平使得原有下切的深流之深度變淺，將持續監測水生生物的種數與數量變化。

表 1.2-1　本季環境監測結果摘要(續 3)

監測類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
水域生物	・魚類 ・水生昆蟲 ・蝦蟹螺貝類 ・浮游植物 ・附著性藻類 ・浮游動物 ・蜻蜓類	•桶頭橋下游測站 魚類在 7 月共監測到 2 科 5 種 40 隻次，9 月共監測到 3 科 5 種 33 隻次，監測到的魚類皆為臺灣特有種魚類，未監測保育類。 水生昆蟲 7 月共監測到 4 目 5 科 6 種 93 隻次，9 月共監測到 3 目 4 科 5 種 20 隻次。 蝦蟹螺貝類 7 月監測到 2 目 2 科 3 種 22 隻次，9 月監測到 1 目 1 科 1 種 2 隻次。 浮游植物 7 月監測到 1 門 15 種 257,400 細胞數/公升，9 月監測到 1 門 16 種 45,500 細胞數/公升。 附著藻類 7 月監測到 2 門 31 種 2,380,800 細胞數/100 平方公分，9 月監測到 2 門 33 種 1,612,800 細胞數/100 平方公分。 浮游動物本季未監測到。 蜻蜓類 7 月監測到 1 科 3 種 6 隻次，9 月共監測到 4 科 7 種 64 隻次，臺灣特有種有短腹幽蟌。 •梅南橋測站 魚類在 7 月共監測到 2 科 2 種 2 隻次，外來種有尼羅口孵非鯽，未監測到保育類。 水生昆蟲 7 月共監測到 5 目 8 科 10 種 155 隻次。 蝦蟹螺貝類 7 月監測到 2 目 3 科 3 種 18 隻次，臺灣特有種有假鋸齒米蝦。 浮游植物 7 月監測到 1 門 16 種 62,400 細胞數/公升。 附著藻類 7 月監測到 2 門 21 種 1,100,800 細胞數/100 平方公分。 浮游動物 7 月監測到 1 大類 5 種 28 個體數/公升。 蜻蜓類 7 月共監測到 4 科 10 種 29 隻次，臺灣特有種有短腹幽蟌。 •雷公坑溪上游(天心橋)測站 魚類在 7 月共監測到 2 科 5 種 58 隻次，監測到的皆為臺灣特有種魚類，未監測到保育類。 水生昆蟲 7 月共監測到 5 目 11 科 11 種 237 隻次。 蝦蟹螺貝類 7 月監測到 2 目 2 科 2 種 16 隻次，臺灣特有種有假鋸齒米蝦。 浮游植物 7 月監測到 1 門 16 種 98,800 細胞數/公升。 附著藻類 7 月監測到 3 門 31 種 1,843,200 細胞數/100 平方公分。 浮游動物 7 月未監測到浮游動物。 蜻蜓類 7 月共監測到 1 科 1 種 3 隻次，臺灣特有種有短腹幽蟌。 •雷公坑溪下游測站 魚類在 7 月共監測到 3 科 6 種 77 隻次，監測到的皆為臺灣特有種魚類，未監測到保育類。 水生昆蟲 7 月共監測到 6 目 9 科 11 種 133 隻次。 蝦蟹螺貝類 7 月監測到 2 目 3 科 3 種 56 隻次，臺灣特有種有假鋸齒米蝦。 浮游植物 7 月監測到 1 門 12 種 41,600 細胞數/公升。 附著藻類 7 月監測到 2 門 26 種 947,200 細胞數/100 平方公分。 浮游動物 7 月未監測到浮游動物。 蜻蜓類 7 月共監測到 1 科 1 種 1 隻次，未監測到臺灣特有種。	梅林溪梅南橋測站的五河局河道景觀工程已完工，並恢復為有水的狀態，但是因為棲地狀態已出現大幅度的改變，而且水體也呈現混濁的狀態，使得水生生物的種數與數量都較為減少，再加上有人工構造物截斷河道(固床工)，未來可能成為洄游性生物的阻礙，將持續監測以追蹤種數與數量的變化。

表 1.2-1　本季環境監測結果摘要(續 4)

監測類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
水域生物	・魚類 ・水生昆蟲 ・蝦蟹螺貝類 ・浮游植物 ・附著性藻類 ・浮游動物 ・蜻蜓類	•湖南(第一)取出水工附近測站 魚類在 7 月共監測到 2 科 2 種 2 隻次，外來種有尼羅口孵非鯽，未監測到保育類。 水生昆蟲 7 月共監測到 3 目 3 科 3 種 10 隻次。 蝦蟹螺貝類 7 月監測到 2 目 2 科 2 種 30 隻次，未監測臺灣特有種，外來種則有囊螺。 浮游植物 7 月監測到 4 門 28 種 663,000 細胞數/公升。 附著藻類 7 月 2 門 20 種 6,118,400 細胞數/100 平方公分。 浮游動物 7 月監測到 3 大類 8 種 96 個體數/公升。 蜻蜓類 7 月共監測到 3 科 4 種 5 隻次，未監測到臺灣特有種或保育類。 •湖山(第二)取出水工附近測站 魚類在 7 月監測到 2 科 3 種 7 隻，臺灣特有種 1 科 2 種，外來種為尼羅口孵非鯽。 水生昆蟲 7 月共監測到 2 目 2 科 2 種 7 隻次。 蝦蟹螺貝類 7 月監測到 2 目 3 科 3 種 15 隻次，臺灣特有種有假鋸齒米蝦，外來種則有囊螺。 浮游植物 7 月監測到 3 門 27 種 470,600 細胞數/公升。 附著藻類 7 月 2 門 22 種 3,788,800 細胞數/100 平方公分。 浮游動物 7 月監測到 3 大類 7 種 48 個體數/公升。 蜻蜓類 7 月共監測到 2 科 5 種 9 隻次，未監測到臺灣特有種或保育類。 •引水隧道出口附近測站 魚類在 7 月共記錄 3 科 6 種 60 隻次，監測到的皆為臺灣特有種魚類，未監測到保育類。 水生昆蟲 7 月監測到 4 目 4 科 4 種 75 隻次。 蝦蟹螺貝類 7 月監測到 2 目 2 科 2 種 8 隻次，未監測到臺灣特有種。 浮游植物 7 月監測到 1 門 15 種 65,000 細胞數/公升。 附著藻類 7 月監測到 2 門 20 種 1,024,000 細胞數/100 平方公分。 浮游動物 7 月未監測到浮游動物。 蜻蜓類 7 月共監測到 2 科 2 種 7 隻次，未監測到臺灣特有種或保育類。	本季水庫區內兩處測站的水位明顯升高，水生生物的大致維持穩定的狀態。優養指數(ATSI)計算結果，僅湖山(第二)取出水工附近測站呈現優養的狀態，但是水體透明度仍高而水色也呈現藍灰色，所以優養化的現象應屬輕微，不過仍需留意水質的變化情形。引水隧道出口附近測站則大致呈現穩定的狀態。

監測類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
水域生物	•魚道效益評估監測	•攔河堰樣區 •攔河堰魚道上方測站 魚類9月共監測到4科10種40隻次，蝦蟹類有1科1種3隻次。 •攔河堰魚道測站 魚類9月共監測到2科5種24隻次，未監測到蝦蟹類。 •攔河堰魚道下方測站 魚類9月4科6種35隻次，蝦蟹類監測到1科1種9隻次。 •固床工樣區 •固床工上方測站 魚類9月共監測到1科1種3隻次，蝦蟹類監測到1科1種20隻次。 •固床工魚道測站 魚類9月共監測到1科1種1隻次，未監測到蝦蟹類。 •固床工下方測站 魚類9月共監測到4科8種34隻次，蝦蟹類監測到1科1種13隻次。	本季攔河堰魚道中的單向籠並未捕獲到任何生物，僅於電氣法時紀錄監測到臺灣白甲魚、臺灣石魚賓、何氏棘魚、臺灣間爬岩鰍與埔里中華爬岩鰍等魚類。另外，在固床工魚道的流速因為水流量大的緣故，且流速仍大於2m/s，雖有監測到魚類，但僅有1種1隻次。本季監測結果發現，固床工上方及固床工下方的監測到的豐度有漸減的趨勢，但是分析歷次監測結果顯示，若清水溪環境維持穩定，四處測站的物種組成相似度應維持在 50%以上，顯示具有魚道的桶頭攔河堰及固床工，對於水生生物並無太大的縱向性阻隔。

表 1.2-1　本季環境監測結果摘要(續 5)

監測類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
陸域動物	・鳥類 ・哺乳類 ・兩棲類 ・爬蟲類 ・蝴蝶類	1.水庫集水區 ・鳥類監測共記錄 12 目 30 科 50 種 2,048 隻次；哺乳類監測共記錄到 6 目 8 科 14 種 161 隻次；兩棲類監測共記錄 5 科 15 種 269 隻次；爬蟲類監測共記錄 5 科 12 種 121 隻次；蝴蝶類監測共記錄 5 科 12 亞科 66 種 789 隻次。 ・本季監測共記錄 4 種珍貴稀有保育類(松雀鷹、大冠鷲、領角鴞、黃嘴角鴞)。 2.引水工程區 ・鳥類監測共記錄 10 目 27 科 47 種 704 隻次；哺乳類監測共記錄到到 5 目 7 科 12 種 74 隻次；兩棲類監測共記錄 5 科 13 種 116 隻次；爬蟲類監測共記錄 5 科 10 種 83 隻次；蝴蝶類監測共記錄 5 科 12 亞科 58 種 282 隻次。 ・本季監測共記錄 4 種珍貴稀有保育類(大冠鷲、鳳頭蒼鷹、黃嘴角鴞、領角鴞)。 3.自然生態保留及復育區 ・鳥類監測共記錄 11 目 28 科 47 種 934 隻次；哺乳類監測共記錄到 6 目 8 科 14 種 62 隻次；兩棲類監測共記錄 5 科 12 種 122 隻次；爬蟲類監測共記錄 5 科 11 種 37 隻次；蝴蝶類監測共記錄 5 科 12 亞科 60 種 326 隻次。 ・本季監測共記錄 3 種珍貴稀有保育類(大冠鷲、領角鴞、黃嘴角鴞)。	本季物種及數量主要受季節變化影響，監測時間因屬夏季，生物活動力上升，物種及數量較上一季多。目前工程已完工，尚無發現工程對生物的影響，建議未來可持續多種植具生態功能的植栽。如於自然生態保留及復育區之綠美化工程多種植原生植物，或於綠美化工程之沿線、管理中心周邊及維修道路周邊種植蝴蝶喜好的蜜源植物及食草植物如黃荊、方骨消、杜虹花、龍船花...等，以吸引蝴蝶利用及繁殖。
陸域植物	・陸域植物	1.水庫集水區：本季記錄植物 111 科 352 屬 472 種，另有記錄環保署「植物生態評估技術規範」所公告環評等級為 3 之台灣地區稀特有植物圓葉布勒德藤 1 種。 2.引水工程區：本季記錄到 107 科 336 屬 458 種，其中包含 1 種稀有種-圓葉布勒德藤。 3.自然生態保留及復育區：本季記錄到 102 科 322 屬 407 種，其中包含 2 種稀有種，分別為環評等級為 1 的臺灣羅漢果和等級為 3 的圓葉布勒德藤。	本季於自然生態保留及復育區所進行的綠美化步道工程已完工，但尚未開放，因此對周圍環境破壞較少，裸地有逐漸恢復植被的情形，且在步道沿線開始栽植景觀樹種。

表 1.3-1　湖山水庫工程本季試營運期間環境監測計畫

類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行單位	監測時間
空氣品質	・TSP ・PM_{10} ・$PM_{2.5}$ ・CO ・NO_2 ・SO_2 ・O_3 ・THC ・風向、風速、溫度、溼度	一、固定測站： 1.棋山國小　2.梅林國小 3.玉當山　4.瑞竹國小 5.桶頭國小 6.引水隧道出口 7.引水隧道入口 二、移動測站： 1.24hr 測站： ・湖山水庫工地周圍 3 站(樣仔坑回春寺、北勢坑溪民宅、第一取出水工) 2.1hr 測站：工地周圍 3 處(上風 1 處，下風 2 處) 三、PM_{10} 及 $PM_{2.5}$ 即時監測：施工區域下風處不定時、不定點選擇 3 處測定	• 固定測站：每季 1 次 移動測站：每月 1 次 • PM_{10} 及 $PM_{2.5}$ 監測：每日進行	・總懸浮微粒(TSP)：NIEA A102.12A ・PM_{10}：NIEA A206.10C / NIEA A208.12C ・$PM_{2.5}$：NIEA A205.11C ・CO：NIEA A421.13C ・NO_2：NIEA A417.11C ・SO_2：NIEA A416.13C ・O_3：NIEA A420.12C ・THC：NIEA A740.10C ・風向、風速、溫度、溼度：氣象設備自動測定法	台灣檢驗科技股份有限公司	固定測站：7/13、7/12、7/19、8/1、8/2、9/3 移動測站：7/7、7/13、8/3、8/10、9/1、9/8 即時監測：7/1~9/30
噪音振動	噪音：L_{eq}、L_{max}、L_x 振動：Lv_{eq}、Lv_{max}、Lv_x	1.棋山國小　2.梅林國小 3.玉當山　4.瑞竹國小 5.桶頭國小 6.引水隧道出口 7.引水隧道入口	・每季測定 1 次，每次 24 小時連續測定。	・噪音：NIEA P201.96C ・振動：NIEA P204.90C	台灣檢驗科技股份有限公司	7/12~7/13

表 1.3-1　湖山水庫工程本季試營運期間環境監測計畫(續 1)

類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行單位	監測時間
營建噪音振動	噪音： L_{eq}、L_{max} 振動： L_{Veq}、L_{Vmax}	工區周界 15 公尺處監測，大壩工區選擇 3 處，其中測點三於 107 年 8 月 20 日起，移至玉當山測站。	施工期間每 2 週辦理 1 次，每次 10 分鐘。	・噪音：NIEA P201.96C ・振動：NIEA P204.90C	台灣檢驗科技股份有限公司	7/12、7/24 8/3、8/20 9/3、9/17
河川水質水量	・水溫 ・pH 值 ・生化需氧量 ・溶氧量 ・懸浮固體 ・總磷 ・總氮 ・流量 ・油脂 ・化學需氧量 ・殘留農藥 ・導電度 ・葉綠素 a	・梅林溪流域： 北勢坑溪上游、土地公坑溪上游、南勢坑溪上游 2 處、梅林溪壩址下游測站 ・清水溪： 全仔社橋、社興橋、鹿窟三號橋、瑞草橋、桶頭攔河堰上、下游測站	除殘留農藥每半年 1 次外，其餘項目每月 1 次。 本季無殘餘農藥監測	・pH 值：NIEA W424.52A ・水溫：NIEA W217.51A ・生化需氧量：NIEA W510.55B ・溶氧：NIEA W455.52C ・懸浮固體：NIEA W210.58A ・總磷：NIEA W427.53B ・總氮：NIEA W423.52C ・流量： NIEAW020.51C/W022.51C ・化學需氧量：NIEA W517.52B ・油脂：NIEA W506.21B ・殘留農藥： NIEA W610.52B(達馬松等)、 NIEA W605.53B (飛布達等)、 NIEA W642.50A(2,4-地)、 NIEA W645.50A(丁基拉草)、 NIEA W641.51A(巴拉刈)、 NIEA W635.51C(得滅克等) ・導電度：NIEA W203.51B ・葉綠素 a：NIEA E506.00B	台灣檢驗科技股份有限公司	土地公坑溪上游、南勢坑溪上游 2 處、桶頭攔河堰上游測站： 7/19、8/22、9/3 北勢坑溪上游、梅林溪壩址下游、全仔社橋、社興橋、鹿窟三號橋、瑞草橋、桶頭攔河堰下游測站：7/10、8/23、9/7

表 1.3-1　湖山水庫工程本季試營運期間環境監測計畫(續 2)

類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行單位	監測時間
地面水質	・pH ・水溫 ・溶氧量 ・生化需氧量 ・化學需氧量 ・大腸桿菌群 ・氨氮 ・懸浮固體 ・總氮 ・總有機碳 ・總磷 ・重金屬(銀、砷、鎘、六價鉻、銅、汞、錳、鉛、硒及鋅) ・葉綠素 a ・殘餘農藥 ・透明度(註)	・湖山壩址 ・湖南壩址 ・梅林溪壩址下游 ・桶頭攔河堰上游桶頭吊橋	每季 1 次(殘餘農藥半年 1 次) 本季有殘餘農藥監測	・pH 值：NIEA W424.52A ・水溫：NIEA W217.51A ・溶氧：NIEA W455.52C ・生化需氧量：NIEA W510.55B ・化學需氧量：NIEA W517.52B ・大腸桿菌群：NIEA E202.55B ・氨氮：NIEA W437.52C ・懸浮固體：NIEA W210.58A ・總氮：NIEA W423.52C ・總有機碳：NIEA W532.52C ・總磷：NIEA W427.53B ・重金屬： NIEA W320.52A(六價鉻) NIEA W311.53C(鎘等) NIEA W330.52A(汞) NIEA W341.51B(硒) NIEA W434.54B(砷) ・殘留農藥： NIEA W610.52B(達馬松等)、 NIEA W605.53B (飛布達等)、 NIEA W642.50A(2,4-地)、 NIEA W645.50A(丁基拉草)、 NIEA W641.51A(巴拉刈)、 NIEA W635.51C(得滅克等) ・葉綠素 a：NIEA E506.00B ・透明度：NIEA E220.51C	台灣檢驗科技股份有限公司	7/19 9/13(殘餘農藥監測)

註：為瞭解地面水質狀況(壩址水質)，並計算「卡爾森指數，Carlson trophic state index(CTSI)」，本計畫於 107 年第 2 季起增測透明度。

表 1.3-1　湖山水庫工程本季試營運期間環境監測計畫(續 3)

類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行單位	監測時間
工地水質水量	・水溫 ・pH 值 ・生化需氧量 ・溶氧量 ・懸浮固體 ・總磷　・總氮 ・流量　・油脂 ・化學需氧量 ・真色色度 ・氨氮 ・大腸桿菌群	・原水產生點 ・工地污水放流口 ・桶頭端隧道放流口 ・庫區端隧道放流口	・每月 1 次	・pH 值：NIEA W424.52A ・水溫：NIEA W217.51A ・生化需氧量：NIEA W510.55B ・溶氧：NIEA W455.52C ・懸浮固體：NIEA W210.58A ・總磷：NIEA W427.53B ・總氮：NIEA W423.52C ・流量： NIEA W020.51C ・化學需氧量：NIEA W517.52B ・油脂：NIEA W506.21B ・氨氮：NIEA W437.52C ・真色色度：NIEA W223.52B ・大腸桿菌群：NIEA E202.55B	台灣檢驗科技股份有限公司	本季除綠美化工程(第二期)外均已完工，惟綠美化工程無放流水產生，故無工地水質水量資料(僅進行拍照紀錄)
交通量	路段： ・車輛類型、數目及流量道路服務水準 ・速率(僅監測上、下午尖峰時段) 路口： ・車輛類型、數目及流量道路服務水準 ・延滯	路段： 1.雲 214 鄉道(雲 55 鄉道交會口—玉當山，梅林國小附近) 2.149 縣道(投 52 鄉道交會口—158 甲縣道交會口) 3.梅林溪南岸運輸道路(雲 214 至湖南壩出入口) 路口： 1.台 3 省道與雲 214 鄉道路口 2.台 3 省道與 149 縣道路口 3.台 3 省道與雲 55 鄉道路口 4.台 3 省道與雲 67-1 路口	・每季一次，每次連續 24 小時監測	・攝影機及人工計數法	台灣檢驗科技股份有限公司	7/13

表 1.3-1　湖山水庫工程本季試營運期間環境監測計畫(續 4)

類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行單位	監測時間
水域生物	・魚類 ・水生昆蟲 ・蝦蟹螺貝類 ・浮游植物 ・附著性藻類 ・浮游動物 ・蜻蜓類	・清水溪(桶頭攔河堰上下游、桶頭橋下游) ・梅林溪 ・雷公坑溪(引水路上下游)	・每季 1 次，並進行三重複次數努力量 ・清水溪每季 1 次，每年 2、5、9 月增加 1 次	・電魚法 ・蘇伯氏網法 ・徒手採集法 ・蝦籠誘捕法 ・浮游動植物及藻類採集後，以顯微鏡計數	嘉南藥理大學	清水溪:桶頭橋下游 7/10~13、9/3~6 桶頭吊橋及桶頭橋 7/17~20、9/3~6 雷公坑溪：7/10~13 梅林溪：7/10~13
		・湖山壩址(第二取出水工附近) ・湖南壩址(第一取出水工附近) ・引水隧道出口附近測站	・每季 1 次，並進行三重複次數努力量	・電魚法・蘇伯氏網法 ・徒手採集法・蝦籠誘捕法 ・浮游動植物及藻類採集後，以顯微鏡計數		7/17~20
	魚道效益： ・流速測定 ・魚道利用觀察	・桶頭攔河堰 ・桶頭橋固床工	・每季 1 次	・電魚法 ・蝦籠誘捕法		9/4~7
陸域動物	・鳥類 ・哺乳類 ・兩棲類 ・爬蟲類 ・蝴蝶類	・水庫集水區 38 個測站 ・攔河堰與引水路周邊 500 公尺範圍，以及引水隧道上方兩側 200 公尺範圍內共 10 個測站	每季 1 次，並進行三重複次數努力量	・固定點監測法 ・捕捉器、網具捕捉法 ・目視遇測法及繁殖地監測法	民享環境生態調查有限公司	水庫集水區 7/2~6、7/9~13 引水工程區 7/2~6、7/9
陸域植物	陸域植物	・水庫集水區 2 個測站 ・攔河堰與引水路周邊 500 公尺範圍，引水隧道上方兩側 200 公尺範圍內共 4 個測站 ・自然生態保留及復育區 3 個測站	每季 1 次	・記錄監測各測站內植物種類、覆蓋度、生長高度等現況。草生地低於 1 m 以下的草本植物，則監測其組成及覆蓋度。 ・測站大小設為 10m×10m		7/11~14
八色鳥	八色鳥數量	・水庫集水區 38 個測站及「湖本」地區 10 個測站 ・攔河堰與引水路周邊 500 公尺範圍，以及引水隧道上方兩側 200 公尺範圍內共 10 個測站	每年 4~6 月間，每月 1 次監測(每次均含 3 次錄放反應法)，惟監測時若因降雨導致無法執行時，則延後於適當時間完成監測	・錄放反應法		4 至 6 月(每月分上、中、下旬)

註：*為水庫區(湖山壩址、湖南壩址、引水隧道出口附近測站)及引水口上下游(桶頭吊橋及桶頭橋)之水域生物上下游同步監測日期。

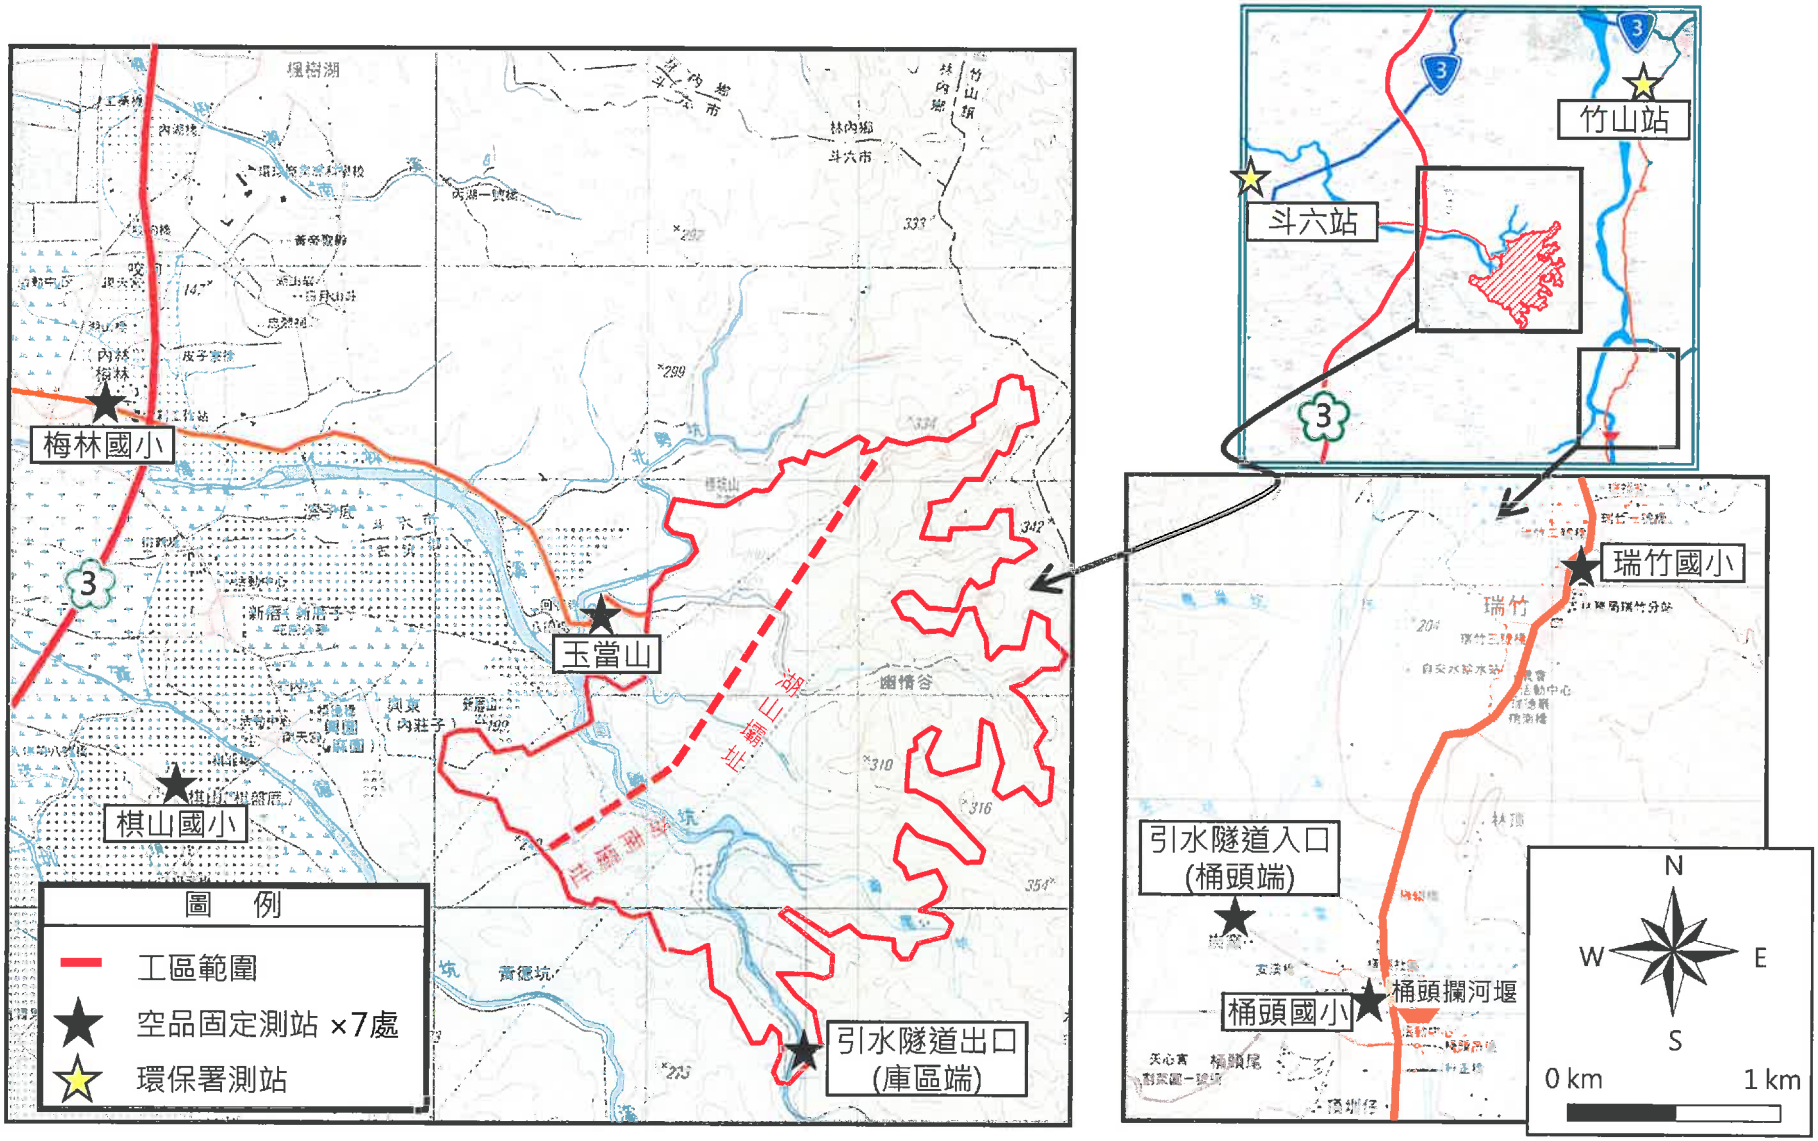

圖 1.4-1 本季湖山水庫工程空氣品質監測測站位置圖(固定測站)

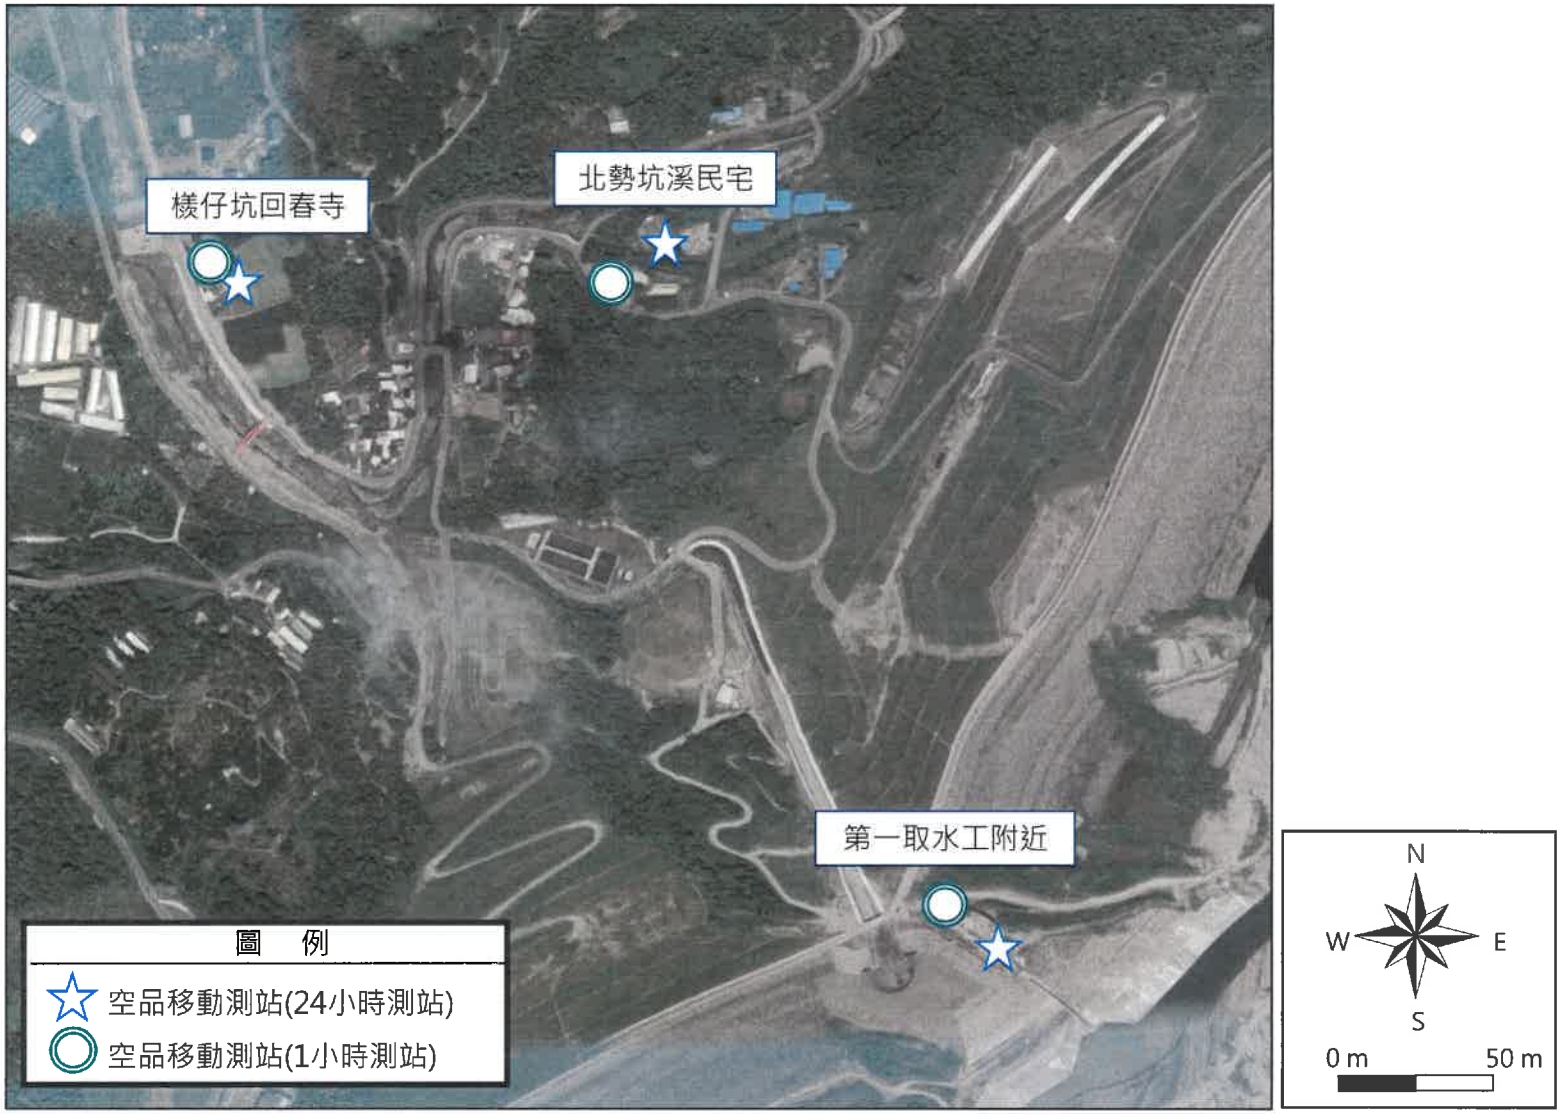

圖 1.4-2 本季湖山水庫工程空氣品質監測測站位置圖(移動測站)

圖 1.4-3 本季湖山水庫工程空氣品質監測測站位置圖(即時監測測站)

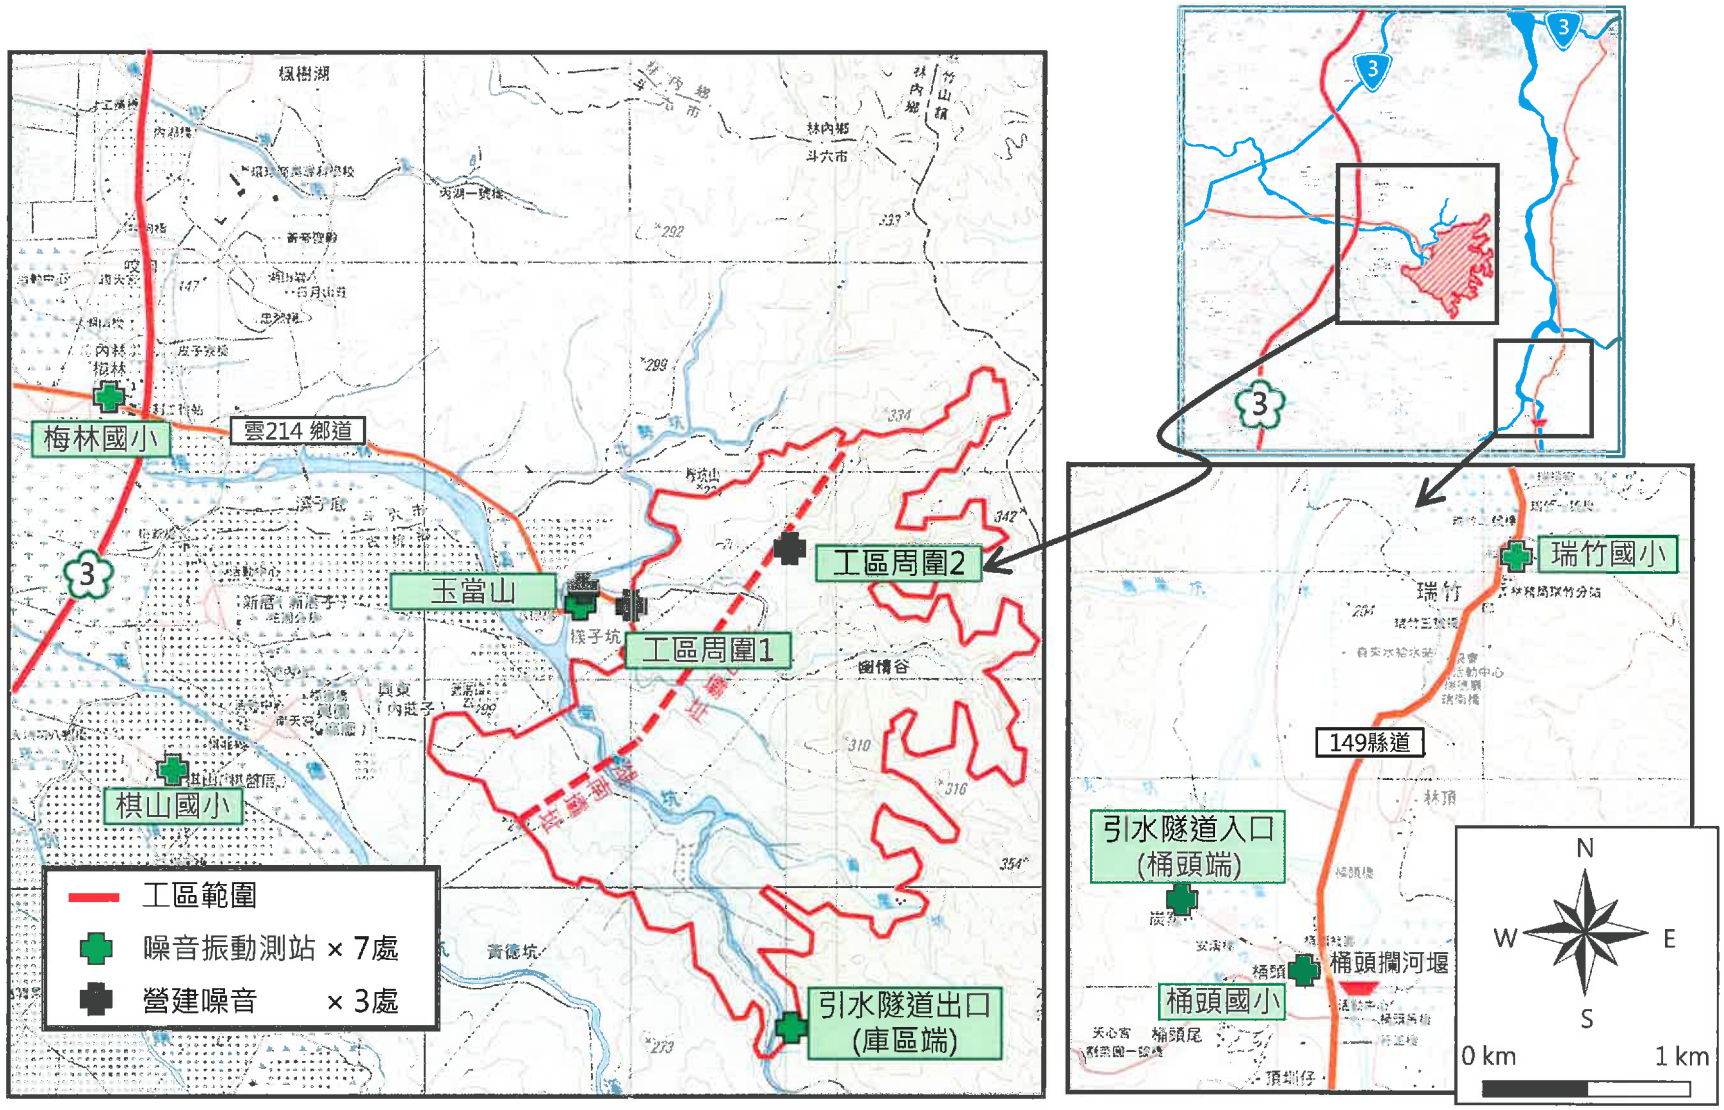

圖 1.4-4 本季湖山水庫工程噪音振動監測點位置圖

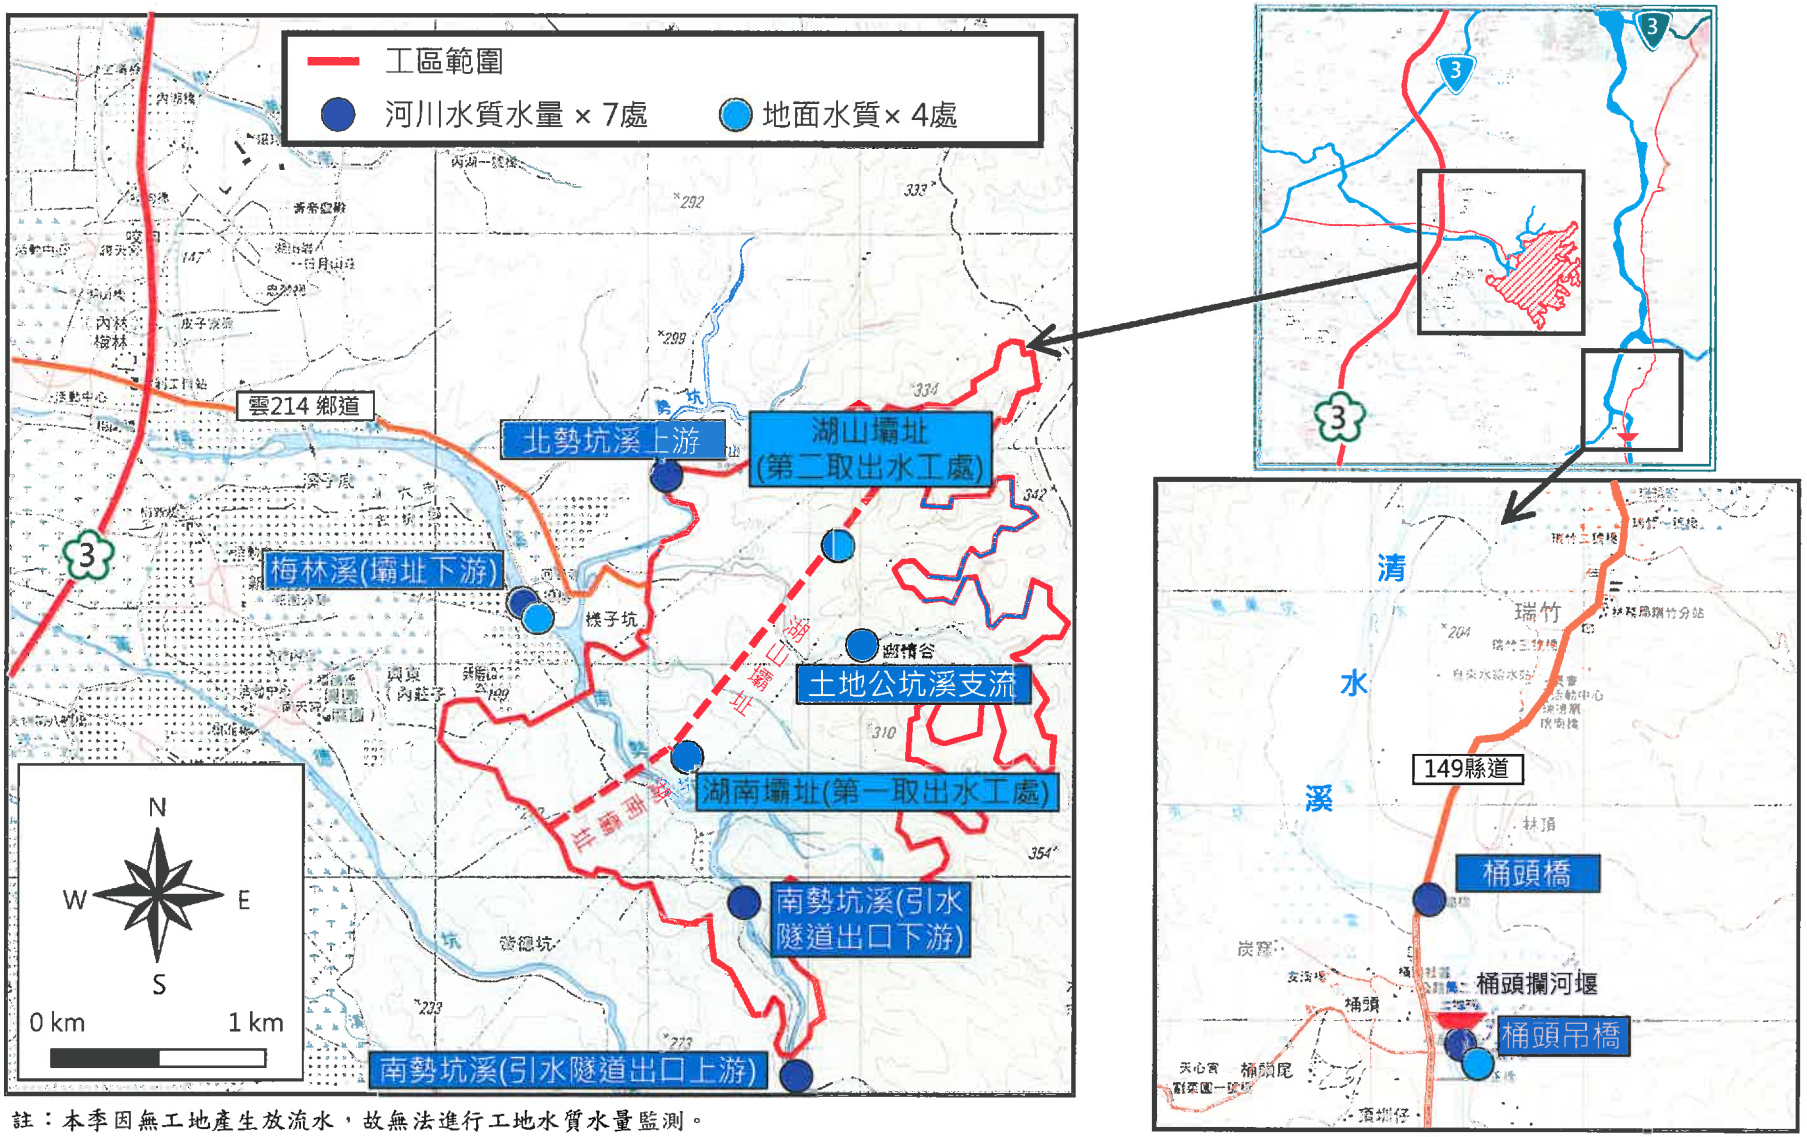

註：本季因無工地產生放流水，故無法進行工地水質水量監測。

圖 1.4-5　本季湖山水庫工程地面水質監測樣區位置圖

圖 1.4-5　本季湖山水庫工程地面水質監測樣區位置圖(續)

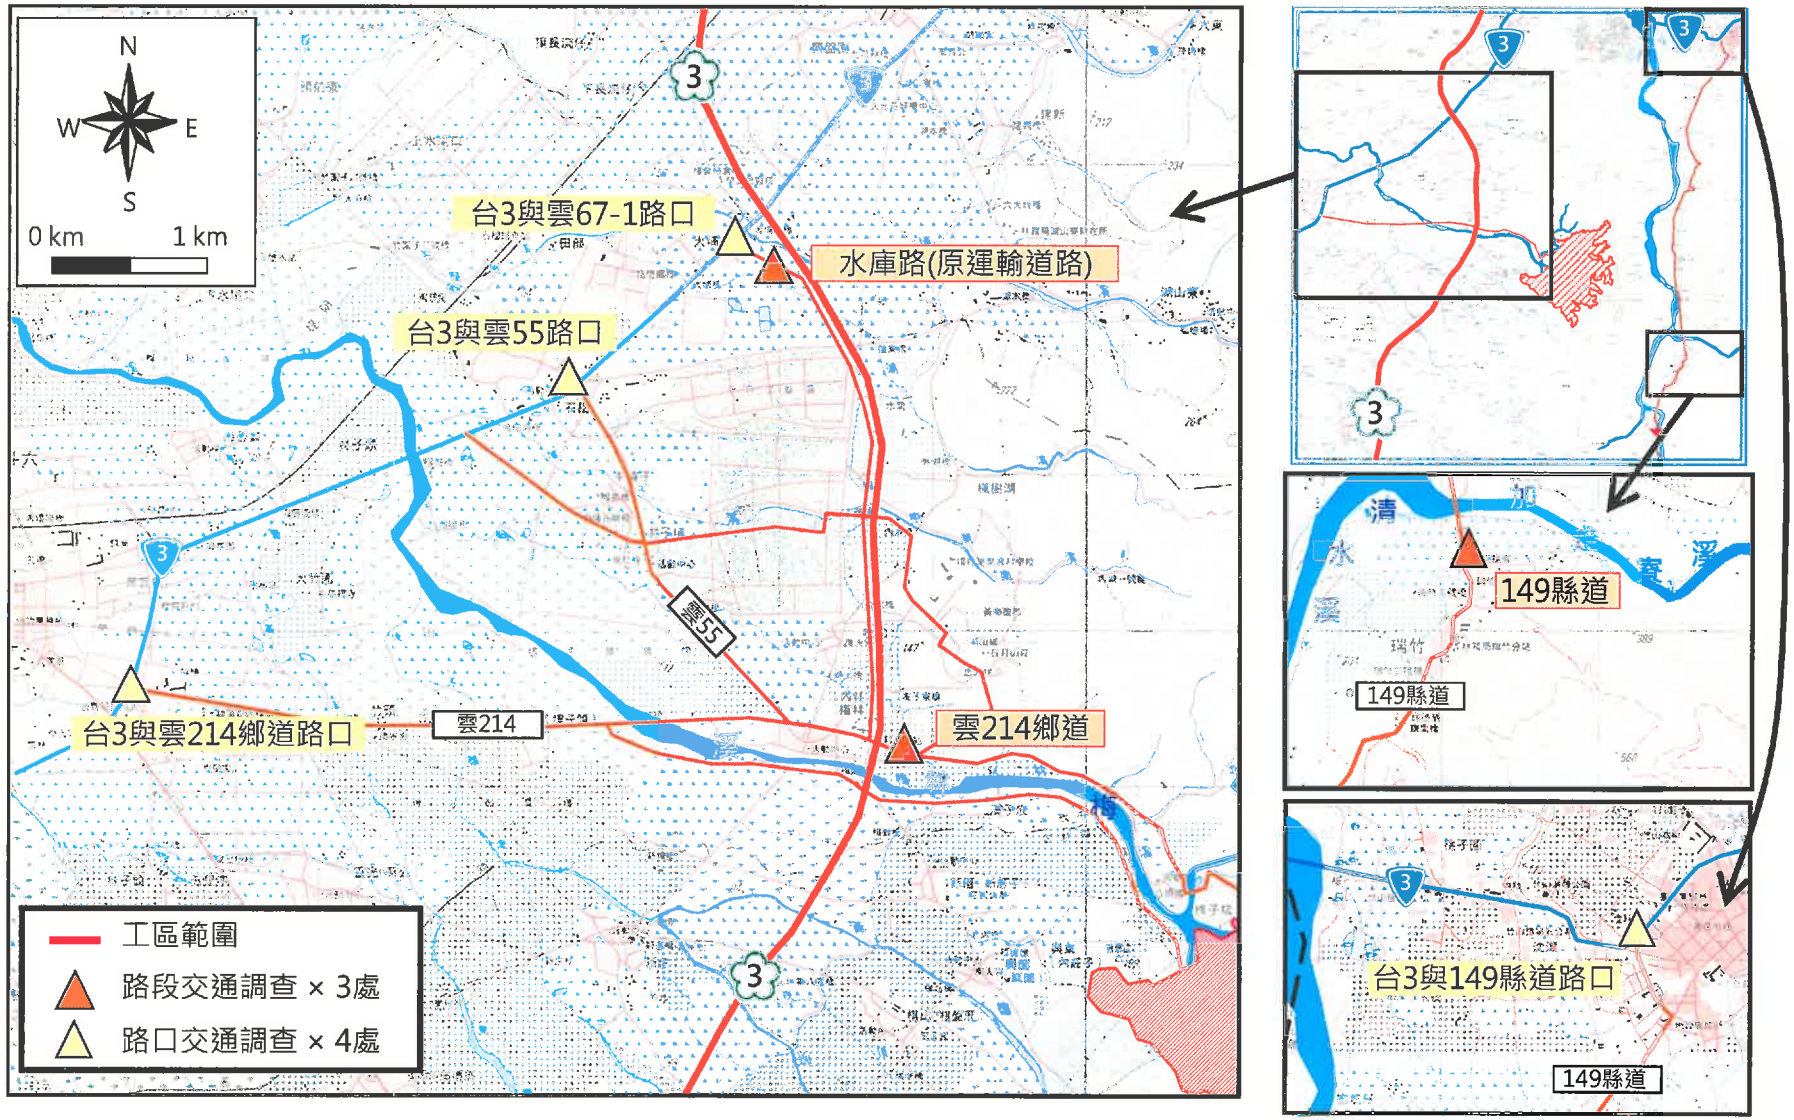

圖 1.4-6 本季湖山水庫工程交通量監測測站位置圖

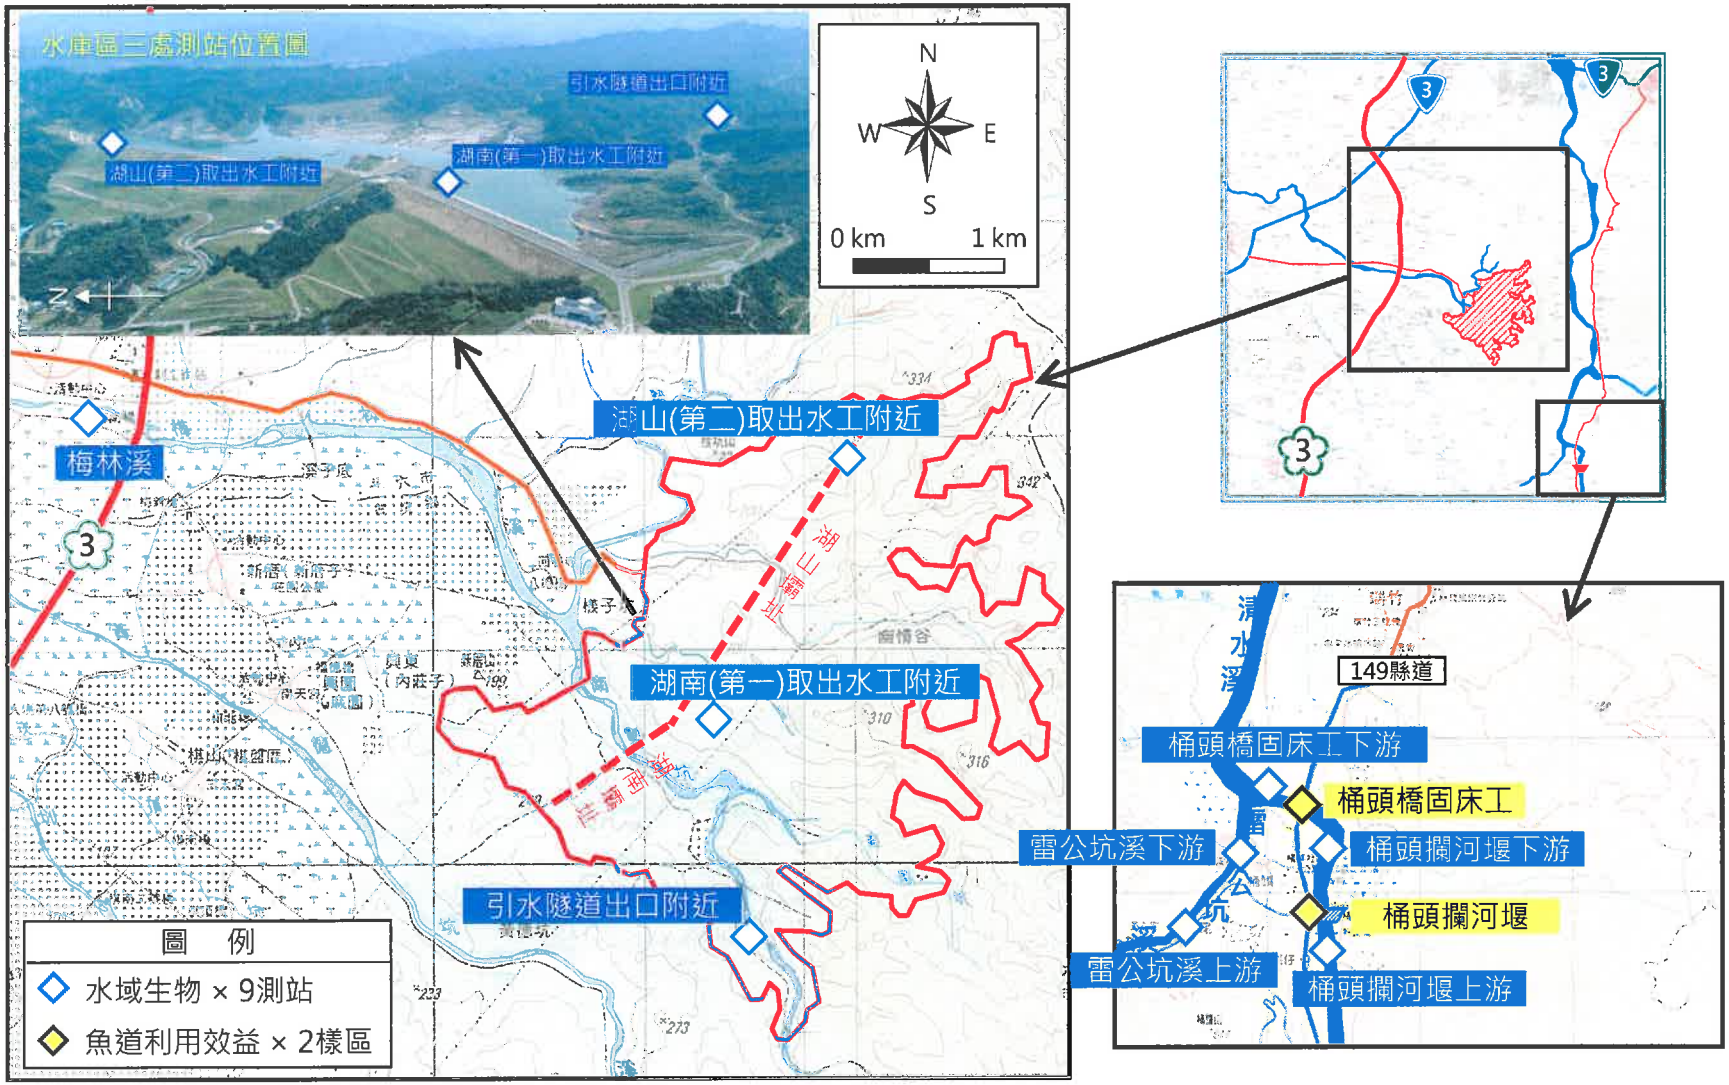

註：魚道利用效益監測於蓄水階段開始時依機關指示開始監測。

圖 1.4-7　本季生態監測測站位置圖(水域生物)

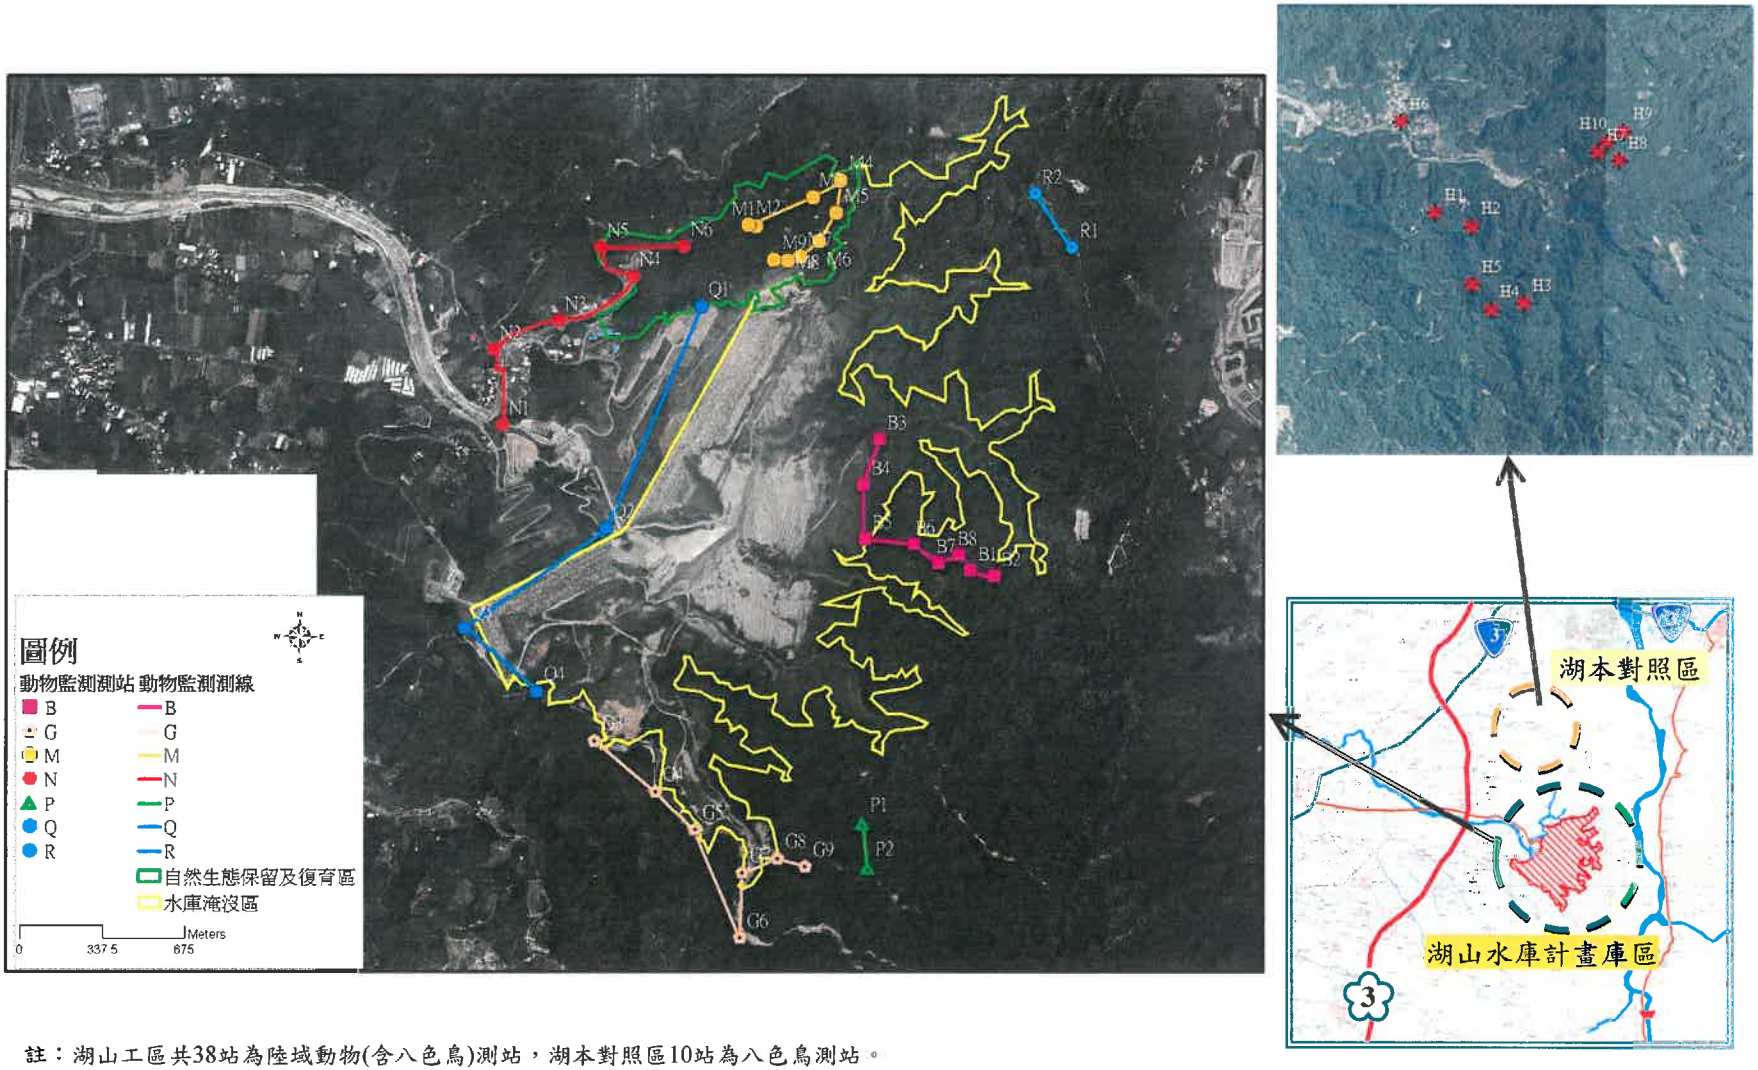

註：湖山工區共38站為陸域動物(含八色鳥)測站，湖本對照區10站為八色鳥測站。

圖 1.4-8 本季生態監測測站位置圖(陸域動物-庫區端、湖本對照區)

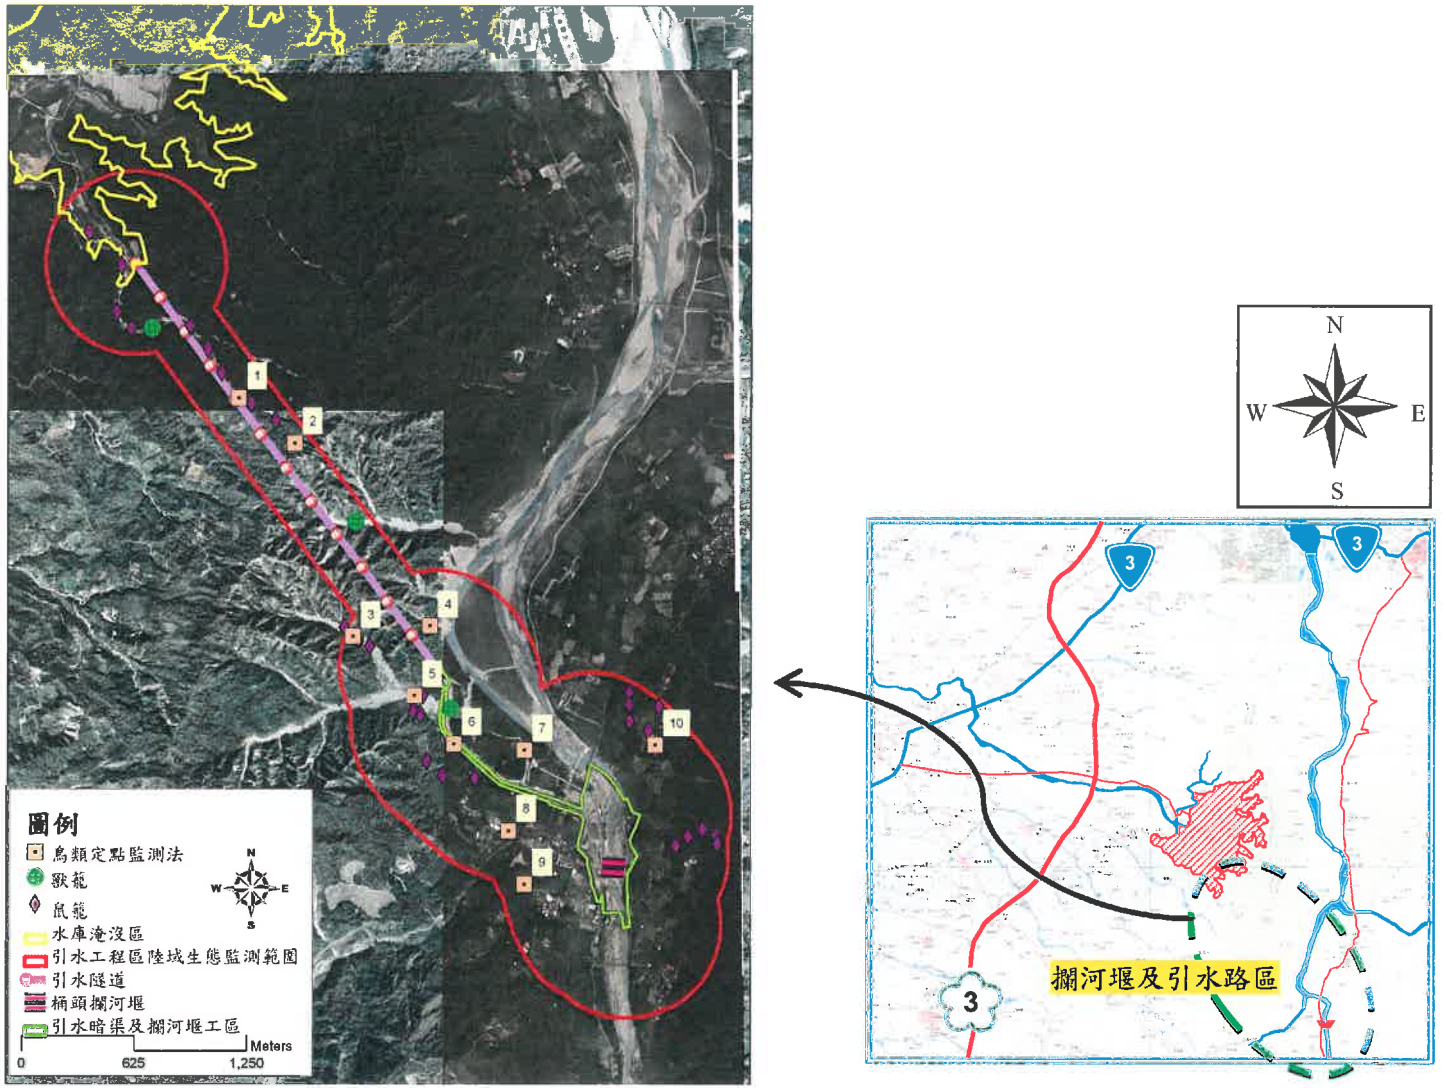

圖 1.4-9　本季生態監測測站位置圖(陸域動物-攔河堰、引水路)

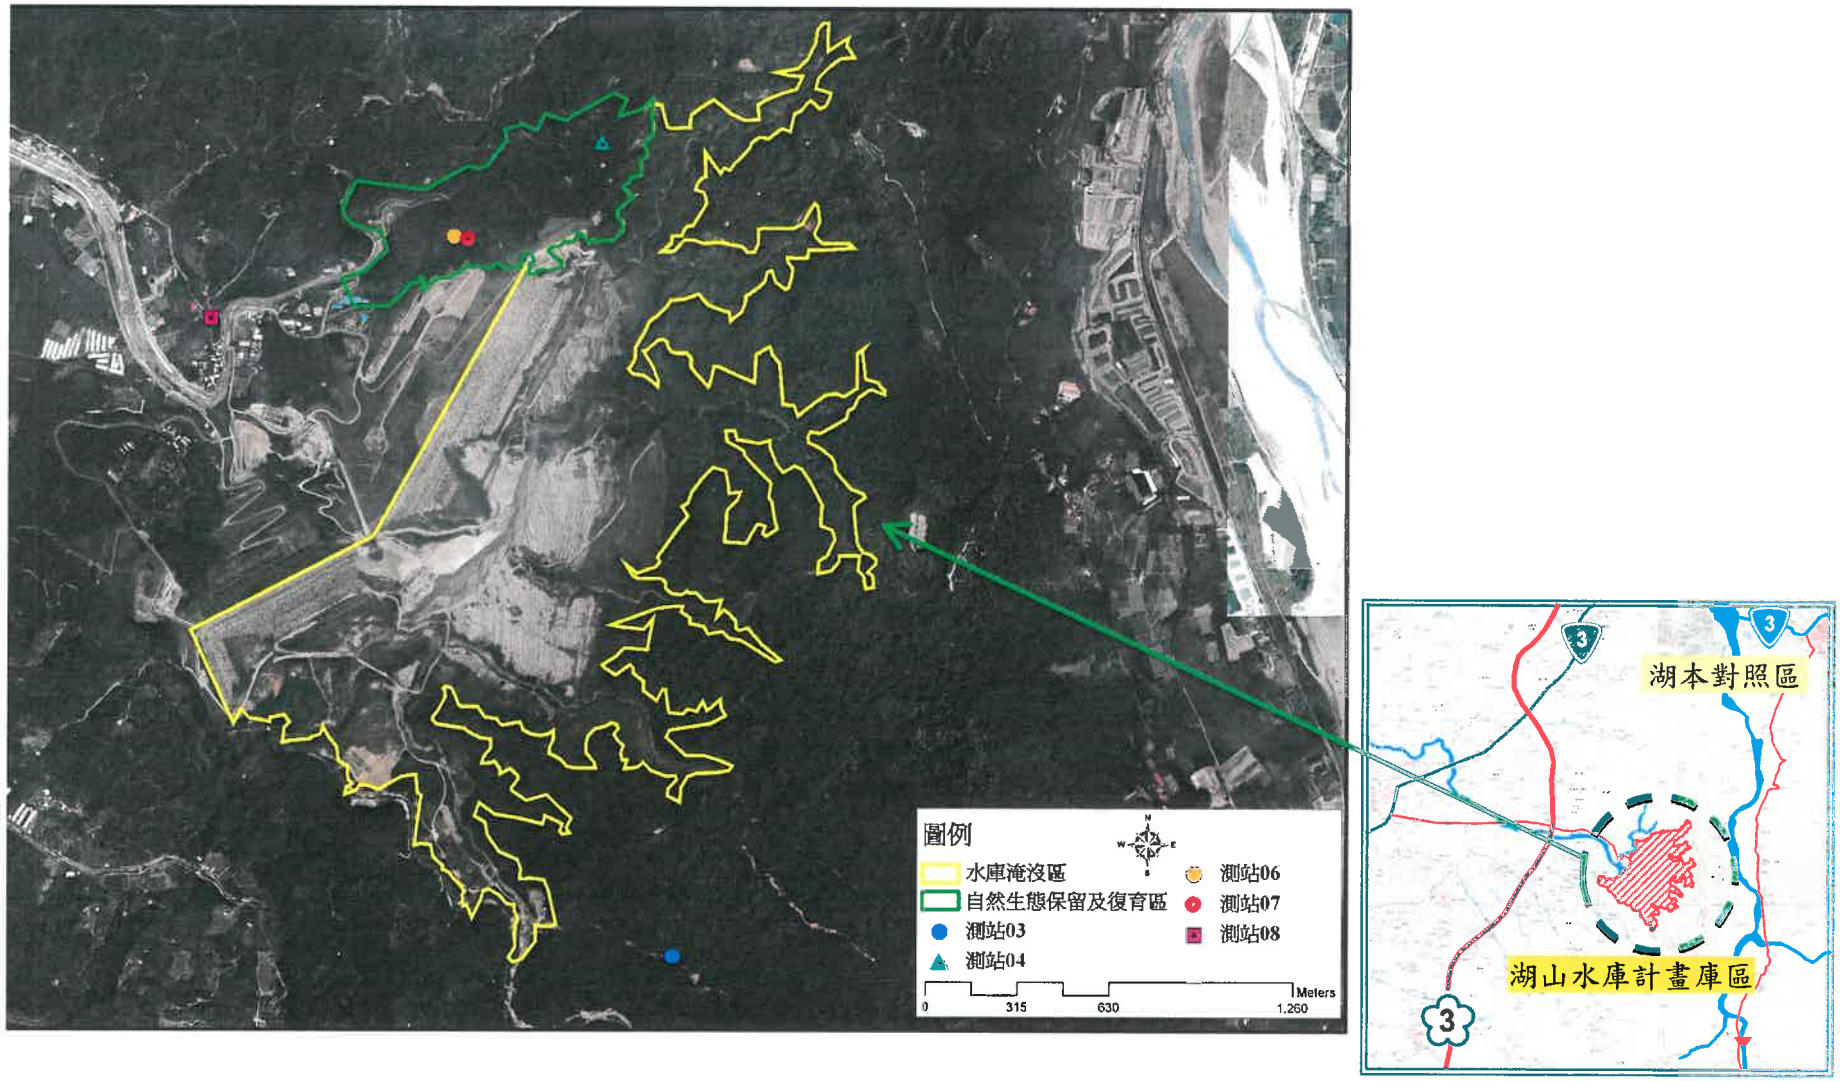

圖 1.4-10 本季生態監測測站位置圖(陸域植物-庫區端)

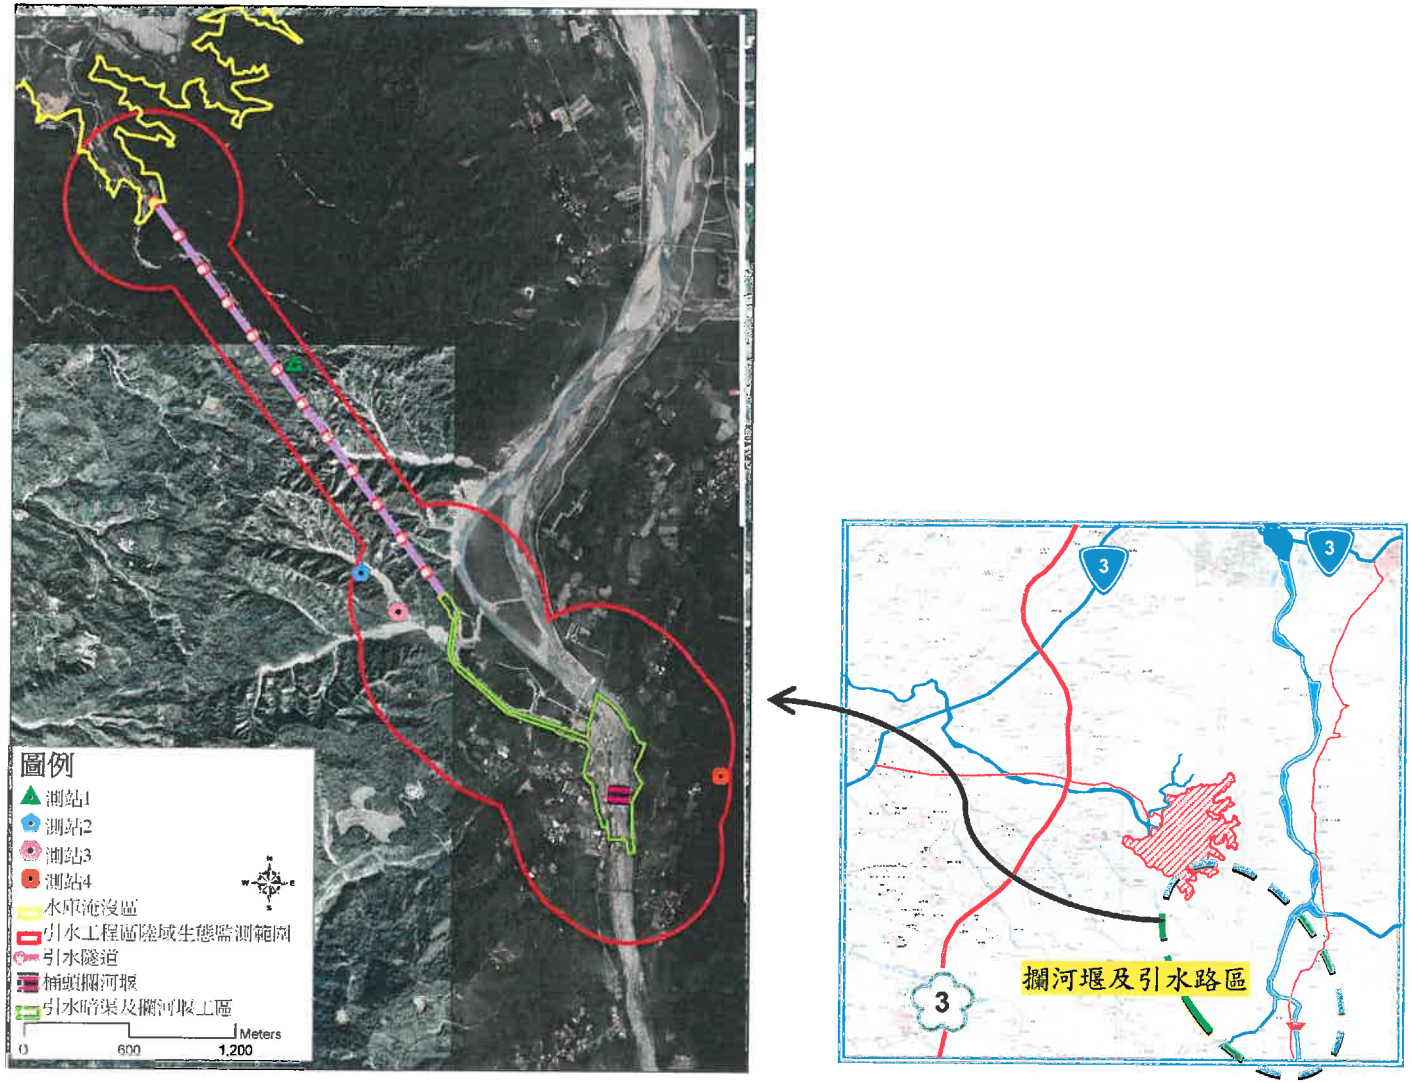

圖 1.4-11　本季生態監測測站位置圖(陸域植物-攔河堰、引水路)

1.5 品保/品管作業措施概要

環境品質監測計畫的執行，首重所得資料的正確與完整。本計畫建立了一套完整的品保(Quality Assurance, QA)及品管(Quality Control, QC)制度，以確保檢測分析結果的準確性。品質管制是利用標準作業程序，記錄存檔及校正措施，適當管制並改善監測數據品質的例行作業；項目包含採樣及檢驗工作、預防性維護、校正及修正措施等。品質保證則是保障數據的品質，亦即數據之精確性及準確性，藉以達到品質管制的成效；包括品管工作的查核、精密性檢查、準確性檢查。品保與品管作業計畫為任何一個監測工作中不可缺少之一環，執行品保與品管作業可以確保監測數據符合監測目標。

品保品管作業措施包括現場採樣之品保品管、分析工作之品保品管、儀器維修校正項目及頻率、分析項目之檢測方法及數據處理原則。以下依一般及特定項目之品保品管作業詳細說明如下。

一、一般品保品管

(一)現場採樣之品保品管

樣品採集、輸送及保存是品管步驟中重要的一環，確保所採集的樣品能分析出具有可信度的數據。故採樣作業流程依圖1.5-1所示，而採樣規劃前必須遵行以下幾點：

1.採樣前對檢測地點的了解。

2.依檢測項目不同，規劃採樣方法、人員及行程。

3.採樣前工作準備(儀器校正，藥品及樣品保存容器準備等)。

4.現場採樣之記錄

採樣人員到達現場後，依現場標準採樣方法操作，並正確無誤的填寫現場採樣記錄。採樣過程中任何異常狀況，都必須填寫於採樣記錄上，採取適當之應變措施。

5.樣品之運送、保存、交接

為避免樣品因化學性或生物性的變化而改變性質，故採樣與檢驗間隔的時間愈短，所得的結果愈正確可靠。若採樣後不能立刻檢驗，需將樣品密封處理，再以適當方法保存以延緩其變質。

(二)分析工作之品保品管

影響數據準確度和精密度之主要因素為：儀器設備校正之準確度、藥品管理、人員分析能力及分析方法之精密度，以上幾點可由檢驗室分析品管措施加以控制。優良的管制系統可維持分析數據的準確性及可追溯性，也可由分析中得知誤差來源並加以更正。

檢驗室之品管措施分為七大類：

1.空白分析

(1)野外空白：指在實驗室中將不含待測物之氣體、試劑水、吸收液、萃取液、吸附介質、濾材或相似基質者置入與盛裝待測樣品相同之採樣容器或其他適當之容器內，將瓶蓋旋緊攜至採樣地點，在現場開封並模擬採樣過程，但不實際採樣；密封後，再與待測樣品同時攜回實驗室。由現場空白樣品之分析結果，可判知樣品在採樣過程是否遭受污染。

(2)運送空白：與野外空白相同，惟此空白樣品於採樣現場不開封，或於採樣現場再將試劑水、吸收液或吸附介質裝入樣品瓶中密封。由運送空白樣品之分析結果，可判知樣品在運送過程是否遭受污染。

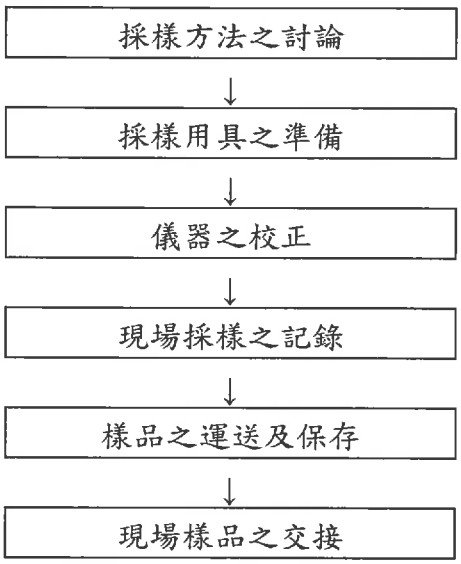

圖 1.5-1　採樣作業流程圖

(3)設備空白：指在現場使用過之採樣設備經清洗後，以不含待測物之試劑水或吸收液淋洗，收集最後一次之試劑水或吸收液的淋洗液者。由設備空白樣品之分析結果，可判知採樣設備是否遭受污染。

(4)方法空白：指為觀察整個分析過程中可能導入污染而設計之樣品，由方法空白樣品之分析結果，可判知樣品在分析過程是否遭受污染或樣品之背景值。

(5)分析空白：為一不含分析物之水溶液或試劑，伴隨每一分析批次，依同樣操作程序分析，以判知分析過程是否遭受污染之過程。每十個或每一批次(指少於十個)樣品至少做一個分析空白，分析空白值應不大於該檢驗方法偵測極限之二倍。

2.偵測極限

原則上每一年重新製作一次，但若因實驗分析上需要，可重新校正製作。

(1)儀器偵測極限(IDL)：以儀器商建議之 IDL 值為依據。

(2)方法偵測極限(MDL)：方法偵測極限是指某一待測物在99%可信度下可被量測及報告之最低濃度，在一個含待測物已知基質的樣品檢驗時，此濃度必需大於零。重覆配製 1～5 倍儀器偵測極限濃度之樣品，分析多組數據後求其標準偏差，換算相當濃度，則方法偵測極限等於 3 倍標準偏差之相當濃度。

3.檢量線製備

檢量線必須以檢驗方法上所規定之方法製備，並註明日期、標示方式、分析對象及標準溶液濃度，依此繪出座標曲線、直線之最小平方式及相關係數；可接受之相關係數應≧0.995，儀器對樣品的反應強度必須小於最高濃度的標準溶液，最低濃度的標準溶液宜與定量極限(約 3 倍 MDL 值)之濃度相當。

4.重覆分析

通常每一批次(少於 10 個樣品)或 10 個基質相同之樣品，至少有一樣品執行重覆分析。

5.添加標準品分析

將樣品等分為二，一部份直接依步驟分析之，另一部份添加適當濃度之標準品後再行分析，除另有規定外，通常每一批次(少於 10 個樣品)或 10 個基值相同之樣品，應同時分析一添加標準品之樣品。

6.查核樣品分析

將適當濃度之標準品，添加於試劑水或及他適當之物質中配製而成，除了另有規定外，通常每一批次(少於 10 個樣品)或 10 個基質相同之樣品，應同時分析一參考樣品。

7.標準添加法

加入一系列的參考標準品(至少兩種濃度)於樣品中，加以測試，並製作檢量線，以外插法來求得檢量線之濃度，此係針對基質干擾較大的樣品之分析方法。

(三)儀器維修校正項目及頻率

監測系統之品質管制包括多點校正、零點/全幅校正。校正的目的在建立一種介於污染物濃度真值和監測分析儀測量值之間的關係；爾後，則利用此關係來量測污染物的濃度。

1.多點校正：即零點及 3～5 點高幅濃度校正。零點校正為純空氣校正；而高幅濃度校正則由全幅濃度之氣體加入適量的純空氣來稀釋以達到欲採用之濃度以作校正。多點校正之實施必須始於監測分析儀安裝之初。

2.零點/全幅校正：即零點及 1 點高幅濃度(通常為全幅濃度的 70～90%)校正。此校正的目的在於評估儀器的偏移性、資料數據的真實可靠性、以及儀器是否需要作評估。零點/全幅校正必須每日實施。

(四)生態監測方法

配合湖山水庫工程計畫第四次環境影響差異分析報告之變更，自 101 年第 2 季起各項動物監測努力量則依據 100 年 7 月最新公告之動物生態評估技術規範，每次監測均進行三重複次數努力量，各項動物監測數量資料則以三次監測之最大值呈現。

1.陸域植物

(1)監測方式

在計畫影響範圍選擇自然度較高之區域劃設植物測站(每個測站大小為 10×10 公尺)，進行維管束植物種類，如原生、歸化(外來種)、栽植(外來種)、稀有及特有等監測；記錄其中胸高直徑(DBH)大於等於 1 公分之木本植物名稱、胸高直徑及株數，以及林下地被層之植物種類及覆蓋度，分析後以文字進行測站之結構層次、種類組成與主

要優勢種類等描述。

(2)鑑定及名錄製作

植物名稱及名錄主要依據「Flora of Taiwan」(Huang *et al.*, 1993-2003)製作。將野外採集所記錄之植物一一列出，依據科屬種之學名字母順序排序，附上中名，並註明生態資源特性(徐國士，1987，1980；許建昌，1971，1975；劉棠瑞，1960；劉瓊蓮，1993)。稀特有植物之認定則配合「植物生態評估技術規範」中所附之台灣地區植物稀特有植物名錄進行評估。

2.陸域動物

(1)鳥類

A.監測方法：湖山水庫計畫區係延續前期監測方式，以固定點監測，於每固定樣點停留 10 分鐘，記錄以 10×25 雙筒望遠鏡、目擊或聽見的鳥種及數量。有關數量之計算需注意該鳥類活動位置與行進方向，以避免對同一隻個體重複記錄；以鳴聲判斷資料時，若所有的鳴叫均來自相同方向且持續鳴叫，則記為同一隻鳥。而由於不同鳥類有其特定的活動時間，為避免遺漏所有可能物種，監測時段將區分成白天及夜間兩時段，以兩組人員進行監測為原則，白天時段於日出後三小時內完成；夜間時段則於七點至九點完成，夜間觀察時以大型探照燈輔以鳥類鳴聲進行觀察記錄。另外，針對 4～6 月八色鳥之監測，透過錄放反應法進行八色鳥之監測，監測時利用錄放器材於每個測點以回播方式，播放八色鳥聲音 5 分鐘，傾聽八色鳥回應之叫聲，記錄該時間內有回應的個體數量、方向、距離等相關資料，並從中交叉篩檢出合理的數量，以作為判斷族群數量的依據；由於天候不佳會影響鳥類活動及監測員判斷能力，因此監測期間將盡量在能見度佳、無雨及風速在微風以下的天候條件下進行。八色鳥監測方式，除延續前期監測方法外，亦將參考特生中心於湖山水庫之八色鳥監測方式(如執行時段從清晨至上午 10 點前等)；另配合湖山水庫工程計畫第五次環境影響差異分析報告之審查結論，自 102 年第 2 季起八色鳥監測於每年第 2 季(4~6 月)進行每月三次監測，原則上於每月上旬、中旬及下旬各進行 1 次監測，遇大雨或無法監測則順延，並視狀況加派人力。以利後續八色鳥數量之分析比對。此外，在引水道區域亦採用固定點監測，於每固定樣點停留 10 分鐘，記錄以 10×25 雙筒望遠鏡目擊或聽見的鳥種及數量。另外，配合

湖山水庫工程計畫第四次環境影響差異分析報告之變更，自 101 年第 2 季起鳥類監測努力量則參照 100 年 7 月最新公告之動物生態評估技術規範之精神，每次監測均進行三重複次數努力量。

B. 名錄製作及物種屬性判別：所記錄之鳥種依據 A.中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會審定之「2017 年台灣鳥類名錄」(2017)、B.行政院農業委員會於中華民國 106 年 3 月 29 日農林務字第 1061700219 號公告之「保育類野生動物名錄」，進行名錄製作以及判別其稀有程度、居留性質、特有種、水鳥別及保育等級等。

(2)哺乳類

A.監測方法：湖山水庫計畫區係延續前期監測方式，採用固定點監測與捕捉器捕捉法(Trapping)。配合鳥類監測時段，於每固定樣點停留 10 分鐘，並在既成道路上行進，此法主要用以尋覓哺乳類之活動痕跡，包括足跡、排遺、食痕、掘痕、窩穴、殘骸等跡相，據此判斷種類並估計其相對數量。於夜間則以強力探照燈搜尋夜行性動物之蹤跡，並輔以鳴叫聲進行記錄。捕捉器捕捉法是以薛氏捕鼠器及台灣製老鼠籠等誘捕籠進行小型鼠類誘捕，佈設地點同湖山庫區鳥類監測樣點。蝙蝠監測針對空中活動的蝙蝠類，若發現飛翔的蝙蝠，則藉由體型大小、飛行方式，再配合蝙蝠聲波偵測器偵測到的頻率範圍辨識種類及判斷數量。在引水道區域則使用台灣製松鼠籠陷阱、薛曼氏鼠籠(Sherman's trap)、Tomahawk 獸籠進行連續三個捕捉夜，陷阱佈設位置以 GPS 進行標定。另外，配合湖山水庫工程計畫第四次環境影響差異分析報告之變更，自 101 年第 2 季起哺乳類監測努力量則參照 100 年 7 月最新公告之動物生態評估技術規範之精神，每次監測均進行三重複次數努力量。

B. 名錄製作及物種屬性判別：所記錄之哺乳類依據 A.台灣生物多樣性入口網 http://taibif.tw/ (2017)，B.鄭錫奇等所著「臺灣蝙蝠圖鑑」(2015)，C.祁偉廉所著「台灣哺乳動物」(2008)以及 D.行政院農業委員會於中華民國 106 年 3 月 29 日農林務字第 1061700219 號公告之「保育類野生動物名錄」，進行名錄製作以及判別其稀有程度、特有種及保育等級等。

(3)兩棲爬蟲類

A.監測方法：延續前期監測方式，綜合目視遇測法及繁殖

地監測法，以每小時 1.5 公里的步行速度在既成道路上行進，於每固定樣點停留 10 分鐘，將目擊到的兩棲爬蟲類記錄下來。監測時段將區分成白天及夜間兩時段，日間時段約上午 8~10 時，夜間時段約 7~9 時(以兩組監測人員進行)。日間監測時，許多爬蟲類都有日間至樹林邊緣或路旁較空曠處曬太陽，藉此調節體溫之習性，因此採目視遇測法為主，徒手翻掩蓋物為輔。而繁殖地監測法則是在蛙類聚集繁殖的溪澗等處等候記錄，另著重於永久性或暫時性水域，直接檢視水中是否有蛙卵、蝌蚪，並翻找底質較濕之覆蓋物，看有無已變態之個體藏匿其下。夜間監測：同樣採目視遇測法為主，徒手翻掩蓋物為輔，以手電筒照射之方式記錄所見之兩爬類動物，若聽聞叫聲(如蛙類及部分守宮科蜥蜴)亦記錄之。另外，配合湖山水庫工程計畫第四次環境影響差異分析報告之變更，自 101 年第 2 季起兩棲爬蟲類監測努力量則參照 100 年 7 月最新公告之動物生態評估技術規範之精神，每次監測均進行三重複次數努力量。

B. 名錄製作及物種屬性判別：所記錄之種類依據 A.台灣生物多樣性入口網 http://taibif.tw/ (2017)，B.呂光洋等所著「台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)」(2002)，C.楊懿如所著「賞蛙圖鑑-台灣蛙類野外觀察指南(第二版)」(2002)、D.向高世等所著「台灣兩棲爬行類圖鑑」(2009)以及 E.行政院農業委員會於中華民國 106 年 3 月 29 日農林務字第 1061700219 號公告之「保育類野生動物名錄」進行名錄製作以及判別其稀有程度、特有種及保育等級等。

(4)蝴蝶類

A.監測方法：於本計畫動物監測測站(含水庫集水區 38 個測站及引水工程區 10 個測站)進行樣點設置，各測站採用定點監測法，每季次監測於選定樣點各進行一次監測，停留時間每樣點為 10 分鐘，監測時段為上午 9~11 時完成。主要以目視、捕蟲網捕捉並使用 10×25 雙筒望遠鏡輔助觀察，進行種類辨識。另外，配合湖山水庫工程計畫第四次環境影響差異分析報告之變更，自 101 年第 2 季起蝴蝶類監測努力量則參照 100 年 7 月最新公告之動物生態評估技術規範之精神，每次監測均進行三重複次數努力量。

B. 名錄製作及物種屬性判別：所記錄之種類依據 A. 台灣生物多樣性入口網 http://taibif.tw/ (2017)、B.徐堉峰

所著之「台灣蝶圖鑑第一卷、第二卷、第三卷」(2000, 2002, 2006)、C.濱野榮次所著「台灣蝶類生態大圖鑑」(1987)、D.張永仁所著之「蝴蝶 100：台灣常見 100 種蝴蝶野外觀察及生活史全紀錄（增訂新版）」(2007)、E.徐堉峰所著之「臺灣蝴蝶圖鑑(上)、(中)、(下)」(2013)以及 F.行政院農業委員會於中華民國 106 年 3 月 29 日農林務字第 1061700219 號公告之「保育類野生動物名錄」，進行名錄製作以及判別其稀有程度、特有種及保育等級等。

3.水域生物

(1)魚類

魚類之採集方式參考「動物生態評估技術規範」並視選定測站實際棲地狀況而定，適合本區水域環境的魚類監測採集包括下列方法；另外，配合湖山水庫工程計畫第四次環境影響差異分析報告之變更，自 101 年第 2 季起魚類監測努力量則依據行政院環境保護署 100 年 7 月最新公告之動物生態評估技術規範，每次監測均進行三重複次數努力量，而為避免水域生物之損傷，電器採集法則仍維持一次努力量。

A.手拋網法主要以樣區中的深水水域魚類的監測方式。手拋網尺寸為長度 3m，網目 2.5cm 寬，拋出距離 2~4m。取樣範圍在離岸 3~4m，水深 0.5~1m 處。手拋網以安全為第一考量，選擇河岸底質較硬以及可站立之石塊上下網，採範圍內選擇五個點，每點下二至三網。

B.蝦籠誘捕：於籠內放置餌料(豆餅與秋刀魚或狗罐頭、狗飼料等)以吸引魚類進入，於各測站分別設置 5 個籠具，並放置 3 夜，以捕捉足夠數量。籠具包括直徑為 12 公分，長度 32 公分以及直徑 20 公分，長度 37 公分兩種蝦籠共 4 具，加上 1 只 7 公尺長的長沉籠進行採集。

C.電氣採集法：為本計畫主要監測方式。適用於河川中、上游之小型溪流且水深較淺的水域，使用背負式電魚器電擊魚體，並配合手抄網撈捕。採樣時以右岸為測站，若右岸無法進行時則於左岸進行監測。每次監測操作三十分鐘或 100 公尺，以作為努力量。為避免水域生物之損傷，電器捕魚法每季每一測站，進行一次努力量。所有捕獲魚類除計數外，如有現場未能鑑定種類情形，將以數位相機拍攝其外觀型態及主要分類特徵作為鑑定依據，待拍攝記錄後則當場釋放。

D.名錄製作及物種屬性判別：所記錄之種類依據邵廣昭等主編的「2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(2008)、臺灣物種名錄網(TaiBNET)、中央研究院之台灣魚類資料庫(http://fishdb.sinica.edu.tw/)、沈世傑之「臺灣魚類誌」(沈世傑，1993)、林春吉之「臺灣淡水魚蝦生態大圖鑑(上)、(下)」、「臺灣河川溪流的指標魚類—兩側洄游淡水魚類」(陳義雄，2009a；2009b)、陳義雄等編著的「臺灣的外來入侵淡水魚類」(陳義雄等，2010)、邵廣昭、陳靜怡「魚類圖鑑-臺灣七百多種常見魚類圖鑑」(邵廣昭、陳靜怡，2005)以及行政院農業委員會於中華民國 106 年 3 月 29 日農林務字第 10617002191 號公告之「保育類野生動物名錄」，進行名錄製作以及判別其稀有程度、特有種及保育等級等。

(2)水生昆蟲

A.採集方法：參考行政院環保署之「動物生態評估技術規範」與環境檢院所共告之方法，水生昆蟲採集方法視選定測站實際棲地狀況而定將利用蘇伯氏採集網法與踢擊法進行採集。

蘇伯氏採集網法：參考 2011 年(100)環署檢字第 1000109874 號公告 NIEA E801.31C「河川底棲水生昆蟲採樣方法」，於溪流湍急環境採樣時在沿岸水深 50 公分內，以蘇伯氏採集網，採集 4 網，此網之大小為長寬高各 50 公分，網框以不銹鋼片製成，網袋近框處以帆布製成，網袋部分為 24 目(mesh，每公分 9 條網線，網孔大小為 0.595mm)之尼龍網製成。採集避免於大雨後一週內進行採集，並盡量避開河川人工構造物下游，最好選擇河床底質為卵石、礫石之處且水深不宜超過 50 公分左右。水生昆蟲採樣先在採樣處置放蘇伯氏採集網，將網框內之河床底質攪動，使其間之底棲昆蟲隨水流入網中。若有附著在石塊者，則用鑷子夾入標本瓶中或用刷子刷入網袋。將水生昆蟲網提起至岸邊挑蟲，挑蟲時較大型的水生昆蟲以鑷子夾取，而較小型的水生昆蟲則以毛筆沾水將其取出放入標本瓶內。

踢擊法：若於水庫區監測時，水深較深的情形下將輔以踢擊法進行採樣。踢擊法採集時，採集者面向上游，利用腳或手擾動底質，同時在下游的位置放置一具有長網柄(約 100 cm)底部有一長方形開口(長×寬×深約 45×25×25 cm，網目約 0.90mm)踢擊網，進行採集。

配合湖山水庫工程計畫第四次環境影響差異分析報告之變更，自 101 年第 2 季起水生昆蟲監測努力量則參照 100 年 7 月最新公告之動物生態評估技術規範之精神，每次監測均進行三重複次數努力量。

B.保存：採獲之水生昆蟲先以 70%酒精固定，記錄採集地點與日期後，帶回實驗室鑑定分類。標本瓶上記錄採樣時間、地點及採集者名字。樣品在 10 日內完成鑑定及計數。

C.鑑定：水生昆蟲分類主要參考津田(1962)、川合(1985)、松木(1978)、康(1993)、農試所(1996)、徐(1997)等研究報告。

(3)蝦蟹螺貝類

蝦蟹螺貝類之採集方式參考「動物生態評估技術規範」並視選定測站實際棲地狀況而定，適合本區水域環境的蝦蟹螺貝類監測採集包括下列方法；配合湖山水庫工程計畫第四次環境影響差異分析報告之變更，自 101 年第 2 季起蝦蟹螺貝類監測努力量則依據行政院環境保護署 100 年 7 月最新公告之動物生態評估技術規範，每次監測均進行三重複次數努力量。

A.螺貝類：主要使用徒手採集，以 1 平方公尺為採集面積。

B.蝦蟹類：主要使用蝦籠誘捕，於籠內放置餌料以吸引蝦、蟹類進入，於各測站分別設置 5 個籠具，放置 3 夜。

C.保存：可以鑑定種類當場記錄後釋放，無法鑑定物種則以數位相機拍照分類特徵同樣當場釋放，未能鑑定則以 5-10%之甲醛固定，攜回實驗室以顯微鏡觀察鑑定其種類及計數。

D.名錄製作及鑑定：所記錄之種類依據中央研究院生物多樣性研究中心之台灣貝類資料庫(http://shell.sinica.edu.tw/)、賴景陽之「貝類、貝類(二)」(賴景陽，1996；1998)、陳文德之「臺灣淡水貝類」(陳文德、吳錫圭，2011)、臺灣物種名錄網(TaiBNET)及邵廣昭等主編的「2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(2008)進行名錄製作。

(4)浮游植物

A.採樣方法及保存：採樣方法參考環檢所水中浮游植物採

樣方法-採水法(NIEA E505.50C)，選定採樣點，以定位設備確定採樣點位置，並記錄採樣位置之座標。以採水瓶採集水樣，取 1L 注入廣口塑膠瓶中，上面標示採樣地點、深度。採得水樣立即加入路戈氏碘液，最終濃度為 1%(即加入 10 mL)或中性福馬林，最終濃度為 3-5%。水樣瓶標記後放置暗處 4℃ 冷藏保存。水樣保存以三個月為限。

B.分析方法：鑑定分析前，均勻搖晃水樣，用量筒取 100 毫升水樣，利用抽氣幫浦以及硝酸纖維濾膜(孔徑 0.45μm，直徑 2mm)過濾水樣，之後將濾膜置於無塵處，令其乾燥。將乾燥後的濾膜剪半，置於玻片中央，並滴 2 滴香柏油(或其它可使濾膜透明化之油滴)，蓋上蓋玻片鏡檢計數。鏡檢次數以 3 次為主，若遇浮游植物數量過低時則增加至 5 次，再推算每 1 公升藻類數。

C.名錄製作及鑑定：所記錄之種類依據邵廣昭等主編的「2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(2008)與臺灣物種名錄網(TaiBNET)進行名錄製作。分類主要參考山岸(1998)、水野(1980)、胡與魏(2006)等圖鑑書籍。

(5)附著性藻類

A.採樣方法及保存：由於國內目前並無相關標準監測方法，因此為能比較歷次監測之資料，將沿用原有之方法進行採樣，於各測站設立 2 個 10cm×10cm 網格，共 200 cm^2 個點採集到的樣品，使用牙刷小心將網格內的附著性藻類刷下於含有 3 毫升 Lugol's Solution (Sournia, 1978)的蒸餾水(200 毫升)中予以固定，裝入冰桶低溫保存，攜回實驗室，以光學顯微鏡鏡檢，鑑定種別與計數。本項採集應避免於大雨後一週內進行。

B.分析方法：鑑定分析前，均勻搖晃水樣，取 1 毫升水樣，利用抽氣幫浦以及硝酸纖維濾膜(孔徑 0.45μm，直徑 2mm)過濾水樣，之後將濾膜置於無塵處，令其乾燥。將乾燥後的濾膜置於玻片中央，並滴 2 滴香柏油(或其它可使濾膜透明化之油滴)，蓋上蓋玻片鏡檢計數。該實驗重覆 5~10 次其物種之總合平均，再推算每 100 平方公分藻類數，為求實驗的精準本步驟將視附著性藻類的密度調整鏡檢次數，鏡檢次數以 3 次為主，若遇附著性藻類數量過低時則增加至 5 次，再推算每 100 平方公分藻類數。

C.名錄製作及鑑定：所記錄之種類依據邵廣昭等主編的

「2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(2008)與臺灣物種名錄網(TaiBNET)進行名錄製作。分類主要參考山岸(1998)、水野(1980)、胡與魏(2006)等圖鑑書籍。

(6)浮游動物

A.採樣方法及保存：：由於國內目前並無相關標準監測方法，因此為能比較歷次監測之資料，將沿用原有之方法進行採樣，以中型水桶在各測站採取 50 公升水樣，以網目 300 目的浮游生物採集網過濾濃縮，接著把過濾濃縮的浮游動物以蒸餾水(190 毫升)沖入採集瓶中，加入 10 毫升甲醛予以固定，放入冰桶低溫保存。配合湖山水庫工程計畫第四次環境影響差異分析報告之變更，自 101 年第 2 季起浮游動物監測努力量則參照 100 年 7 月最新公告之動物生態評估技術規範之精神，每次監測均進行三重複次數努力量。

B.分析方法：鑑定分析前，均勻搖晃水樣，接著取 1 毫升水樣，置於定量 1 毫升的細胞計數玻片上，以光學顯微鏡鏡檢，鑑定種別與計數。若浮游動物密度過低，將過濾所有水樣共 10 公升並計算所有觀察到之浮游動物。

C.名錄製作及鑑定：記錄之種類依據邵廣昭等主編的「2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(2008)進行名錄製作。分類主要參考山岸(1998)、水野(1980)等書籍。

(7)蜻蜓類

A.監測方法：參考「動物生態評估技術規範」採用穿越線監測法，採用沿線監測法，每次監測共進行三次重複，而為避免重複計數所造成之誤差，數量呈現取三次重複中最大數量。

B.監測時段：於上午 8~10 時完成。

C.監測路徑及行進速率：沿監測範圍內 1-2 公里內可及路徑行進，監測人員手持 GPS 定位所經航跡。行進速率時速小於 2 公里/小時。

D.記錄方法：主要以目視、捕蟲網捕捉並使用 10×25 雙筒望遠鏡輔助觀察，進行種類辨識。監測時，先以目視法或雙筒望遠鏡觀察現場出現之蜻蜓，若無法以目視法鑑定之相近種類則以捕蟲網進行掃網法採集，另以水網(網目一公釐)蒐集水中和水面上之蜻蛉目水蠆蛻殼作定性記錄，並配合圖鑑和檢索表來辨識種類。

E.名錄製作及物種屬性判別：所記錄之種類依據邵廣昭等主編的「2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵等，2008)、汪良仲所著之「台灣的蜻蛉」(汪，2000)、曹美華等所著之「臺灣 120 種蜻蜓圖鑑」(曹等，2005)行政院農業委員會於中華民國 106 年 3 月 29 日農林務字第 1061700219 號公告之「保育類野生動物名錄」以及 D.臺灣物種名錄網(TaiBNET)，進行名錄製作以及判別其稀有程度、特有種及保育等級等。

(8) 魚道利用效益監測

A.監測時段：依據清水溪歷年監測結果，9~12 月為洄游生物溯河的主要季節。因此在監測時間規劃上考量本河段洄游生物未溯河及溯河之季節進行採樣。上半年於 6 月進行未溯河季節監測，下半年則規劃於 11 月溯河季節監測。並確認監測前至少 7 天需無大環境變動(如颱風、豪大雨等)後再執行，以強化監測之代表性。

B.監測樣站：採樣點共設計為桶頭攔河堰 1 樣區(3 樣站)及桶頭固床工 1 樣區(3 樣站)，共 2 樣區(6 個樣站)，位置圖參見圖 2.5-15。

C.監測方法：依前述規劃共有 6 樣站，除攔河堰之魚道內樣站使用特製單向籠捕抓上溯動物外，其餘各站分設置 5 個籠具(蝦籠及長沉籠)。籠具內以新鮮的餌料為誘餌，監測當日將籠具施放於適當的位置，施放後隔 1 日再收取，並重複進行第二次監測。若樣點許可，監測中同時進行電氣採捕法，並配合手抄網撈捕，每次監測操作三十分鐘，以時間取代距離作為努力量。但是為防止補捉造成的族群衝擊，電氣採捕法僅以一次監測為限。魚道內部監測方法則參考曾晴賢執行斗六堰魚道監測之方法，並視現地狀況進行監測(巨廷工程顧問股份有限公司，2006；巨廷工程顧問股份有限公司 2008)。

D.分析方法：捕獲之樣品進行記錄種類、數量及個體之體長。透過每次生態監測成果，將各樣點分布記錄，掌握優勢物種或保育類物種(如埔里中華爬岩鰍、臺灣間爬岩鰍、臺灣鬚鱲、粗首馬口鱲、明潭吻鰕虎等)之活動區域，以 bubble plot 表示不同時間內特定物種族群變化；同時並利用統計軟體進行各樣點間魚類組成之群聚相似度分析，以瞭解攔河堰及桶頭固床工魚道上下游之魚種相似程度與關聯性。

E.測量方法：所捕獲之魚類及蝦類之形質測量，體長測量

在考量現場操作人員的便利性及生物的存活率，以測量全長的方式代替體長。

(五)數據處理原則

1.數據之分析程序與品管管制

對於本計畫中的每一檢驗項目，即所有的待檢污染物，應有適當的標準作業程序(Standard Operation Procedure, SOP)之參考資料，若無標準作業程序，則應提供相等的分析程序。

(1)分析人員進行分析前，先依分析類別之不同，參閱空氣標準檢測方法或水質標準檢測方法及採樣資料。

(2)於實驗分析中，必須配合品管步驟，將所使用之藥品量寫於記錄本，所有資料皆為 QC 記錄，應妥善保存以便備查。

(3)分析數據，經過品管要求及樣品分析後，若符合品管要求，則填寫於內部報告中並經分析組長及品管主管審核。

2.監測數據品質目標

監測數據組的品質先與評估標準作比對，以確認其數據可接受性。再以五種特性表示數據品質。

(1)精確性(Precision)－精確性為一定量的測量，描述一數據組具有的變異度大小。意謂著同一參數重覆測量的一致性。一般以百分比示之。

(2)準確性(Accuracy)－準確性為一定量的測量，描述數據組具有的偏差大小，意謂著真值與估計值得差距。一般以百分比示之。

(3)完整性(Completeness)－完整性指成功蒐集與欲蒐集的數據數量之比率。然而遺失的數據將會影響精確度與準確度，且降低該數據組歸納結論的可信度。一般是用百分比示之。

(4)比較性(Comparability)－比較性係指數據組中不同來源的數據，其相似之程度；以及不同數據組之間可比較程度。

(5)代表性(Representativeness)－表示蒐集到的數據是能準確地反映出樣品族群。然甄選須知中已明確規定採樣的位置，故監測儀器之位置是否具有代表性之問題，應不屬於本品質保證計畫之一部份。

二、特定項目品保品管作業

(一)物化環境之監測

1.採樣程序及工作方法

為確保環境檢測數據品質，除了在樣品檢測分析過程中執行品保品管作業外，更應注意樣品之採集、輸送及保存作業中所有步驟是否依據標準作業程序進行，惟有採集正確且不受污染或變質之樣品，其檢測結果方能代表受測環境的真實值。為達上述目的，採樣作業流程圖(圖 1.5-2 及圖 1.5-3)提供採樣人員從採樣作業開始至樣品送達實驗室接收為止之採樣標準作業程序。

(1)採樣前準備工作

實驗室受理的環境檢體來源均不相同，所以若每一件採樣工作進行前訂有週詳的規劃，對分析所得數據之研判將有莫大助益。

(2)樣品採樣作業

本計畫物化環境之監測項目包括：空氣品質、噪音振動、河川水質、工區放流水水質、交通量等。除依規定需在現場以標準操作程序即刻分析，以免性質起化學或物理性變化影響正確檢測值之測項外，其它檢驗項目所需保存之塑膠、玻璃瓶或容器，在實驗室內須事先清洗乾淨並晾乾備用，樣品之保存及保存試劑添加規定，於表 1.5-1 詳細說明。在樣品採樣作業上除遵照環保署所公告之標準方法進行外，並依照表 1.5-2 之採樣作業準則進行採樣工作。而交通流量之監測方法因環保署並無公告之方法，故參考交通部運輸研究所編定之台灣區公路容量手冊之方法及準則辦理交通流量監測。

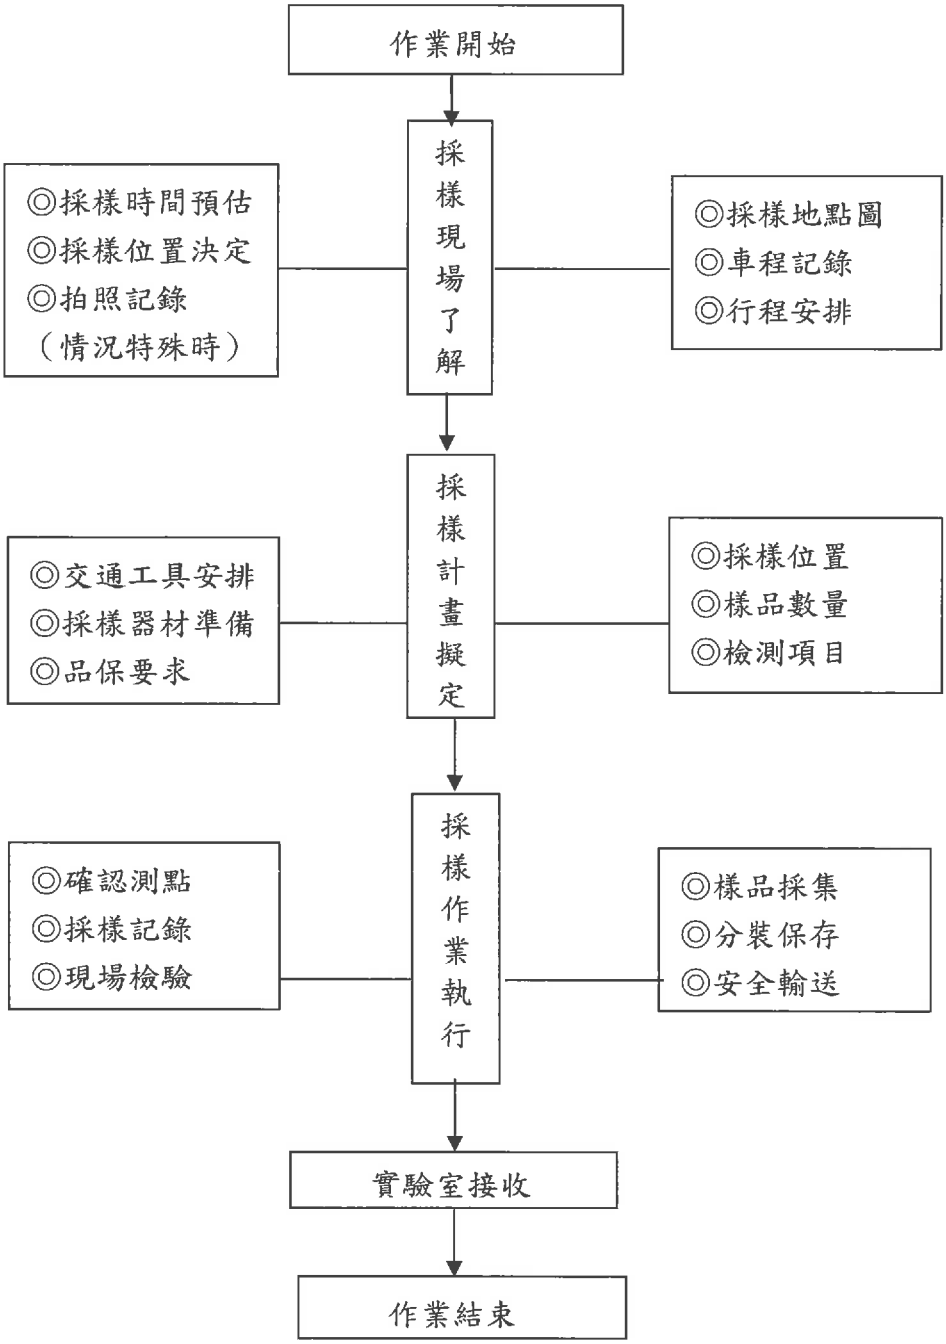
作業開始
採樣現場了解
◎採樣時間預估
◎採樣位置決定
◎拍照記錄
（情況特殊時）
◎採樣地點圖
◎車程記錄
◎行程安排
採樣計畫擬定
◎交通工具安排
◎採樣器材準備
◎品保要求
◎採樣位置
◎樣品數量
◎檢測項目
採樣作業執行
◎確認測點
◎採樣記錄
◎現場檢驗
◎樣品採集
◎分裝保存
◎安全輸送
實驗室接收
作業結束

圖 1.5-2　採樣作業流程

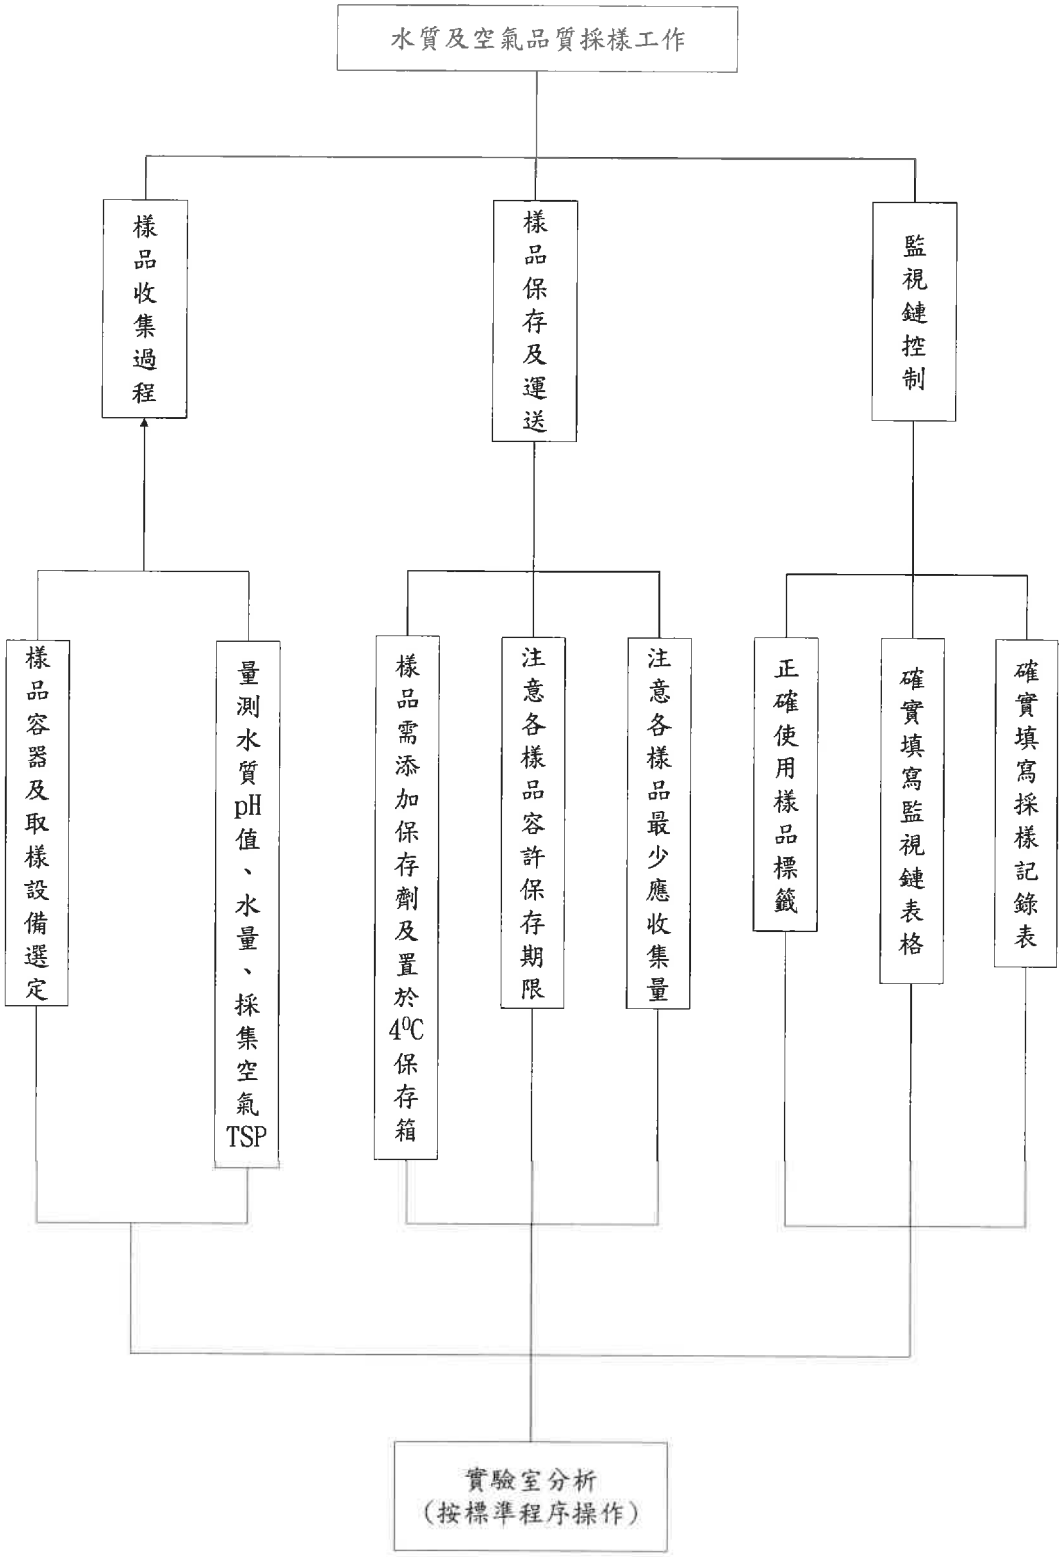

圖 1.5-3　樣品採集至分析作業流程

表 1.5-1 樣品保存方法及期限

檢驗項目	樣品最少需要量	容器	保存方法	保存期限
空氣中粒狀物	介質-濾紙	塑膠袋	置於塑膠袋保持乾燥。	30 天
導電度	500ml	—	若採樣後無法在 24 小時內測定完成，應立即以 0.45 μm 之濾膜過濾後，4℃冷藏並避免與空氣接觸。	—
pH 值	300 ml	玻璃或塑膠瓶	—	現場測定
溫度	1,000 ml	—	—	現場測定
懸浮固體	500 ml	抗酸性之玻璃或塑膠瓶	暗處，4℃冷藏。	7 天
氨氮	500 ml	玻璃或塑膠瓶	加硫酸使水樣之 pH <2，暗處，4℃冷藏。	7 天
溶氧	300 ml	BOD 瓶	採樣後立刻加入 0.7 mL 濃硫酸及 1 mL 疊氮化鈉溶液，在 10 ~ 20℃時以水封保存	8 小時
生化需氧量	1,000 ml	玻璃或塑膠瓶	暗處，4℃冷藏。	48 小時
化學需氧量	100 ml	玻璃或塑膠瓶	加硫酸使水樣之 pH＜2，暗處，4℃冷藏	7 天
油脂	1,000 ml	廣口玻璃瓶採集(採樣前廣口玻璃瓶先以清潔劑清潔，於清水洗淨後再以正己烷淋洗，以去除干擾)	若水樣於採樣後 2 小時內無法分析，以 1＋1 鹽酸或 1＋1 硫酸酸化水樣至 pH ＜ 2，並於 4℃冷藏。不得以擬採之水樣預洗。	28 天
總磷	100 ml	以 1+1 熱鹽酸洗淨之玻璃瓶	加硫酸使水樣 pH ＜ 2，暗處，4℃冷藏。	7 天
總磷	100 ml	以 1+1 熱鹽酸洗淨之玻璃瓶	加硫酸使水樣 pH ＜ 2，暗處，4℃冷藏。	7天
氯鹽	50 ml	使用清潔並經試劑水清洗過之塑膠瓶或玻璃瓶，並用擬採集之水樣洗滌二至三次	—	28 天
真色色度	100 ml	使用清潔並經試劑水清洗過之塑膠瓶或玻璃瓶，並用擬採集之水樣洗滌二至三次	暗處，4℃冷藏	儘可能在最短時間內分析；若無法即時分析，水樣應於 48 小時內完成分析
農藥 (Pesticides)	1,000 ml	以褐色玻璃瓶或以鋁箔紙包裹等避光方式處理之玻璃瓶盛裝樣品，並須附鐵氟龍內墊之蓋子。	不得以擬採之水樣預洗。保存方法因種類而異，請依公告檢測方法規定行之。	水樣應於 72 小時內完成萃取，萃取後於公告檢測方法規定期限完成分析

表 1.5-2 採樣作業準則

採樣項目	作業準則
空氣品質	1.監測站宜尋找空曠地點，附近儘可能遠離建築物及樹林。 2.遠離交通要道，以避免受交通工具排放污染物之影響。 3.須有便利之電源供應及容量應符合需要。 4.測站附近不應有大型工作機具。
水質	1.承受水體監測點以選擇施工路段與溪流會合處。 2.放流水水質以採集各工區之廢水及臨時排水排放口。 3.採集水質會合，以採集穩定混合均勻且具代表性水為主。 4.採集河川水或淨水池內之水樣時，以採集混合均勻，深度為水深之 0.6 倍的水樣為主。
噪音	1.測定高度：聲音感應器置於離地或樓板 1.2 至 1.5 公尺之間。 2.測量地點： (1)測量地點在室外者，距離周圍建築物 1~2 公尺。 (2)道路邊地區：距離道路邊緣 1 公尺處。但道路邊有建築物者，應距離最靠近之建築物牆面線向外 1 公尺以上。
振動	測定地點： (1)無緩衝物，且踩踏十分堅固之堅硬地點。 (2)無傾斜或凹凸之水平面。 (3)不受溫度、電氣、磁氣等外圍條件影響之地點。
營建噪音	1.測定高度：聲音感應器置於離地或樓板 1.2 至 1.5 公尺之間，接近人耳之高度。 2.測量地點：以工程周界或周界外 15 公尺位置測定之。

(3)樣品保存及輸送應注意事項

空氣中之 TSP 則經由高量空氣採樣器採樣後之濾紙以較長之一邊(約 25cm)對摺，將粒狀物採集面摺於內，放入封套中取回檢驗。

樣品採集、輸送的過程當中，應使傳遞人員減至最少，由一採樣負責人詳實填寫採樣記錄表，並負責管理整批樣品之點收、包裝及傳送，樣品瓶應保存於保溫冰筒中，整批攜回實驗室，採樣記錄表亦隨此批樣品同時送回，由樣品管理員接收。詳細採樣至運輸過程中注意事項請參考表 1.5-3。

樣品管理員接收樣品時，須查看樣品是否密封保存，並檢查樣品瓶有無破損或漏失水樣，待所有樣品檢查完畢，即簽名以示負責，並記錄收樣日期及時間後，將樣品置於指定之冰箱內，並填寫監視鏈記錄表，以便日後樣品之管理追蹤。

2.樣品管制

樣品管制應自樣品採集、保存、運送、接收再到樣品之

處理分析，乃至於檢測後樣品之棄置，因此為了取得代表性之樣品，避免採集後樣品受污染，增加實驗分析之可信賴度，那麼確實做好樣品管制工作便是一重要之程序。

3.檢驗程序

樣品進入實驗室即執行樣品檢測作業，每步驟均詳實記錄於檢驗記錄表格，並經專責人員審核檢測數據及品質管制合格後，檢測報告才由實驗室主任覆核簽名交付委託單位。

表 1.5-3 採樣至運輸過程中注意事項

A.水質採樣

採樣程序	目的	注意事項
清洗採樣設備	洗淨採水器以便採取足夠代表該水層之水樣。	須用蒸餾水清洗採樣器。
採樣	自水體採取水樣時，應確保水樣化學性質受干擾的程度至最低。	在採取對氣體敏感性較高之項目時，如：溶氧，宜避免有氣泡殘存。
過濾與保存	欲測定水中溶解物質必須先經過濾，且應儘速於採樣後進行，此步驟可視為樣品保存方式之一。而樣品保存則是為避免水樣在分析前變質(如揮發、反應、吸附、光解等)。	依各分析項目添加適當之保存試劑及使用清淨之容器保存樣品。
現場測定	為確保取出樣品為具代表性一些指標於取樣後應儘速分析。	pH 值應於現場立即進行分析。
樣品保存與運輸	樣品分析前應依樣品保存方式，予以保存，裨使化學性質變化減至最小。	需遵照環保署所公告之樣品保存方法與時間，在限定時間內將樣品送達實驗室進行分析。

B.空氣品質採樣-TSP、PM_{10}、$PM_{2.5}$

採樣程序	目的	注意事項
現場記錄	了解採樣當天現場一些可能造成之干擾。	必須將氣象資料，周界環境因子詳加記載。
穩定/校正	確保分析所得之數據具有代表性。	使用儀器前必須先經流量校正。
採樣	採樣時必須先行開機運轉，避免本身機件之誤差。	使用測定前預先開機運轉至流量穩定，才開始測定 24 小時之值。
運送空白	為確保分析結果之正確性，每次均有一組運送空白樣品。	以運送空白，瞭解運送過程之完整性。
儲存/運送	避免樣品因儲存時間過久或是運送不當，造成品質變化。	依照環保署所公告規定項目保存方式加以運送保存，並注意密封時之完整性。

表 1.5-3 採樣至運輸過程中注意事項(續)

C.噪音振動監測

採樣程序	目的	注意事項
器材清點	確保器材設備之完整性。	填寫儀器使用紀錄表。
確定音位校正有效期	保證監測數據標準可追溯性。	檢查儀器校正資料。
現場架設	完成設備組裝。	1.依現勘選定之測點進行監測，並依噪音管制規定之準則來架設。 2.接上電源將噪音計調整高度至 1.2 M ~ 1.5 M。
電子式校正	確保儀器之穩定性。	利用 NL-18、NL-31、NL-32、NA-28 內設電子訊號，由內部資料蒐集系統讀取反應值。
儀器設定	依計畫需求設定資料輸出模式。	噪音採用 A 加權，動特性為 Fast，每秒讀取 1 筆資料。

4.檢驗方法

(1)空氣品質：如表 1.5-4。

(2)噪音監測：如表 1.5-5。

(3)河川水質、工區放流水水質：如表 1.5-6。

表 1.5-4 空氣品質分析項目之檢測方法

分析類別	分析項目	檢測方法	方法偵測極限	儀器偵測極限
空氣品質	總懸浮微粒(TSP)	NIEA A102.12A	—	—
	懸浮微粒 PM_{10}	NIEA A206.10C	—	—
		NIEA A208.12C		
	一氧化碳	NIEA A421.12C	—	0.05 ppm
	二氧化硫	NIEA A416.12C	—	0.4 ppb
	氮氧化物	NIEA A417.11C	—	0.5 ppb
	臭氧	NIEA A420.11C	—	—
	碳氫化合物	NIEA A740.10C	—	—

表 1.5-5 噪音監測分析項目之檢測方法

分析類別	分析項目	分析項目	精密度	準確性	完整性	儀器偵測極限
噪音	L_{eq}、L_{max}、$L_{夜}$、$L_{日}$、$L_{晚}$、L_x	NIEA P201.96C	±0.7 dB	±1.0 dB	75 %	30 dB (A)
振動	Lv_{eq}、Lv_{max}、$Lv_{日}$、$Lv_{夜}$、Lv_x	NIEA P204.90C	±0.7 dB	±1.0 dB	75 %	30 dB

(二)生態環境之監測

1.監測時程之一致性

生態監測主要是以現場觀察為主，監測結果除會受到天候和季節性的影響外，也會受到人為的干擾，遂改變生物出現或發生的頻率。因此為使生態監測的數據具代表性，監測的時程之一致性與監測位置受干擾之情況可作為每次監測結果之重要依據。

2.計畫路線踏勘與採用方法

在監測前需依監測區域的環境背景，並參考當地相關資料，依自然度之區分程度擬定具代表性監測樣線及監測方法。現場踏勘時除檢視相關環境之細微變化外，也加以記錄未來可能變動之環境位置。另外，也於踏勘過程中規劃各監測項目採用的器具與位置之適合性。

3.採樣及分析作業

(1)每個監測樣線或採樣地點均於地圖上標定清楚，並以 GPS 於地圖上標定，水域可以浮標、繫繩下垂重物著水底明確標示使每個採樣固定的地點，唯恐標記隨洪水流失，可加註 GPS 並拍照佐證。

(2)每次採樣之標本皆以最新的圖鑑及文獻資料鑑定。

(3)每次野外監測均詳實記錄並在每次監測後拍照存證。

4.工作日誌的考核與追蹤

監測人員於監測及分析工作過程中均攜帶工作日誌，內容則為記載監測時期發生之現場狀況。工作日誌於監測工作結束後三日內連同原始監測記錄表交由各該案負責人員簽名並審核執行或異常狀況，以做為後續執行參考。

表 1.5-6 水質分析項目之檢測方法

序號	檢驗項目	檢驗方法 (NIEA)	單位	方法偵測極限	重複分析差異百分比 (精密度) (%)	查核分析回收率 (準確度) (%)	樣品添加分析回收率 (準確度) (%)	完整性 (≧%)
1	水溫	W217.51A	℃	—	—	—	—	95
2	pH	W424.52A	—	—	±0.2	—	—	95
3	導電度	W203.51B	μmho/cm	—	—	—	—	—
4	總懸浮固體	W210.58A	mg/L	<1.0*	≦10；濃度≧25mg/L	—	—	95
5	溶氧量	W455.52C	mg/L	<1.0*	≦20	—	—	95
6	生化需氧量	W510.55B	mg/L	<1.0*	≦15	80-120	—	95
7	化學需氧量	W517.52B	mg/L	3.1	≦20	85-115	75-125	95
8	氯鹽	W406.52C	mg/L	1.4	≦15	80-120	75-125	95
9	大腸桿菌群	E202.55B	CFU/100mL	<10	註 1	—	—	95
10	油脂	W506.21B	mg/L	<1.0	—	—	—	95
11	總磷	W427.53B	mg/L	0.012	≦15	80-120	80-120	95
12	氨氮	W437.52C	mg/L	0.1	≦15	80-120	80-120	95
13	葉綠素 a	E508.00B	μg/L	0.1	—	—	—	—
14	安殺番	W605.53B	mg/L	0.00003	≦20	80-120	70-130	95
15	靈丹		mg/L	0.00003	≦20	80-120	70-130	95
16	丁基拉草	W645.50A	mg/L	0.00027	≦20	80-120	70-130	95
17	2,4-D	W642.50A	mg/L	0.00023	≦20	75-125	75-125	95
18	巴拉刈	W641.51A	mg/L	0.0010	≦15	85-115	80-120	95
19	納乃得	W635.51C	mg/L	0.00310	≦20	80-120	70-130	95
20	加保扶		mg/L	0.00346	≦20	80-120	70-130	95
21	滅必蝨		mg/L	0.00264	≦20	80-120	70-130	95
22	達馬松	W610.52B	mg/L	0.0022	≦20	80-120	70-130	95
23	大利松		mg/L	0.0010	≦20	80-120	70-130	95
24	巴拉松		mg/L	0.0013	≦20	80-120	70-130	95
25	一品松		mg/L	0.0010	≦20	80-120	70-130	95

5.分析方法

(1)陸域植物

於每季監測之植物測站資料輸入電腦，對植種組成計算以下各值：

A.重要值指數及覆蓋度計算

利用 Excel 統計測站內，木本植物各徑級之密度及其 IV 值；草本植物則計算各物種之相對覆蓋度。

(A)木本植物之重要值指數(IV)

IV=(相對密度+相對優勢度利用相對底面積代表)×100/2

相對密度=(某一物種的株數/所有測站全部物種之株數)

相對面積=(某一物種的面積/所有測站全部物種之面積)

(B)草本植物之相對覆蓋度

相對覆蓋度=(某一物種覆蓋度/所有物種覆蓋度)×100

B.均勻度分析

均勻度指數是以生物社會的豐富度及均勻程度的組合所表示。此處以 S、Simpson、Shannon、N1、N2 及 E5 六種指數表示之。木本植物以株數計算，草本植物則以覆蓋度計算。另有估計出現頻度，即某植物出現之測站數除以總測站數。

(A) S 代表研究區域內的所有種數。

(B) λ：Simpson 指數

$$\lambda = \sum \left(\frac{n_i}{N} \right)^2$$

ni：某種個體數

N：所有種個體數

ni/N 為機率，表示在一測站內同時選出兩棵，其同屬於同一種的機率是多少。其最大值是 1；如果優勢度集中於少數種時，λ 值愈高。

(C) H'：Shannon 指數

$$H' = -\sum\left(\frac{n_i}{N}\right)ln\left(\frac{n_i}{N}\right)$$

此指數受種數及個體數影響，種數愈多，種間的個體數量愈平均，則值愈高。但較無法表現出稀有種。

(D) $N_1 = e^{H'}$

H'：Shannon 指數，此指數指示植物社會中最具優勢的種數。

(E) $N_2 = \frac{1}{\lambda}$

λ 為 Simpson 指數，此指數指示植物社會中最具優勢的種數。

(F) $E5 = \frac{N_2 - 1}{N_1 - 1}$

此指數可以明顯的指示出植物社會組成的均勻程度。指數愈高，則組成愈均勻；反之，如果此社會只有一種時，指數為 0。

(2)陸域動物、水域生物

將現場監測所得資料整理與建檔，再將所有資料繪製成圖表，並適時提供相關優勢物種及稀有物種之圖片，以增進閱讀報告之易讀性，並依據其存在範圍、出現種類及頻率，嘗試選擇其指標生物，以供分析比較；相關之數據運算，平均值均採用算術平均值。多樣性指數分析則採用 Shannon-Wiener's diversity index (H')，均勻度指數則採用 Shannon-Wiener's evenness index (E)如下。

A. Shannon-Wiener's diversity index (H')

$$H' = -\sum(P_i \times lnP_i)$$

$$P_i = \frac{N_i}{N}$$

Ni：為 i 種生物之個體數

N：為所有種類之個體數

H'指數數值範圍多介於 1.5~3.5 之間，可綜合反映一群聚內生物種類之豐富程度及個體數在種間分配是

否均勻。此指數越大時表示此地群落之物種越豐富，即各物種個體數越多越均勻，代表此群落歧異度較大，若此地群落只由一物種組成則 H'值為 0。通常成熟穩定之生態系擁有較高的歧異度，且高歧異度對生態系的平衡有利，因此藉由歧異度指數的分析，可以得知監測區域是否為穩定成熟之生態系。

B. Shannon's evenness index (E)

$$E = \frac{H'}{lnS}$$

S：為所出現的物種總數

E 指數數值範圍為 0~1 之間，表示的是一個群落中全部物種個體數目的分配狀況，即為各物種個體數目分配的均勻程度。當此指數愈接近 1 時，表示此監測環境的各物種其個體數越平均，優勢種越不明顯。

(3)水質指標(魚類)

生態系統係由藻類、浮游動物、水生昆蟲、軟體動物、甲殼類及魚類等生物組成的複雜有機體系統。由於藻類、浮游動物、水生昆蟲、軟體動物、甲殼類及魚類的生命週期不同。因此，當一個區域水質開始改變時，往往是短生命週期的藻類先行改變，其次是底棲生物(水生昆蟲、軟體動物及甲殼類)，最後才是魚類。因此水質化學檢測結果係反應採樣當時的水質狀況。舉例來說，若以藻類為生物指標，反應的是過去數小時到數天的平均水質狀況；以底棲昆蟲為生物指標，所反應的是過去數天或數週到數月之平均水質狀況；以魚類為生物指標，則反應的是過去數月到數年的平均水質狀況。再者，水環境中的任何一個因子，都不能單獨影響水生生物，水質的評估，也是根據多個因子而予以評定。因此，單一性的生物指標已經不足以用來評價完整的環境狀況。藉此，環境影響評估進行時也需透過許多生物指標進行多面向的評估。然而，應用多項生物組成作為水質指標，除了要有種類鑑定能力外，需有一定專業訓練才有辦法判讀其結果。

一般來說，生物指標需對於環境的適應性是狹適性的，才可反映出環境的實際情形。例如官田菱角田的臺北赤蛙，對於水質污染的耐受性低，只要水質出現污染狀況便無法存活，也會將影響反映到族群數量的改變。水域環境則如河流底棲大型無脊椎動物(水棲昆蟲、貧毛類、螺貝類與蝦蟹類等)，由於具有分佈廣、種類多、活

動力不強、生活史夠長(相較於浮游動植物)、可與河床沈澱物相互作用等特性，因此相當適合作為環境指標。本計畫將結合各類生物指標，利用魚類生物整合性指標法（Index of Biotic Integrity, IBI）、科級生物指標(Family-Level Biotic Index, FBI)、河川附著藻類腐水度指數(Saprobity Index, SI)與藻屬指數(Generic Index,GI)提出綜合評估。

魚類生物整合性指標法（Index of Biotic Integrity, IBI）的分析法中發展 12 個表現種類的豐富與組成、種類的忍受度、食性組成、生殖行為、數量的豐度及魚類的健康狀態等之分析矩陣，以此進行整治環境影響評估(Karr, 1981; Teels, 2002)。由於國內魚種與國外魚種屬性不同及研究需求不同，因此應用 12 項矩陣。評估矩陣所需之生物特性對照國內文獻，溪流魚類特性表如表 1.5-7 所示；本法中以 12 項指標矩陣調查的現況來綜合給分，其評分標準如表 1.5-8 所示；最後將各項積分累加，將求得之 IBI 值與生物狀態劃分為四個狀態等級，等級劃分如表 1.5-9。

表 1.5-7 溪流魚類特性表

魚種	食性層	耐受性	棲性	外來種
鰻鱺科 Anguillidae				
花鰻鱺 *Anguilla marmorata*	肉食性	M	B	
鱨科 Bagridae				
脂鮠 *Pseudobagrus adiposalis*	肉食性	I	B	
爬鰍科 Balitoridae				
纓口臺鰍 *Formosania lacustre*	雜食性	I	B	
臺灣間爬岩鰍 *Hemimyzon formosanus*	雜食性	I	B	
鱧科 Channidae				
斑鱧 *Channa maculata*	雜食性	H	B	
麗魚科 Cichlidae				
巴西珠母麗魚 *Geophagus brasiliensis*	雜食性		W	Introduced
莫三比克口孵非鯽 *Oreochromis mossambicus*	雜食性	H	W	Introduced
吉利非鯽 *Tilapia zillii*	雜食性	H	W	Introduced
塘虱魚科 Clariidae				
鬍鯰 *Clarias fuscus*	肉食性	H	B	
花鰍科 Cobitididae				
中華鰍 *Cobitis sinensis*	雜食性	M	B	
泥鰍 *Misgurnus anguillicaudatus*	雜食性	H	B	
鯉科 Cyprinidae				
臺灣石鰟 *Acrossochelius paradoxus*	雜食性	M	W	
臺灣鬚鱲 *Candidia barbata*	雜食性	I	W	
鯽 *Carassius auratus auratus*	雜食性	H	W	
高體高鬚魚 *Carassius cuvieri*	雜食性	H	W	Introduced
紅鰭鮊 *Chanodichthys erythropterus*	肉食性	M	W	
鯉魚 *Cyprinus carpio carpio*	雜食性	H	W	Introduced
圓吻鯝 *Distoechodon tumirostris*	雜食性	M	W	
唇鱎 *Hemibarbus labeo*	食蟲性	M	W	
白鱎 *Hemiculter leucisculus*	雜食性	H	W	
短吻小鰾鮈 *Microphysogobio brevirostris*	雜食性	M	B	
臺灣白甲魚 *Onychostoma barbatulum*	雜食性	I	W	
粗首馬口鱲 *Opsariichthys pachycephalus*	雜食性	M	W	
羅漢魚 *Pseudorasbora parva*	雜食性	M	W	
高體鱒鮀 *Rhodeus ocellatus ocellatus*	雜食性	M	W	
革條田中鱒鮀 *Tanakia himantegus*	雜食性	M	W	
平頷鱲 *Zacco platypus*	雜食性	M	W	Introduced

魚種	食性層	耐受性	棲性	外來種
鰕虎科 Gobiidae				
明潭吻鰕虎 *Rhinogobius candidanus*	雜食性	M	B	
大吻鰕虎 *Rhinogobius gigas*	雜食性	M	B	
極樂吻鰕虎 *Rhinogobius giurinus*	雜食性	M	B	
短吻紅斑吻鰕虎 *Rhinogobius rubromaculatus*	食蟲性	I	B	
日本瓢鰭鰕虎 *Sicyopterus japonicus*	食藻性	I	B	
甲鯰科 Loricariidae				
多輻翼甲鯰 *Pterygoplichthys multiradiatus*	雜食性	H	B	Introduced
胡瓜魚科 Osmeridae				
香魚 *Plecoglossus altivelis altivelis*	雜食性	I	W	Introduced
花鱂科 Poeciliidae				
食蚊魚 *Gambusia affinis*	食蟲性	H	W	Introduced
鯰科 Siluridae				
鯰 *Silurus asotus*	肉食性	M	B	

註：攝食功能(Trophic function)：依攝食功能組成區分為雜食性、食蟲性、肉食性及食藻性；污染耐受性：I：Intolerant species (不耐污種)；M：Moderate tolerant species (中度耐污種)；H：High tolerant species (耐污性物種)；棲性：W，游泳性魚類；B，底棲性魚類。參考資料: Barbour et al(1999)；朱(2006)；亞太環境科技股份有限公司(2008)；魚類資料庫；陳(2009a)；民享環境生態調查有限公司(2012)。

表 1.5-8 IBI 選用矩陣及其評分標準

計量項目(Metric)	評分標準(Scoring criteria)		
	1	3	5
(1) 原生種種數%	≦33%	33-66%	≧66%
(2) 底棲性魚種種數%	≦33%	33-66%	≧66%
(3) 水層活動性魚種種數%	≦33%	33-66%	≧66%
(4) 低耐性魚數比例%	≦5%	5-15%	≧15%
(5) 耐污性魚數比例%	≧15%	5-15%	≦5%
(6) 雜食性魚數比例%	≧40%	20-40%	≦20%
(7) 蟲食性魚數比例%	≦5%	5-20%	≧20%
(8) 食魚性魚數比例%	≦3%	3-10%	≧10%
(9) 單位魚獲努力量	≦100	100-250	≧250
(10) 病畸形魚之比例%	≧3%	1-3%	≦1%
(11) 外來種之比例%	≧10%	1-10%	≦1%
(12) 漁獲生物量(kg/hr)	≦2	2-10	≧10

資料來源：艾奕康工程顧問股份有限公司(2013)

表 1.5-9 IBI 選用矩陣及其評分等級

生物環境狀態 Biological condition Category	評分等級 Score Range
河川品質極佳 (Excellent)	55-60
河川品質為好 (Good)	47-54
河川品質為普通 (Fair)	38-46
河川品質為較差 (Poor)	26-37
河川品質為極差 (Very Poor)	<26
未發現有魚類出現 (No Fish)	*

參考資料：Karr, 1981

(4)水質指標(水生昆蟲)

利用 Hilsenhoff 科級生物指標評估法(Family-level biotic index，FBI)(Hilsenhoff, 1988)

$$FBI = \frac{\sum[(TV_i)(n_i)]}{N}$$

TV_i：該科之忍耐值

n_i：該科個體數目

N：總個體數目

表 1.5-10 水生昆蟲科級生物指標評估法指數表

FBI	水質評價	有機污染物出現程度
0.00-3.5	極佳 Excellent	no apparent organic pollution
3.51-4.5	優良 very good	possible slight organic pollution
4.51-5.50	好 good	some organic pollution
5.51-6.50	尚可 fair	fairly significant organic pollution
6.51-7.50	尚待改善 fairly poor	significant organic pollution
7.51-8.50	差 poor	very significant organic pollution
8.51-10.00	極差 very poor	severe organic pollution

根據不同科或種水生昆蟲對污染之忍耐程度，從低至高給予 1~10 之忍耐值，並考慮該科昆蟲在整個水棲昆蟲群聚中之相對數量，合計生物指數，並用以評估水質。

(5)水質指標

A. 藻屬指數(Generic Index,GI)

透過附著性藻類藻屬指數(Generic Index,GI)資料分析，以藻類中之曲殼藻屬(*Achnanthes*)、卵形藻屬(*Cocconeis*)、橋彎藻屬(*Cymbella*)、小環藻屬(*Cyclotella*)、直鏈藻屬(*Melosira*)與菱形藻屬(*Nitzschia*)等各藻屬所出現之頻度和比值作為水質指標之參考，公式表示如下：

$$\text{藻屬指數}(GI)=\frac{\text{曲殼藻屬}(Achnanthes)+\text{卵形藻屬}(Cocconeis)+\text{橋灣藻屬}(Cymbella)}{\text{直鏈藻屬}(Melosira)+\text{小環藻屬}(Cyclotella)+\text{菱形藻屬}(Nitzschia)}$$

其中 GI>30 為極輕微污染，11<GI<30 為微污染，1.5<GI<11 為輕度污染，0.5<GI<1.5 為中度污染，GI<0.5 為嚴重污染。

B. 腐水度指數(Saprobity Index, SI)

將附著性藻種出現的頻度用於附著藻類腐水度指數(Saprobity Index, SI)，以作為判斷水質的指標，計算方式從樣品中出現的指標藻類，依其腐水度之指數值(si)、出現之頻度(hi)及指標權重(wi)，利用腐水度指數公式(Zelinka and Marvan, 1961)，以求得該樣品之腐水度指數。依 Sládecek(1973)之區分：SI<0.5 為無污染水質(未(稍)受污染)，0.5<SI<1.5 為貧腐水水質(未(稍)度污染)，1.5<SI<2.5 為β-中腐水水質(輕度污染)，2.5<SI<3.5 為α-中腐水水質(中度污染)，SI>3.5 為強腐水水質(嚴重污染)。河川附著藻類腐水度指數如表 1.5-11 所示。

$$S=\Sigma(si\cdot hi\cdot wi)/\Sigma(hi\cdot wi)$$

式中， si 為腐水度之指數值
hi 為物種出現之頻度
wi 為物種指標之權重

表 1.5-11 河川附著藻類腐水度指數表

屬名	中文屬名	污染指數	屬名	中文屬名	污染指數
Ankistrodesmus	纖維藻屬	2	*Navicula*	舟形藻屬	3
Chlamydomonas	衣藻屬	4	*Nitzschia*	菱形藻屬	3
Chlorella	小球藻屬	3	*Ocillatoria*	顫藻屬	5
Closterium	新月藻屬	1	*Pandorina*	實球藻屬	1
Comphonema	異極藻屬	1	*Phormidium*	席藻屬	1
Cyclotella	小環藻屬	1	*Phacus*	扁裸藻屬	2
Euglena	裸藻屬	5	*Scenedesmus*	柵藻屬	4
Lepocinctis	鱗孔藻	1	*Stigealonium*	毛枝藻屬	2
Melosira	直鏈藻屬	1	*Synedra*	針杆藻屬	2
Microtinium	微芒藻屬	1	*Synethocystis*	集胞藻屬	1

資料來源：Zelinka and Marvan, 1961

C. 藻類優養指數(Algal trophic state index, ATSI)

藻類優養指數法不受季節影響，可以彌補卡爾森優養指數受季節及濁度影響之缺點。此法係利用水庫中出現之藻種，依貧養(oligo)、普養(meso)和優養(eu)指標，然後以各級指標種出現的頻度(分別為 F_{oligo}、F_{meso} 及 F_{eu}，表 1.5-12)，依下列式計算藻類優養指數(ATSI)(吳俊宗 1998)：

藻類優氧指數 (ATSI)=(F_{oligo}+ F_{meso})/(F_{eu}+F_{meso}) 式中，F_{oligo} 為貧養條件中其藻類群落中指標藻種出現之頻度，F_{meso} 為依中養條件其藻類群落中指標藻種出現之頻度，F_{eu} 為優養養條件其藻類群落中指標藻種出現之頻度。計算後 ATSI>1.5 為貧養狀態，1.5~0.5 間為中養狀態，小於 0.5 為優養狀態。

表 1.5-12　貧養、普養和優養之藻群

貧養(oligo)	中養(meso)	優養(eu)
Aulacoseira distans	*Anabaena* div.sp.	*Carteria* div.sp.
Batrachospermum div.sp.	*Ankistrodesmus* div. sp.	*Chlamydomonas* div.sp.
Calothrix div.sp.	*Aphanizomenon flos-aquae*	*Chroomonas* div.sp.
Chromulina div.sp.	*Aphanocapsa delicatissima*	*Coelastrum* div.sp.
Dinobryon divergens	*Aulacoseira granulate*	*Cryptomonas* div.sp.
Elakatothrix gelatiosa	*Ceratium furcoides*	*Cyclotella meneghiniana*
Euastrum div. sp.	*Ceratium hirundinella*	*Eudorina elegans*
Fragilaria capucina	*Coelastrum* div.sp.	*Euglena* div.sp.
Fragilaria div. sp.	*Coelosphaerium* sp.	*Gonium* div.sp.
Gloeocapsa div.sp.	*Coenocystis* div.sp.	*Lepocinclis* div.sp.
Gomphonema div. sp.	*Cyclotella stelligera*	*Mallomonas* div.sp.
Hildebrandia rivulare	*Eutetramorus* div.sp.	*Merismopedia tenuissima*
Mougeotia div.sp.	*Fragilaria crotonensis*	*Micractinium pusillum*
Pleurotaenium div.sp.	*Kirchneriella* ssp.	*Microcystis flosaquae*
Rivularia div.sp.	*Microcapsa delicatissima*	*Microcystis* spp.
Sphaerozosma granulata	*Monoraphidium* ssp.	*Nitzschia palea*
Staurastrum div.sp.	*Oocystis* div.sp.	*Peridinium bipes*
Tabellaria fenestrata	*Pediastrum* div.sp.	*Phacus* div.sp.
Tabellaria flocculosa	*Rhizosolenia longiseta*	*Scenedesmus* div.sp.
Thorea div.sp.	*Stephanodiscus astraea*	*Spirulina* div.sp.
Zygonema div.sp.	*Synura* div.sp.	*Trachelomonas* div.sp.
	Tetraedron div sp.	*Trachelomonas* div.sp.

資料來源:本研究匯整 環境保護署(2005)及 Whitmore (1989)資料

D. 卡爾森指數(Carlson trophic state index, CTSI)

目前環保署用於評估水庫水質優養程度的指標為「卡爾森指數 ，Carlson trophic state index」，簡稱CTSI。CTSI係以水中的透明度（SD）、葉綠素a（Chl-a）及總磷（TP）等三項水質參數之濃度值進行計算，再以其計算所得之指標值，判定水庫水質之優養程度，有關計算方式如下：

卡爾森指數(CTSI) =TSI(SD)+TSI (Chl)+ TSI(TP)／3

TSI (SD) = 60 - 14.41 x ln SD

TSI (Chl-a) = 9.81 x ln Chl-a + 30.6

TSI (TP) = 14.42 x ln TP + 4.15

經計算後，當 CTSI<40 為貧養狀態，40≦CTSI≦50 為普養狀態，CTSI>50 則為優養狀態。

第二章　監測結果數據分析

第二章　監測結果數據分析

湖山水庫工程計畫自 93 年起即進入施工階段，整體工程進度已接近完工，水庫更於 105 年 5 月起開始蓄水，故中水局為同步掌握湖山水庫施工、營運之環境影響，自 105 年 5 月起同步執行湖山水庫施工期間及試營運期間之環境監測項目，包含：空氣品質、噪音振動、水質水量、交通量、水域生物、陸域動物及陸域植物等項目之監測，茲將各項監測結果分述如下：

2.1 空氣品質

本計畫之空氣品質監測點位共可分為固定測站及移動測站二種，其中固定測站均為 24 小時測站(棋山國小、梅林國小、桶頭國小、瑞竹國小、引水隧道入口、引水隧道出口及玉當山等 7 站)、移動測站則包含 24 小時測站(樣仔坑回春寺、北勢坑溪民宅及第一取出水工等 3 站)、1 小時測站(上風處、下風處 1 及下風處 2 等 3 站)及即時監測等項目。茲將本季各監測點附近之環境特性描述如表 2.1-1；另有關空氣 $PM_{2.5}$ 及 PM_{10} 即時監測之監測，係每日在工區下風處選擇 3 處進行監測，而監測地點則以總工務所為中心，視當日之風向決定即時監測測站之位置(當季施工點之下風處 3 站)，對應關係整理如圖 1.4-3 及表 2.1-2。彙整本季各項監測結果如表 2.1-3~表 2.1-7；鄰近環保署斗六及竹山測站之測值(詳附表 4.1-16)比對則整理如圖 2.1-1~圖 2.1-2 所示，各項目之監測原始記錄請詳附錄三，歷季監測成果詳附錄四，歷次成果分析則彙整如圖 2.1-3~圖 2.1-27。

一、固定測站

本季空氣品質固定測站之監測頻率及監測項目請詳表 1.2-1，監測位置詳表 1.3-1，茲分測項說明本季及歷季之監測結果。

(一)總懸浮微粒 TSP

本季各固定測站之 TSP 24 小時值介於 28 ~ 51 $\mu g/m^3$ 之間，均符合空氣品質標準(250 $\mu g/m^3$)。其中最大值出現在引水隧道入口處測站(7 月份測值)；最小值則出現在引水隧道出口處測站(9 月份測值)。

歷年監測數據介於 28~232 $\mu g/m^3$，均符合空氣品質標準，本季並無超出歷年數值範圍，各測站亦無特殊異常狀況發生。另比對玉當山測站之近 5 年之監測結果，均低於本計畫第二次環差時所承諾之 202 $\mu g/m^3$ 限值。

(二)懸浮微粒 PM_{10}

本季各固定測站之 PM_{10} 24 小時值介於 16~34$\mu g/m^3$ 之

間，均符合空氣品質標準(125 μg/m^3)。其中最大值出現在梅林國小及引水隧道入口測站(7 月份測值)；最小值則出現在引水隧道出口測站(9 月份測值)。

本季測值與歷年測值(13~139 μg/m^3)相較，測值均在歷年數值範圍內，各測站之測值均無特殊異常狀況發生。另在與空氣品質標準比對上，歷年測值僅於 95 年第 1 季(梅林國小)及 104 年第 2 季(引水隧道入口)因背景環境影響而有略微超標，其餘測值則均可符合空氣品質標準(125 μg/m^3)。

(三)細懸浮微粒 $PM_{2.5}$

本監測計畫依據環評承諾，自 102 年第 4 季起，每季進行 $PM_{2.5}$ 監測一次，本季各站之 $PM_{2.5}$ 24 小時值介於 7~15 μg/m^3 之間，本季皆符合空氣品質標準(35 μg/m^3)，且本計畫目前僅剩景觀綠美化二期，其餘各工程皆已完工，故本計畫對於細懸浮微粒之貢獻量影響輕微。

$PM_{2.5}$ 之監測從 102 年第 4 季起至本季止共計執行 20 季次。歷季(含本季)測值則介於 2~82 μg/m^3 間，過往曾於 104 年第 4 季時有記錄到高值發生(梅林國小測站，82 μg/m^3)，分析高值發生原因，主要係因該次監測執行時適逢冷氣團夾帶大量污染物南下影響，致使當日之測值有明顯偏高狀況發生。另就本項目之監測結果與空氣品質標準進行比對，目前已監測之結果常有超標狀況發生，比對鄰近環保署斗六及竹山空品站之測值亦有相同之趨勢，顯示細懸浮微粒偏高多與大環境之影響有關。一般而言，由 $PM_{2.5}$ 與 PM_{10} 之比值可初步看出細懸浮微粒之貢獻量，若比值越高，表示細懸浮微粒之貢獻量越大，即代表長程傳輸之影響相對明顯。

(四)二氧化硫 SO_2

本季各固定測站 SO_2 小時平均值介於 0.001 ~ 0.002 ppm 之間，均遠低於空氣品質標準(0.25 ppm)。另於 SO_2 日平均值之監測成果皆約為 0.001 ppm，亦均符合空氣品質標準(0.1 ppm)，各測站間測值差異不大。

本季 SO_2 小時值與歷年測值(0.001~0.023 ppm)相較亦無特殊異常狀況發生；而 SO_2 日平均值測項於各固定測站之測值與歷年測值(0.001~0.010 ppm，詳附表 4.1-4 及圖 2.1-8)相較亦無特殊異常狀況發生。歷年各測值均可符合空氣品質標準(日平均值標準 0.100 ppm；小時值標準為 0.250 ppm)。

(五)二氧化氮 NO_2

本季各固定測站之 NO_2 小時平均值介於 0.002~0.018 ppm 之間，均符合空氣品質標準(0.25 ppm)。另於 NO_2 日平均值之監測成果則介於 0.001~0.004 ppm 之間，測值差距亦不明顯。

本季 NO_2 小時值與歷年測值(<0.004~0.073 ppm)相較並無特殊異常狀況發生；而 NO_2 日平均值測項於各固定測站之測值與歷年測值(0.001~0.048 ppm)相較亦無特殊異常。歷年各測值均可符合空氣品質標準(小時值標準為 0.250 ppm)。

(六)一氧化碳 CO

本季各固定測站之 CO 小時平均值介於 0.1 ~ 0.4 ppm 之間，均符合空氣品質標準(35 ppm)。另於 CO 8 小時平均值之監測成果則介於 0.1~ 0.3 ppm 之間，亦均遠低於空氣品質標準(9 ppm)。

本季 CO 之最大小時測值與歷年測值(0.1~1.7 ppm)相較並無特殊異常狀況發生。另最大 8 小時測值與歷年測值(0.1~ 1.5 ppm)相較亦無特殊異常。歷年各測值均可符合空氣品質標準(最大小時標準值 35ppm；最大 8 小時標準值 9 ppm)。

(七)總碳氫化合物 THC

本季各固定測站之 THC 小時平均值介於 1.9~ 2.3 ppm 之間；而日平均值之監測成果則介於 1.8 ~ 2.2 ppm 之間，各測站間測值差異不大。

本季 THC 測項之最大小時與歷年測值(1.9~6.1 ppm)相較並無特殊異常狀況發生。另本季於日平均值與歷年測值(1.8~3.7 ppm)相較亦無特殊異常。

(八)臭氧 O_3

本季各固定測站之 O_3 小時平均值介於 0.040 ~ 0.079 ppm 之間，均符合空氣品質標準(0.12 ppm)。另於 O_3 8 小時平均值之監測成果則介於 0.023 ~ 0.062 ppm 之間，除桶頭國小外，其於測站均符合空氣品質標準(0.06 ppm)。

本季 O_3 之最大小時測值與歷年測值(0.013~0.135 ppm)相較並無特殊異常狀況發生。另最大 8 小時測值與歷年測值(12~91 ppb) 相較亦無特殊異常，各測站均曾有超出空氣品質標準之紀錄(最大小時標準值 120 ppb；最大 8 小時標準值 60 ppb)。由於臭氧係屬二次污染物，其濃度較易於日照強、擴散條件差之環境明顯升高，且就本計畫區之開發特性而言亦較不易產生臭氧污染(包含其前趨物質)，顯示雲林地區臭氧偏高應

與大環境之影響有關，後續本計畫將持續監測，以追蹤臭氧項目是否異常。

二、移動測站—24 小時測站

本季空氣品質移動測站(連續監測 24 小時)之監測點位分別選在湖山水庫工地周圍(樸仔坑回春寺、北勢坑溪民宅及第一取出水工等 3 站)進行每月一次之監測，本季監測成果彙整如表 2.1-4 所示，除 8 月北勢坑溪民宅之 O_3 8 小時有超標之情形(比對鄰近同時段之環保署斗六空品站(58 ppb)與竹山空品站(62 ppb)均有超標或偏高，顯示臭氧濃度偏高與大環境之影響有關，其餘各測站監測結果均可符合空氣品質標準。

三、移動測站—1 小時測站

本季空氣品質移動測站(連續監測 1 小時)之監測成果如表 2.1-5 所示，各監測項目之測值均符合空氣品質標準。

本計畫歷次移動測站-24 小時測站及 1 小時測站之測值與歷年測值相較，本季各項監測結果均在歷年測值區間內，由於本工程目前已逐漸進入收尾階段，對於空氣品質之影響應隨之下降，後續將持續監測。

四、移動測站—PM_{10} 及 $PM_{2.5}$ 即時監測

為遵守本計畫第 2 次環境影響差異分析時所承諾之揚塵警戒上限(TSP 值 202 μg/m^3；PM_{10} 值 140 μg/m^3)，同時為確實掌握大壩工程施工期間對鄰近環境之揚塵影響，故針對大壩工區周遭之粒狀物進行加強監測；惟 TSP 一項無法藉由即時監測獲得測值(1 日僅產生 1 筆資料)，對於現地之即時狀況反應有所限制，因此自 99 年 1 月 1 日起，選擇 PM_{10} 進行即時監測作為預警之依據，每日在工區下風不定時選擇 3 處進行監測，當測值超出警戒範圍時，則立即採行空氣污染防制措施，以減輕相關影響。此外，為配合本計畫第 5 次環境影響差異分析之承諾，亦自 102 年第 4 季起，新增 $PM_{2.5}$ 即時監測，以掌握工區懸浮微粒測值之變化狀況。

本季監測自 7 月 1 日起至 9 月 30 日止，每日均完成工區下風處 3 測站之即時監測，各測站相對位置如圖 1.4-3。風向所對應的測站、監測之天候、地點、時間及測值彙整如表 2.1-5~表 2.1-7 所示，本季 PM_{10} 測值介於 10～114 μg/m^3 之間、$PM_{2.5}$ 測值則介於 5.5~70.4 μg/m^3 之間。

歷年監測期間，區域環境之粒狀污染於偶有偏高之情形，可能是受本計畫施工期間之工程(尤以大壩工程為最)、庫區內裸露地及大環境之影響所致。而本計畫於施工期間(以影響最大之大壩施工

期為例)雖有開挖、回填及夯壓等作業，惟依據現地之地質條件及施工特性，本計畫衍生之揚塵顆粒均較 $PM_{2.5}$ 為大，且本計畫亦藉由覆蓋、灑水及降低施工強度等方式減輕其影響。後隨 103 年大壩工程結束及 105 年進入試營運蓄水階段(裸露地面積大幅減少)，106 年期間監測雖偶有超標狀況發生，但比對鄰近環保署斗六及竹山空品站之測值亦有相同之趨勢，顯示細懸浮微粒偏高多與大環境之影響有關，本計畫對於鄰近環境已無影響之虞。

五、本季超標日分析

為了解本計畫區域鄰近之大環境空氣品質狀況，統計環保署斗六測站之超標日及指標污染物。本季 7 月超標日期為 7/16，指標污染物為 O_3 8 小時及細懸浮微粒，共 1 日；8 月超標日期為 8/12，指標污染物為細懸浮微粒，共 1 日；9 月超標日期分別為 9/14 及 9/30，指標污染物為 O_3 8 小時，共 2 日。

表 2.1-1　空氣品質監測地點背景資料說明

測點名稱	測點位置及環境特性描述
棋山國小	棋山國小測站為本計畫於環評階段所規定之測點，位於棋盤厝附近之社區內，鄰近為典型之偏僻鄉村聚落，車輛進出不多。
梅林國小	梅林國小測站為本計畫於環境影響差異分析時所提出列為承諾之測點，惟該測站歷年來均有監測，屬既有之測站。由於該測站位於斗六市梅林社區內，緊鄰雲 214 鄉道，且鄰近本計畫之材料運輸專用道路及中二高，故歷年監測較常受到交通因素之影響。
引水隧道出口(庫區端)	本測點位於庫區內南勢坑溪之上游處，本季監測時，已無工程施作。
引水隧道入口(桶頭端)	本測點位於雷公坑溪北側，鄰近環境較為自然，人口住宅十分稀少。
桶頭國小	桶頭國小測站為本計畫於環評階段所規定之測點，其位於 149 縣道旁，來往砂石車較多，附近多為茶園，人口及住宅均較稀少。
瑞竹國小	瑞竹國小測點位於 149 縣道旁，149 縣道平時人車不多，監測結果多屬背景值。
玉當山	玉當山測站為本計畫於環評階段所規定之測點，且另於第 2 次環境影響差異分析中亦承諾，當此測站之 TSP 測值超出 202μg/m^3 時，將加強相關之空保措施，以抑制本計畫揚塵對鄰近地區之影響。本測站位於玉當山廟前廣場上，地處山區之小村落，人口稀少。
樸仔坑回春寺	本測站為本計畫於第 2 次環境影響差異分析時所提出新增之移動測站之一，位於斗六市湖山里樸林路 83 號之回春寺大門旁空地。附近為山林、果樹，北側為零星住宅分佈。附近往來車流量稀少。
北勢坑溪民宅	本測站為本計畫於第 2 次環境影響差異分析時所提出新增之移動測站之一，位於北勢坑溪及土地公坑溪交會處附近，附近人車稀少。
第一取出水工	位於本工程之第一取出水工附近(壩體上)，周遭環境多為裸露面，附近均屬為本計畫範圍。
玉當山橋	玉當山橋位於玉當山廟正對面，鄰近住宅區及樹叢，為附近里民之活動場所。
樸仔坑橋	位於玉當山廟附近，周遭環境為樹叢，人口稀少，較為荒涼。
北勢坑溪橋	鄰近總工務所，周邊樹叢林立且無敏感住宅區。
主壩出入口	總工務所旁之警衛室，周遭環境為樹叢，為工程車輛之主要進出入口，惟自大壩工程完工後，進出車輛已少。
總工務所(舊址)	北為北勢坑溪，周遭無住宅多為樹叢。
植物保存區	位於自然保留區西側，北勢坑溪上游右側，車流量及人口稀少。
湖南壩出入口	靠近梅林溪旁之警衛室，附近多為綠地及樹叢，目前工程已近完工，目前已非湖山水庫之主要出入口。

表 2.1-2　本季空氣 $PM_{2.5}$ 及 PM_{10} 即時監測風向對應測站

東	東南	東北	西	西南	西北	南	北
玉當山橋	主壩出入口	玉當山橋	主壩出入口	玉當山橋	主壩出入口	總工務所	玉當山橋
樸仔坑橋	總工務所	樸仔坑橋	總工務所	主壩出入口	湖南壩出入口	植物保存區	樸仔坑橋
北勢坑溪橋	植物保存區	湖南壩出入口	植物保存區	北勢坑溪橋	主壩出入口	北勢坑溪橋	湖南壩出入口

表 2.1-3 本季空氣品質固定測站監測結果表

監測項目		測站	棋山國小	梅林國小	引水隧道出口處	引水隧道入口處	桶頭國小	瑞竹國小	玉當山	空氣品質標準
		單位	08/02	08/01	09/02	07/13	07/19	07/12	07/12	
TSP	24小時值	$\mu g/m^3$	36	41	28	51	34	39	39	250
PM_{10}	24小時值	$\mu g/m^3$	29	34	16	34	27	29	27	125
$PM_{2.5}$	24小時值(手動監測)	$\mu g/m^3$	8	12	7	11	14	13	15	35
PM_{10}與TSP之比例			81.4%	83.1%	56.9%	65.9%	78.9%	73.7%	70.0%	—
$PM_{2.5}$與PM_{10}之比例			27.4%	35.0%	44.4%	32.6%	52.6%	45.5%	54.8%	—
SO_2	小時平均值	ppm	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.25
	日平均值	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.1
NO_2	小時平均值	ppm	0.004	0.005	0.018	0.002	0.004	0.005	0.009	0.25
	日平均值	ppm	0.001	0.002	0.004	0.001	0.002	0.002	0.004	—
CO	小時平均值	ppm	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.4	35
	8小時平均值	ppm	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	9
	日平均值	ppm	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	—
O_3	小時平均值	ppm	0.041	0.040	0.040	0.042	0.079	0.048	0.066	0.12
	8小時平均值	ppm	0.033	0.036	0.027	0.023	0.062	0.042	0.045	0.06
THC	小時平均值	ppm	2.3	2.2	1.9	2.1	2.0	2.0	2.2	—
	日平均值	ppm	2.1	2.1	1.8	1.9	1.9	1.9	2.2	—
風向		—	SE	NW	SSE	SW	ESE	SW	E	—
風速		m/s	0.6	0.6	0.8	0.3	0.6	0.6	0.5	—
溫度		℃	29.5	29.2	24.9	23.4	27.3	26.0	26.7	—
相對濕度		%	80	77	83	79	82	90	79	—

註：灰底表示超出行政院環保署於民國101年5月14日環署空字第1010038913 號令修正發布之空氣品質標準。

表 2.1-4 本季空氣品質移動測站 24 小時監測結果表

項目		單位	湖山水庫工地周圍移動測站									空氣品質標準
			樣仔坑回春寺			北勢坑溪民宅			第一取出水工			
			07/13	08/03	09/01	07/07	08/10	09/01	07/07	08/03	09/08	
TSP	24小時值	μg/m^3	43	44	39	24	43	30	23	22	31	250
PM_{10}	日平均值	μg/m^3	28	35	27	18	31	20	18	17	17	125
$PM_{2.5}$	24小時值	μg/m^3	14	7	15	4	21	13	4	7	11	35
PM_{10}與TSP之比例			65.2%	79.1%	70.0%	72.3%	71.5%	67.2%	77.6%	75.1%	56.6%	—
$PM_{2.5}$與PM_{10}之比例			50.1%	20.0%	55.6%	22.9%	68.5%	63.7%	22.8%	41.8%	63.5%	—
SO_2	小時平均值	ppm	0.001	0.004	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	0.003	0.002	0.25
	日平均值	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.1
NO_2	小時平均值	ppm	0.004	0.001	0.003	0.016	0.007	0.005	0.003	0.003	0.003	0.25
	日平均值	ppm	0.003	0.001	0.001	0.007	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	—
CO	小時平均值	ppm	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	35
	8小時平均值	ppm	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	9
	日平均值	ppm	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	—
O_3	小時平均值	ppm	0.066	0.047	0.062	0.055	0.084	0.049	0.066	0.057	0.057	0.12
	8小時平均值	ppm	0.044	0.023	0.046	0.033	0.066	0.036	0.041	0.028	0.037	0.06
THC	小時平均值	ppm	2.2	2.2	2.1	1.9	2.2	1.3	2.0	2.0	1.9	—
	日平均值	ppm	2.1	2.0	1.9	1.8	2.1	1.1	1.9	1.9	1.8	—
風向		—	NE	E	ENE	SE	E	WSW	SSE	SSE	S	—
風速		m/s	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	1.4	1.0	1.1	—
溫度		℃	24.4	25.6	26.5	26.4	28.8	27.1	26.8	27.0	24.7	—
相對濕度		%	84	85	80	81	77	81	79	82	87	—

註：1.本監測計畫之$PM_{2.5}$監測作業係依據NIEA A205.11C執行手動採樣。

2."灰底"表示該值超出空氣品質標準。

表 2.1-5 本季空氣品質移動測站 1 小時監測結果表

項目		單位	1 Hr測站									空氣品質標準
			上風			下風-1			下風-2			
			07/08	08/03	09/08	07/07	08/11	09/01	07/13	08/11	09/02	
TSP	小時平均值	$\mu g/m^3$	38	38	47	114	48	36	56	56	39	—
PM_{10}	小時平均值	$\mu g/m^3$	11	24	28	15	38	21	32	43	27	—
PM_{10}與TSP之比例			28.7%	63.0%	59.1%	13.1%	79.5%	58.3%	57.6%	76.8%	70.1%	—
SO_2	小時平均值	ppm	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.25
NO_2	小時平均值	ppm	0.004	0.023	0.001	0.002	0.007	0.002	0.006	0.014	0.001	0.25
CO	小時平均值	ppm	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	35
O_3	小時平均值	ppm	0.039	0.028	0.038	0.031	0.071	0.012	0.078	0.069	0.022	0.12
THC	小時平均值	ppm	1.9	1.9	1.9	1.9	2.3	3.1	2.4	2.2	1.9	—
風向		—	N	WSW	NW	N	W	W	NNW	WNW	N	—
風速		m/s	2.1	4.4	1.0	1.4	0.7	0.2	0.8	0.8	0.4	—
溫度		℃	32.2	30.3	29.4	32.4	33.1	28.4	32.6	32.8	27.7	—
相對濕度		%	56.0	66.7	66.2	59.0	57.0	74.1	63.0	59.1	74.2	—

表 2.1-6 本季空氣 $PM_{2.5}$ 即時測站即時監測結果表

月份	日	星	測量座標		測值	校正測值	週遭環境	量測	天	風速	風向
7	1	日	211516	2621108	20	16.8	玉當山橋	07:21	晴	0.2	西南
			211746	2621314	23	19.4	北勢坑溪橋	07:44		0.2	西南
			211824	2621185	27	22.8	主壩出入口	08:08		0.3	西南
	2	一	211516	2621108	10	8.1	玉當山橋	13:48	雨	0.5	西南
			211746	2621314	13	10.7	北勢坑溪橋	14:12		0.4	西南
			211824	2621185	11	9.0	主壩出入口	14:36		0.5	西南
	3	二	211516	2621108	25	21.1	玉當山橋	13:07	陰	0.4	西南
			211746	2621314	23	19.4	北勢坑溪橋	13:30		0.3	西南
			211824	2621185	20	16.8	主壩出入口	13:54		0.4	西南
	4	三	211516	2621108	10	8.1	玉當山橋	11:52	陰	0.3	西南
			211746	2621314	13	10.7	北勢坑溪橋	12:16		0.2	西南
			211824	2621185	9	7.3	主壩出入口	12:40		0.2	西南
	5	四	211516	2621108	16	13.3	玉當山橋	14:26	陰	0.3	西南
			211746	2621314	12	9.9	北勢坑溪橋	14:49		0.4	西南
			211824	2621185	10	8.1	主壩出入口	15:13		0.3	西南
	6	五	211516	2621108	16	13.3	玉當山橋	13:19	晴	0.3	西南
			211746	2621314	16	13.3	北勢坑溪橋	13:43		0.3	西南
			211824	2621185	20	16.8	主壩出入口	14:06		0.4	西南
	7	六	211516	2621108	12	9.9	玉當山橋	13:02	晴	0.5	西南
			211746	2621314	15	12.4	北勢坑溪橋	13:26		0.6	西南
			211824	2621185	19	15.9	主壩出入口	13:50		0.5	西南
	8	日	211539	2620785	16	13.3	湖南壩出入口	11:55	晴	0.4	西北
			211516	2620868	11	9.0	樸仔坑橋	12:18		0.5	西北
			211824	2621185	15	12.4	主壩出入口	12:42		0.5	西北
	9	一	211539	2620785	23	19.4	湖南壩出入口	12:05	晴	0.3	北
			211516	2620868	21	17.6	樸仔坑橋	12:29		0.2	北
			211516	2621108	18	15.0	玉當山橋	12:53		0.3	北
	10	二	211539	2620785	42	35.8	湖南壩出入口	13:16	晴	0.4	西北
			211516	2620868	45	38.4	樸仔坑橋	13:40		0.3	西北
			211824	2621185	38	32.3	主壩出入口	14:03		0.3	西北
	11	三	211516	2621108	12	9.9	玉當山橋	13:23	陰	0.4	西南
			211746	2621314	10	8.1	北勢坑溪橋	13:46		0.4	西南
			211824	2621185	16	13.3	主壩出入口	14:00		0.3	西南
	12	四	211539	2620785	25	21.1	湖南壩出入口	13:03	雨	0.3	西北
			211516	2620868	20	16.8	樸仔坑橋	13:27		0.2	西北
			211824	2621185	23	19.4	主壩出入口	13:50		0.3	西北
	13	五	211824	2621185	52	44.4	主壩出入口	13:51	雨	0.3	西
			211896	2621291	50	42.7	總工務所	14:14		0.4	西
			212055	2621506	45	38.4	植物保存區	14:38		0.4	西
	14	六	211539	2620785	29	24.5	湖南壩出入口	13:59	晴	0.3	西北
			211516	2620868	31	26.3	樸仔坑橋	14:23		0.3	西北
			211824	2621185	30	25.4	主壩出入口	14:46		0.4	西北
	15	日	211539	2620785	33	28.0	湖南壩出入口	11:04	晴	0.5	西北
			211516	2620868	29	24.5	樸仔坑橋	11:28		0.5	西北
			211824	2621185	27	22.8	主壩出入口	11:52		0.4	西北
	16	一	211539	2620785	49	41.8	湖南壩出入口	12:24	陰	0.2	西北
			211516	2620868	53	45.3	樸仔坑橋	12:48		0.3	西北
			211824	2621185	46	39.2	主壩出入口	13:10		0.2	西北

表 2.1-6 本季空氣 $PM_{2.5}$ 即時測站即時監測結果表(續 1)

月份	日	星	測量座標		測值	校正測值	週遭環境	量測	天	風速	風向
7	17	二	211824	2621185	23	19.4	主壩出入口	14:03	晴	0.6	西
			211896	2621291	28	23.7	總工務所	14:26		0.5	西
			212055	2621506	23	19.4	植物保存區	14:50		0.5	西
	18	三	211824	2621185	17	14.2	主壩出入口	13:10	晴	0.3	西
			211896	2621291	12	9.9	總工務所	13:33		0.4	西
			212055	2621506	16	13.3	植物保存區	13:57		0.3	西
	19	四	211539	2620785	40	34.1	湖南壩出入口	14:43	陰	0.2	西北
			211516	2620868	44	37.5	樸仔坑橋	15:07		0.3	西北
			211824	2621185	41	34.9	主壩出入口	15:30		0.4	西北
	20	五	211539	2620785	23	19.4	湖南壩出入口	12:56	晴	0.4	西北
			211516	2620868	18	15.0	樸仔坑橋	13:20		0.5	西北
			211824	2621185	15	12.4	主壩出入口	13:54		0.4	西北
	21	六	211539	2620785	30	25.4	湖南壩出入口	14:29	雨	0.3	西北
			211516	2620868	29	24.5	樸仔坑橋	14:52		0.3	西北
			211824	2621185	34	28.9	主壩出入口	15:16		0.4	西北
	22	日	211824	2621185	27	22.8	主壩出入口	13:51	陰	0.4	西
			211896	2621291	25	21.1	總工務所	14:15		0.3	西
			212055	2621506	23	19.4	植物保存區	14:38		0.4	西
	23	一	211516	2621108	25	21.1	玉當山橋	10:29	晴	0.3	西南
			211746	2621314	29	24.5	北勢坑溪橋	10:53		0.2	西南
			211824	2621185	29	24.5	主壩出入口	11:17		0.2	西南
	24	二	211824	2621185	18	15.0	主壩出入口	10:19	晴	0.3	西
			211896	2621291	14	11.6	總工務所	10:43		0.2	西
			212055	2621506	20	16.8	植物保存區	11:06		0.3	西
	25	三	211824	2621185	15	12.4	主壩出入口	10:43	晴	0.2	西
			211896	2621291	17	14.2	總工務所	11:07		0.3	西
			212055	2621506	10	8.1	植物保存區	11:30		0.3	西
	26	四	211539	2620785	23	19.4	湖南壩出入口	10:37	晴	0.3	西北
			211516	2620868	21	17.6	樸仔坑橋	11:01		0.4	西北
			211824	2621185	23	19.4	主壩出入口	11:24		0.4	西北
	27	五	211539	2620785	17	14.2	湖南壩出入口	10:24	晴	0.3	西北
			211516	2620868	20	16.8	樸仔坑橋	10:45		0.2	西北
			211824	2621185	22	18.5	主壩出入口	11:09		0.3	西北
	28	六	211539	2620785	11	9.0	湖南壩出入口	12:19	晴	0.4	西北
			211516	2620868	15	12.4	樸仔坑橋	12:43		0.5	西北
			211824	2621185	15	12.4	主壩出入口	13:06		0.4	西北
	29	日	211824	2621185	12	9.9	主壩出入口	16:28	晴	0.4	西
			211896	2621291	10	8.1	總工務所	16:52		0.4	西
			212055	2621506	12	9.9	植物保存區	17:16		0.5	西
	30	一	211824	2621185	14	11.6	主壩出入口	13:57	晴	0.4	西
			211896	2621291	17	14.2	總工務所	14:21		0.3	西
			212055	2621506	20	16.8	植物保存區	14:44		0.5	西
	31	二	211824	2621185	12	9.9	主壩出入口	12:44	晴	0.4	西
			211896	2621291	15	12.4	總工務所	13:08		0.4	西
			212055	2621506	12	9.9	植物保存區	13:32		0.5	西

表 2.1-6 本季空氣 $PM_{2.5}$ 即時測站即時監測結果表(續 2)

月份	日	星期	測量座標		測值	校正測值	週遭環境	量測	天	風速	風向
8	1	三	211824	2621185	15	12.4	主壩出入口	13:27	晴	0.3	西
			211896	2621291	17	14.2	總工務所	13:50		0.3	西
			211516	2621108	21	17.6	玉當山橋	14:14		0.2	西
	2	四	211516	2621108	9	7.3	玉當山橋	12:50	晴	0.3	西南
			211746	2621314	13	10.7	北勢坑溪橋	13:13		0.3	西南
			211824	2621185	10	8.1	主壩出入口	13:37		0.4	西南
	3	五	211516	2621108	8	6.4	玉當山橋	15:30	陰	0.4	西南
			211746	2621314	7	5.5	北勢坑溪橋	15:53		0.3	西南
			211824	2621185	12	9.9	主壩出入口	16:17		0.4	西南
	4	六	211824	2621185	21	17.6	主壩出入口	14:09	晴	0.3	西
			211896	2621291	19	15.9	總工務所	14:33		0.4	西
			211516	2621108	18	15.0	玉當山橋	14:56		0.4	西
	5	日	211539	2620785	14	11.6	湖南壩出入口	09:24	晴	0.3	北
			211516	2620868	12	9.9	樸仔坑橋	09:48		0.3	北
			211516	2621108	9	7.3	玉當山橋	10:13		0.2	北
	6	一	211539	2620785	22	18.5	湖南壩出入口	12:20	晴	0.4	西北
			211516	2620868	25	21.1	樸仔坑橋	12:43		0.4	西北
			211516	2621108	28	23.7	玉當山橋	13:07		0.5	西北
	7	二	211824	2621185	18	15.0	主壩出入口	10:28	晴	0.3	西
			211896	2621291	20	16.8	總工務所	10:52		0.4	西
			211516	2621108	17	14.2	玉當山橋	11:15		0.3	西
	8	三	211824	2621185	33	28.0	主壩出入口	15:20	晴	0.3	西
			211896	2621291	40	34.1	總工務所	15:43		0.2	西
			211516	2621108	45	38.4	玉當山橋	16:07		0.3	西
	9	四	211539	2620785	22	18.5	湖南壩出入口	10:30	陰	0.3	西北
			211516	2620868	18	15.0	樸仔坑橋	10:54		0.3	西北
			211516	2621108	19	15.9	玉當山橋	11:17		0.2	西北
	10	五	211539	2620785	24	20.2	湖南壩出入口	10:32	晴	0.2	西北
			211516	2620868	17	14.2	樸仔坑橋	10:56		0.3	西北
			211516	2621108	20	16.8	玉當山橋	11:20		0.2	西北
	11	六	211539	2620785	62	53.1	湖南壩出入口	10:58	晴	0.3	西北
			211516	2620868	61	52.2	樸仔坑橋	11:21		0.4	西北
			211516	2621108	58	49.6	玉當山橋	11:45		0.5	西北
	12	日	211539	2620785	50	42.7	湖南壩出入口	14:42	晴	0.4	西北
			211516	2620868	51	43.6	樸仔坑橋	15:06		0.3	西北
			211516	2621108	50	42.7	玉當山橋	15:30		0.3	西北
	13	一	211516	2621108	13	10.7	玉當山橋	13:30	雨	0.3	西南
			211746	2621314	16	13.3	北勢坑溪橋	13:54		0.4	西南
			211824	2621185	18	15.0	主壩出入口	14:18		0.3	西南
	14	二	211516	2621108	15	12.4	玉當山橋	14:13	陰	0.3	西南
			211746	2621314	10	8.1	北勢坑溪橋	14:36		0.3	西南
			211824	2621185	13	10.7	主壩出入口	15:00		0.4	西南
	15	三	211516	2621108	12	9.9	玉當山橋	13:10	陰	0.3	西南
			211746	2621314	14	11.6	北勢坑溪橋	13:33		0.3	西南
			211824	2621185	10	8.1	主壩出入口	13:57		0.2	西南
	16	四	211516	2621108	12	9.9	玉當山橋	12:30	晴	0.4	西南
			211746	2621314	10	8.1	北勢坑溪橋	12:54		0.5	西南
			211824	2621185	10	8.1	主壩出入口	13:17		0.4	西南

表 2.1-6 本季空氣 $PM_{2.5}$ 即時測站即時監測結果表(續 3)

月份	日	星期	測量座標		測值	校正測值	週遭環境	量測	天	風速	風向
8	17	五	211516	2621108	9	7.3	玉當山橋	15:51	陰	0.2	西南
			211746	2621314	11	9.0	北勢坑溪橋	16:15		0.33	西南
			211824	2621185	13	10.7	主壩出入口	16:38		0.3	西南
	18	六	211516	2621108	13	10.7	玉當山橋	13:18	雨	0.3	西南
			211746	2621314	11	9.0	北勢坑溪橋	13:42		0.2	西南
			211824	2621185	8	6.4	主壩出入口	14:06		0.2	西南
	19	日	211516	2621108	16	13.3	玉當山橋	13:55	雨	0.5	西南
			211746	2621314	18	15.0	北勢坑溪橋	14:18		0.4	西南
			211824	2621185	14	11.6	主壩出入口	14:42		0.4	西南
	20	一	211824	2621185	16	13.3	主壩出入口	12:45	雨	0.3	西
			211896	2621291	14	11.6	總工務所	13:10		0.3	西
			211516	2621108	13	10.7	玉當山橋	13:33		0.4	西
	21	二	211824	2621185	10	8.1	主壩出入口	12:03	晴	0.3	西
			211896	2621291	8	6.4	總工務所	12:27		0.3	西
			211516	2621108	9	7.3	玉當山橋	12:51		0.2	西
	22	三	211539	2620785	8	6.4	湖南壩出入口	09:08	晴	0.2	北
			211516	2620868	7	5.5	樸仔坑橋	09:32		0.2	北
			211516	2621108	8	6.4	玉當山橋	09:56		0.3	北
	23	四	211824	2621185	18	15.0	主壩出入口	11:24	陰	0.3	西
			211896	2621291	20	16.8	總工務所	11:48		0.4	西
			211516	2621108	15	12.4	玉當山橋	12:12		0.4	西
	24	五	211516	2621108	7	5.5	玉當山橋	14:22	雨	0.8	西南
			211746	2621314	8	6.4	北勢坑溪橋	14:45		0.8	西南
			211824	2621185	9	7.3	主壩出入口	15:09		0.9	西南
	25	六	211516	2621108	23	19.4	玉當山橋	14:15	晴	0.7	西南
			211746	2621314	20	16.8	北勢坑溪橋	14:39		0.7	西南
			211824	2621185	19	15.9	主壩出入口	15:02		0.8	西南
	26	日	211516	2621108	10	8.1	玉當山橋	13:03	晴	0.3	西南
			211746	2621314	10	8.1	北勢坑溪橋	13:27		0.3	西南
			211824	2621185	8	6.4	主壩出入口	13:50		0.2	西南
	27	一	211516	2621108	9	7.3	玉當山橋	12:33	晴	0.4	西南
			211746	2621314	13	10.7	北勢坑溪橋	12:57		0.5	西南
			211824	2621185	8	6.4	主壩出入口	13:21		0.5	西南
	28	二	211824	2621185	15	12.4	主壩出入口	12:03	雨	0.4	南
			211896	2621291	10	8.1	總工務所	12:27		0.3	南
			211516	2621108	8	6.4	玉當山橋	12:51		0.4	南
	29	三	211824	2621185	12	9.9	主壩出入口	14:20	雨	0.3	南
			211896	2621291	8	6.4	總工務所	14:44		0.3	南
			211516	2621108	8	6.4	玉當山橋	15:08		0.2	南
	30	四	211824	2621185	12	9.9	主壩出入口	11:07	陰	0.3	南
			211896	2621291	14	11.6	總工務所	11:31		0.4	南
			211516	2621108	11	9.0	玉當山橋	11:55		0.3	南
	31	五	211539	2620785	57	48.8	湖南壩出入口	12:54	晴	0.4	西北
			211516	2620868	48	41.0	樸仔坑橋	13:19		0.3	西北
			211516	2621108	54	46.2	玉當山橋	13:43		0.5	西北

表 2.1-6 本季空氣 $PM_{2.5}$ 即時測站即時監測結果表(續 4)

月份	日期	星期	測量座標		測值	校正測值	週遭環境概述	量測時	天	風速	風向
9	1	六	211539	2620785	50	42.7	湖南壩出入口	12:16	晴	0.5	西北
			211513	2620868	55	47.0	樸仔坑橋	12:40		0.5	西北
			211516	2621108	53	45.3	玉當山橋	13:04		0.4	西北
	2	日	211539	2620785	55	47.0	湖南壩出入口	14:42	晴	0.6	西北
			211513	2620868	54	46.2	樸仔坑橋	15:06		0.5	西北
			211516	2621108	50	42.7	玉當山橋	15:30		0.6	西北
	3	一	211824	2621185	47	40.1	主壩出入口	13:04	晴	0.7	西
			211896	2621291	50	42.7	總工務所	13:27		0.6	西
			211516	2621108	50	42.7	玉當山橋	13:51		0.6	西
	4	二	211516	2621108	48	41.0	玉當山橋	12:51	晴	0.6	西南
			211746	2621314	50	42.7	北勢坑溪橋	13:15		0.7	西南
			211824	2621185	52	44.4	主壩出入口	13:39		0.6	西南
	5	三	211824	2621185	69	59.1	主壩出入口	12:34	晴	0.3	西
			211896	2621291	71	60.9	總工務所	12:58		0.4	西
			211516	2621108	82	70.4	玉當山橋	13:22		0.3	西
	6	四	211539	2620785	72	61.7	湖南壩出入口	12:59	陰	0.3	西北
			211513	2620868	77	66.0	樸仔坑橋	13:22		0.3	西北
			211516	2621108	74	63.4	玉當山橋	13:46		0.2	西北
	7	五	211539	2620785	49	41.8	湖南壩出入口	14:12	雨	0.5	西北
			211513	2620868	46	39.2	樸仔坑橋	14:36		0.5	西北
			211516	2621108	44	37.5	玉當山橋	15:00		0.4	西北
	8	六	211539	2620785	19	15.9	湖南壩出入口	13:10	晴	0.4	西北
			211513	2620868	23	19.4	樸仔坑橋	13:34		0.3	西北
			211516	2621108	20	16.8	玉當山橋	13:57		0.4	西北
	9	日	211539	2620785	15	12.4	湖南壩出入口	14:15	晴	0.4	北
			211513	2620868	13	10.7	樸仔坑橋	14:38		0.5	北
			211516	2621108	19	15.9	玉當山橋	15:02		0.4	北
	10	一	211539	2620785	13	10.7	湖南壩出入口	13:07	陰	0.3	西北
			211513	2620868	16	13.3	樸仔坑橋	13:31		0.3	西北
			211516	2621108	11	9.0	玉當山橋	13:55		0.2	西北
	11	二	211824	2621185	25	21.1	主壩出入口	13:53	陰	0.3	西
			211896	2621291	30	25.4	總工務所	14:17		0.2	西
			211516	2621108	25	21.1	玉當山橋	14:41		0.2	西
	12	三	211539	2620785	25	21.1	湖南壩出入口	13:18	雨	0.4	西北
			211513	2620868	26	22.0	樸仔坑橋	13:41		0.4	西北
			211516	2621108	21	17.6	玉當山橋	14:05		0.3	西北
	13	四	211539	2620785	35	29.7	湖南壩出入口	14:23	晴	0.2	西北
			211513	2620868	32	27.1	樸仔坑橋	14:47		0.3	西北
			211516	2621108	31	26.3	玉當山橋	15:12		0.3	西北
	14	五	211539	2620785	36	30.6	湖南壩出入口	13:10	晴	0.2	西北
			211513	2620868	29	24.5	樸仔坑橋	13:34		0.2	西北
			211516	2621108	25	21.1	玉當山橋	13:57		0.3	西北
	15	六	211539	2620785	15	12.4	湖南壩出入口	15:29	陰	0.3	北
			211513	2620868	12	9.9	樸仔坑橋	15:53		0.4	北
			211516	2621108	20	16.8	玉當山橋	16:16		0.3	北
	16	日	211539	2620785	23	19.4	湖南壩出入口	14:02	陰	0.3	北
			211513	2620868	19	15.9	樸仔坑橋	14:26		0.2	北
			211516	2621108	24	20.2	玉當山橋	14:50		0.2	北

表 2.1-6 本季空氣 $PM_{2.5}$ 即時測站即時監測結果表(續 5)

月份	日期	星期	測量座標		測值	校正測值	週遭環境概述	量測時	天	風速	風向
9	17	一	211516	2621108	18	15.0	玉當山橋	12:44	晴	0.3	西南
			211746	2621314	14	11.6	北勢坑溪橋	13:07		0.4	西南
			211824	2621185	20	16.8	主壩出入口	13:31		0.3	西南
	18	二	211539	2620785	23	19.4	湖南壩出入口	13:40	晴	0.4	西北
			211513	2620868	21	17.6	樸仔坑橋	14:04		0.3	西北
			211516	2621108	25	21.1	玉當山橋	14:27		0.4	西北
	19	三	211824	2621185	19	15.9	主壩出入口	12:09	晴	0.4	西
			211896	2621291	14	11.6	總工務所	12:33		0.3	西
			211516	2621108	13	10.7	玉當山橋	12:56		0.3	西
	20	四	211824	2621185	17	14.2	主壩出入口	14:05	晴	0.2	西
			211896	2621291	21	17.6	總工務所	14:28		0.3	西
			211516	2621108	20	16.8	玉當山橋	14:52		0.2	西
	21	五	211824	2621185	16	13.3	主壩出入口	14:29	晴	0.4	西
			211896	2621291	15	12.4	總工務所	14:53		0.3	西
			211516	2621108	10	8.1	玉當山橋	15:16		0.4	西
	22	六	211539	2620785	24	20.2	湖南壩出入口	11:42	晴	0.5	西北
			211513	2620868	25	21.1	樸仔坑橋	12:06		0.4	西北
			211516	2621108	24	20.2	玉當山橋	12:30		0.4	西北
	23	日	211539	2620785	56	47.9	湖南壩出入口	14:56	晴	0.4	西北
			211513	2620868	50	42.7	樸仔坑橋	15:19		0.5	西北
			211516	2621108	51	43.6	玉當山橋	15:43		0.4	西北
	24	一	211539	2620785	20	16.8	湖南壩出入口	14:00	晴	0.3	西北
			211513	2620868	16	13.3	樸仔坑橋	14:24		0.3	西北
			211516	2621108	12	9.9	玉當山橋	14:48		0.4	西北
	25	二	211539	2620785	17	14.2	湖南壩出入口	12:04	晴	0.3	西北
			211513	2620868	10	8.1	樸仔坑橋	12:28		0.3	西北
			211516	2621108	10	8.1	玉當山橋	12:52		0.2	西北
	26	三	211539	2620785	24	20.2	湖南壩出入口	12:44	陰	0.2	西北
			211513	2620868	24	20.2	樸仔坑橋	13:07		0.3	西北
			211516	2621108	20	16.8	玉當山橋	13:31		0.2	西北
	27	四	211539	2620785	20	16.8	湖南壩出入口	12:00	晴	0.4	西北
			211513	2620868	16	13.3	樸仔坑橋	12:24		0.3	西北
			211516	2621108	11	9.0	玉當山橋	12:48		0.4	西北
	28	五	211539	2620785	17	14.2	湖南壩出入口	12:33	陰	0.4	北
			211513	2620868	11	9.0	樸仔坑橋	12:56		0.5	北
			211516	2621108	12	9.9	玉當山橋	13:20		0.3	北
	29	六	211539	2620785	10	8.1	湖南壩出入口	08:59	晴	0.5	北
			211513	2620868	14	11.6	樸仔坑橋	09:23		0.4	北
			211516	2621108	15	12.4	玉當山橋	09:46		0.6	北
	30	日	211539	2620785	29	24.5	湖南壩出入口	14:21	晴	0.4	西北
			211513	2620868	30	25.4	樸仔坑橋	14:45		0.4	西北
			211516	2621108	25	21.1	玉當山橋	15:08		0.3	西北

表 2.1-7 本季空氣 PM_{10} 即時測站即時監測結果表

月份	日期	星期	測量座標		測值 μg/m³	週遭環境概述	量測時間	天氣	風速 m/s	風向
7	1	日	211516	2621108	39	玉當山橋	07:09	晴	0.2	西南
			211746	2621314	42	北勢坑溪橋	07:33		0.2	西南
			211824	2621185	37	主壩出入口	07:56		0.3	西南
	2	一	211516	2621108	28	玉當山橋	13:37	雨	0.5	西南
			211746	2621314	31	北勢坑溪橋	14:00		0.4	西南
			211824	2621185	28	主壩出入口	14:25		0.5	西南
	3	二	211516	2621108	44	玉當山橋	12:55	陰	0.4	西南
			211746	2621314	43	北勢坑溪橋	13:19		0.3	西南
			211824	2621185	39	主壩出入口	13:43		0.4	西南
	4	三	211516	2621108	31	玉當山橋	11:41	陰	0.3	西南
			211746	2621314	33	北勢坑溪橋	12:04		0.2	西南
			211824	2621185	26	主壩出入口	12:29		0.2	西南
	5	四	211516	2621108	36	玉當山橋	14:14	陰	0.3	西南
			211746	2621314	34	北勢坑溪橋	14:38		0.4	西南
			211824	2621185	30	主壩出入口	15:02		0.3	西南
	6	五	211516	2621108	37	玉當山橋	13:07	晴	0.3	西南
			211746	2621314	36	北勢坑溪橋	13:32		0.3	西南
			211824	2621185	40	主壩出入口	13:55		0.4	西南
	7	六	211516	2621108	32	玉當山橋	12:51	晴	0.5	西南
			211746	2621314	34	北勢坑溪橋	13:15		0.6	西南
			211824	2621185	38	主壩出入口	13:38		0.5	西南
	8	日	211539	2620785	35	湖南壩出入口	11:43	晴	0.4	西北
			211513	2620868	31	樸仔坑橋	12:07		0.5	西北
			211824	2620785	36	主壩出入口	12:30		0.5	西北
	9	一	211539	2620785	43	湖南壩出入口	11:54	晴	0.3	北
			211513	2620868	40	樸仔坑橋	12:17		0.2	北
			211516	2621108	38	玉當山橋	12:42		0.3	北
	10	二	211539	2620785	64	湖南壩出入口	13:05	晴	0.4	西北
			211513	2620868	66	樸仔坑橋	13:29		0.3	西北
			211824	2620785	61	主壩出入口	13:52		0.3	西北
	11	三	211516	2621108	32	玉當山橋	13:11	陰	0.4	西南
			211746	2621314	30	北勢坑溪橋	13:35		0.4	西南
			211824	2621185	35	主壩出入口	13:58		0.3	西南
	12	四	211539	2620785	44	湖南壩出入口	12:52	雨	0.3	西北
			211513	2620868	39	樸仔坑橋	13:16		0.2	西北
			211824	2620785	43	主壩出入口	13:39		0.3	西北
	13	五	211824	2621185	73	主壩出入口	13:39	雨	0.3	西
			211896	2621291	69	總工務所	14:03		0.4	西
			212055	2621506	64	植物保存區	14:27		0.4	西
	14	六	211539	2620785	49	湖南壩出入口	13:47	晴	0.3	西北
			211513	2620868	53	樸仔坑橋	14:12		0.3	西北
			211824	2620785	50	主壩出入口	14:35		0.4	西北
	15	日	211539	2620785	53	湖南壩出入口	10:52	晴	0.5	西北
			211513	2620868	52	樸仔坑橋	11:17		0.5	西北
			211824	2620785	49	主壩出入口	11:40		0.4	西北
	16	一	211539	2620785	68	湖南壩出入口	12:13	陰	0.2	西北
			211513	2620868	71	樸仔坑橋	12:37		0.3	西北
			211824	2620785	66	主壩出入口	13:00		0.2	西北

表 2.1-7 本季空氣 PM_{10} 即時測站即時監測結果表(續 1)

月份	日期	星期	測量座標		測值 μg/m³	週遭環境概述	量測時間	天氣	風速 m/s	風向
7	17	二	211824	2621185	43	主壩出入口	13:51	晴	0.6	西
			211896	2621291	47	總工務所	14:15		0.5	西
			212055	2621506	44	植物保存區	14:38		0.5	西
	18	三	211824	2621185	35	主壩出入口	12:58	晴	0.3	西
			211896	2621291	31	總工務所	13:22		0.4	西
			212055	2621506	37	植物保存區	13:46		0.3	西
	19	四	211539	2620785	61	湖南壩出入口	14:31	陰	0.2	西北
			211513	2620868	66	樸仔坑橋	14:56		0.3	西北
			211824	2620785	63	主壩出入口	15:19		0.4	西北
	20	五	211539	2620785	43	湖南壩出入口	12:45	晴	0.4	西北
			211513	2620868	40	樸仔坑橋	13:09		0.5	西北
			211824	2620785	35	主壩出入口	13:32		0.4	西北
	21	六	211539	2620785	52	湖南壩出入口	14:17	雨	0.3	西北
			211513	2620868	49	樸仔坑橋	14:41		0.3	西北
			211824	2620785	54	主壩出入口	15:04		0.4	西北
	22	日	211824	2621185	47	主壩出入口	13:39	陰	0.4	西
			211896	2621291	47	總工務所	14:04		0.3	西
			212055	2621506	43	植物保存區	14:27		0.4	西
	23	一	211516	2621108	46	玉當山橋	10:18	晴	0.3	西南
			211746	2621314	49	北勢坑溪橋	10:42		0.2	西南
			211824	2621185	50	主壩出入口	11:05		0.2	西南
	24	二	211824	2621185	38	主壩出入口	10:07	晴	0.3	西
			211896	2621291	35	總工務所	10:32		0.2	西
			212055	2621506	40	植物保存區	10:55		0.3	西
	25	三	211824	2621185	34	主壩出入口	10:32	晴	0.2	西
			211896	2621291	37	總工務所	10:56		0.3	西
			212055	2621506	31	植物保存區	11:19		0.3	西
	26	四	211539	2620785	45	湖南壩出入口	10:25	晴	0.3	西北
			211513	2620868	43	樸仔坑橋	10:49		0.4	西北
			211824	2620785	46	主壩出入口	11:13		0.4	西北
	27	五	211539	2620785	37	湖南壩出入口	10:13	晴	0.3	西北
			211513	2620868	41	樸仔坑橋	10:36		0.2	西北
			211824	2620785	43	主壩出入口	10:57		0.3	西北
	28	六	211539	2620785	29	湖南壩出入口	12:07	晴	0.4	西北
			211513	2620868	32	樸仔坑橋	12:32		0.5	西北
			211824	2620785	30	主壩出入口	12:55		0.4	西北
	29	日	211824	2621185	32	主壩出入口	16:17	晴	0.4	西
			211896	2621291	29	總工務所	14:40		0.4	西
			212055	2621506	31	植物保存區	17:04		0.5	西
	30	一	211824	2621185	36	主壩出入口	13:45	晴	0.4	西
			211896	2621291	38	總工務所	14:10		0.3	西
			212055	2621506	42	植物保存區	14:33		0.5	西
	31	二	211824	2621185	34	主壩出入口	12:33	晴	0.4	西
			211896	2621291	37	總工務所	12:56		0.4	西
			212055	2621506	33	植物保存區	13:20		0.5	西

表 2.1-7 本季空氣 PM_{10} 即時測站即時監測結果表(續 2)

月份	日期	星期	測量座標		測值 μg/m³	週遭環境概述	量測時間	天氣	風速 m/s	風向
8	1	三	211824	2621185	36	主壩出入口	13:15	晴	0.3	西
			211896	2621291	40	總工務所	13:39		0.3	西
			211516	2621108	42	玉當山橋	14:03		0.2	西
	2	四	211516	2621108	23	玉當山橋	12:38	晴	0.3	西南
			211746	2621314	25	北勢坑溪橋	13:02		0.3	西南
			211824	2621185	21	主壩出入口	13:26		0.4	西南
	3	五	211516	2621108	24	玉當山橋	15:18	陰	0.4	西南
			211746	2621314	21	北勢坑溪橋	15:41		0.3	西南
			211824	2621185	30	主壩出入口	16:05		0.4	西南
	4	六	211824	2621185	40	主壩出入口	13:57	晴	0.3	西
			211896	2621291	40	總工務所	14:21		0.4	西
			211516	2621108	38	玉當山橋	14:45		0.4	西
	5	日	211539	2620785	36	湖南壩出入口	09:13	晴	0.3	北
			211513	2620868	32	樣仔坑橋	09:36		0.3	北
			211516	2621108	30	玉當山橋	10:01		0.2	北
	6	一	211539	2620785	44	湖南壩出入口	12:08	晴	0.4	西北
			211513	2620868	45	樣仔坑橋	12:32		0.4	西北
			211516	2621108	49	玉當山橋	12:56		0.5	西北
	7	二	211824	2621185	39	主壩出入口	10:17	晴	0.3	西
			211896	2621291	42	總工務所	10:41		0.4	西
			211516	2621108	37	玉當山橋	11:04		0.3	西
	8	三	211824	2621185	52	主壩出入口	15:08	晴	0.3	西
			211896	2621291	60	總工務所	15:32		0.2	西
			211516	2621108	67	玉當山橋	15:56		0.3	西
	9	四	211539	2620785	43	湖南壩出入口	10:18	陰	0.3	西北
			211513	2620868	40	樣仔坑橋	10:42		0.3	西北
			211516	2621108	42	玉當山橋	11:06		0.2	西北
	10	五	211539	2620785	46	湖南壩出入口	10:21	晴	0.2	西北
			211513	2620868	39	樣仔坑橋	10:45		0.3	西北
			211516	2621108	41	玉當山橋	11:08		0.2	西北
	11	六	211539	2620785	97	湖南壩出入口	10:46	晴	0.3	西北
			211513	2620868	95	樣仔坑橋	11:10		0.4	西北
			211516	2621108	90	玉當山橋	11:34		0.5	西北
	12	日	211539	2620785	81	湖南壩出入口	14:31	晴	0.4	西北
			211513	2620868	83	樣仔坑橋	14:55		0.3	西北
			211516	2621108	80	玉當山橋	15:18		0.3	西北
	13	一	211516	2621108	35	玉當山橋	13:19	雨	0.3	西南
			211746	2621314	37	北勢坑溪橋	13:42		0.4	西南
			211824	2621185	38	主壩出入口	14:07		0.3	西南
	14	二	211516	2621108	32	玉當山橋	14:01	陰	0.3	西南
			211746	2621314	28	北勢坑溪橋	14:25		0.3	西南
			211824	2621185	31	主壩出入口	14:49		0.4	西南
	15	三	211516	2621108	29	玉當山橋	12:58	陰	0.3	西南
			211746	2621314	30	北勢坑溪橋	13:21		0.3	西南
			211824	2621185	27	主壩出入口	13:45		0.2	西南
	16	四	211516	2621108	33	玉當山橋	12:19	晴	0.4	西南
			211746	2621314	31	北勢坑溪橋	12:43		0.5	西南
			211824	2621185	29	主壩出入口	13:06		0.4	西南

表 2.1-7 本季空氣 PM_{10} 即時測站即時監測結果表(續 3)

月份	日期	星期	測量座標		測值 μg/m³	週遭環境概述	量測時間	天氣	風速 m/s	風向
8	17	五	211516	2621108	28	玉當山橋	15:59	陰	0.2	西南
			211746	2621314	31	北勢坑溪橋	16:03		0.3	西南
			211824	2621185	35	主壩出入口	16:27		0.3	西南
	18	六	211516	2621108	30	玉當山橋	13:07	雨	0.3	西南
			211746	2621314	32	北勢坑溪橋	13:31		0.2	西南
			211824	2621185	28	主壩出入口	13:55		0.2	西南
	19	日	211516	2621108	36	玉當山橋	13:43	雨	0.5	西南
			211746	2621314	39	北勢坑溪橋	14:07		0.4	西南
			211824	2621185	34	主壩出入口	14:31		0.4	西南
	20	一	211824	2621185	35	主壩出入口	12:34	雨	0.3	西
			211896	2621291	35	總工務所	12:58		0.3	西
			211516	2621108	33	玉當山橋	13:22		0.4	西
	21	二	211824	2621185	29	主壩出入口	11:51	晴	0.3	西
			211896	2621291	26	總工務所	12:15		0.3	西
			211516	2621108	28	玉當山橋	12:40		0.2	西
	22	三	211539	2620785	23	湖南壩出入口	08:57	晴	0.2	北
			211513	2620868	21	樸仔坑橋	09:20		0.2	北
			211516	2621108	26	玉當山橋	09:45		0.3	北
	23	四	211824	2621185	37	主壩出入口	11:13	陰	0.3	西
			211896	2621291	40	總工務所	11:36		0.4	西
			211516	2621108	34	玉當山橋	12:00		0.4	西
	24	五	211516	2621108	10	玉當山橋	14:10	雨	0.8	西南
			211746	2621314	13	北勢坑溪橋	14:34		0.8	西南
			211824	2621185	10	主壩出入口	14:58		0.9	西南
	25	六	211516	2621108	23	玉當山橋	14:03	晴	0.7	西南
			211746	2621314	20	北勢坑溪橋	14:27		0.7	西南
			211824	2621185	19	主壩出入口	14:51		0.8	西南
	26	日	211516	2621108	21	玉當山橋	12:51	晴	0.3	西南
			211746	2621314	18	北勢坑溪橋	13:16		0.3	西南
			211824	2621185	18	主壩出入口	13:39		0.2	西南
	27	一	211516	2621108	19	玉當山橋	12:22	晴	0.4	西南
			211746	2621314	22	北勢坑溪橋	12:46		0.5	西南
			211824	2621185	17	主壩出入口	13:09		0.5	西南
	28	二	211824	2621185	23	主壩出入口	11:51	雨	0.4	南
			211896	2621291	20	總工務所	12:15		0.3	南
			211516	2621108	18	玉當山橋	12:40		0.4	南
	29	三	211824	2621185	21	主壩出入口	14:09	雨	0.3	南
			211896	2621291	17	總工務所	14:33		0.3	南
			211516	2621108	18	玉當山橋	14:56		0.2	南
	30	四	211824	2621185	22	主壩出入口	10:55	陰	0.3	南
			211896	2621291	25	總工務所	11:19		0.4	南
			211516	2621108	20	玉當山橋	11:44		0.3	南
	31	五	211539	2620785	85	湖南壩出入口	12:43	晴	0.4	西北
			211513	2620868	77	樸仔坑橋	13:07		0.3	西北
			211516	2621108	81	玉當山橋	13:31		0.5	西北

表 2.1-7 本季空氣 PM_{10} 即時測站即時監測結果表(續 4)

月份	日期	星期	測量座標		測值 $\mu g/m^3$	週遭環境概述	量測時間	天氣	風速 m/s	風向
9	1	六	211539	2620785	69	湖南壩出入口	12:04	晴	0.5	西北
			211513	2620868	75	樣仔坑橋	12:28		0.5	西北
			211516	2621108	72	玉當山橋	12:53		0.4	西北
	2	日	211539	2620785	87	湖南壩出入口	14:31	晴	0.6	西北
			211513	2620868	84	樣仔坑橋	14:55		0.5	西北
			211516	2621108	81	玉當山橋	15:19		0.6	西北
	3	一	211824	2621185	75	主壩出入口	12:52	晴	0.7	西
			211896	2621291	78	總工務所	13:15		0.6	西
			211516	2621108	79	玉當山橋	13:39		0.6	西
	4	二	211516	2621108	79	玉當山橋	12:39	晴	0.6	西南
			211746	2621314	82	北勢坑溪橋	13:03		0.7	西南
			211824	2621185	83	主壩出入口	13:28		0.6	西南
	5	三	211824	2621185	96	主壩出入口	12:23	晴	0.3	西
			211896	2621291	97	總工務所	12:47		0.4	西
			211516	2621108	102	玉當山橋	13:10		0.3	西
	6	四	211539	2620785	99	湖南壩出入口	12:47	陰	0.3	西北
			211513	2620868	114	樣仔坑橋	13:11		0.3	西北
			211516	2621108	103	玉當山橋	13:35		0.2	西北
	7	五	211539	2620785	78	湖南壩出入口	14:01	雨	0.5	西北
			211513	2620868	74	樣仔坑橋	14:24		0.5	西北
			211516	2621108	71	玉當山橋	14:49		0.4	西北
	8	六	211539	2620785	33	湖南壩出入口	12:58	晴	0.4	西北
			211513	2620868	35	樣仔坑橋	13:22		0.3	西北
			211516	2621108	31	玉當山橋	13:45		0.4	西北
	9	日	211539	2620785	34	湖南壩出入口	14:03	晴	0.4	北
			211513	2620868	31	樣仔坑橋	14:27		0.5	北
			211516	2621108	37	玉當山橋	14:51		0.4	北
	10	一	211539	2620785	26	湖南壩出入口	12:56	陰	0.3	西北
			211513	2620868	30	樣仔坑橋	13:20		0.3	西北
			211516	2621108	23	玉當山橋	13:43		0.2	西北
	11	二	211824	2621185	45	主壩出入口	13:41	晴	0.3	西
			211896	2621291	49	總工務所	14:05		0.2	西
			211516	2621108	44	玉當山橋	14:30		0.2	西
	12	三	211539	2620785	53	湖南壩出入口	13:07	雨	0.4	西北
			211513	2620868	55	樣仔坑橋	13:30		0.4	西北
			211516	2621108	50	玉當山橋	13:54		0.3	西北
	13	四	211539	2620785	54	湖南壩出入口	14:11	晴	0.2	西北
			211513	2620868	49	樣仔坑橋	14:35		0.3	西北
			211516	2621108	49	玉當山橋	15:00		0.3	西北
	14	五	211539	2620785	56	湖南壩出入口	12:59	晴	0.2	西北
			211513	2620868	48	樣仔坑橋	13:23		0.2	西北
			211516	2621108	45	玉當山橋	13:46		0.3	西北
	15	六	211539	2620785	32	湖南壩出入口	15:17	陰	0.3	北
			211513	2620868	30	樣仔坑橋	15:42		0.4	北
			211516	2621108	39	玉當山橋	16:05		0.3	北
	16	日	211539	2620785	42	湖南壩出入口	13:51	陰	0.3	北
			211513	2620868	39	樣仔坑橋	14:14		0.2	北
			211516	2621108	44	玉當山橋	14:39		0.2	北

表 2.1-7 本季空氣 PM_{10} 即時測站即時監測結果表(續 5)

月份	日期	星期	測量座標		測值 μg/m³	週遭環境概述	量測時間	天氣	風速 m/s	風向
9	17	一	211516	2621108	37	玉當山橋	12:32	晴	0.3	西南
			211746	2621314	34	北勢坑溪橋	12:56		0.4	西南
			211824	2621185	39	主壩出入口	13:20		0.3	西南
	18	二	211539	2620785	43	湖南壩出入口	13:29	晴	0.4	西北
			211513	2620868	40	樣仔坑橋	13:52		0.3	西北
			211516	2621108	35	玉當山橋	14:16		0.4	西北
	19	三	211824	2621185	38	主壩出入口	11:57	晴	0.4	西
			211896	2621291	34	總工務所	12:22		0.3	西
			211516	2621108	32	玉當山橋	12:45		0.3	西
	20	四	211824	2621185	37	主壩出入口	13:54	晴	0.2	西
			211896	2621291	39	總工務所	14:17		0.3	西
			211516	2621108	41	玉當山橋	14:41		0.2	西
	21	五	211824	2621185	36	主壩出入口	14:17	晴	0.4	西
			211896	2621291	33	總工務所	14:41		0.3	西
			211516	2621108	31	玉當山橋	15:05		0.4	西
	22	六	211539	2620785	44	湖南壩出入口	11:31	晴	0.5	西北
			211513	2620868	46	樣仔坑橋	11:55		0.4	西北
			211516	2621108	43	玉當山橋	12:18		0.4	西北
	23	日	211539	2620785	75	湖南壩出入口	14:44	晴	0.4	西北
			211513	2620868	69	樣仔坑橋	15:08		0.5	西北
			211516	2621108	72	玉當山橋	15:32		0.4	西北
	24	一	211539	2620785	38	湖南壩出入口	13:49	晴	0.3	西北
			211513	2620868	35	樣仔坑橋	14:13		0.3	西北
			211516	2621108	32	玉當山橋	14:36		0.4	西北
	25	二	211539	2620785	35	湖南壩出入口	11:53	晴	0.3	西北
			211513	2620868	31	樣仔坑橋	12:16		0.3	西北
			211516	2621108	30	玉當山橋	12:41		0.2	西北
	26	三	211539	2620785	44	湖南壩出入口	12:32	陰	0.2	西北
			211513	2620868	46	樣仔坑橋	12:56		0.3	西北
			211516	2621108	41	玉當山橋	13:20		0.2	西北
	27	四	211539	2620785	38	湖南壩出入口	11:49	晴	0.4	西北
			211513	2620868	33	樣仔坑橋	12:13		0.3	西北
			211516	2621108	30	玉當山橋	12:36		0.4	西北
	28	五	211539	2620785	35	湖南壩出入口	12:21	陰	0.4	北
			211513	2620868	32	樣仔坑橋	12:45		0.5	北
			211516	2621108	32	玉當山橋	13:08		0.3	北
	29	六	211539	2620785	31	湖南壩出入口	08:48	晴	0.5	北
			211513	2620868	34	樣仔坑橋	09:12		0.4	北
			211516	2621108	37	玉當山橋	09:35		0.6	北
	30	日	211539	2620785	47	湖南壩出入口	14:09	晴	0.4	西北
			211513	2620868	51	樣仔坑橋	14:33		0.4	西北
			211516	2621108	46	玉當山橋	14:56		0.3	西北

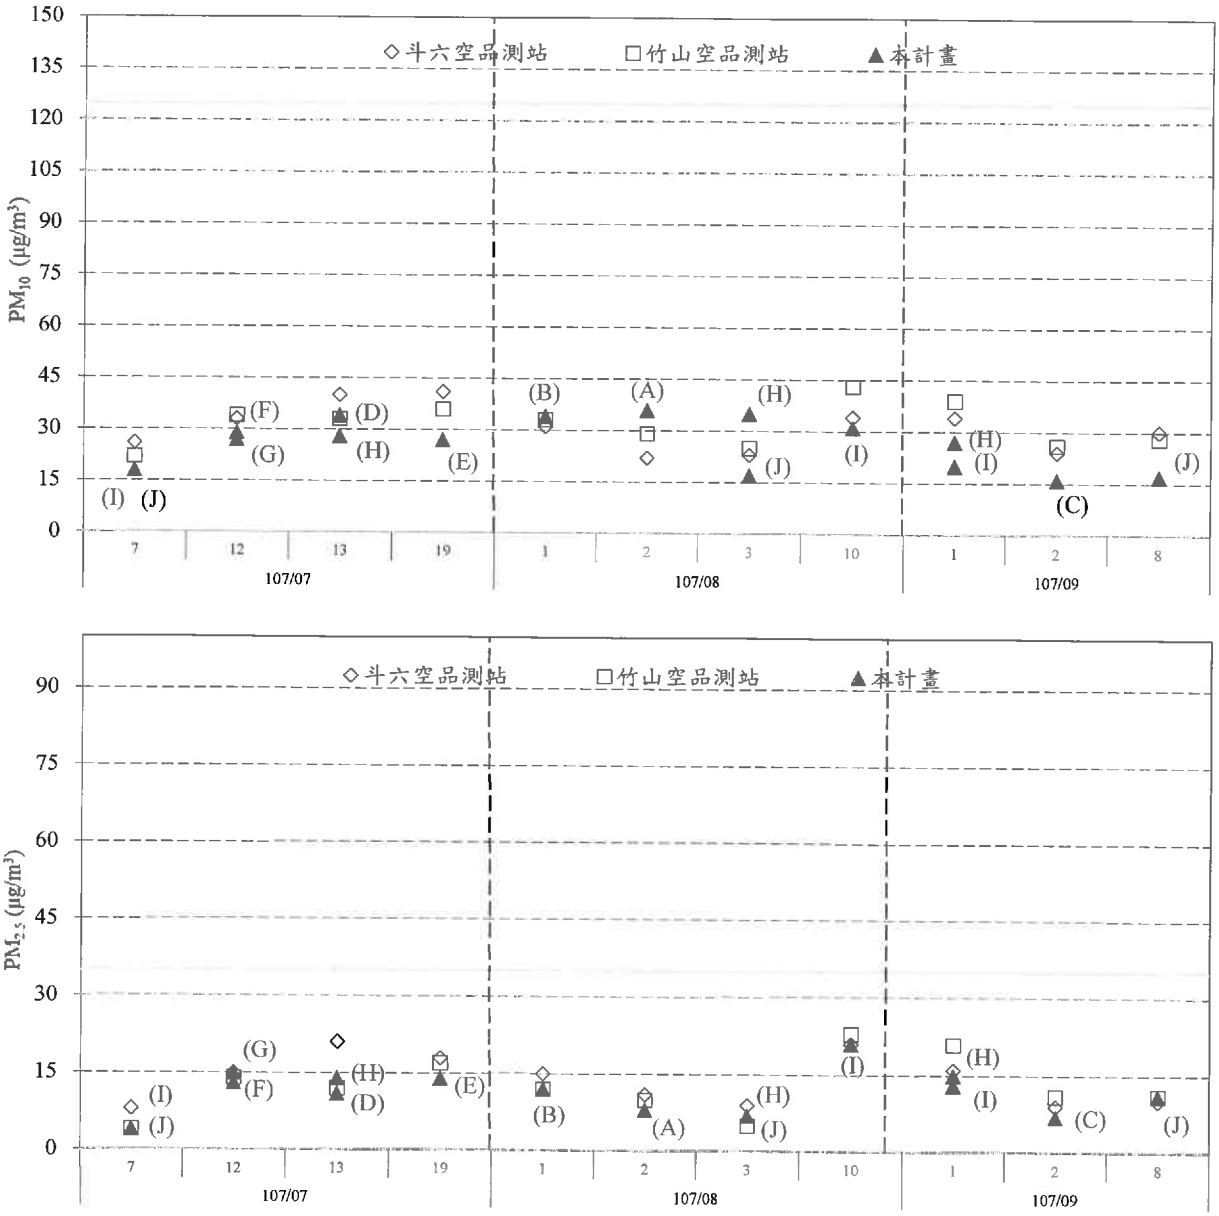

註 1: (A)棋山國小(B)梅林國小(C)引水隧道出口(D)引水隧道入口(E)桶頭國小(F)瑞竹國小(G)玉當山(H)樸仔坑回春寺(I)北勢坑溪民宅(J)第一取出水工

圖 2.1-1 本季固定及移動測站 PM_{10} 及 $PM_{2.5}$ 24 小時值與鄰近環保署測值比對圖

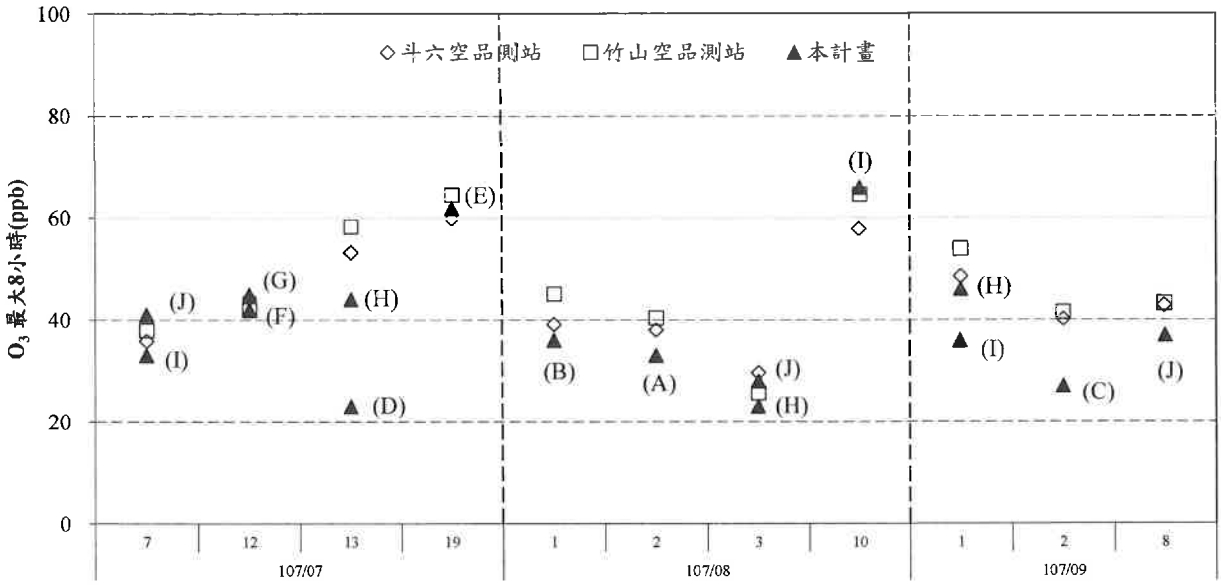

註 1: (A)棋山國小(B)梅林國小(C)引水隧道出口(D)引水隧道入口(E)桶頭國小(F)瑞竹國小(G)玉當山(H)樸仔坑回春寺(I)北勢坑溪民宅(J)第一取出水工

圖 2.1-2 本季固定及移動測站 O_3 最大 8 小時值與鄰近環保署測值比對圖

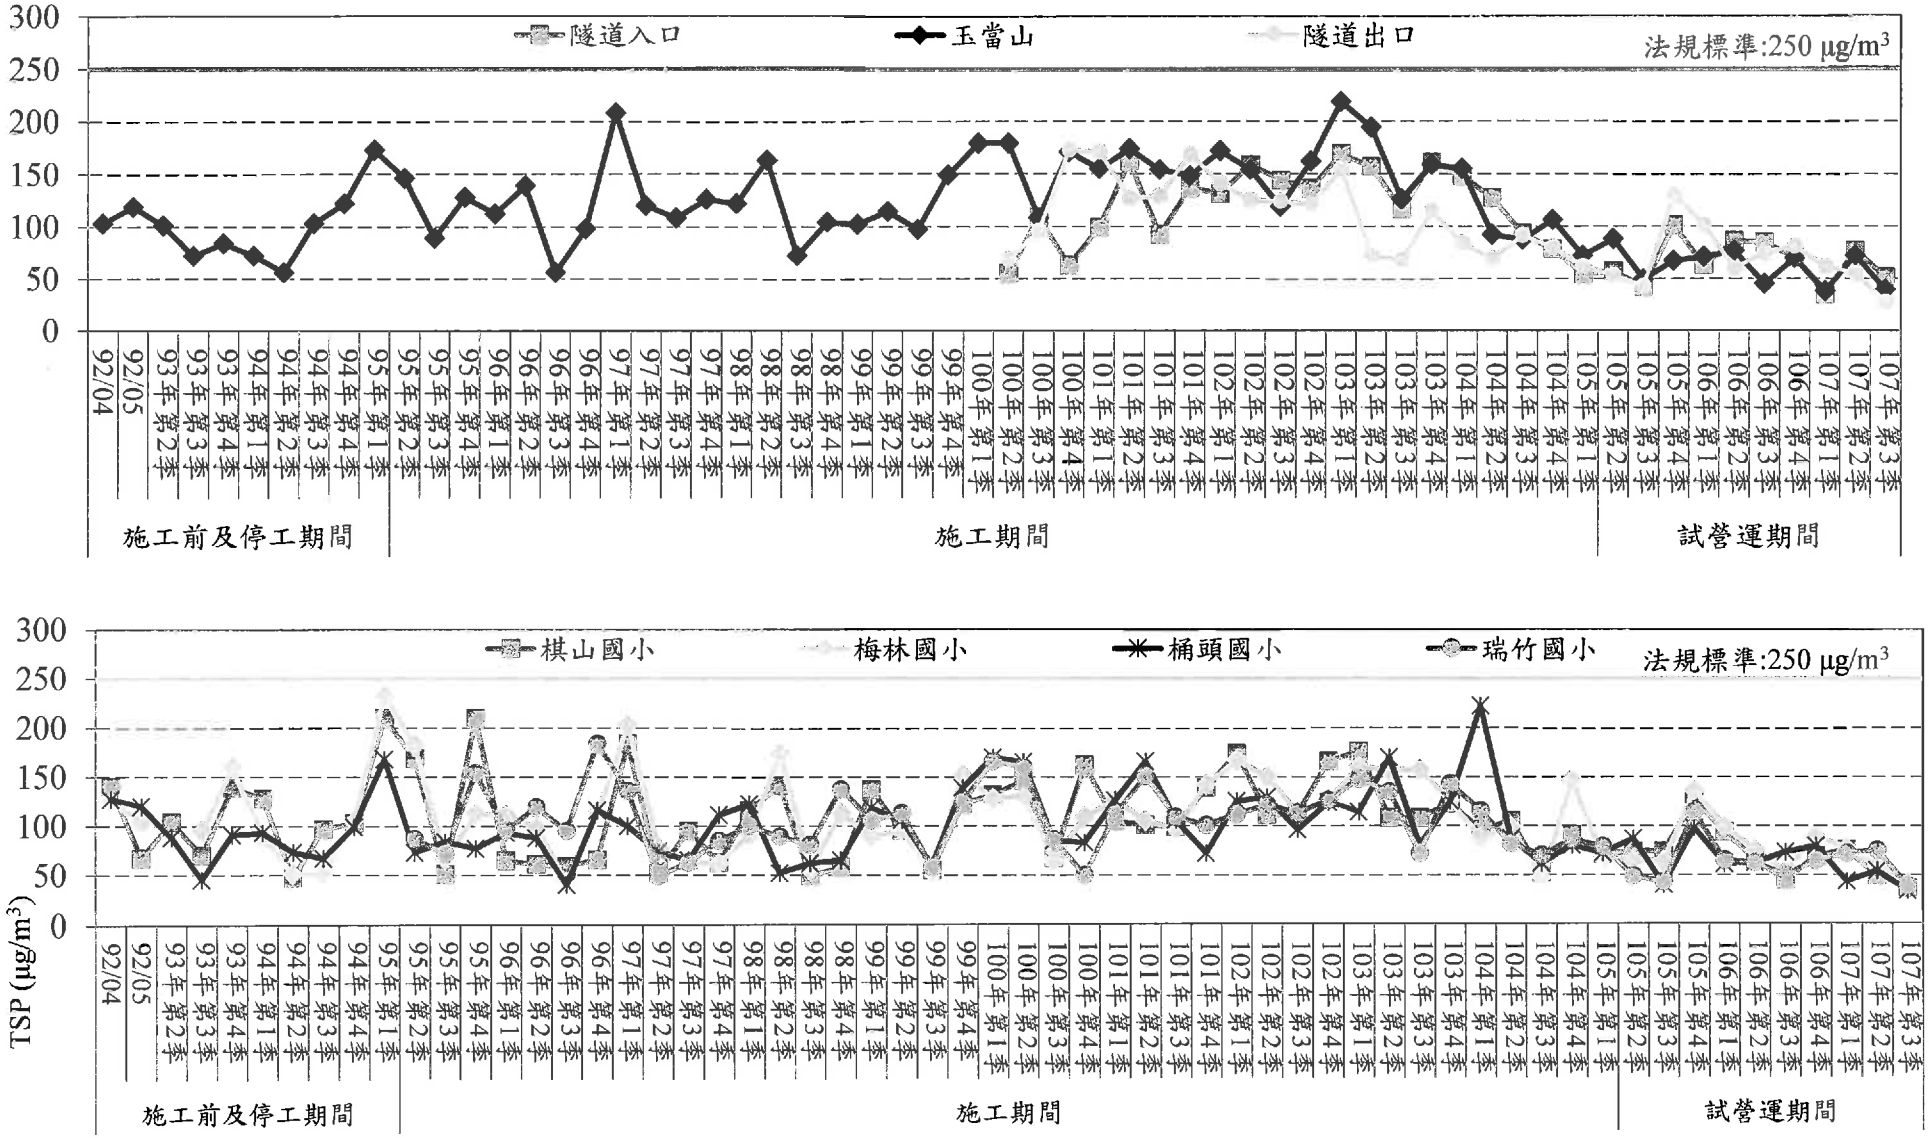

圖 2.1-3　歷次空氣品質總懸浮微粒 TSP 24 小時值監測成果圖(固定測站)

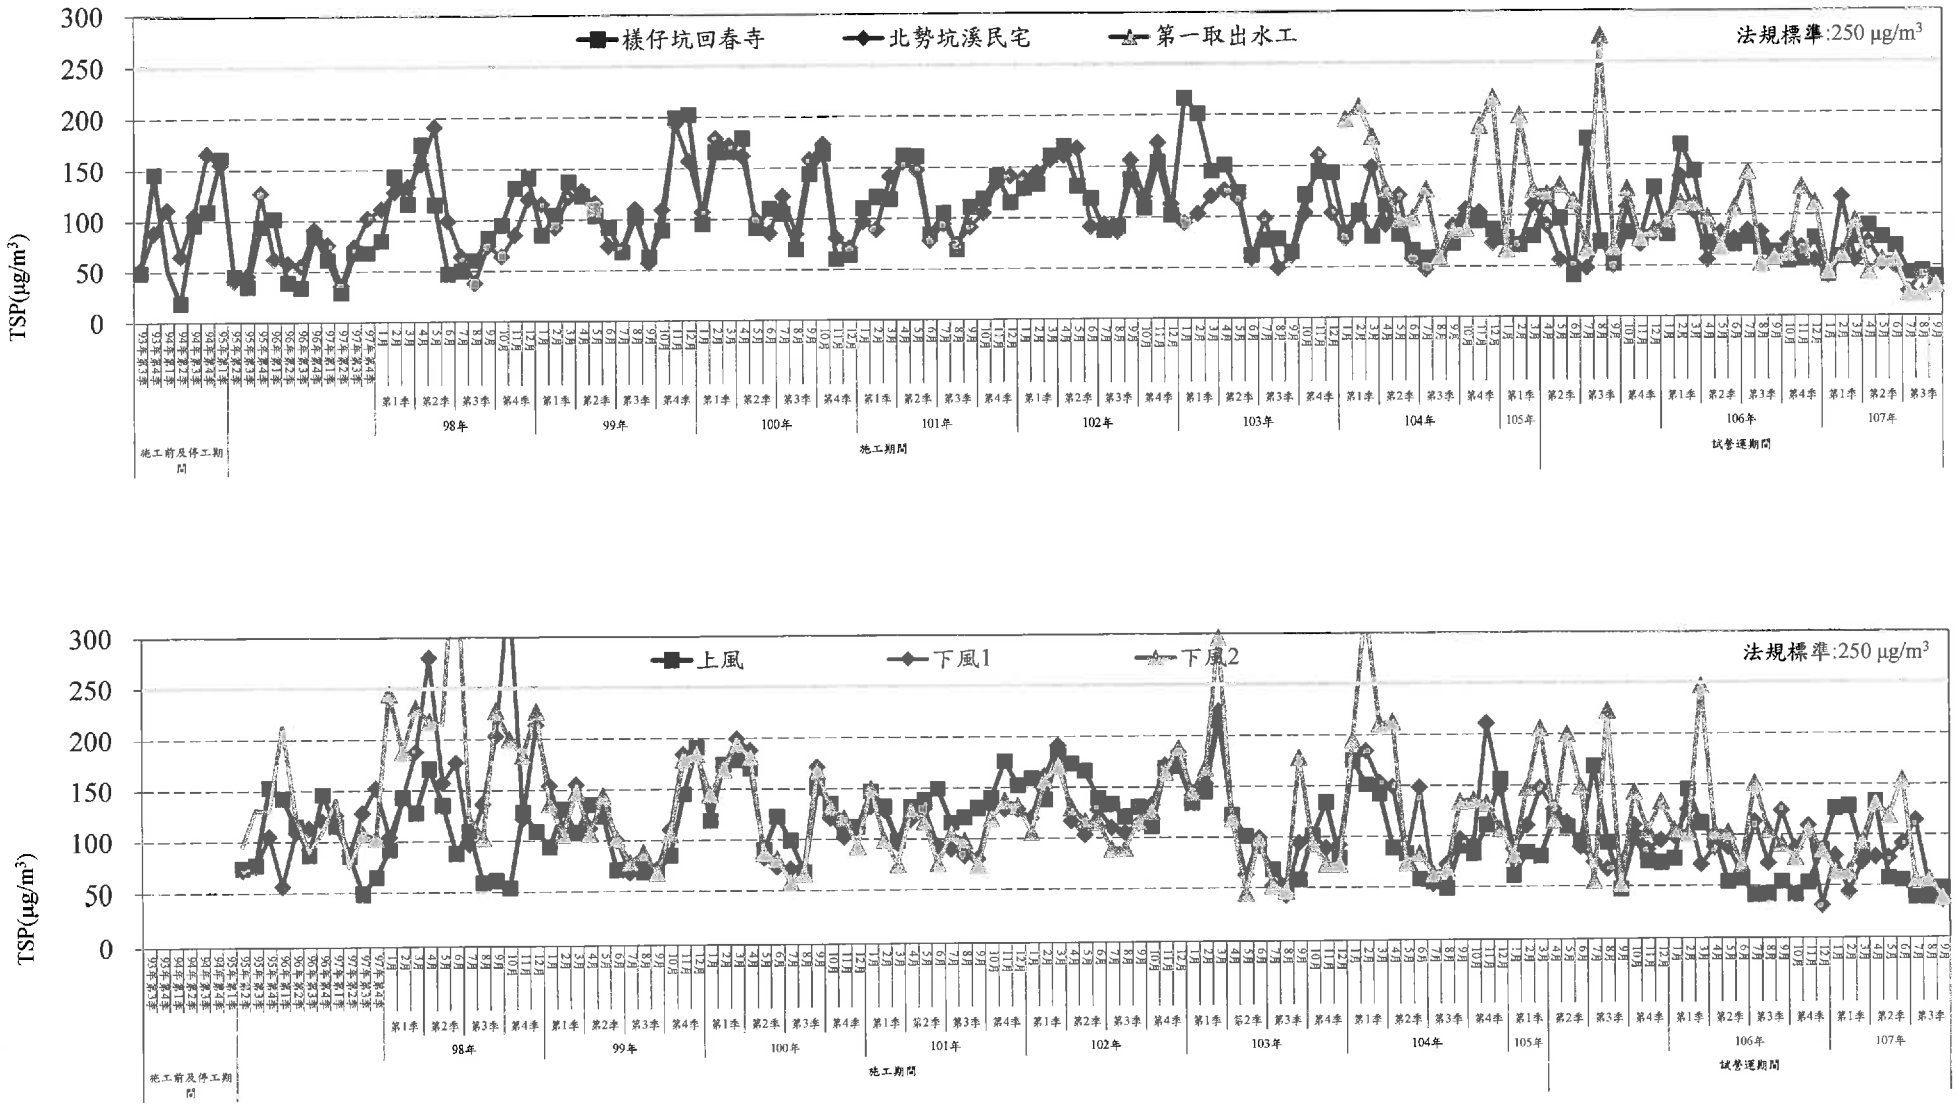

圖 2.1-4　歷次空氣品質 TSP 監測成果圖(移動測站)

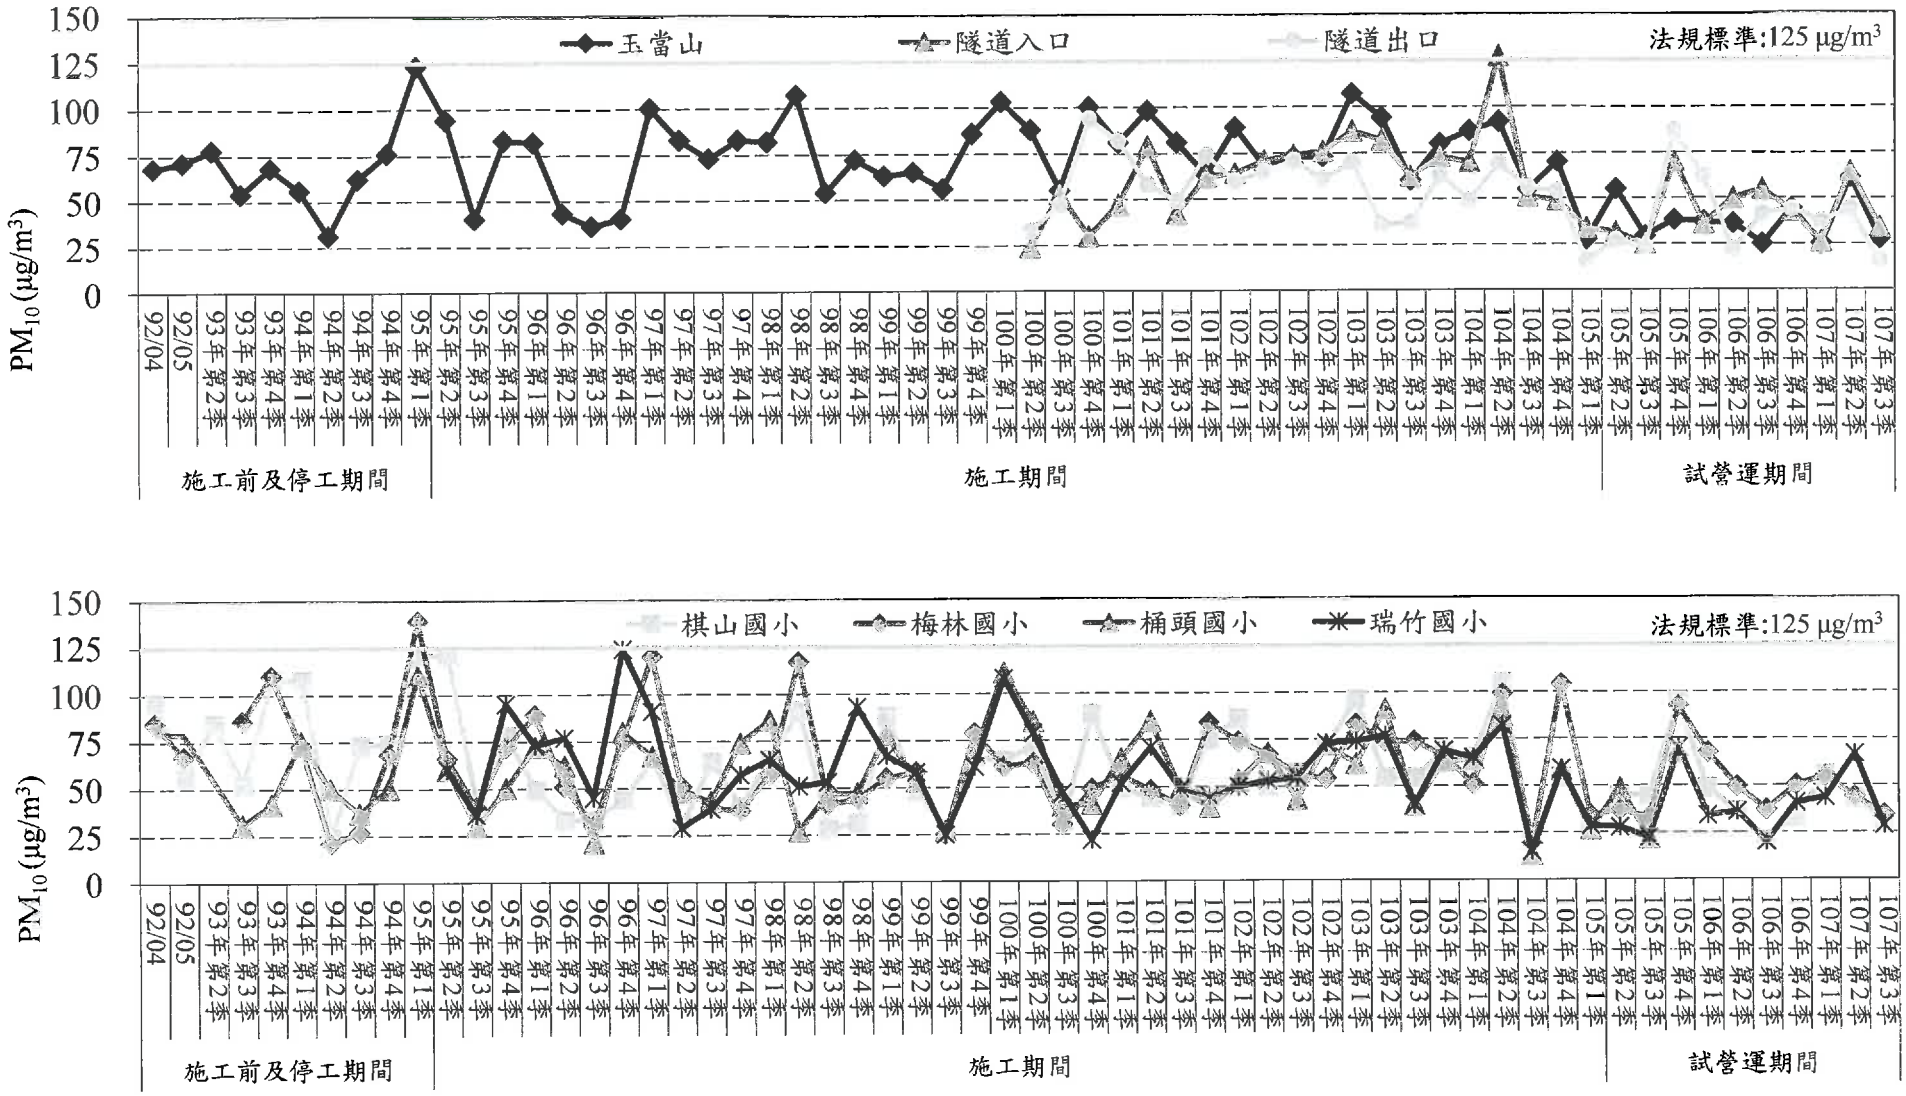

圖 2.1-5　歷次空氣品質懸浮微粒 PM_{10} 日平均值監測成果圖(固定測站)

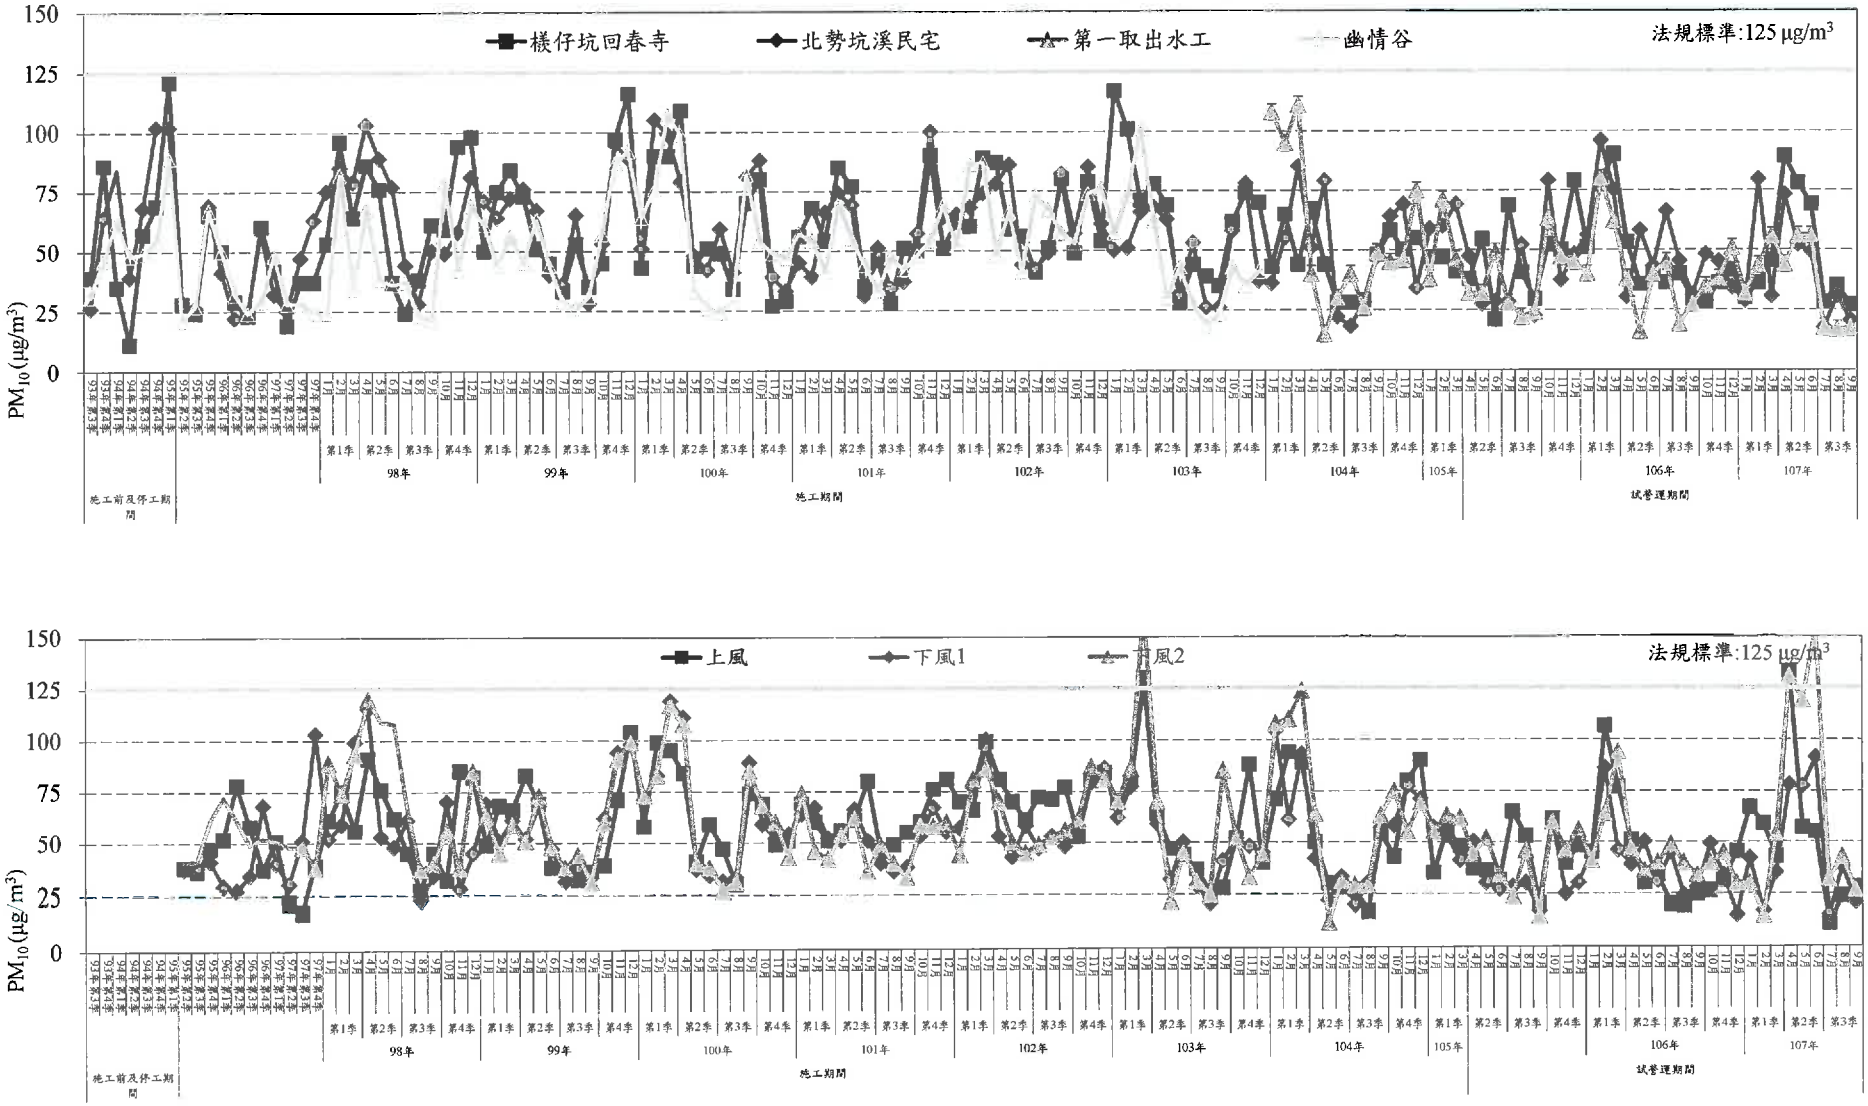

圖 2.1-6　歷次空氣品質 PM_{10} 監測成果圖(移動測站)

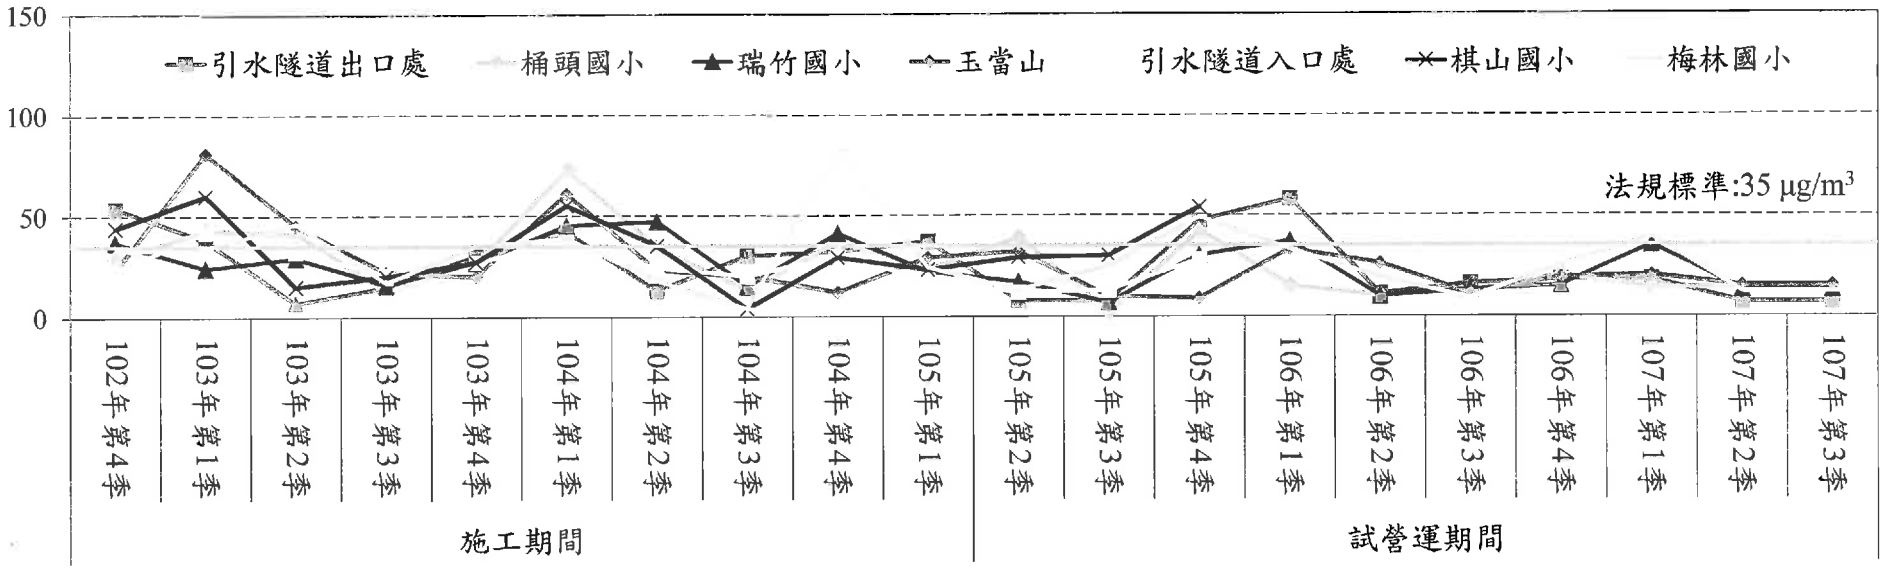

圖 2.1-7　歷次空氣品質總懸浮微粒 $PM_{2.5}$ 24 小時值監測成果圖(固定測站)

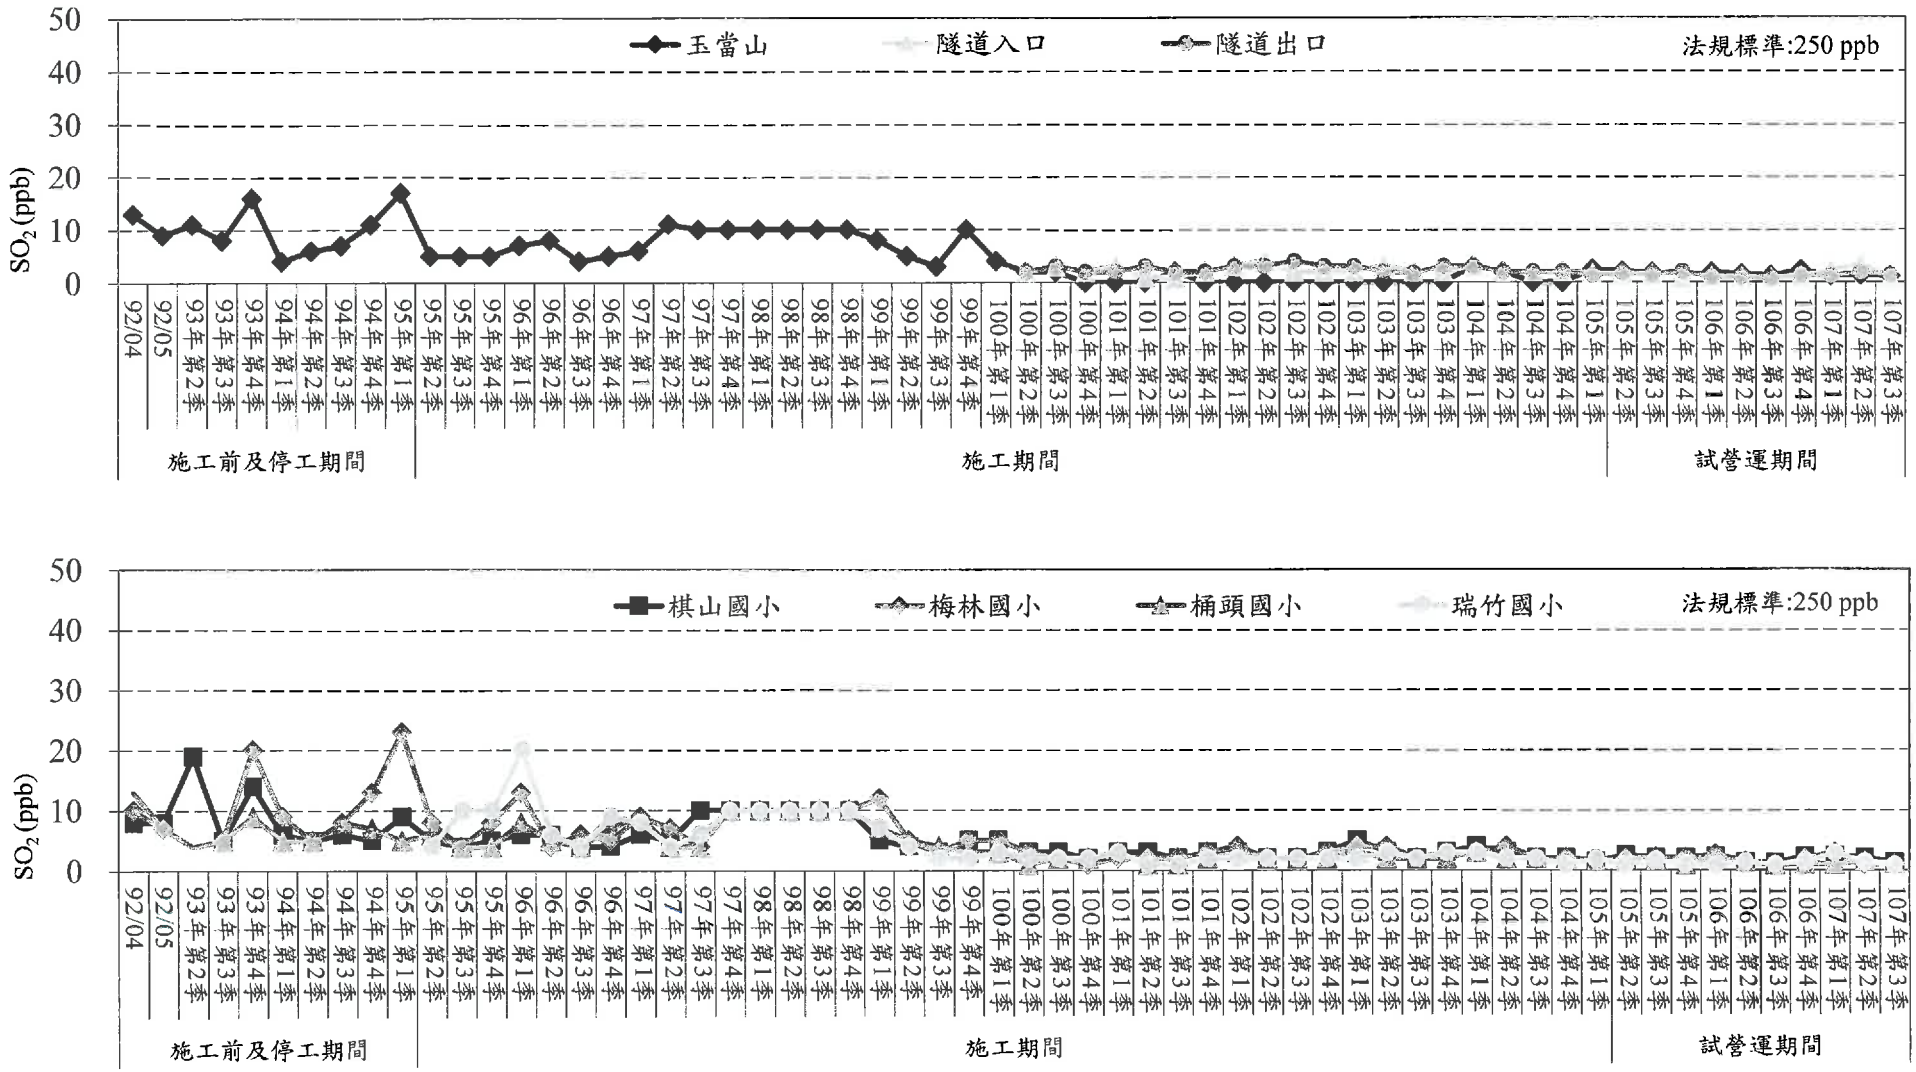

圖 2.1-8　歷次空氣品質二氧化硫 SO_2 小時平均值監測成果圖(固定測站)

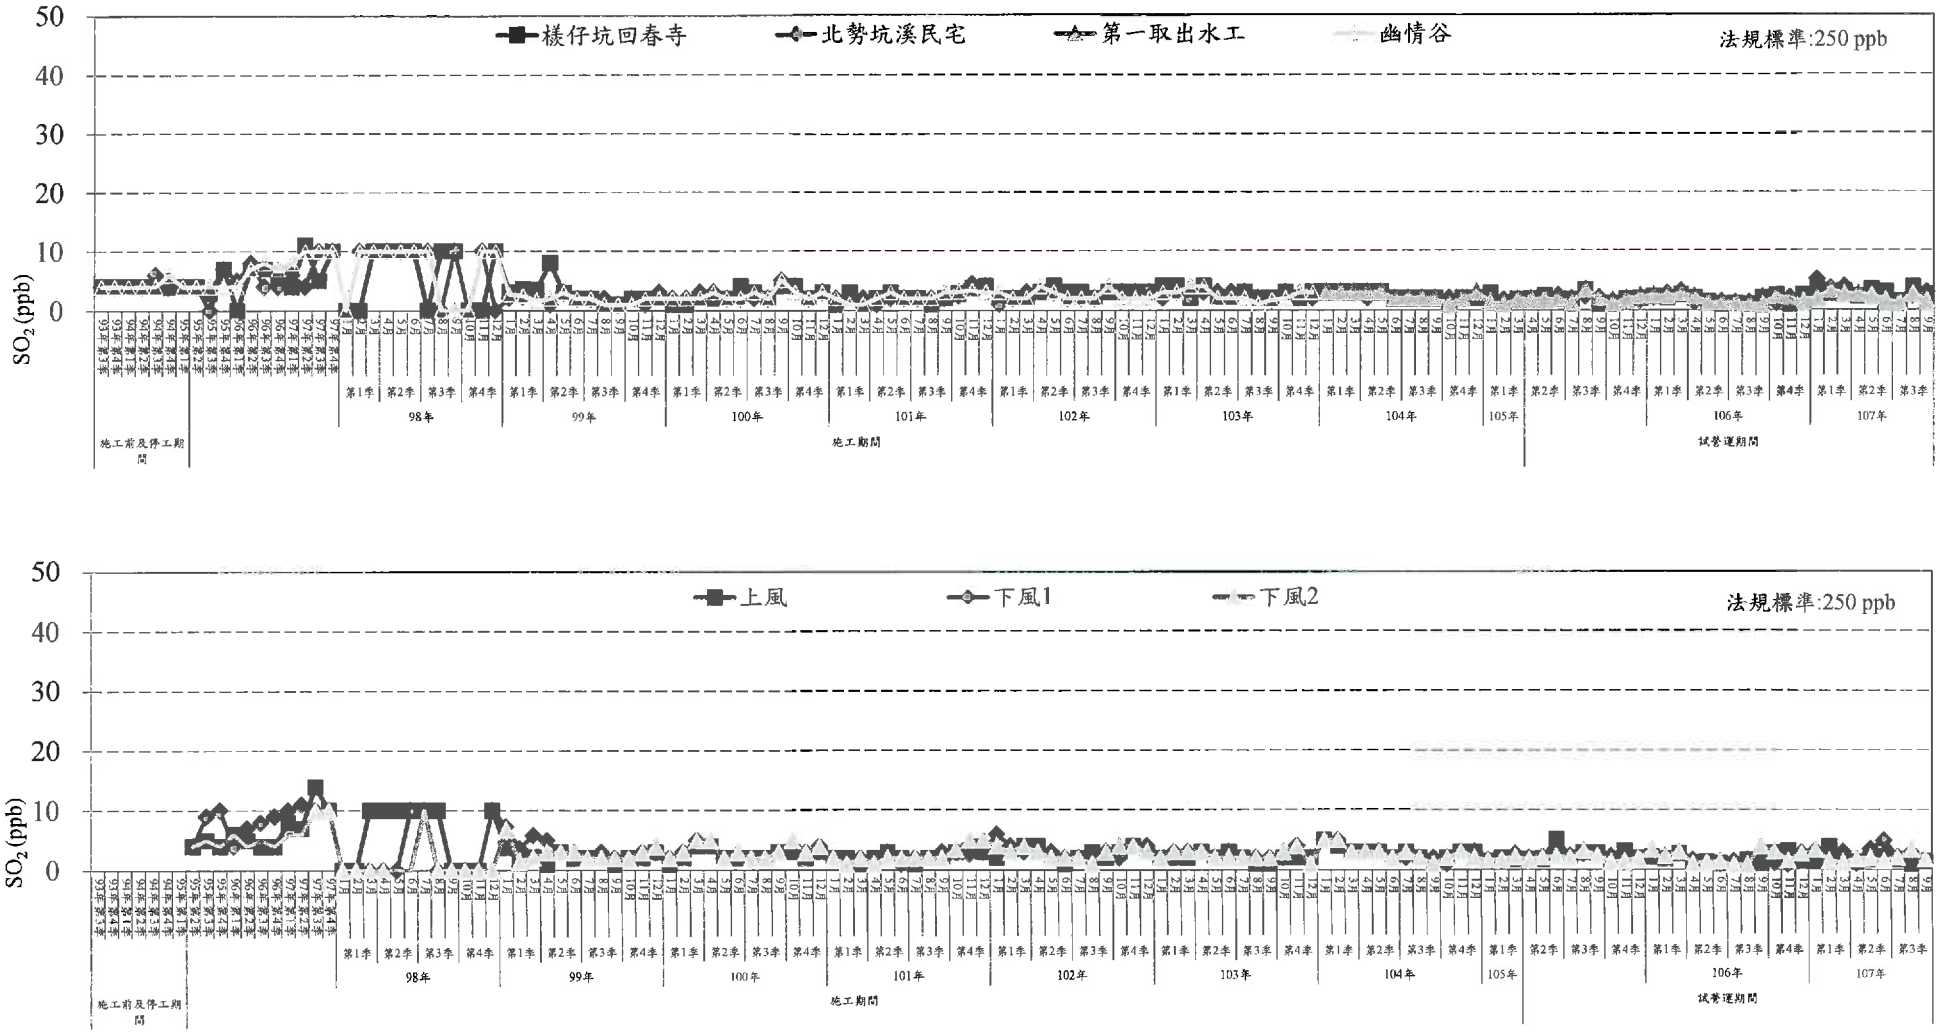

圖 2.1-9　歷次空氣品質 SO_2 監測成果圖(移動測站)

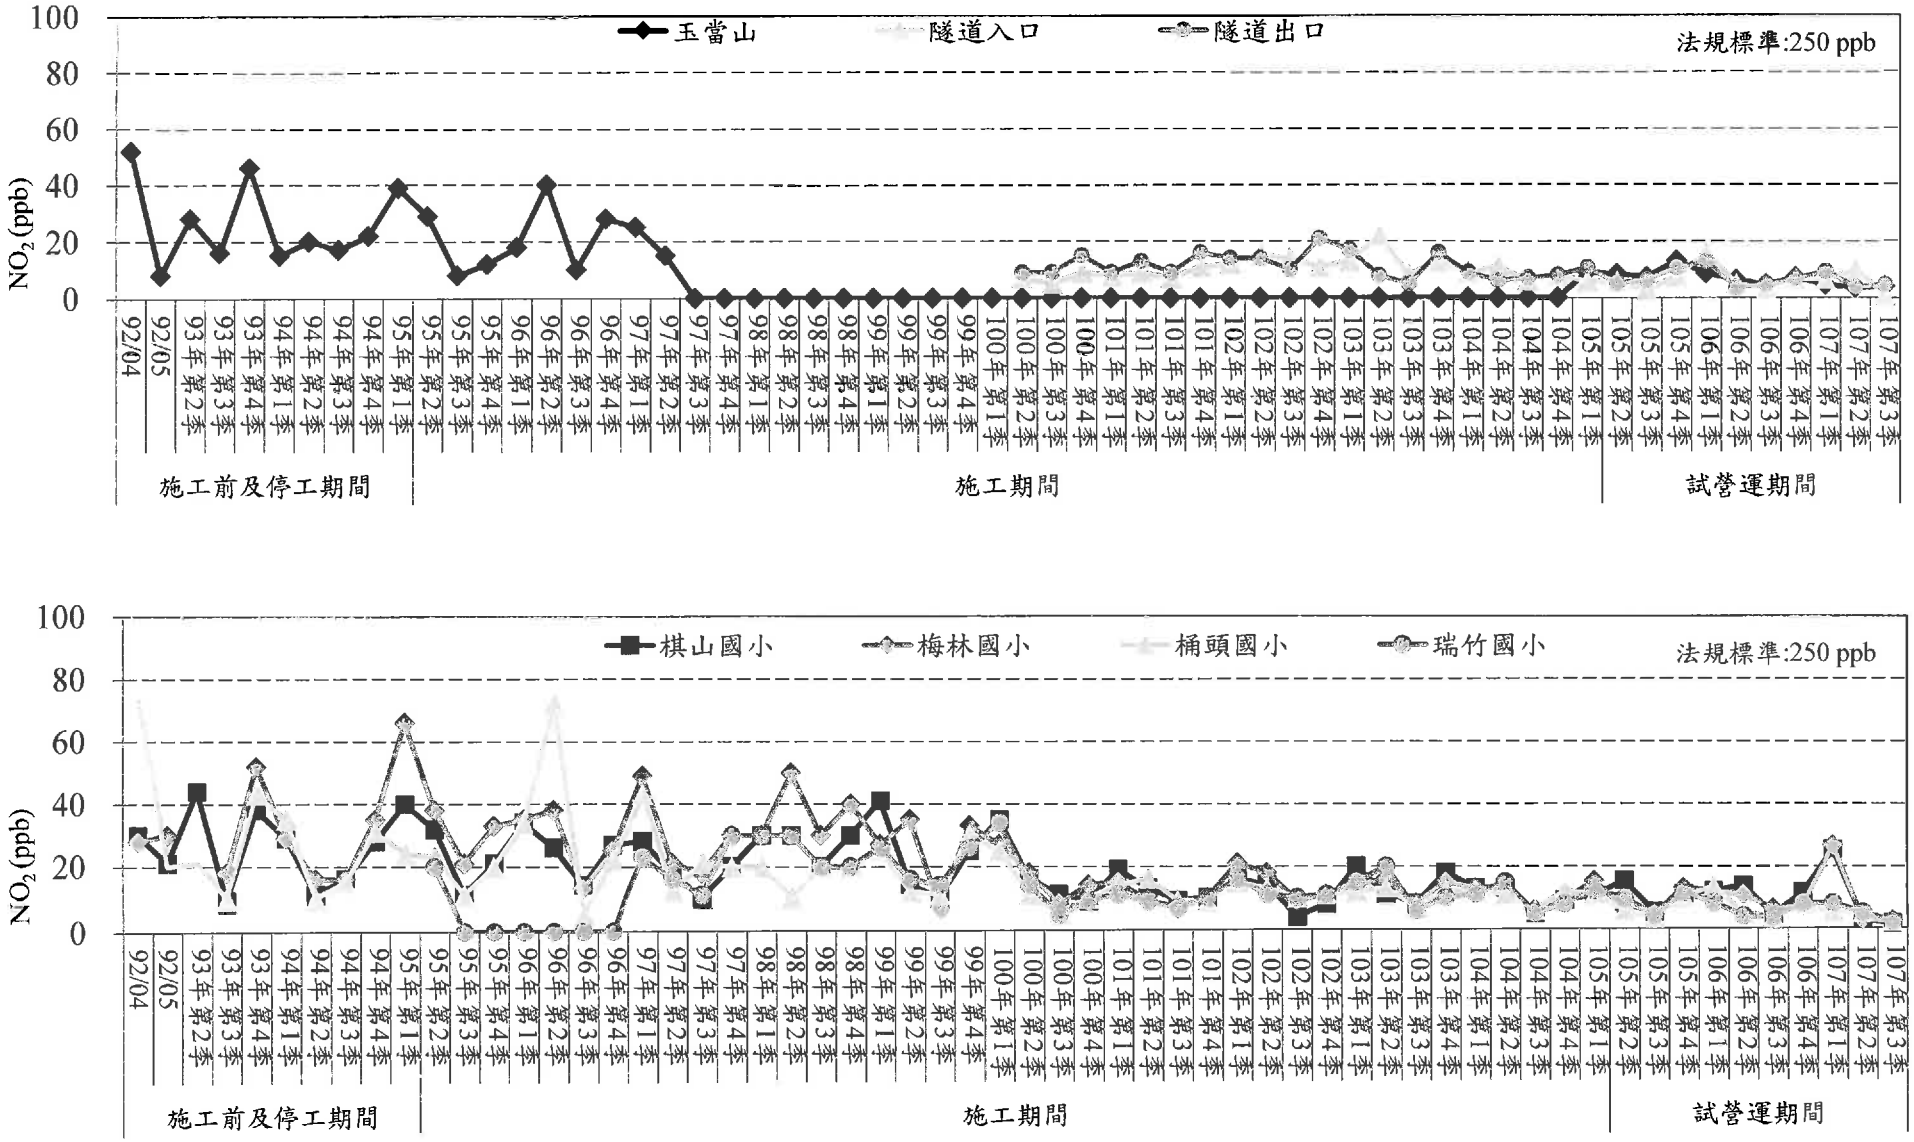

圖 2.1-10　歷次空氣品質二氧化氮 NO_2 小時平均值監測成果圖(固定測站)

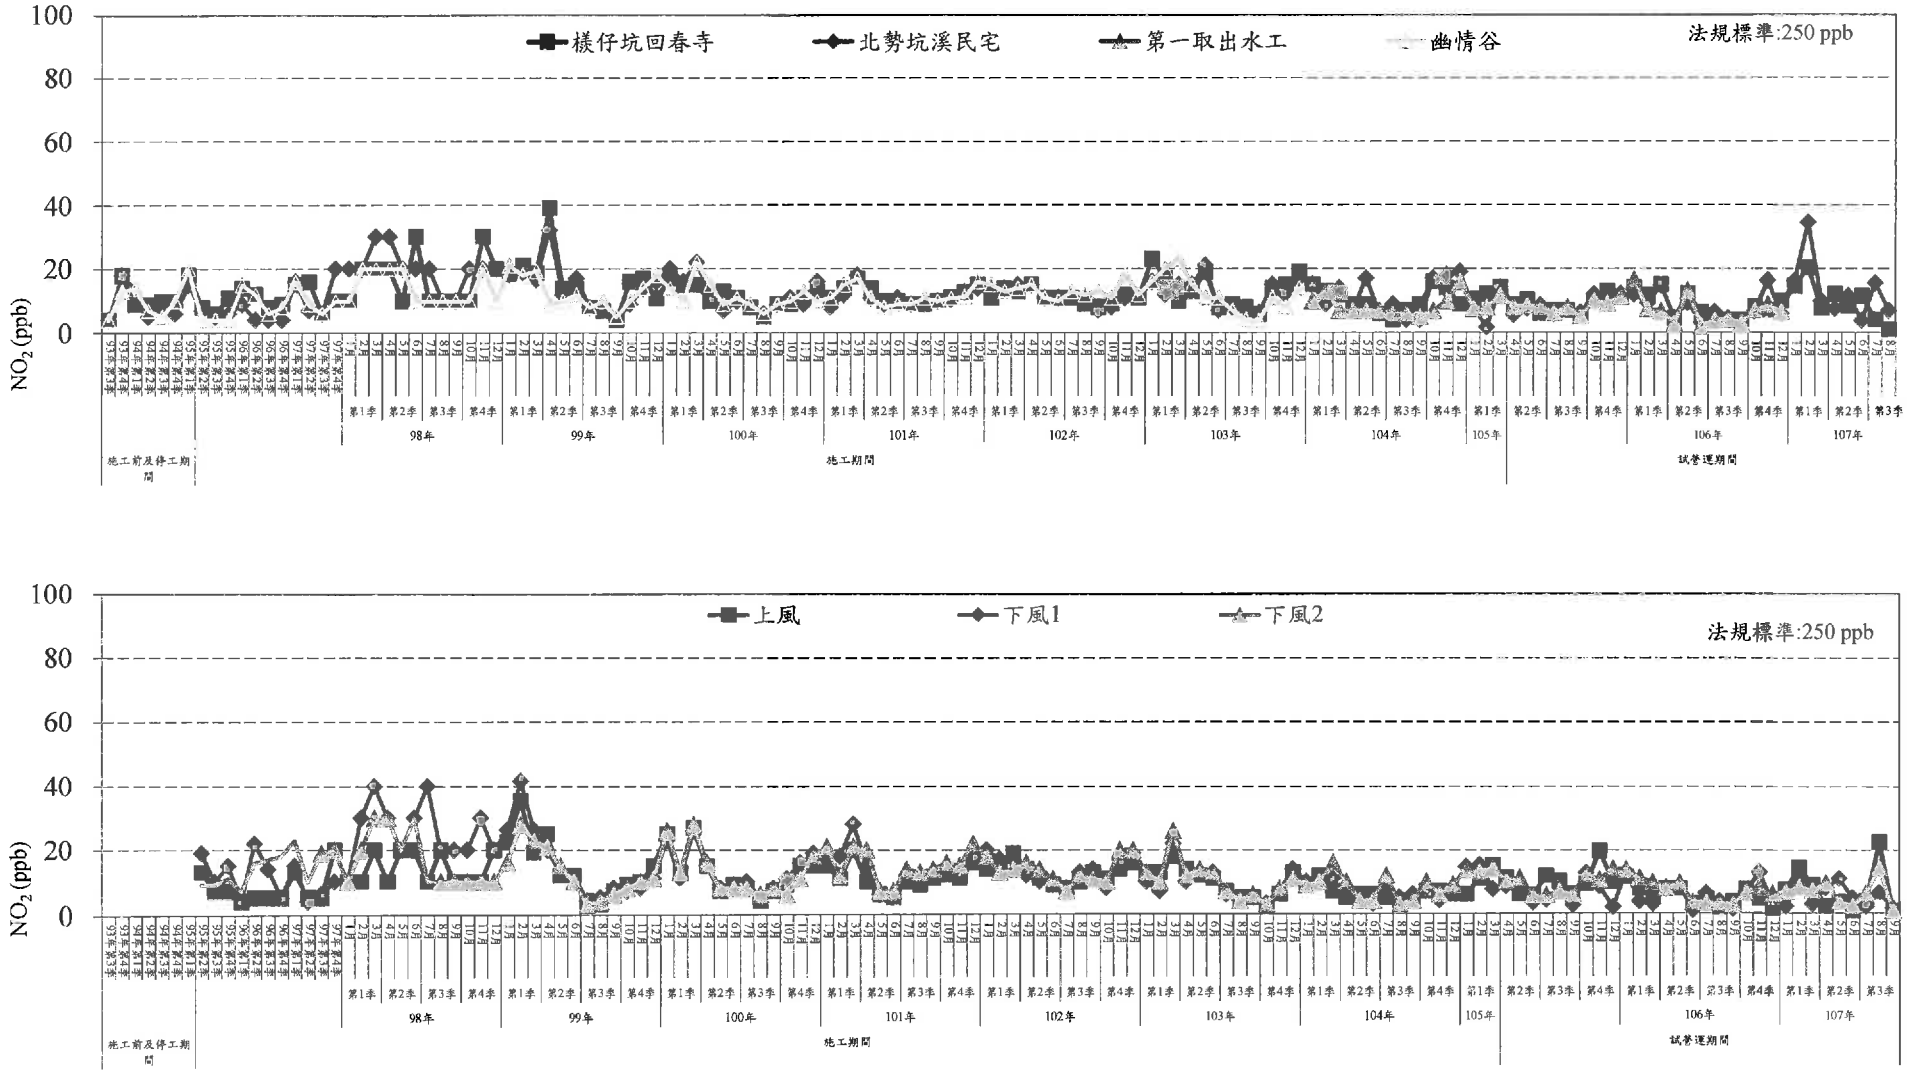

圖 2.1-11　歷次空氣品質 NO_2 監測成果圖(移動測站)

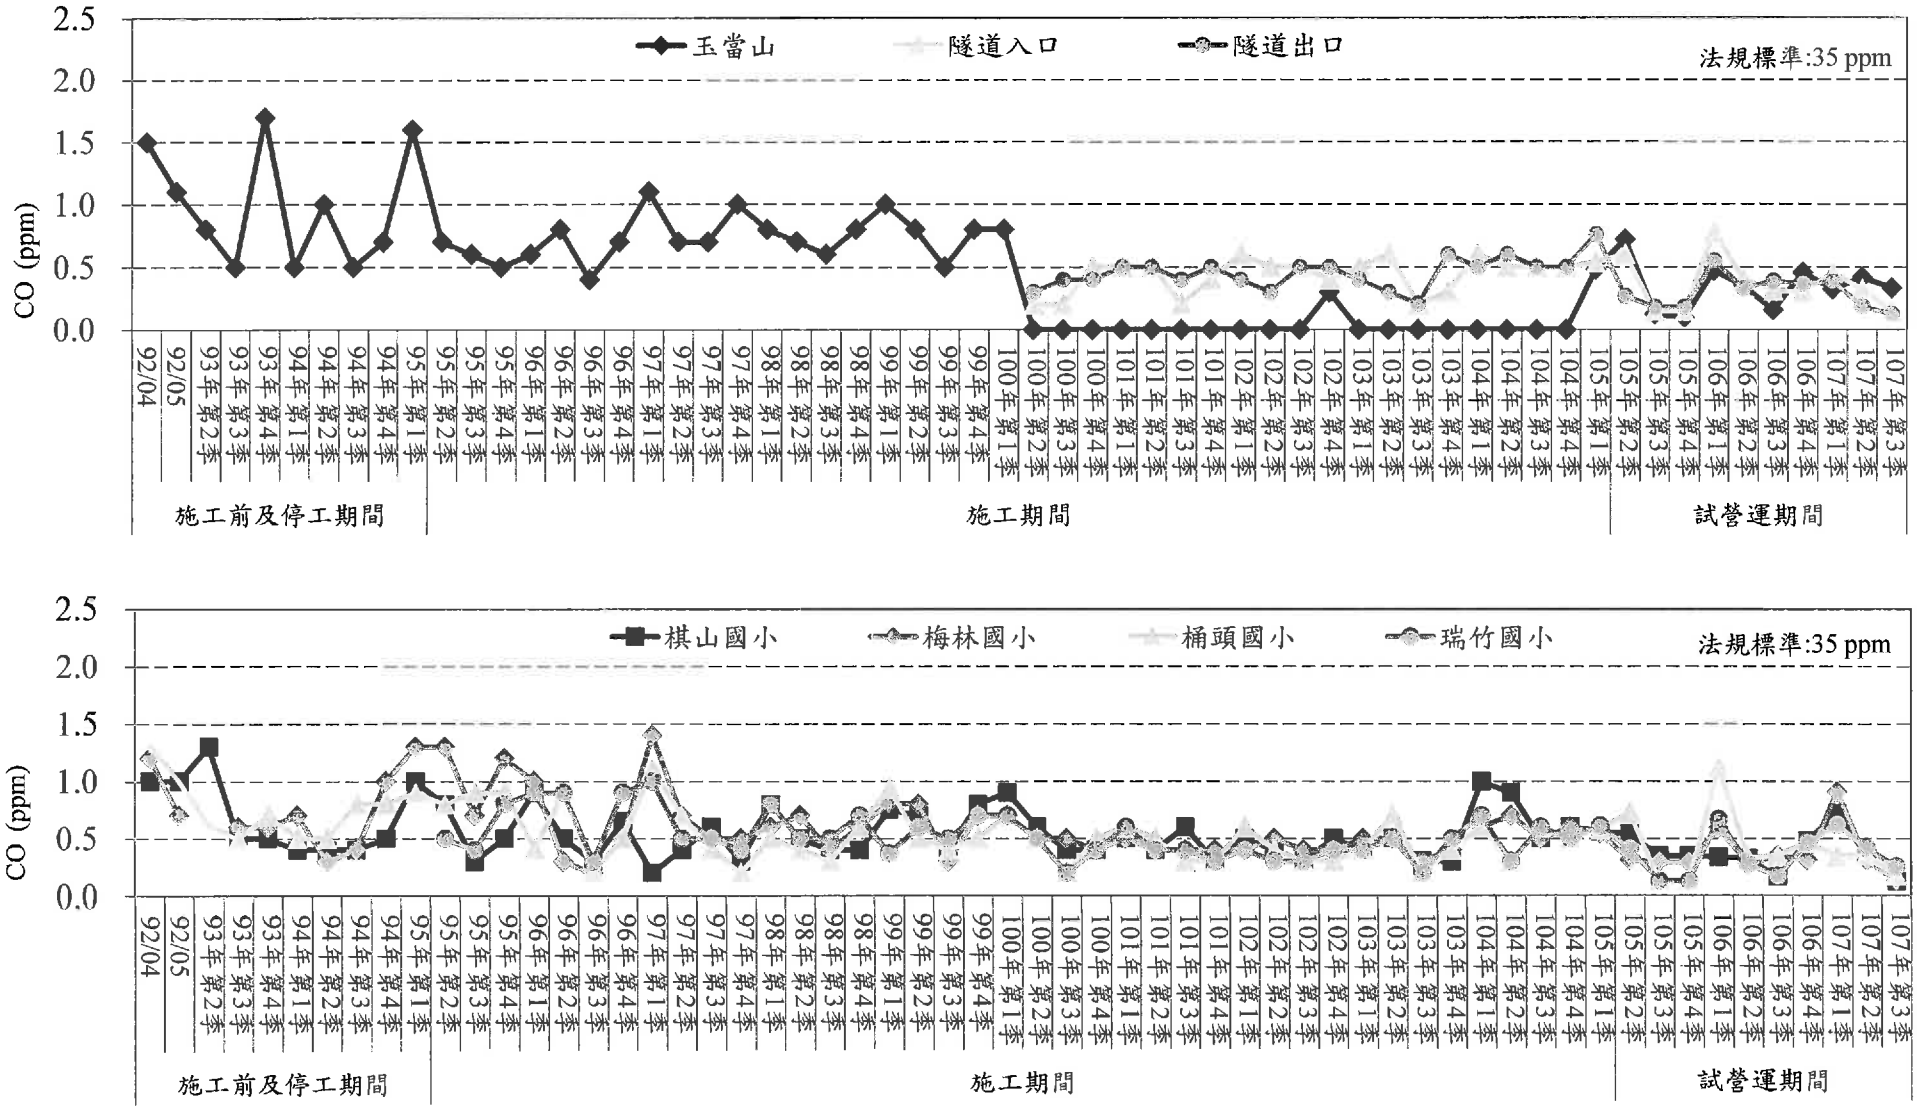

圖 2.1-12　歷次空氣品質一氧化碳 CO 平均值監測成果圖(固定測站)

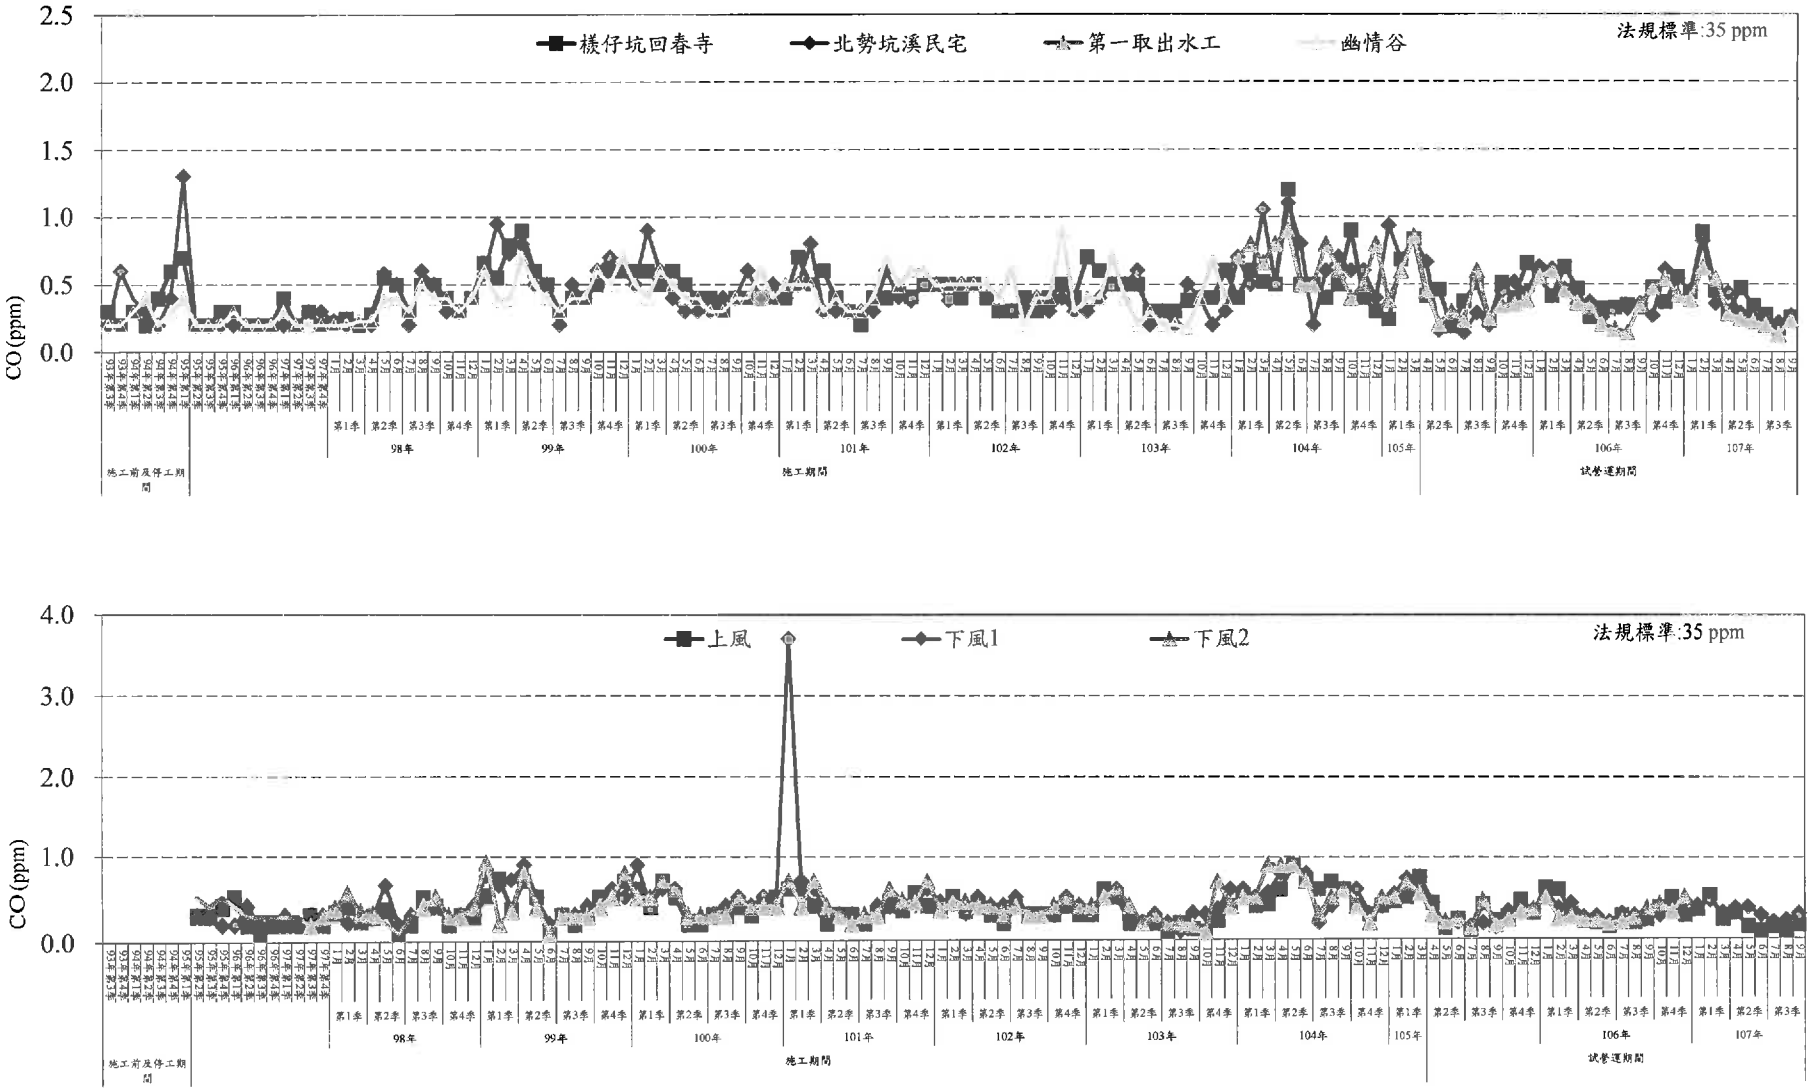

圖 2.1-13　歷次空氣品質 CO 監測成果圖(移動測站)

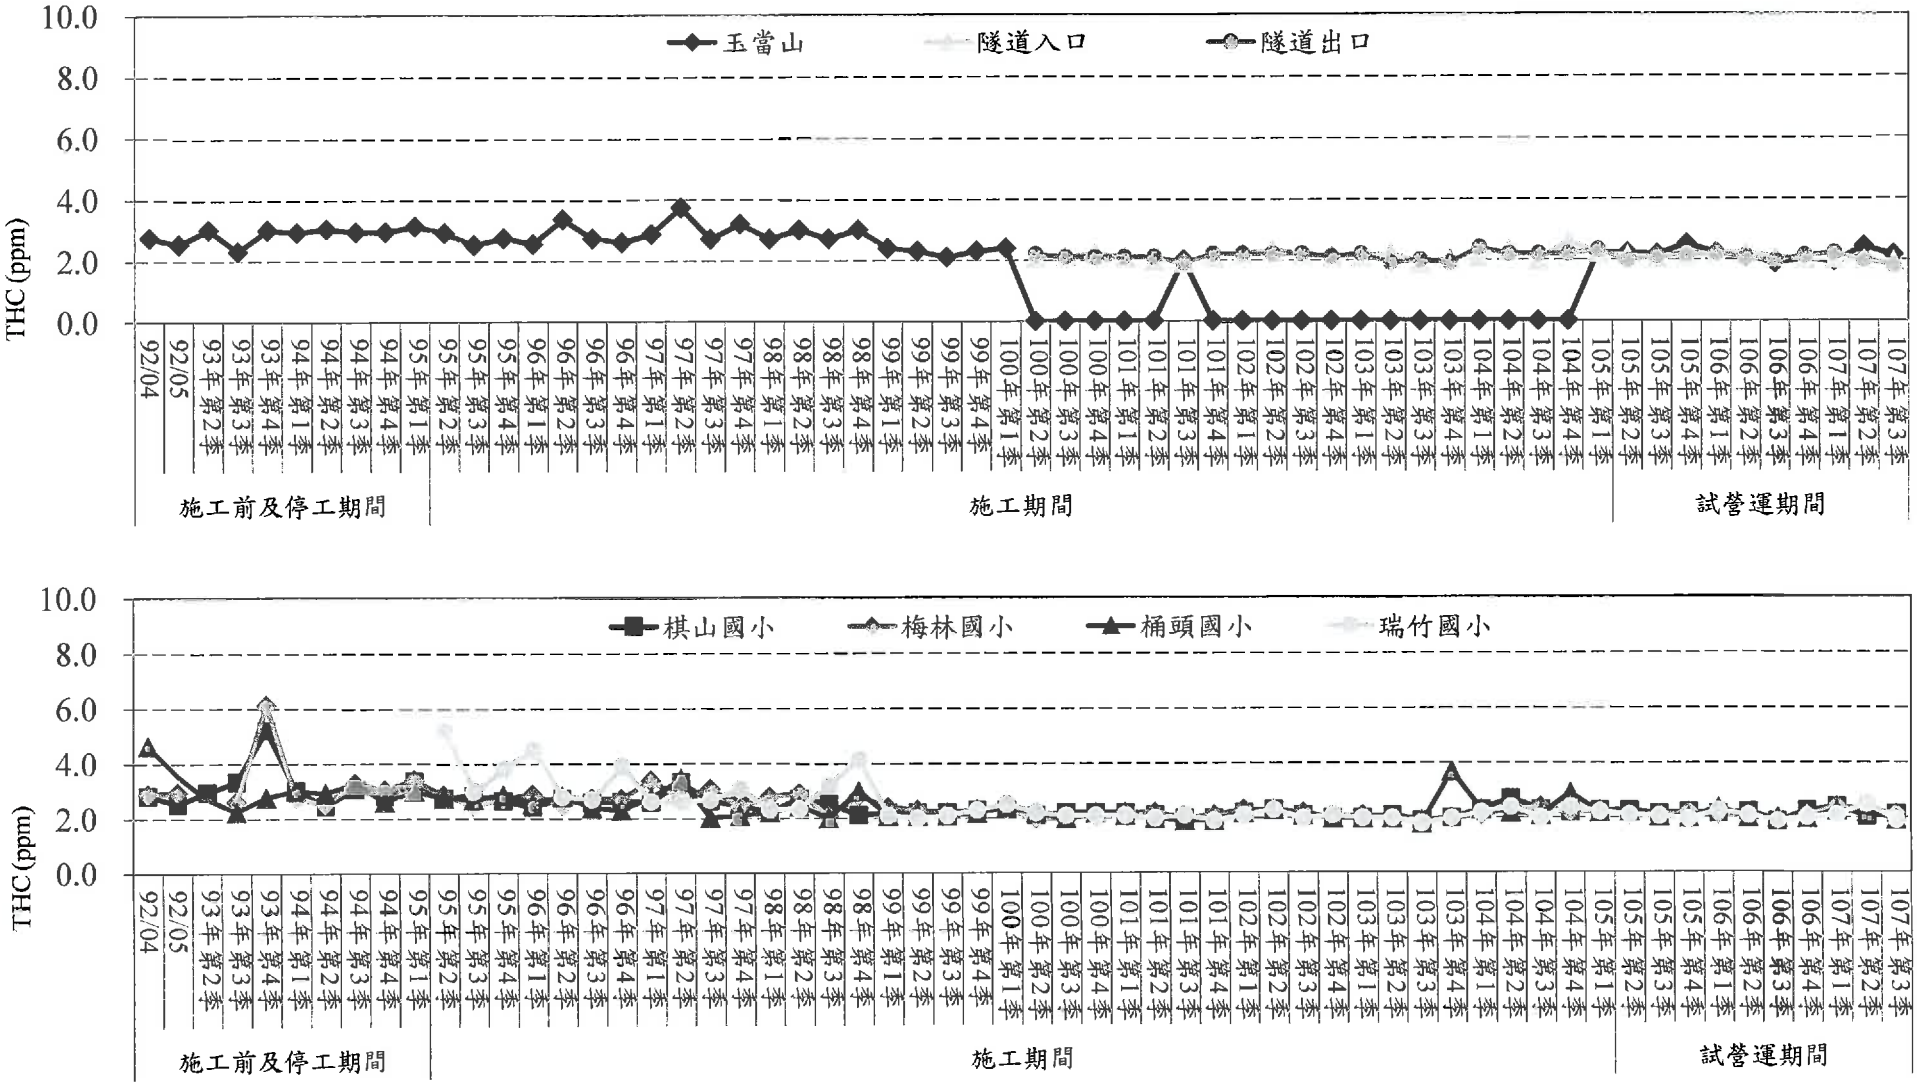

圖 2.1-14　歷次空氣品質 THC 最大小時平均值監測成果圖(固定測站)

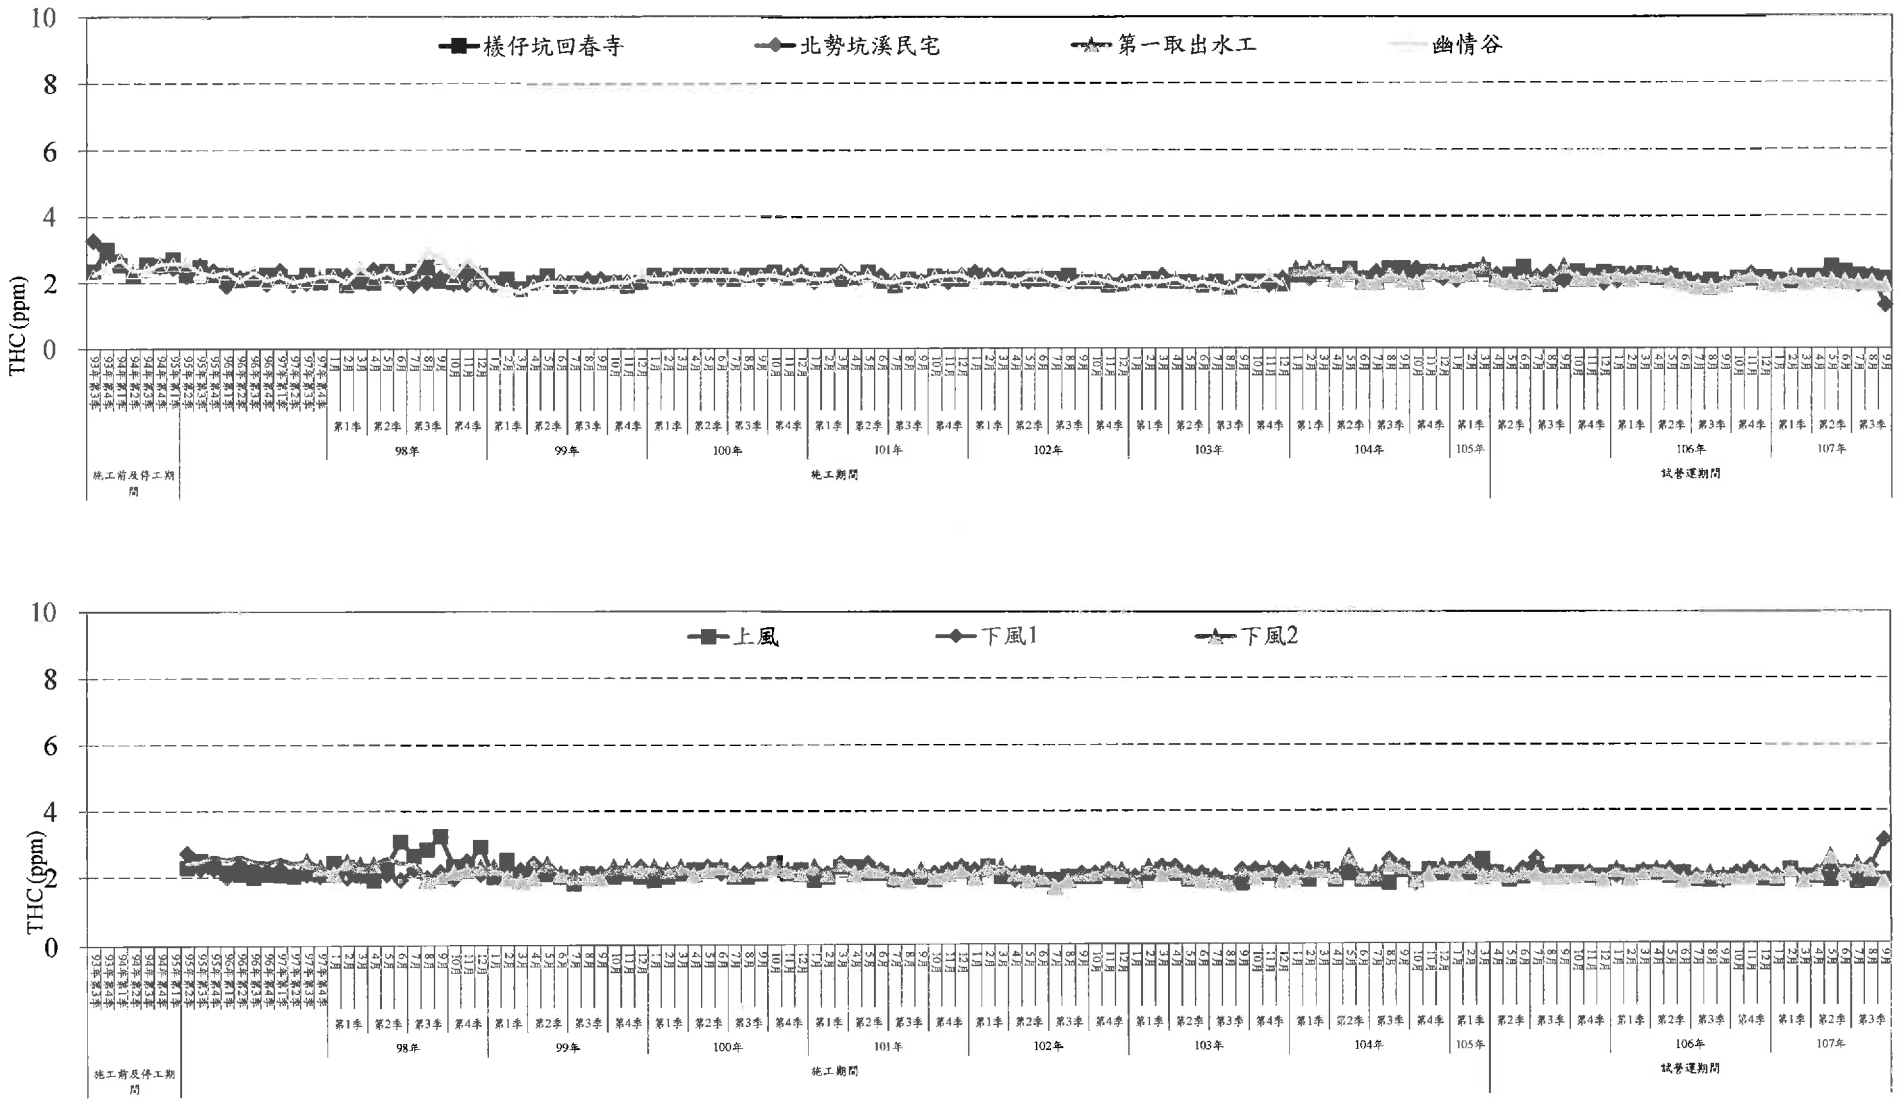

圖 2.1-15　歷次空氣品質 THC 監測成果圖(移動測站)

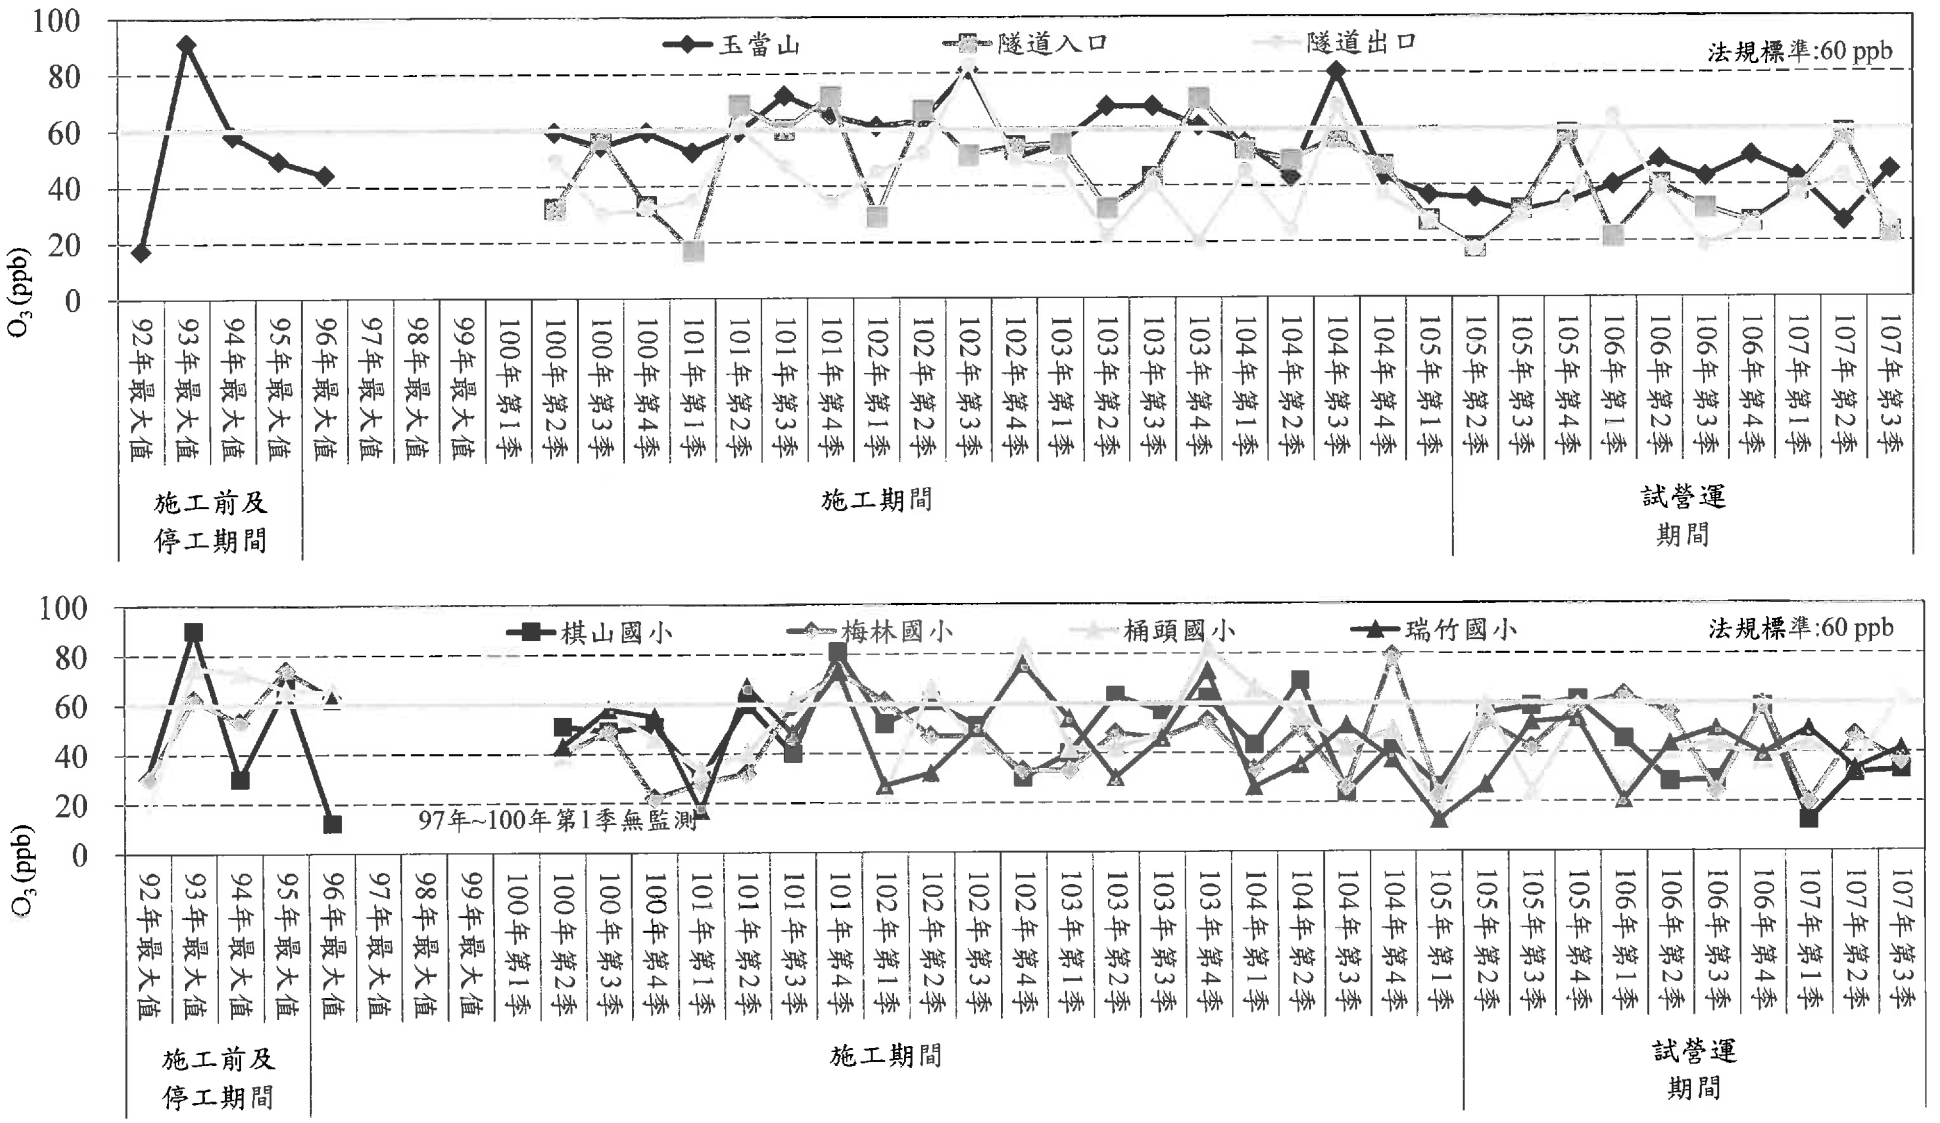

圖 2.1-16　歷次空氣品質臭氧 O_3 最大 8 小時值監測成果圖(固定測站)

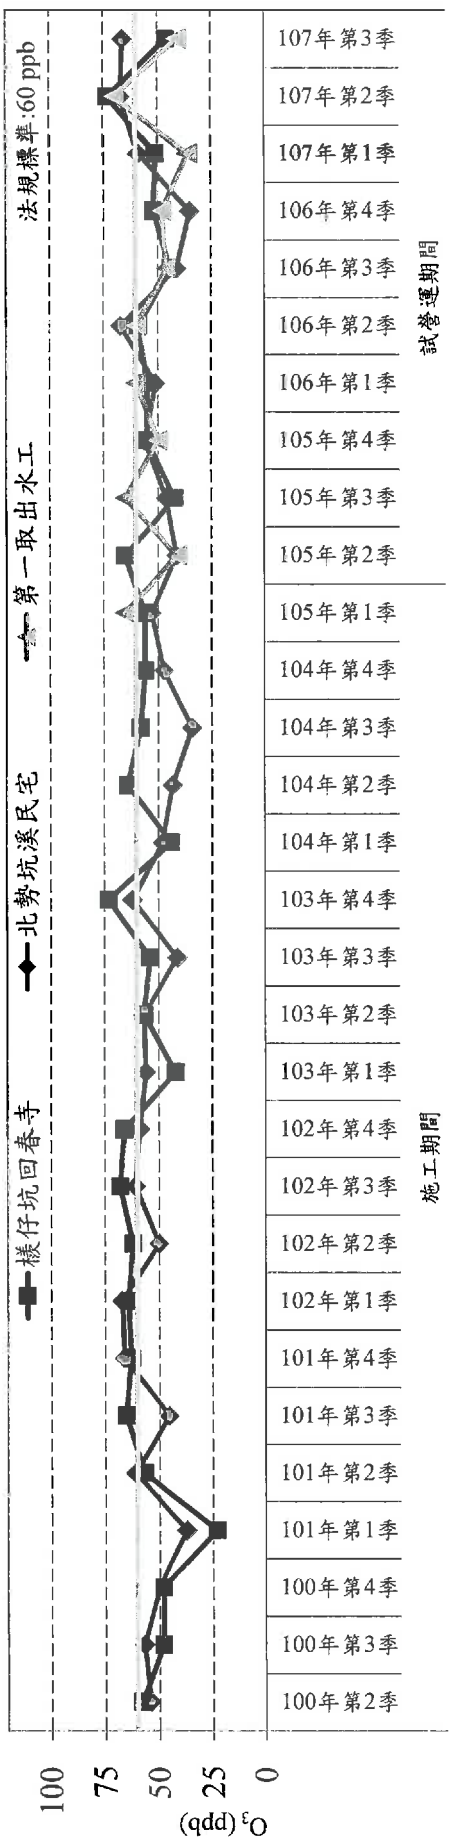

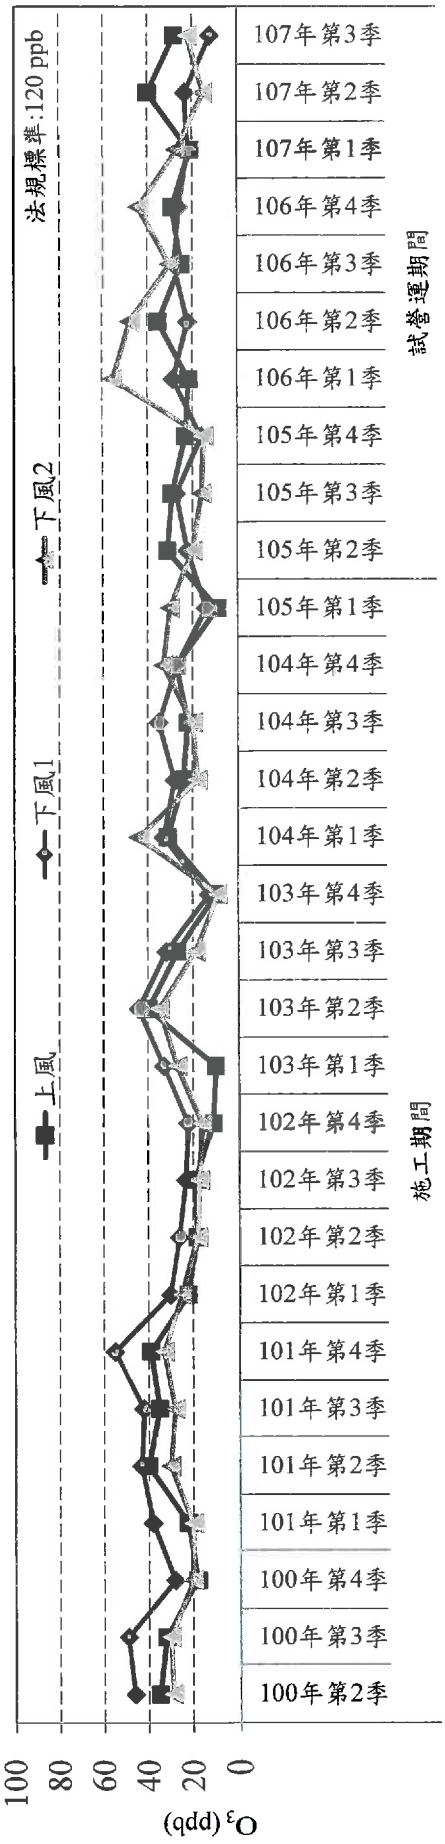

圖 2.1-17　歷次空氣品質 O_3 監測成果圖(移動測站)

2.2 噪音振動

2.2.1 環境噪音振動

本季執行環境噪音振動監測之測站分別為玉當山、引水隧道入口(桶頭端)、引水隧道出口(庫區端)、棋山國小、桶頭國小、梅林國小及瑞竹國小等 7 站。在監測頻率上，各測站均進行每季 1 次之監測，各監測點附近環境特性描述如表 2.2-1 所示。另外，因下游連接管路工程已於 104 年第 2 季完工，故無進行低頻噪音監測。

本報告依據環保署 99 年 1 月 21 日修正公告之「環境音量標準」、98 年 9 月 4 日公告之「噪音管制區劃定作業準則」及 102 年 8 月 5 日公告之「噪音管制標準」內容(如表 2.2-2 及表 2.2-3 所示)進行本季環境噪音監測結果比對。另參考之振動規制法振動基準值則如表 2.2-4 所示。表 2.2-5~表 2.2-6 及圖 2.2-1~圖 2.2-5 為本季監測成果，並與歷季之環境噪音振動監測成果進行各測站之比對。歷季監測成果詳附錄四，歷次成果分析則彙整如圖 2.2-6~圖 2.2-7。

一、玉當山

本測站隸屬於第二類噪音管制區一般地區，由表 2.2-5 顯示，本季日晚夜時段之均能音量分別為 65.8dB(A)、58.5dB(A)及 54.4dB(A)，全日各時段均未符合環境音量標準，經現場監測錄音資料分析，日間之主要噪音源來自鄰近居民之廟會活動，晚間及夜間則主要為蟲鳴聲，判斷此乃造成監測值超標之原因。

由表 2.2-6 顯示，本季日間及夜間振動位準 L_{V10} 值均低於日本振動規制法施行規則之參考基準，亦低於人體可感受閾值 55dB。

玉當山為最接近本計畫大壩工區之測點，平時主要音源為交通噪音、居民作息，本季監測結果與歷年監測結果差異不大；而環境振動則均低於參考之標準，與歷年監測成果一致。

二、引水隧道入口(桶頭端)

本季日晚夜時段之均能音量分別為 48.8dB(A)、50.8dB(A)及 51.8(A)dB，除夜間時段超出環境音量標準，其餘時段皆符合標準，經現場監測錄音資料分析，主要噪音源為蟲鳴之環境背景聲音，判斷為環境影響造成超標之原因

由表 2.2-6 顯示，本季日間及夜間振動位準 L_{V10} 值均低於日本振動規制法施行規則之參考基準，亦低於人體可感受閾值 55dB。

本測站係自 100 年第 2 季配合第 3 次環差變更而增設之測站，原各時段之測值均可符合相關管制標準，惟自 102 年 8 月配合噪音

管制標準加嚴後，部分夜間測值有超出管制標準狀況，惟檢視 102 年 8 月前後噪音測值無太大之變化。

三、引水隧道出口(庫區端)

本季日晚夜時段之均能音量分別為 66.5dB(A)、66.7dB(A)及 66.2dB(A)，全日時段之均能音量均高於環境音量標準。根據現場紀錄顯示，現場環境噪音源主要為水流聲。由表 2.2-6 顯示，本季日間及夜間振動位準 L_{V10} 值均低於日本振動規制法施行規則之參考基準，亦低於人體可感受閾值 55dB。

本測站係自 100 年第 2 季配合第 3 次環差變更而增設之測站，原各時段之測值均可符合相關管制標準，惟自 102 年 8 月配合噪音管制標準加嚴後，部分夜間測值有超出管制標準狀況。另在環境振動則均低於參考之標準，與歷年監測成果一致。

四、棋山國小

本測站屬於第二類噪音管制區之特定管制區，為典型之偏僻鄉村聚落，由表 2.2-5 顯示，本季日晚夜時段之均能音量分別為 54.5dB(A)、47.5dB(A)及 43.4dB(A)，各時段均符合環境音量標準。

由表 2.2-6 顯示，本季日間及夜間振動位準 L_{V10} 值均低於日本振動規制法施行規則之參考基準，亦低於人體可感受閾值 55dB。本季振動測值與歷年監測結果亦無明顯差異。

五、桶頭國小

本測站屬於第二類噪音管制區之特定管制區，由表 2.2-5 顯示，本季日晚夜時段之均能音量分別為 52.6dB(A)、44.6dB(A)及 44.5dB(A)，各時段皆符合標準。

由表 2.2-6 顯示，本季日間及夜間振動位準 L_{V10} 值均低於日本振動規制法施行規則之參考基準，亦低於人體可感受閾值 55dB，與歷年監測結果相較亦差異不大。

六、梅林國小

本監測點位於壩址聯外道路(雲 214 鄉道)旁，屬於第二類噪音管制區之特定管制區，本季日晚夜時段之均能音量分別為 59.9dB(A)、48.8dB(A)及 46.9dB(A)，本季各時段皆符合標準。

由表 2.2-6 顯示，本季日間及夜間振動位準 L_{V10} 值均低於日本振動規制法施行規則之參考基準，亦低於人體可感受閾值 55 dB，與歷年監測結果相較亦差異不大。

七、瑞竹國小

本測站位於 149 縣道旁，屬於第二類噪音管制區之特定管制區。由表 2.2-5 顯示，本季日晚夜時段之均能音量分別為 55.9dB(A)、52.9dB(A)及 52.4dB(A)，除夜間時段超出環境音量標準，其餘時段皆符合標準，經現場監測錄音資料分析，主要噪音源為蟲鳴之環境聲音，判斷此乃造成監測值超標之原因。

由表 2.2-6 顯示，本季日間及夜間振動位準 Lv_{10} 值均低於日本振動規制法施行規則之參考基準，亦低於人體可感受閾值 55 dB，與歷年監測結果相較亦差異不大。

2.2.2 營建噪音振動

本季營建工程噪音振動於大壩工區(3 測站)進行每 2 週 1 次之監測，本季監測時間及成果如表 2.2-7、表 2.2-8 所示，另本計畫之施工僅剩景觀綠美化工程，故本季之營建噪音多無測值。測點一、二及三的位置依營建施工工區而有不同，詳如附錄現場紀錄表，皆位於主壩及副壩附近，並未受蓄水範圍區域影響，另考量第二原水管工程即將動工，爰將測點三於 107 年 8 月 20 日起，移至玉當山測站進行監測。本季監測結果中，各測點之營建噪音均符合噪音管制標準。營建振動位準則均符合日本振動規制法施行細則之建設作業參考基準。

本計畫歷次營建噪音振動之監測結果如附表 4.2-3 及附表 4.2-4 所示，其中曾有部分均能音量超出噪音管制標準，惟均屬偶發事件，後續經追蹤改善後，已均可符合相關標準規範。

表 2.2-1　環境噪音振動監測地點背景資料說明

測點名稱	測點位置及環境特性描述
玉當山	玉當山測站為本計畫於環評階段所規定之測點，位於玉當山廟前廣場邊，主要噪音振動源為路上來往車輛及居民作息活動。
引水隧道入口(桶頭端)	本測點位於雷公坑溪北側，鄰近環境較為自然，人口住宅十分稀少，主要噪音振動來源來自背景自然環境，如蟲鳴聲.....等。
引水隧道出口(庫區端)	本測點位於庫區內南勢坑溪之上游處，本季監測時，鄰近已無其它工程施作。
棋山國小	棋山國小測站為本計畫於環評階段所規定之測點，位於棋盤厝附近之社區內，鄰近為典型之偏僻鄉村聚落，主要噪音振動源為路上來往車輛及學生活動。
桶頭國小	桶頭國小測站為本計畫於環評階段所規定之測點，測點附近多為茶園，主要噪音振動源為 149 縣道之來往砂石車及大小車輛，此外學生活動亦為影響源之一。
梅林國小	梅林國小測站為本計畫於環境影響差異分析時所提出列為承諾之測點，惟該測站歷年來已均有進行監測，屬既有之測站。測點附近東側為果園、遠處有中二高經過，西側為小型社區分佈。主要噪音振動來源為附近車輛行駛及校園內上課活動作息影響。
瑞竹國小	位於 149 縣道旁，149 縣道平時人車不多，主要噪音振動源為校園內上課活動作習。

表 2.2-2　道路邊地區環境音量標準

單位：dB(A)

管制區 / 時段		第一類或第二類管制區內		第三類或第四類管制區內	
		緊臨未滿8公尺之道路	緊臨8公尺(含)以上道路	緊臨未滿8公尺之道路	緊臨8公尺(含)以上道路
均能音量(Leq)	日間	71	74	74	76
	晚間	69	70	73	75
	夜間	63	67	69	72

註：1.$L_{日}$：第一、二類管制區指上午六時至晚上八時；第三、四類管制區指上午七時至晚上八時

$L_{晚}$：第一、二類管制區指晚上八時至晚上十時；第三、四類管制區指晚上八時至晚上十一時

$L_{夜}$：第一、二類管制區指晚上十時至翌日上午六時；

第三、四類管制區指晚上十一時至翌日上午七時

2.環境音量標準係引用環保署於民國99年1月21日所公告之「環境音量標準」

表 2.2 -3　一般地區環境音量標準

單位：dB(A)

管制區 / 時段		第一類管制區	第二類管制區	第三類管制區	第四類管制區
均能音量(Leq)	日間	55	60	65	75
	晚間	50	55	60	70
	夜間	45	50	55	65

註：1.時段區分方式同表2.2-2之註1所列

2.環境音量標準係引用環保署於民國98年9月4日所公告之「噪音管制區劃定作業準則」

表 2.2-4　日本振動規制法施行規則之基準值

管制區 / 時段	日間		夜間	
	時段	基準值	時段	基準值
第一種區域	上午5點至下午7點 上午6點至下午8點 上午7點至下午9點 上午8點至下午10點	65dB	下午7點至翌日上午5點 下午8點至翌日上午6點 下午9點至翌日上午7點 下午10點至翌日上午8點	60dB
第二種區域	上午5點至下午7點 上午6點至下午8點 上午7點至下午9點 上午8點至下午10點	70dB	下午7點至翌日上午5點 下午8點至翌日上午6點 下午9點至翌日上午7點 下午10點至翌日上午8點	65dB

註：1.日本環境廳振動測定。

2.第一種區域類似我國環境噪音品質標準之第一、第二類管制區，

第二種區域類似我國環境噪音品質標準之第三、第四類管制區。

3.測定位置：道路邊緣。

表 2.2-5　本季各測站噪音監測結果

單位：dB(A)

監測地點及管制區分類	監測時間	時段		
		$L_{日}$	$L_{晚}$	$L_{夜}$
玉當山	107/07/12	65.8	58.5	54.4
引水隧道入口(桶頭端)	107/07/12	48.8	50.8	51.8
引水隧道出口(庫區端)	107/07/12	66.5	66.7	66.2
第二類管制區內一般地區環境音量標準		**60**	**55**	**50**
棋山國小	107/07/12	54.5	47.5	43.4
桶頭國小	107/07/12	52.6	44.6	44.5
梅林國小	107/07/12	59.9	48.8	46.9
瑞竹國小	107/07/12	55.9	52.9	52.4
第二類管制區內特定管制區環境音量標準		**60**	**55**	**50**

註：灰底表超出其所屬之標準值。

表 2.2-6　本季各測站振動監測結果

單位：dB

監測地點	監測時間	時段	
		$Lv_{日}$	$Lv_{夜}$
玉當山	107/07/12	30.0	30.8
引水隧道入口(庫區端)	107/07/12	30.1	30.0
引水隧道出口(庫區端)	107/07/12	30.0	30.0
棋山國小	107/07/12	30.0	30.0
桶頭國小	107/07/12	30.0	30.0
梅林國小	107/07/12	34.0	30.0
瑞竹國小	107/07/12	31.7	30.0
第一種區域		65	60

註：1.我國目前尚無振動管制標準，參考「日本振動規制法施行細則」第一種區域管制標準。
2.$Lv_{日}$：05:00~19:00，$Lv_{夜}$：19:00~00:00及00:00~05:00。

表 2.2-7　本季各測站營建噪音監測結果

單位：dB(A)

監測日期	監測項目	湖山水庫工區						營建工程噪音管制標準
		測點一	背景值	測點二	背景值	測點三	背景值	
107/07/12	Leq 10min	62.1	50.6	—	46.4	—	45.1	67
	Lmax	78.9	60.2	—	57.6	—	52.6	100
107/07/24	Leq 10min	—	45.4	—	39.3	—	51.5	67
	Lmax	—	56.5	—	41.2	—	65.5	100
107/08/03	Leq 10min	56.9	49.4	—	41.4	—	44.8	67
	Lmax	75.7	61.5	—	52.5	—	49.3	100
107/08/20	Leq 10min	—	49.7	—	32.3	—	46.3	67
	Lmax	—	54.0	—	35.0	—	50.7	100
107/09/03	Leq 10min	59.5	57.7	—	45.6	—	45.7	67
	Lmax	72.9	58.7	—	51.5	—	52.6	100
107/09/17	Leq 10min	—	46.3	63.3	62.0	—	44.2	67
	Lmax	—	53.7	78.3	62.5	—	49.3	100

註：1.灰底表示該值超出營建工程第二類噪音管制標準

2."—"表示當日現場並無施工行為，因此只量測環境背景音量

3.測點三於107年8月20日移至玉當山

表 2.2-8　本季各測站營建振動監測結果

單位：dB

監測日期	監測項目	湖山水庫工區						參考標準
		測點一	背景值	測點二	背景值	測點三	背景值	
107/07/12	Lveq	31.5	30.3	—	30.2	—	30.0	65
	Lvmax	35.4	30.8	—	30.5	—	30.0	—
107/07/24	Lveq	—	30.0	—	30.0	—	30.0	65
	Lvmax	—	30.0	—	30.0	—	30.0	—
107/08/03	Lveq	30.2	30.0	—	31.5	—	30.0	65
	Lvmax	33.4	30.0	—	35.4	—	31.2	—
107/08/20	Lveq	—	30.0	—	30.0	—	30.0	65
	Lvmax	—	30.0	—	30.0	—	32.1	—
107/09/03	Lveq	32.3	31.2	—	30.6	—	30.4	65
	Lvmax	42.1	36.8	—	34.9	—	34.6	—
107/09/17	Lveq	—	30.0	32.8	30.0	—	30.0	65
	Lvmax	—	30.0	39.1	30.0	—	30.0	—

註：1.我國目前尚無振動管制標準，參考「日本振動規制法施行細則」之建設作業參考基準。

2."—"表示當日現場並無施工行為，因此只量測環境背景振動

3.測點三於107年8月20日移至玉當山測站

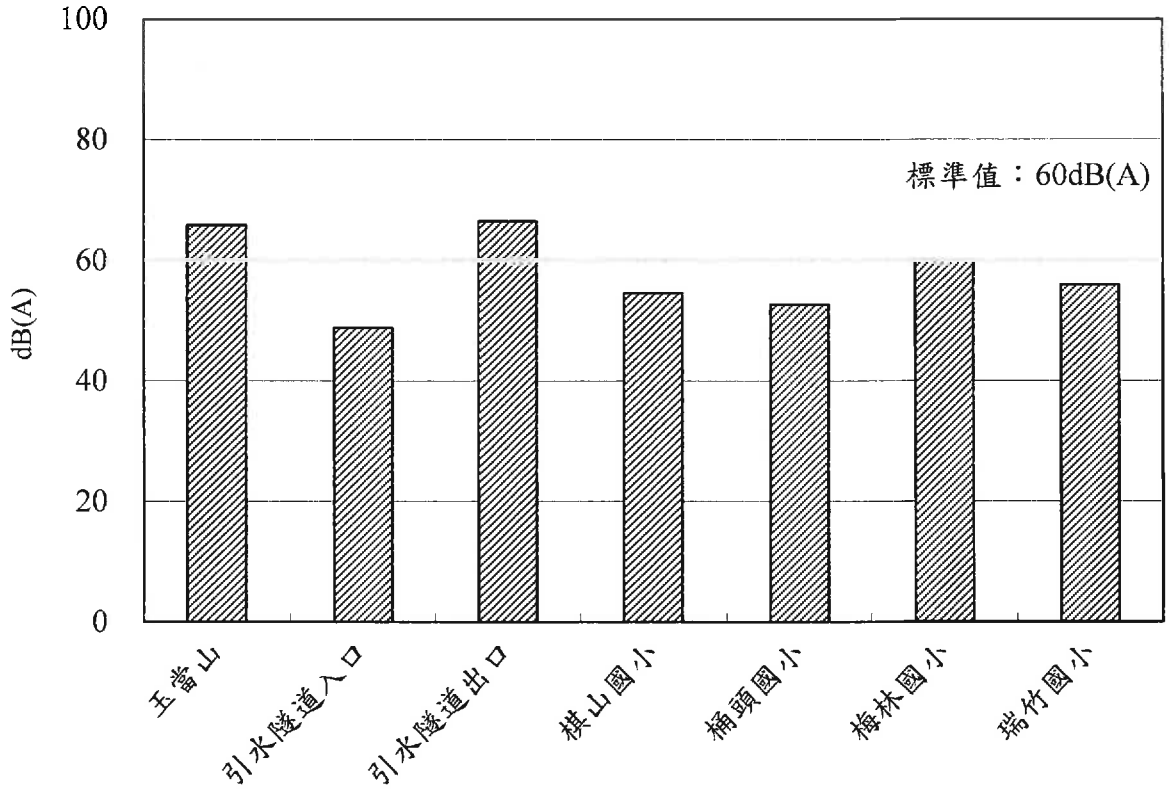

圖 2.2-1　本季噪音均能音量 $L_{日}$比較圖

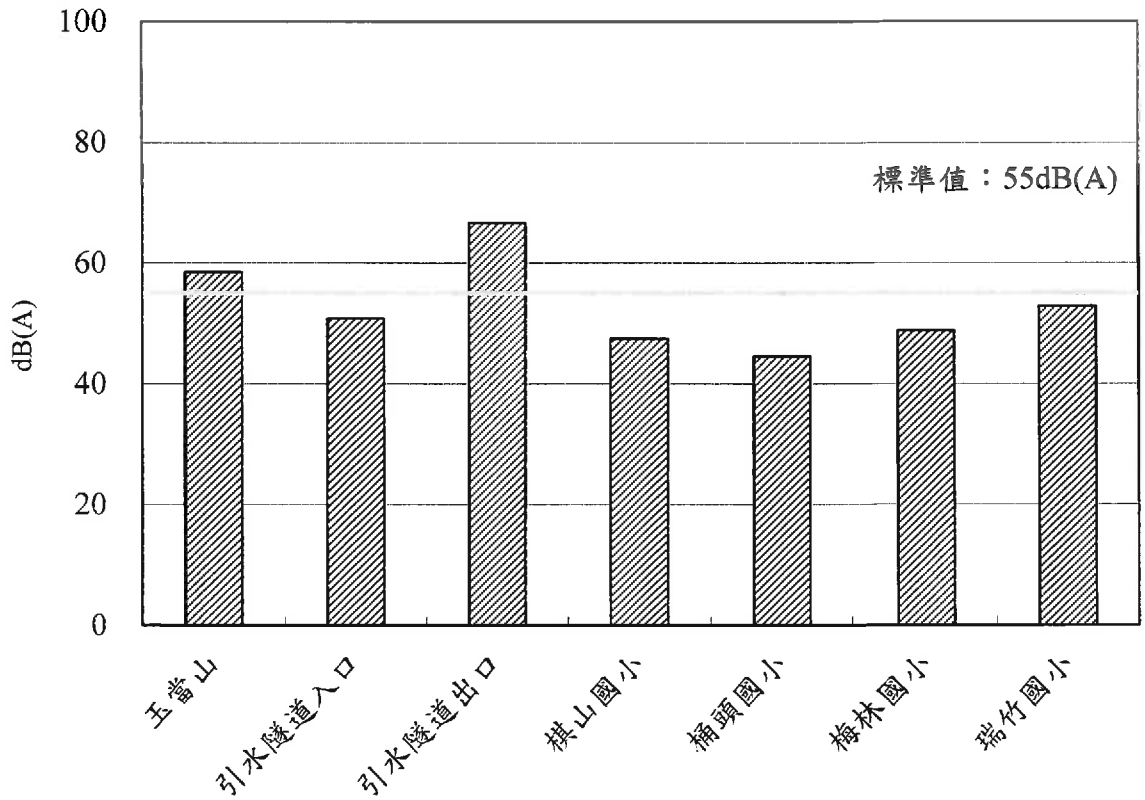

圖 2.2-2　本季噪音均能音量 $L_{晚}$比較圖

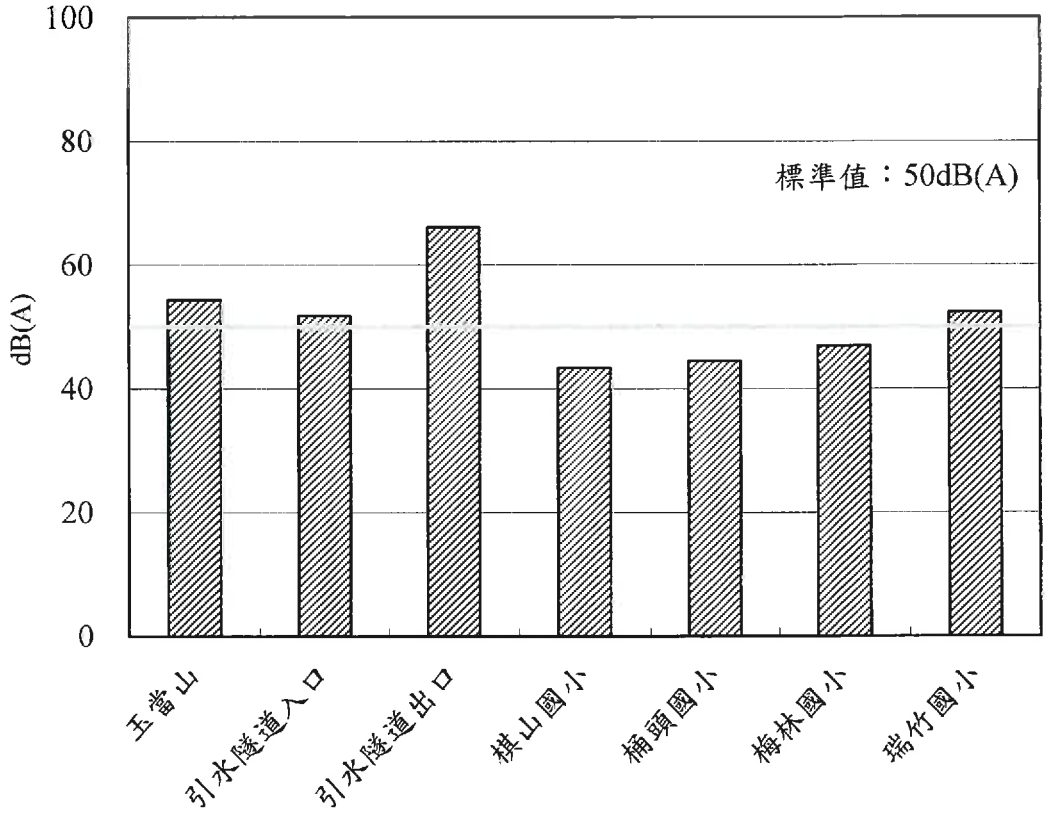

圖 2.2-3 本季噪音均能音量 $L_{夜}$ 比較圖

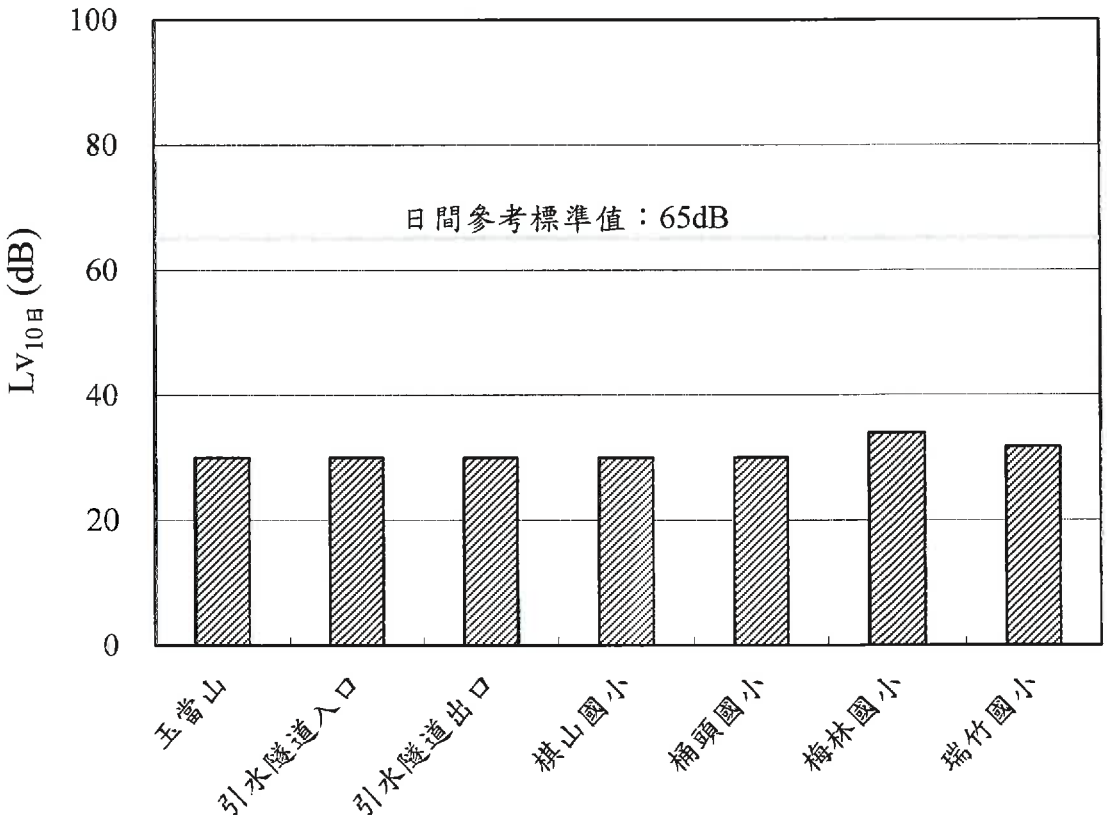

圖 2.2-4 本季日間 L_{v10} 振動監測結果比較圖

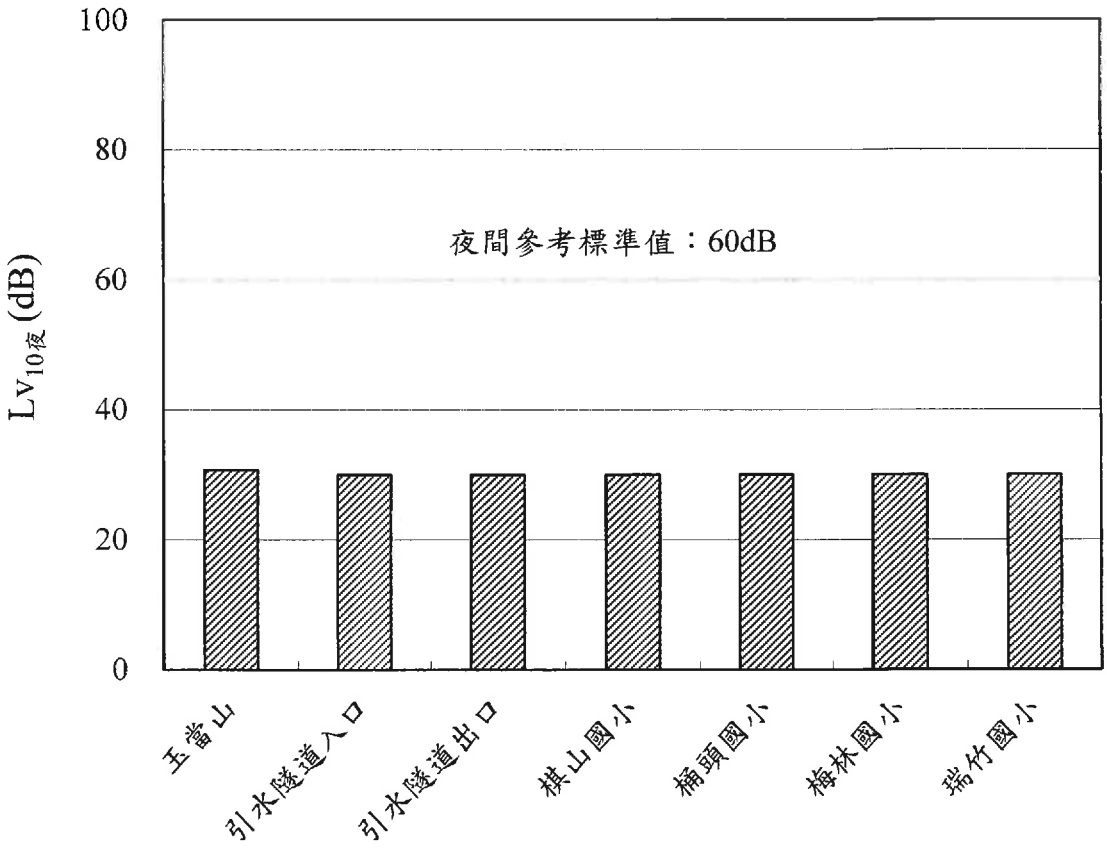

圖 2.2-5 本季夜間 L_{v10} 振動監測結果比較圖

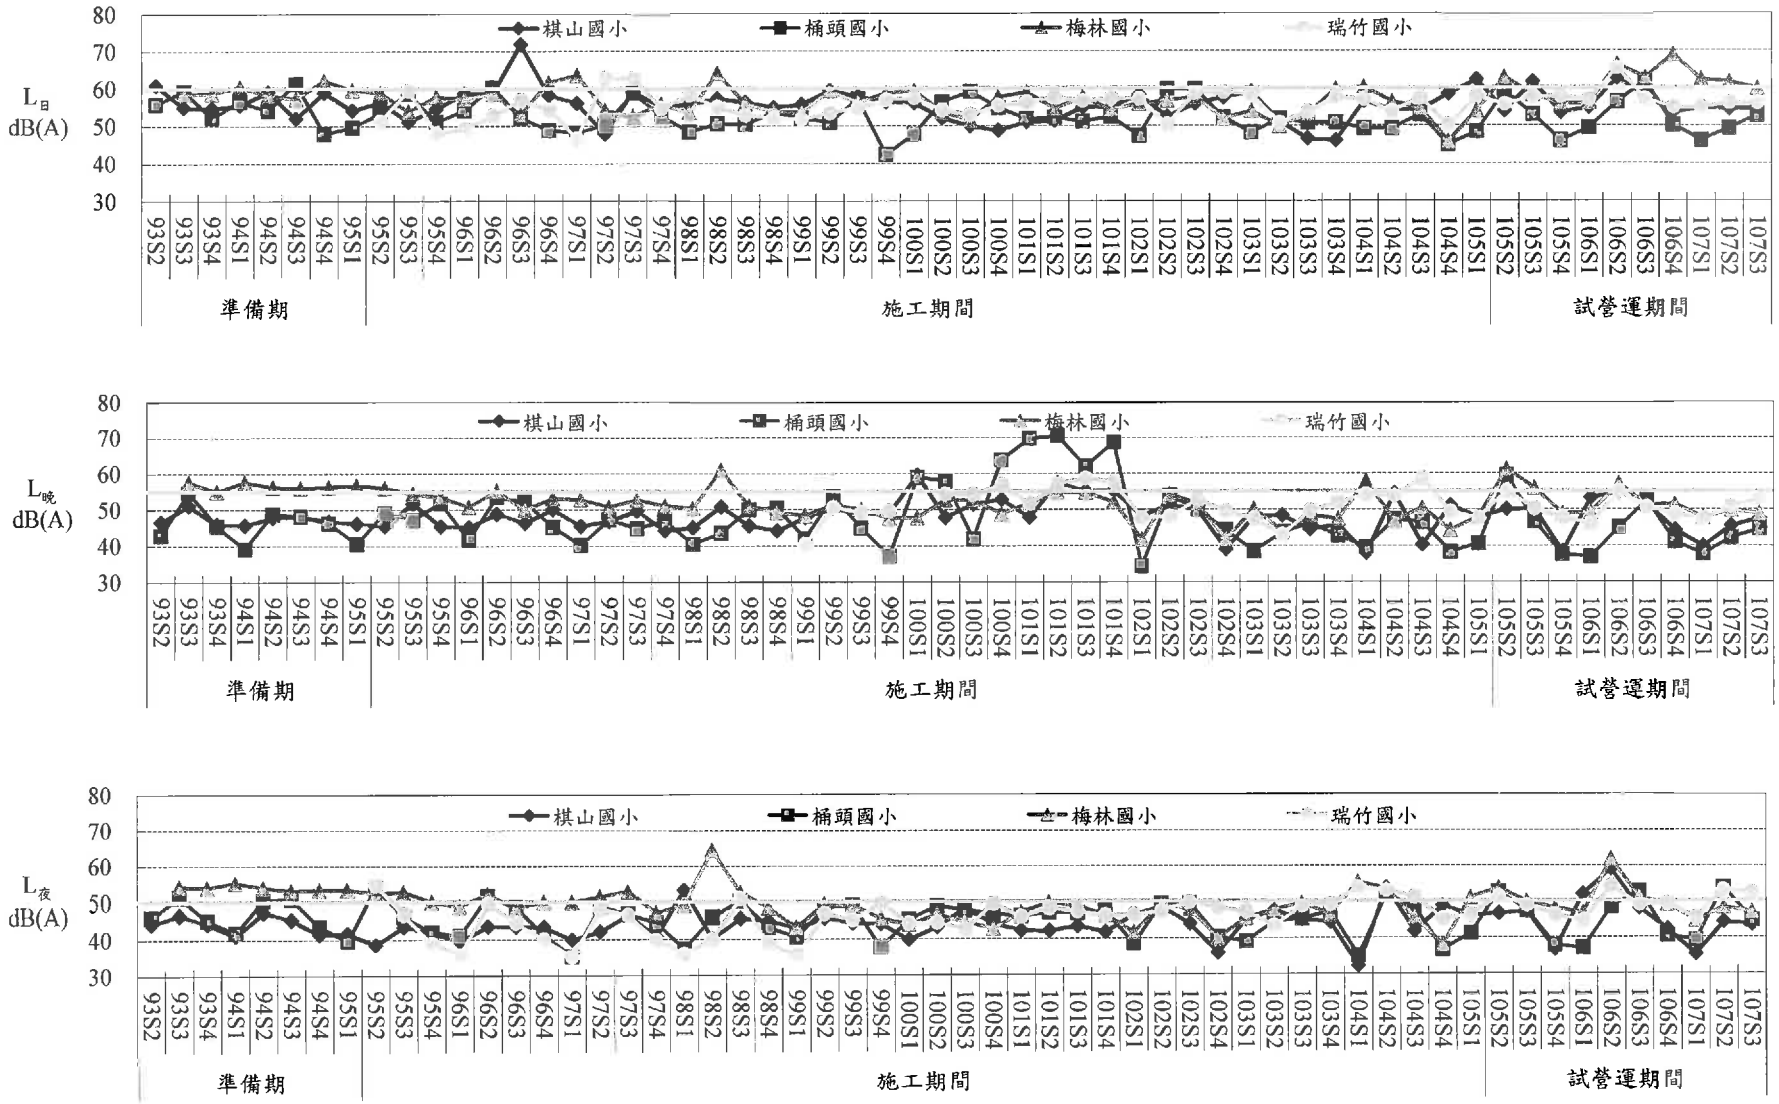

圖 2.2-6 各測站歷年噪音監測結果

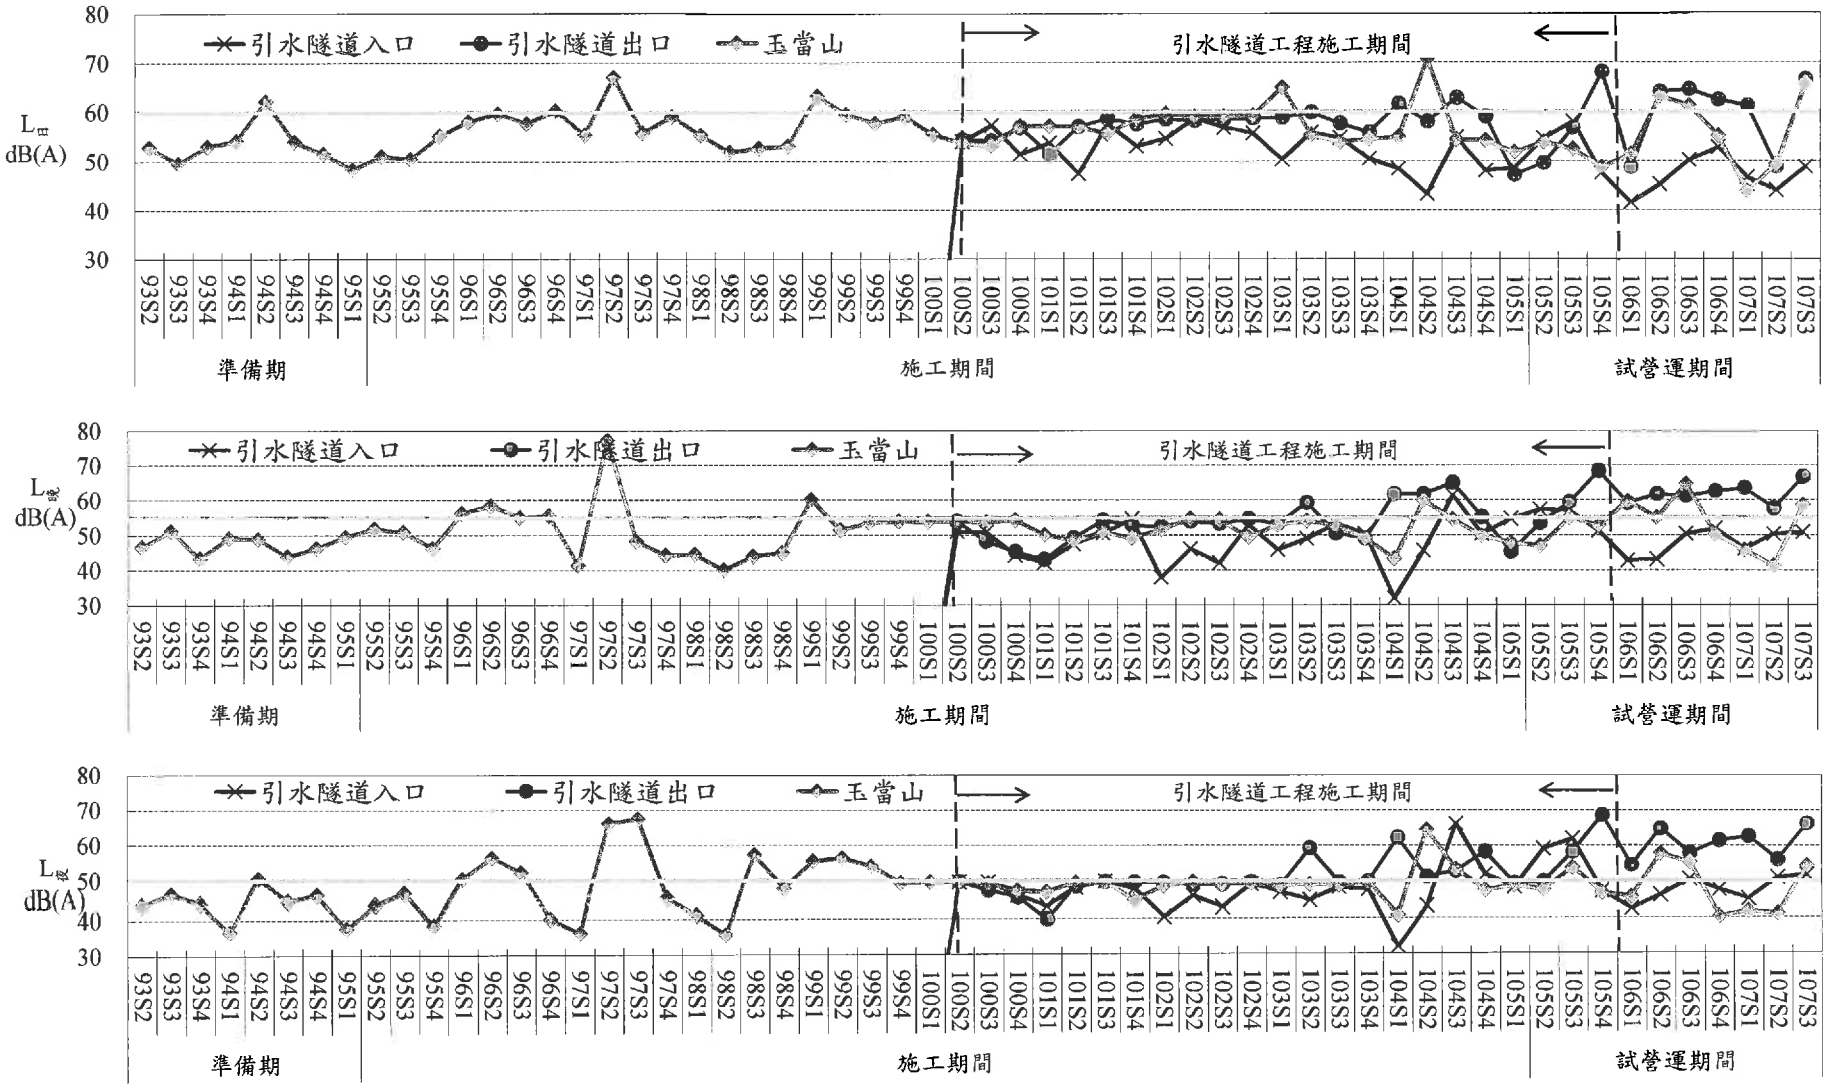

圖 2.2-6 各測站歷年噪音監測結果(續 1)

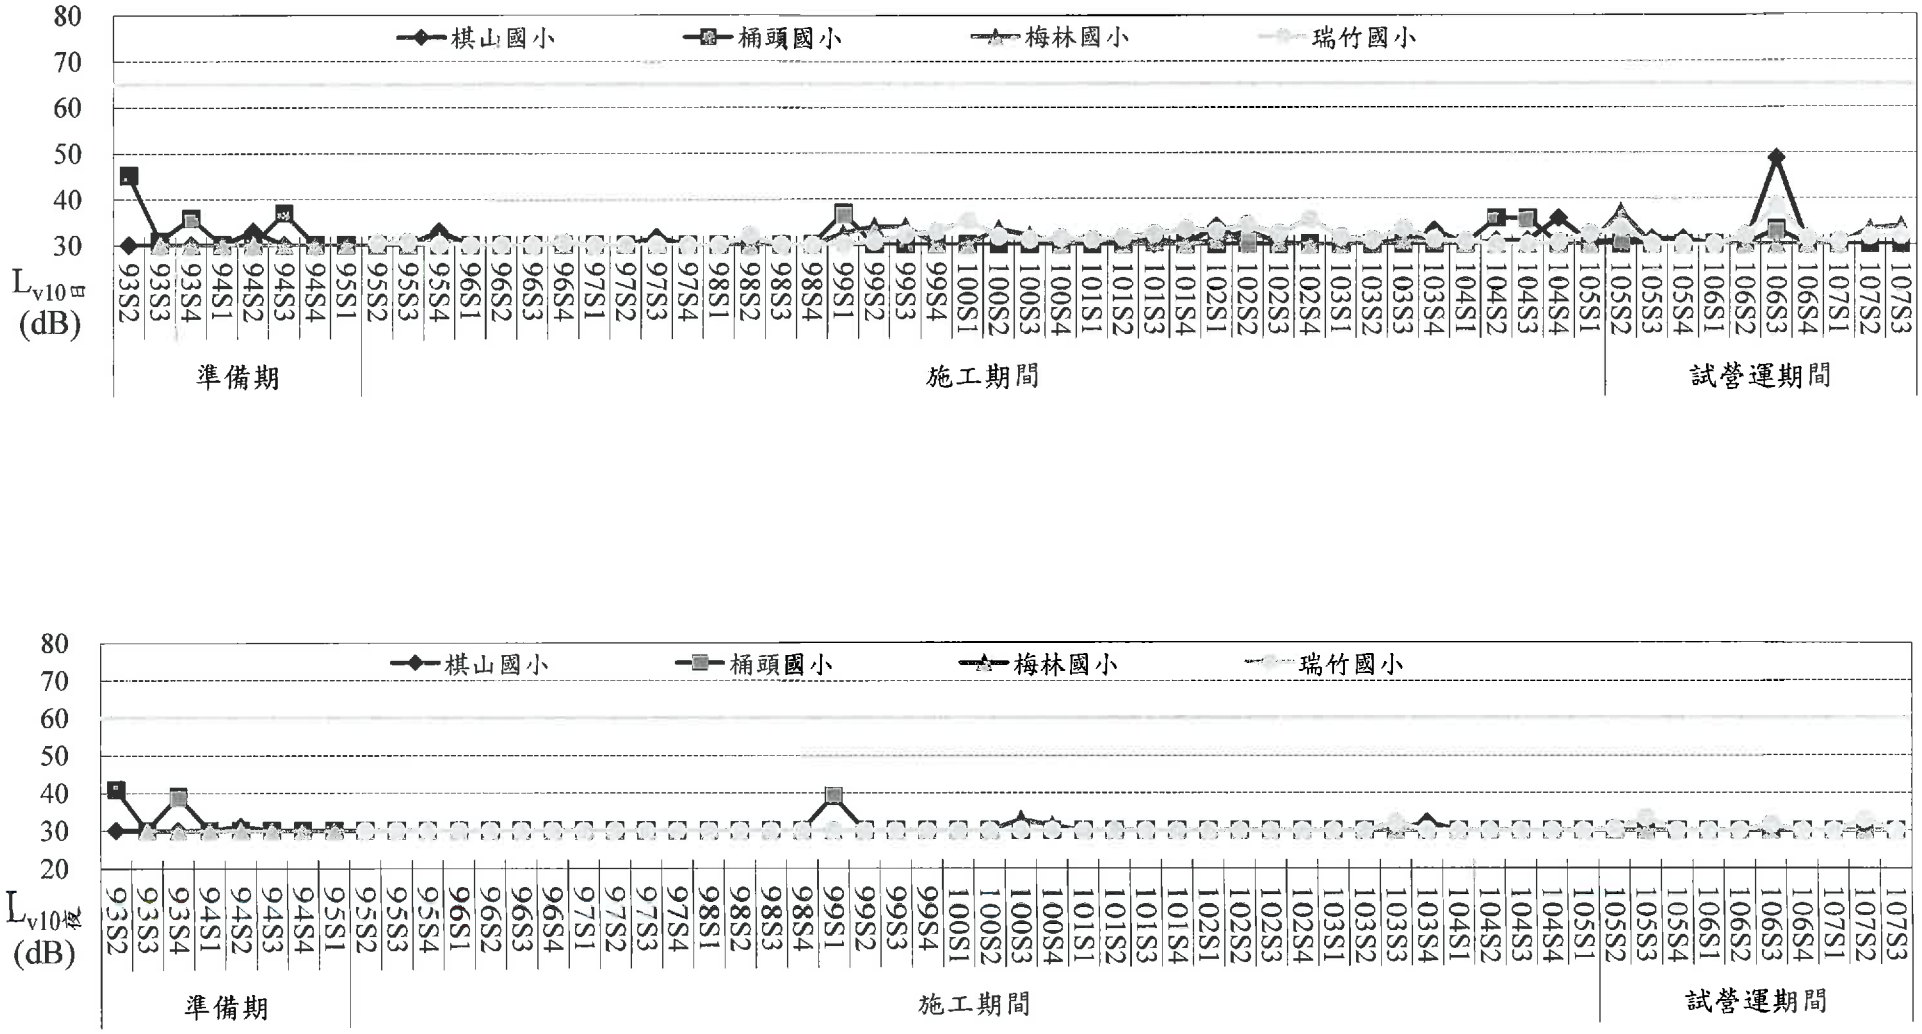

圖 2.2-7 各測站歷年振動監測結果

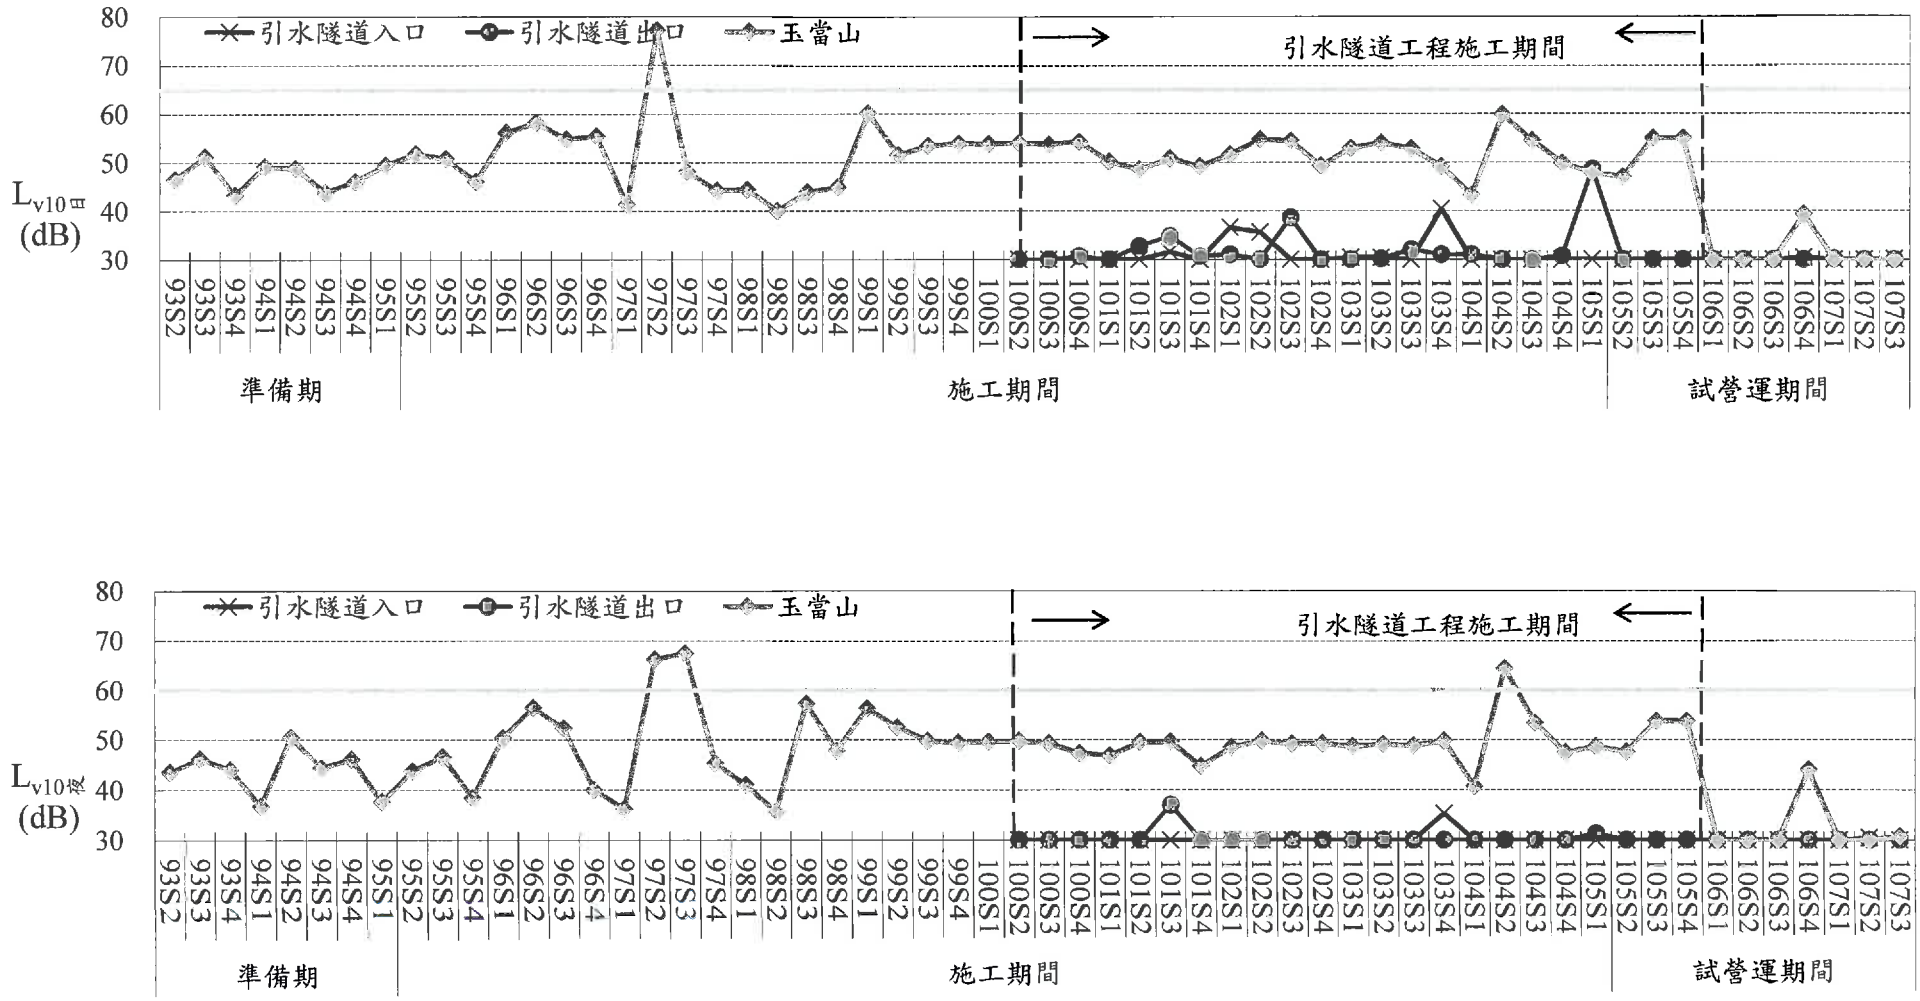

圖 2.2-7 各測站歷年振動監測結果(續 1)

2.3 水質水量

依據監測計畫內容，河川水質水量每月監測 1 次(其中殘餘農藥項目每半年監測 1 次)、工地水質水量為每月監測 1 次、地面水質水量為每月監測 1 次。監測點位置參見圖 1.4-3，監測紀錄詳如附錄三，本季監測成果茲說明如下：

2.3.1 河川水質水量

本計畫範圍相關之梅林溪流域及清水溪流域均屬乙類水體。河川水質水量監測項目包含水溫、pH、生化需氧量、化學需氧量、溶氧量、懸浮固體、總磷、總氮、油脂、導電度、濁度、流量、葉綠素 a 及殘餘農藥，共計 14 項；監測位置位於梅林溪流域為北勢坑溪上游、土地公坑溪上游、南勢坑溪上游 2 處、梅林溪壩址下游；於清水溪為全仔社橋、社興橋、鹿窟三號橋、瑞草橋及桶頭攔河堰上、下游之桶頭吊橋與桶頭橋，共 11 處進行監測。原清水溪上游清水溪橋測站於 106 年 7 月採樣時發現道路坍方無法執行採樣，經中水局同意後，遂自當月起將點位調整至下游瑞草橋執行。監測頻率為每月 1 次，殘餘農藥測項則每半年 1 次，本季分別於 7 月 10、19 日、8 月 22、23 日及 9 月 3、7 日進行採樣工作，由於 105 年 5 月起進入水庫蓄水階段，土地公坑溪上游原測站位置遭淹沒，故改以橡皮艇划至原測站位置執行，其水質比對標準亦因此改為飲用水水源水質標準。本季監測成果如表 2.3-1 及圖 2.3-1~圖 2.3-12 所示，歷季監測成果詳附錄四，歷次成果分析則彙整如圖 2.3-13~圖 2.3-20。茲將各監測項目分別說明如下：

一、水溫

本季梅林溪流域測站(北勢坑溪上游、土地公坑溪上游、南勢坑溪上游 2 處、梅林溪壩址下游測站)測值介於 22.8~32.4℃之間；歷年測值介於 12.5～34.9℃之間，顯示本次測值無明顯異常。

本季清水溪流域測站(全仔社橋、社興橋、鹿窟三號橋、瑞草橋、桶頭吊橋及桶頭橋測站)測值介於 23.0~25.4℃之間；歷年測值介於 13.8～30.3℃之間，本季測值略低但仍均屬正常範圍，顯示本次測值無明顯異常。

二、pH

本季梅林溪流域測站(北勢坑溪上游、土地公坑溪上游、南勢坑溪上游 2 處、梅林溪壩址下游測站)測值介於 8.2~8.8 之間；歷年測值介於 6.8～9.0 間，歷年測值均符合乙類水體水質標準，顯示本次測值無明顯異常。

本季清水溪流域測站(全仔社橋、社興橋、鹿窟三號橋、瑞草橋、桶頭吊橋及桶頭橋測站)測值介於 7.5~8.5 之間；歷年測值介於 7.2～9.0 之間，歷年測值均符合乙類水體水質標準，顯示本次測值

無明顯異常。

三、生化需氧量

本季梅林溪流域測站(北勢坑溪上游、土地公坑溪上游、南勢坑溪上游 2 處、梅林溪壩址下游測站) 測值介於<1.0~2.9mg/L 之間，除南勢坑溪上游(引水隧道出口下游)略有超標外，其餘各測站測值均符合乙類水體水質標準(2.0mg/L)；歷年測值介於<1.0～11.7mg/L 之間，顯示本次測值仍介於歷次範圍內，無明顯異常情況發生。

本季清水溪流域測站(全仔社橋、社興橋、鹿窟三號橋、瑞草橋、桶頭吊橋及桶頭橋測站)測值均為<1.0mg/L，各測站測值符合乙類水體水質標準之情形(2.0mg/L)；歷年測值介於<1.0~6.1mg/L 之間，顯示本次測值無明顯異常。

四、化學需氧量

本季梅林溪流域測站(北勢坑溪上游、土地公坑溪上游、南勢坑溪上游 2 處、梅林溪壩址下游測站)測值介於 ND~11.5mg/L 之間；歷年測值介於 ND～393mg/L 之間，顯示本次測值無明顯異常。

本季清水溪流域測站(全仔社橋、社興橋、鹿窟三號橋、瑞草橋、桶頭吊橋及桶頭橋測站)測值介於 ND~9.6mg/L 之間；歷年測值介於 ND～118.0mg/L 間，顯示本次測值無明顯異常。

五、溶氧量

本季梅林溪流域測站(北勢坑溪上游、土地公坑溪上游、南勢坑溪上游 2 處、梅林溪壩址下游測站)測值介於 5.8~9.1mg/L 之間，各測站測值均符合乙類水體水質標準(5.5mg/L)之情形；歷年測值介於 3.1～12.0 mg/L 之間，顯示本次測值無明顯異常。

本季清水溪流域測站(全仔社橋、社興橋、鹿窟三號橋、瑞草橋、桶頭吊橋及桶頭橋測站)測值介於 6.1~8.3mg/L 之間，各測站測值均符合乙類水體水質標準(5.5mg/L)之情形；歷年測值介於 4.8～9.8 mg/L 之間，顯示本次測值無明顯異常。

六、懸浮固體

本季梅林溪流域測站(北勢坑溪上游、土地公坑溪上游、南勢坑溪上游 2 處、梅林溪壩址下游測站)測值介於<1.0~652mg/L 之間，其中南勢坑溪上游兩站(引水隧道出口上、下游)測值有未符合乙類水體水質標準之情形(25mg/L)之情形；歷年測值介於<0.5～14,100 mg/L 之間，顯示本次測值無明顯異常。

本季清水溪流域測站(全仔社橋、社興橋、鹿窟三號橋、瑞草橋、桶頭吊橋及桶頭橋測站)測值介於 4.6~261mg/L 之間，各測站測值均曾有未符合乙類水體水質標準(25mg/L)之情形；歷年測值介

於<1.0～12,700 mg/L 之間，顯示本次測值無明顯異常。

七、總磷

本季梅林溪流域測站(北勢坑溪上游、土地公坑溪上游、南勢坑溪上游 2 處、梅林溪壩址下游測站)測值介於 0.011~0.280mg/L 之間，其中南勢坑溪上游(引水隧道出口下游)及梅林溪壩址下游測站測值均有未符合乙類水體水質標準之情形(0.05mg/L)；歷年測值介於 ND～5.49mg/L 之間，顯示本次測值無明顯異常。

本季清水溪流域測站(全仔社橋、社興橋、鹿窟三號橋、瑞草橋、桶頭吊橋及桶頭橋測站)測值介於 0.012~0.294mg/L 之間，部份測站測值於 7 月~9 月均有未符合乙類水體水質標準之情形(0.05mg/L)；歷年測值介於 ND～2.17 mg/L 之間，顯示本次測值無明顯異常。

八、總氮

本季梅林溪流域測站(北勢坑溪上游、土地公坑溪上游、南勢坑溪上游 2 處、梅林溪壩址下游測站)測值介於 0.38~2.07 mg/L 之間；歷年測值介於 ND～16.90 mg/L 之間，顯示本次測值無明顯異常。

本季清水溪流域測站(全仔社橋、社興橋、鹿窟三號橋、瑞草橋、桶頭吊橋及桶頭橋測站)本季測值介於 0.62~2.26mg/L 之間；歷年測值介於 0.10～5.64 mg/L 之間，顯示本次測值無明顯異常。

九、油脂

本季梅林溪流域測站(北勢坑溪上游、土地公坑溪上游、南勢坑溪上游 2 處、梅林溪壩址下游測站)測值皆<1.0mg/L；歷年測值介於<1.0～10.8 mg/L 之間，顯示本次測值無明顯異常。

本季清水溪流域測站(全仔社橋、社興橋、鹿窟三號橋、瑞草橋、桶頭吊橋及桶頭橋測站)測值皆<1.0mg/L，歷年測值介於<1.0～9.2 mg/L 之間，顯示本次測值無明顯異常。

十、導電度

本季梅林溪流域測站(北勢坑溪上游、土地公坑溪上游、南勢坑溪上游 2 處、梅林溪壩址下游測站)測值介於 317~438μmho/cm 之間；歷年測值介於 70～1,930μmho/cm 之間，顯示本次測值無明顯異常。

本季清水溪流域測站(全仔社橋、社興橋、鹿窟三號橋、瑞草橋、桶頭吊橋及桶頭橋測站)測值介於 233~467μmho/cm 之間；歷年測值介於 280～1,530 μmho/cm 之間，顯示本次測值無明顯異常。

十一、濁度

濁度測項自 99 年 1 月起進行監測，梅林溪流域測站(北勢坑溪上游、土地公坑溪上游、南勢坑溪上游 2 處、梅林溪壩址下游測站本季測值介於 0.85~450NTU 之間，歷次測值介於 0.2～10,800NTU 之間，顯示本次測值無明顯異常。

清水溪流域測站(全仔社橋、社興橋、鹿窟三號橋、瑞草橋、桶頭吊橋及桶頭橋測站)本季測值介於 3.0~140NTU 之間，歷次測值介於 3.1~2,000 NTU 之間，顯示本次測值無明顯異常。

十二、流量

本季梅林溪流域測站(北勢坑溪上游、土地公坑溪上游、南勢坑溪上游 2 處、梅林溪壩址下游測站)測值介於 0.6~2,022.6 m^3/min 之間，其中南勢坑溪上游(引水隧道出口下游)流量明顯較其它測站高，檢視桶頭攔河堰每日引水量資料，本計畫團隊於 8 月 22 日進行南勢坑溪上游採樣，當日引水量為 78.74 萬噸，與 8 月整體日平均引水量(45.35 萬噸)比對，引水量明顯較高，因此於引水隧道下游處流量明顯有升高情況發生；另外，由於土地公坑溪測站於蓄水階段遭淹沒，因此無法進行流量量測。各測站歷年測值介於<0.1～769 m^3/min 之間。

本季清水溪流域測站(全仔社橋、社興橋、鹿窟三號橋、瑞草橋、桶頭吊橋及桶頭橋測站)由於因受限地形因素，無法進行流量量測；各測站歷次測值介於<0.01~34,085m^3/min 之間。

十三、葉綠素 a

本季於清水溪流域測站桶頭攔河堰上游測值介於<0.1~1.0μg/L；歷次測值介於<1.0~2.4μg/L，顯示本次測值無明顯異常。

十四、殘餘農藥

本季無殘留農藥監測。

本季河川水質於梅林溪及清水溪流域皆有懸浮固體及總磷測項超標情形。懸浮固體測值超標情形，主要因採樣前有發生降雨，計畫區鄰近區域地質較脆弱，易受雨水沖刷導致懸浮固體測值升高。歷次數據顯示，降雨後或是豐水期間常有異常偏高之情形。針對總磷測值常有不符合乙類水體水質標準之情形，分析主要污染來源係為鄰近農田使用之肥料，且降雨後受雨水沖刷淋溶導致磷份溶入水體而被測得，且由歷年監測結果顯示，每年春季之梅雨下、夏季之暴雨後，更易測得總磷污染值偏高之狀況。

2.3.2 工地水質水量

工地水質水量監測項目包含水溫、pH、生化需氧量、化學需氧量、溶氧量、懸浮固體、總磷、總氮、油脂、真色色度、氨氮、大腸桿菌群及流量，共計 13 項；由於本季工地現場除綠美化工程(第二期)外均已完工，惟綠美化工程無放流水產生，故無工地水質水量資料。有關各測項歷季監測成果詳附錄四，另監測成果趨勢彙整如圖 2.3-21~圖 2.3-32。

綠美化工程(107 年 7 月)

工地水質僅於 99 年 2 月、3 月、10 月份之化學需氧量及油脂測項有偏高狀況，99 年~101 年 6 月間係於總工務所執行監測，101 年 7 月至今則於大壩工地或相關附屬工區進行監測。於總工務所監測時期，測值異常情況發生後，已透過提高套裝污水處理設備之維護保養頻率(每季 1 次)進行改善，後續已無異常狀況發生。此外，105 年 1、2 月之懸浮固體曾有偏高，然 105 年 5 月前之工區水體監測位置為湖管中心工區之原水產生點及污水放流口，該洗車台之出流水為工區內循環使用，即使因豪雨溢流亦僅進入水庫之庫區，故不致影響下游溪流水體。

2.3.3 暴雨逕流

本計畫暴雨逕流監測之逐時監測結果顯示沉砂池之處理效率介於 4.5~98.8%之間。由監測結果顯示，沉砂池之處理效率受雨量、進流大小影響甚鉅，且在長時間之大雨沖刷後處理效率將因池內泥砂逐漸淤積而漸漸下降，故開發單位已於汛期期間定期進行沉砂池之維護清淤作業(每週一次)，以保持其處理效率。此項監測已於 101 年 4 月執行 2 次、6 月執行 1 次，故本期監測不再執行。

2.3.4 地面水質

地面水質監測依據環評承諾屬營運階段之監測項目，中水局為先行了解試營運期間之蓄水水質，方自行辦理此項目之補充監測作業，監測項目包含 pH、水溫、溶氧量、生化需氧量、化學需氧量、大腸桿菌群、氨氮、懸浮固體、總氮、總有機碳、總磷、重金屬(銀、砷、鎘、六價鉻、銅、汞、錳、鉛、硒及鋅)、葉綠素 a 及殘餘農藥，監測位置計有水庫區(湖山壩址及湖南壩址)及河川區(梅林溪壩址下游及桶頭攔河堰上游桶頭吊橋處)共 4 處，其中湖山壩址及湖南壩址係針對水庫水質進行監測，依照採樣規範需於表(水面下 0.5 公尺處)、中(水深中間處)、底層(底床上 1 公尺處)採樣；其監測頻率以每季 1 次為原則。本季於 7 月 19 日及 9 月 13 日進行採樣工作，監測成果如表 2.3-2 所示，歷次監測成果則彙整於附錄四，另監測成果趨勢彙整如圖 2.3-33~圖 2.3-47。茲將各監測項目本季及歷次監測成果分別說明如下：

一、pH

本季河川區測值介於 8.5~8.8 之間，歷次河川區測值介於 8.3~8.9 之間；本季湖山壩址測值均為 8.7，歷次湖山壩址測值介於 7.2~9.0 之間；本次湖南壩址測值均為 8.8，歷次湖南壩址測值介於 7.5~8.7 之間；本季及歷次測值均無明顯異常情形。

二、水溫

本季河川區測值介於 25.0~28.9℃之間，歷次河川區測值介於 18.6~33.2℃之間；本季湖山壩址測值介於 29.0~32.8℃之間，歷次湖山壩址測值介於 18.0~31.8℃之間；本次湖南壩址測值介於 28.8~32.8℃之間，歷次湖南壩址測值介於 19.4~31.5℃之間。本季湖山壩址及湖南壩址表層水溫有略較歷次測值高(均為 32.8℃)，查詢鄰近環保署空品測站-斗六測站 7 月 19 日白天氣溫(07~18 時)，介於 31~37℃之間，當日天氣炎熱因此影響水庫表層之水溫(當日水庫蓄水量百分比為 21.56%)，本季及歷次測值均無明顯異常情形。

三、溶氧量

本季河川區測值介於 7.2~8.4mg/L 之間，歷次河川區測值介於 4.7~8.9mg/L 之間；本季湖山壩址測值介於 7.8~7.9mg/L 之間，歷次湖山壩址測值介於 0.8~9.2mg/L 之間；本次湖南壩址測值介於 7.7~7.8mg/L 之間，歷次湖南壩址測值介於 1.2~9.1mg/L 之間。本季及歷次測值均無明顯異常情形。

四、生化需氧量

本季河川區測值皆為<1.0，歷次河川區測值介於 ND~1.4mg/L 之間；本季湖山壩址測值介於<1.0~1.4 mg/L 之間，歷次湖山壩址測值介於 ND~2.5mg/L 之間；本次湖南壩址測值皆為介於<1.0~2.6mg/L 之間，歷次湖南壩址測值介於 ND~2.6mg/L 之間。本季及歷次測值無明顯異常情形。

五、化學需氧量

本季河川區測值介於 4.0~4.2mg/L 之間，歷次河川區測值介於 ND~10.2mg/L 之間；本季湖山壩址測值介於 9.2~9.9mg/L 之間，歷次湖山壩址測值介於 ND~15.9mg/L 之間；本次湖南壩址測值介於 9.7~11.1mg/L 之間，歷次湖南壩址測值介於 ND~14.9mg/L 之間。本季及歷次測值均符合飲用水水源水質標準(25mg/L)且無明顯異常情形。

六、大腸桿菌群

本季河川區測值介於 1.1×10^4~2.7×10^4 CFU/100mL 之間，歷次河川區測值介於<10~4.0×10^3 CFU/100mL 之間；本季湖山壩址測值

介於<10~1.2x10^3CFU/100mL之間，歷次湖山壩址測值介於<10~3.0x10^2 CFU/100mL之間；本次湖南壩址測值皆為<10，歷次湖南壩址測值介於<10~4.5x10^2 CFU/100mL之間；本季除桶頭攔河堰上游(桶頭吊橋)測值有略有高於飲用水水源水質標準(2.0x10^4CFU/100mL)外，其餘測值則無明顯異常情形。

七、氨氮

本季河川區測值皆為ND，歷次河川區測值介於ND~0.04mg/L之間；本季湖山壩址測值皆為0.02mg/L，歷次湖山壩址測值介於ND~0.10mg/L之間；本次湖南壩址測值皆為0.02mg/L，歷次湖南壩址測值介於ND~0.03mg/L之間。本季及歷次測值均符合飲用水水源水質標準(1mg/L)且無明顯異常情形。

八、懸浮固體

本季河川區測值介於4.5~47.7mg/L之間，歷次河川區測值介於1.3~450mg/L之間；本季湖山壩址測值介於1.3~2.3mg/L之間，歷次湖山壩址測值介於ND~25.1mg/L之間；本次湖南壩址測值介於<1.0~1.9mg/L之間，歷次湖南壩址測值介於ND~11.8mg/L之間；本季及歷次測值均無明顯異常情形。

九、總氮

本季河川水質區介於0.95~1.47mg/L之間，歷次河川區測值介於0.22~2.61mg/L之間；本季湖山壩址測值介於0.81~0.87mg/L之間，歷次湖山壩址測值介於0.22~2.86mg/L之間；本次湖南壩址測值介於0.67~0.79mg/L之間，歷次湖南壩址測值介於0.22~1.42mg/L之間。本季及歷次測值無明顯異常。

十、總有機碳

本季河川水質區介於1.0~1.4mg/L之間，歷次河川區測值介於0.4~1.8mg/L之間；本季湖山壩址測值介於2.5~2.8mg/L之間，歷次湖山壩址測值介於0.7~3.2mg/L之間；本次湖南壩址測值介於2.7~3.2mg/L之間，歷次湖南壩址測值介於0.7~3.2mg/L之間；本季及歷次測值均符合飲用水水源水質標準(4mg/L)。

十一、總磷

本季河川區測值介於0.026~0.070mg/L之間，歷次河川區測值介於0.012~0.538mg/L之間；本季湖山壩址測值介於0.012~0.014mg/L之間，歷次湖山壩址測值介於0.007~0.046mg/L之間；本次湖南壩址測值介於0.016~0.028mg/L之間，歷次湖南壩址測值介於0.007~0.077mg/L之間；本季及歷次測值均無明顯異常情形。

十二、重金屬(銀、砷、鎘、六價鉻、銅、汞、錳、鉛、硒、鋅)

本季河川區砷測值皆為<0.0020，歷次河川區測值介於0.0005~0.0098mg/L之間；本季湖山壩址測值皆為<0.0020，歷次湖山壩址測值介於<0.0004~0.002mg/L之間；本次湖南壩址測值皆為<0.0020，歷次湖南壩址測值介於<0.0004~0.0018mg/L之間。本季及歷次測值均符合飲用水水源水質標準(0.05mg/L)。

本季河川區錳測值介於0.032~0.048mg/L，歷次河川區測值介於0.005~0.319mg/L之間；本季湖山壩址測值皆為ND，歷次湖山壩址測值介於ND~0.067mg/L之間，本次湖南壩址測值皆為ND，歷次湖南壩址測值介於ND~0.076mg/L之間。歷次河川水質錳偶有超出基準值；另湖山壩及湖南壩本季及歷季測值均無明顯異常情形。

本季河川區鋅測值介於ND~<0.020mg/L之間，歷次河川區測值介於ND~0.064mg/L之間；本季湖山壩址測值介於ND~<0.020mg/L之間，歷次湖山壩址測值介於ND~0.067mg/L之間；本次湖南壩址測值介於ND~<0.020mg/L之間，歷次湖南壩址測值介於ND~0.052mg/L之間。本季及歷次測值均符合保護人體健康基準(0.5mg/L)。

其餘測項(銀、鎘、六價鉻、銅、汞、鉛、硒)之本季及歷次測值皆小於偵測極限。本季及歷次測值均符合飲用水水源水質標準及保護人體健康基準且無明顯異常情形。

十三、葉綠素a

本季河川區測值介於1.5~1.8μg/L之間，歷次河川區測值介於ND~2.1μg/L之間；本季湖山壩址測值介於1.8~6.5μg/L之間，歷次湖山壩址測值介於ND~17.8μg/L之間；本次湖南壩址測值介於3.6~6.5μg/L之間，歷次湖南壩址測值介於ND~23.7μg/L之間；本季及歷次測值均無明顯異常情形。

十四、透明度

由於河川區水深較淺，因此無法進行量測；湖山壩址測值為1.3cm，湖南壩址則為1.3cm。如參照環保署用於評估水庫水質優養程度的指標「卡爾森指數，Carlson trophic state index(CTSI)」，CTSI<40為貧養狀態，40≦CTSI≦50為普養狀態，CTSI>50則為優養狀態，因此由本計畫測得之透明度、葉綠素-a及總磷進行計算，湖山壩址CTSI指標值為48.06，而湖南壩址CTSI指標值為52.30，水庫優氧化程度介於普養~優養狀態。

另查詢「環保署全國環境水質監測資訊網」資料，湖山水庫於7~8月之卡爾森指數分別為50及48，水庫優養化程度均為普養狀態，比對本計畫7月份監測結果，CTSI指標值差不不大，僅湖南

壩址指標值略高於 50，為再將持續觀察，測值如有持續偏高將會立即通報管理單位，以利相關因應措施執行。

十五、殘餘農藥

本季各測站測值皆小於偵測極限，本季及歷次測值均符合保護人體健康基準且無明顯異常情形。

綜上分析，本季各測項測值皆符合飲用水水源水質標準及保護人體健康基準。

表 2.3-1　本季河川水質監測結果比較表

採樣點 \ 項目			水溫	pH	生化需氧量	化學需氧量	溶氧量	懸浮固體	總磷	總氮	油脂	導電度	濁度	流量	葉綠素a	污染程度
			℃	-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μmho/cm	NTU	m^3/min	μg/L	
梅林溪流域	北勢坑溪上游	7月	29.9	8.5	<1.0	ND	7.7	10.0	0.022	0.38	<1.0	392	0.85	1.2	–	未受污染
		8月	27.1	8.4	<1.0	4.1	6.6	11.2	0.042	0.72	<1.0	395	10.0	15	–	未受污染
		9月	28.1	8.3	<1.0	ND	7.6	<1.0	0.011	0.41	<1.0	401	1.10	3.6	–	未受污染
		歷年平均值	25.3	8.2	1.9	7.7	7.1	25.8	0.033	0.51	4.8	514	8.1	12	–	–
		歷年最大值	34.9	8.9	5.2	73.5	9.9	511	0.345	2.35	9.8	842	130	144	–	–
	南勢坑溪上游引水隧道出口上游	7月	29.8	8.4	<1.0	ND	7.3	97.2	0.103	0.89	<1.0	435	70	4.2	–	輕度污染
		8月	27.5	8.3	<1.0	4.7	5.8	169.0	0.195	1.28	<1.0	438	160	4.8	–	中度污染
		9月	28.5	8.2	<1.0	ND	7.5	143.0	0.108	0.64	<1.0	403	80	0.6	–	中度污染
		歷年平均值	25.1	8.0	1.9	7.0	6.9	33.5	0.037	0.6	5.3	475	16	4.7	–	–
		歷年最大值	34.0	8.9	4.0	32.0	9.3	698.0	0.56	2.3	9.6	721	380	103	–	–
	南勢坑溪上游引水隧道出口下游	7月	31.4	8.3	<1.0	ND	6.7	198.0	0.176	0.79	<1.0	436	90	115.2	–	中度污染
		8月	26.6	8.3	<1.0	4.7	8.0	273.0	0.280	1.28	<1.0	410	210	2022.6	–	中度污染
		9月	22.8	8.4	2.9	11.5	8.3	652.0	0.033	2.07	<1.0	338	450	1735.8	–	中度污染
		歷年平均值	23.1	8.4	1.9	7.8	7.4	129	0.111	1.05	<1.0	434	95	58.3	–	–
		歷年最大值	30.3	8.7	2.7	29.1	8.7	1,360	0.705	2.09	<1.0	609	1,400	272.4	–	–
	梅林溪壩址下游	7月	28.0	8.5	<1.0	3.3	8.2	5.4	0.032	1.11	<1.0	426	7.5	10.2	–	輕度污染
		8月	26.5	8.4	<1.0	3.2	5.9	22.6	0.061	1.54	<1.0	410	25	24.0	–	中度污染
		9月	26.4	8.4	<1.0	3.1	7.6	6.5	0.038	1.06	<1.0	386	15	27.0	–	輕度污染
		歷年平均值	26.2	8.2	2.6	15.5	6.9	276.2	0.144	1.9	4.9	590	282	51.9	–	–
		歷年最大值	33.9	9.0	11.7	393	12.0	11,200	5.49	16.90	10.8	1,930	10,700	769.2	–	–
乙類水體水質標準			–	6.5~9	≦2.0	–	≧5.5	≦25	≦0.05	–	–	–	–	–	–	–
梅林溪流域	土地公坑溪上游	7月	32.4	8.8	1.1	10.1	7.2	2.4	0.015	0.78	<1.0	333	2.9	無法量測	–	未受污染
		8月	29.7	8.6	<1.0	4.5	6.0	5.2	0.021	0.89	<1.0	332	3.1	無法量測	–	輕度污染
		9月	30.1	8.5	<1.0	3.7	9.1	2.8	0.018	0.52	<1.0	317	2.6	無法量測	–	未受污染
		歷年平均值	24.5	8.1	1.8	10.8	6.9	238	0.099	0.82	4.5	532	304	4.5	–	–
		歷年最大值	34.3	8.9	5.5	187	9.7	14,100	3.47	15.1	8.6	1,030	10,800	98.0	–	–
飲用水水源水質標準			–	–	–	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

註1：「-」表示無監測數據或無該項法規；「灰底」表不符合法規標準之本季測值。

註2：自105年5月水庫進入蓄水階段起，土地公坑溪原採樣位置因遭淹沒而改以橡皮艇採樣，故無法量測河川流量測值，亦改以飲用水水源水質標準進行比對。

表 2.3-1　本季河川水質監測結果比較表(續)

採樣點		項目	水溫	pH	生化需氧量	化學需氧量	溶氧量	懸浮固體	總磷	總氮	油脂	導電度	濁度	流量	葉綠素a	污染程度
			℃	-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μmho/cm	NTU	m^3/min	μg/L	
清水溪流域	清水溪	全仔社橋	7月	23.6	8.4	<1.0	ND	8.1	42.5	0.123	0.62	<1.0	278	12	無法量測	—	輕度污染
			8月	23.3	8.4	<1.0	6.4	7.9	104.0	0.136	1.09	<1.0	252	60	無法量測	—	中度污染
			9月	23.8	7.6	<1.0	ND	8.1	4.6	0.012	0.80	<1.0	233	3.0	無法量測	—	未受污染
			歷年平均值	23.3	8.3	1.0	5.9	7.4	39.1	0.045	0.57	<1.0	342	13	—	—	—
			歷年最大值	28.7	8.7	1.1	10.2	8.9	186.0	0.140	1.30	<1.0	437	60	—	—	—
		社興橋	7月	25.4	8.5	<1.0	5.1	7.5	25.6	0.041	2.26	<1.0	467	17	無法量測	—	輕度污染
			8月	23.9	8.4	<1.0	9.6	7.7	110.0	0.131	2.02	<1.0	384	60	無法量測	—	中度污染
			9月	25.2	7.6	<1.0	ND	7.7	32.1	0.064	1.17	<1.0	377	28	無法量測	—	輕度污染
			歷年平均值	23.2	8.4	1.3	7.4	7.5	62.2	0.079	0.86	<1.0	468	43	—	—	—
			歷年最大值	28.6	8.6	1.3	12.8	9.4	456.0	0.404	2.77	<1.0	569	300	—	—	—
		鹿窟三號橋旁	7月	24.1	8.4	<1.0	ND	8.2	57.8	0.056	0.88	<1.0	369	29	無法量測	—	輕度污染
			8月	23.4	8.4	<1.0	3.3	7.9	99.2	0.167	1.33	<1.0	314	60	無法量測	—	中度污染
			9月	25.4	7.5	<1.0	6.5	6.1	16.5	0.030	0.89	<1.0	329	11	無法量測	—	輕度污染
			歷年平均值	23.2	8.4	1.4	6.0	7.6	74.9	0.068	0.64	<1.0	434	31	—	—	—
			歷年最大值	27.8	8.7	1.4	14.2	9.2	651	0.341	1.72	<1.0	568	260	—	—	—
		瑞草橋	7月	23.9	8.5	<1.0	4.5	7.6	64.3	0.083	1.75	<1.0	377	36	無法量測	—	中度污染
			8月	23.9	8.4	<1.0	3.3	8.2	179.0	0.281	1.70	<1.0	329	120	無法量測	—	中度污染
			9月	24.3	7.6	<1.0	4.1	7.4	178.0	0.196	1.89	<1.0	332	100	無法量測	—	中度污染
			歷年平均值	22.2	8.5	1.2	5.7	7.8	71.7	0.085	0.99	<1.0	438	45	—	—	—
			歷年最大值	27.2	9.0	1.2	12.1	9.8	324.0	0.302	2.28	<1.0	577	180	—	—	—
	桶頭攔河堰上游	桶頭吊橋	7月	24.3	8.4	<1.0	4.5	8.1	73.4	0.096	1.49	<1.0	387	70	無法量測	1.0	中度污染
			8月	23.7	8.4	<1.0	6.8	8.2	261.0	0.294	2.13	<1.0	334	140	無法量測	<0.1	中度污染
			9月	24.4	7.6	<1.0	ND	7.5	190.0	0.196	1.47	<1.0	334	110	無法量測	<0.1	中度污染
			歷年平均值	23.5	8.3	2.2	12.2	7.2	366.9	0.143	1.13	1.16	444	116	950	1.1	—
			歷年最大值	30.2	9.0	6.1	118	9.7	12,700	2.17	5.64	9.0	1,530	1,900	11,376	4.4	—
	桶頭攔河堰下游	桶頭橋	7月	24.7	8.4	<1.0	7.4	7.2	50.8	0.081	1.47	<1.0	374	45	無法量測	—	中度污染
			8月	23.0	8.4	<1.0	ND	8.3	231.0	0.268	1.83	<1.0	347	140	無法量測	—	中度污染
			9月	24.0	7.6	<1.0	4.5	7.0	133.0	0.186	1.49	<1.0	340	95	無法量測	—	中度污染
			歷年平均值	23.5	8.3	2.1	12.4	7.1	392.5	0.159	1.1	1.2	436	124	1871	—	—
			歷年最大值	30.4	8.8	5.9	116	9.6	11,600	2.01	4.20	9.2	619	2,000	34,085	—	—
乙類水體水質標準			—	6.5~9	≦2.0	—	≧5.5	≦25	≦0.05	—	—	—	—	—	—	—	—

註1：「-」表示無監測數據或無該項法規；「灰底」表不符合法規標準之本季測值。

註2：全仔社橋、社興橋、鹿窟三號橋及瑞草橋因地形因素無法進行流量量測，故無河川流量測值。

表 2.3-2　本季地面水質監測結果比較表

監測地點及日期 / 項目及單位		桶頭攔河堰上游(桶頭吊橋)	梅林溪(壩址下游)	湖山壩址表層(水面下0.5公尺處)	湖山壩址中層(水面下4.5公尺處)	湖山壩址底層(底床上1公尺處)	湖南壩址表層(水面下0.5公尺處)	湖南壩址中層(水面下3.8公尺處)	湖南壩址底層(底床上1公尺處)	飲用水水源水質標準	保護人體健康基準
		107/7/19	107/7/19	107/7/19	107/7/19	107/7/19	107/7/19	107/7/19	107/7/19		
pH	-	8.5	8.8	8.7	8.7	8.7	8.8	8.8	8.8	—	—
水溫	℃	25.0	28.9	32.8	30.6	29.0	32.8	30.2	28.8	—	—
溶氧量	mg/L	7.2	8.4	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	—	—
生化需氧量	mg/L	<1.0	<1.0	1.4	<1.0	<1.0	<1.0	2.6	1.7	—	—
化學需氧量	mg/L	4.2	4.0	9.2	9.9	9.7	9.9	11.1	9.7	≦25	—
大腸桿菌群	CFU/100mL	2.7×10^4	1.1×10^4	<10	<10	1.2×10^3	<10	<10	<10	≦20000	—
氨氮	mg/L	ND	ND	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	≦1	—
懸浮固體	mg/L	47.7	4.5	1.7	2.3	1.3	1.5	<1.0	1.9	—	—
總氮	mg/L	1.47	0.95	0.84	0.87	0.81	0.76	0.67	0.79	—	—
總有機碳	mg/L	1.0	1.4	2.5	2.5	2.8	2.8	2.7	3.2	≦4	—
總磷	mg P/L	0.070	0.026	0.012	0.013	0.014	0.027	0.028	0.016	—	—
銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—	≦0.05
砷	mg/L	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	≦0.05	≦0.05
鎘	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≦0.01	≦0.01
六價鉻	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—	≦0.05
銅	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—	≦0.03
汞	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≦0.002	≦0.002
錳	mg/L	0.048	0.032	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—	≦0.05
鉛	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≦0.05	≦0.1
硒	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≦0.05	≦0.05
鋅	mg/L	<0.020	ND	ND	ND	<0.020	ND	<0.020	ND	—	≦0.5
葉綠素a	μg/L	1.8	1.5	5.9	6.5	1.8	6.5	5.9	3.6	—	—
透明度	cm	無法量測	無法量測	1.3	—	—	1.3	—	—	—	—

註：1.「—」表無相對應之標準值。

2.灰底表示未符合「飲用水水源水質標準」或「保護人體健康基準」。

表 2.3-2　本季地面水質監測結果比較表(續)

監測地點及日期 / 項目及單位		桶頭攔河堰上游(桶頭吊橋)	梅林溪(壩址下游)	湖山壩址表層(水面下0.5公尺處)	湖山壩址中層(水面下4.5公尺處)	湖山壩址底層(底床上1公尺處)	湖南壩址表層(水面下0.5公尺處)	湖南壩址中層(水面下3.8公尺處)	湖南壩址底層(底床上1公尺處)	飲用水水源水質標準	保護人體健康基準
		107/9/13	107/9/13	107/9/13	107/9/13	107/9/13	107/9/13	107/9/13	107/9/13		
達馬松	mg/L	<0.00070	<0.00070	<0.00070	<0.00070	<0.00070	<0.00070	<0.00070	<0.00070	–	有機磷劑及氨基甲酸鹽之總量≦0.1
大利松	mg/L	<0.00083	<0.00083	<0.00083	<0.00083	<0.00083	<0.00083	<0.00083	<0.00083	–	
巴拉松	mg/L	<0.00073	<0.00073	<0.00073	<0.00073	<0.00073	<0.00073	<0.00073	<0.00073	–	
一品松	mg/L	<0.00057	<0.00057	<0.00057	<0.00057	<0.00057	<0.00057	<0.00057	<0.00057	–	
亞素靈	mg/L	<0.00068	<0.00068	<0.00068	<0.00068	<0.00068	<0.00068	<0.00068	<0.00068	–	
納乃得	mg/L	<0.00208	<0.00208	<0.00208	<0.00208	<0.00208	<0.00208	<0.00208	<0.00208	–	
加保扶	mg/L	<0.00209	<0.00209	<0.00209	<0.00209	<0.00209	<0.00209	<0.00209	<0.00209	–	
滅必蝨	mg/L	<0.00203	<0.00203	<0.00203	<0.00203	<0.00203	<0.00203	<0.00203	<0.00203	–	
靈丹	mg/L	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	–	≦0.004
2,4-地	mg/L	<0.00018	<0.00018	<0.00018	<0.00018	<0.00018	<0.00018	<0.00018	<0.00018	–	除草劑≦0.1
丁基拉草	mg/L	<0.00024	<0.00024	<0.00024	<0.00024	<0.00024	<0.00024	<0.00024	<0.00024	–	
巴拉刈	mg/L	<0.00024	<0.00024	<0.00024	<0.00024	<0.001	<0.00024	<0.00024	<0.00024	–	
飛佈達	mg/L	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	–	飛佈達衍生物≦
環氧飛佈達	mg/L	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	–	
阿特靈	mg/L	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	–	≦0.003
地特靈	mg/L	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	–	≦0.003
安特靈	mg/L	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	–	≦0.0002
α-安殺番	mg/L	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	–	≦0.003
β-安殺番	mg/L	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	–	
4,4'－滴滴依	mg/L	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	–	滴滴涕衍生物≦0.001
2,4'－滴滴滴	mg/L	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	–	
4,4'－滴滴滴	mg/L	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	–	
2,4'－滴滴涕	mg/L	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	–	
4,4'－滴滴涕	mg/L	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	–	
得滅克代謝物I	mg/L	<0.00205	<0.00205	<0.00205	<0.00205	<0.00205	<0.00205	<0.00205	<0.00205	–	有機磷劑及氨基甲酸鹽之總量≦0.1
得滅克代謝物	mg/L	<0.00205	<0.00205	<0.00205	<0.00205	<0.00205	<0.00205	<0.00205	<0.00205	–	
歐殺滅	mg/L	<0.00205	<0.00205	<0.00205	<0.00205	<0.00205	<0.00205	<0.00205	<0.00205	–	
加保扶代謝物	mg/L	<0.00209	<0.00209	<0.00209	<0.00209	<0.00209	<0.00209	<0.00209	<0.00209	–	
得滅克	mg/L	<0.00208	<0.00208	<0.00208	<0.00208	<0.00208	<0.00208	<0.00208	<0.00208	–	
安丹	mg/L	<0.00209	<0.00209	<0.00209	<0.00209	<0.00209	<0.00209	<0.00209	<0.00209	–	
加保利	mg/L	<0.00204	<0.00204	<0.00204	<0.00204	<0.00204	<0.00204	<0.00204	<0.00204	–	
丁基滅必蝨	mg/L	<0.00201	<0.00201	<0.00201	<0.00201	<0.00201	<0.00201	<0.00201	<0.00201	–	
滅賜克	mg/L	<0.00202	<0.00202	<0.00202	<0.00202	<0.00202	<0.00202	<0.00202	<0.00202	–	
拉草	mg/L	<0.00080	<0.00080	<0.00080	<0.00080	<0.00080	<0.00080	<0.00080	<0.00080	–	除草劑≦0.1
五氯酚	mg/L	<0.00141	<0.00141	<0.00141	<0.00141	<0.00141	<0.00141	<0.00141	<0.00141	–	≦0.005
毒殺芬	mg/L	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	–	≦0.005

註：由於農藥項目測值均小於偵測極限，故以小於偵測極限方式表示之。

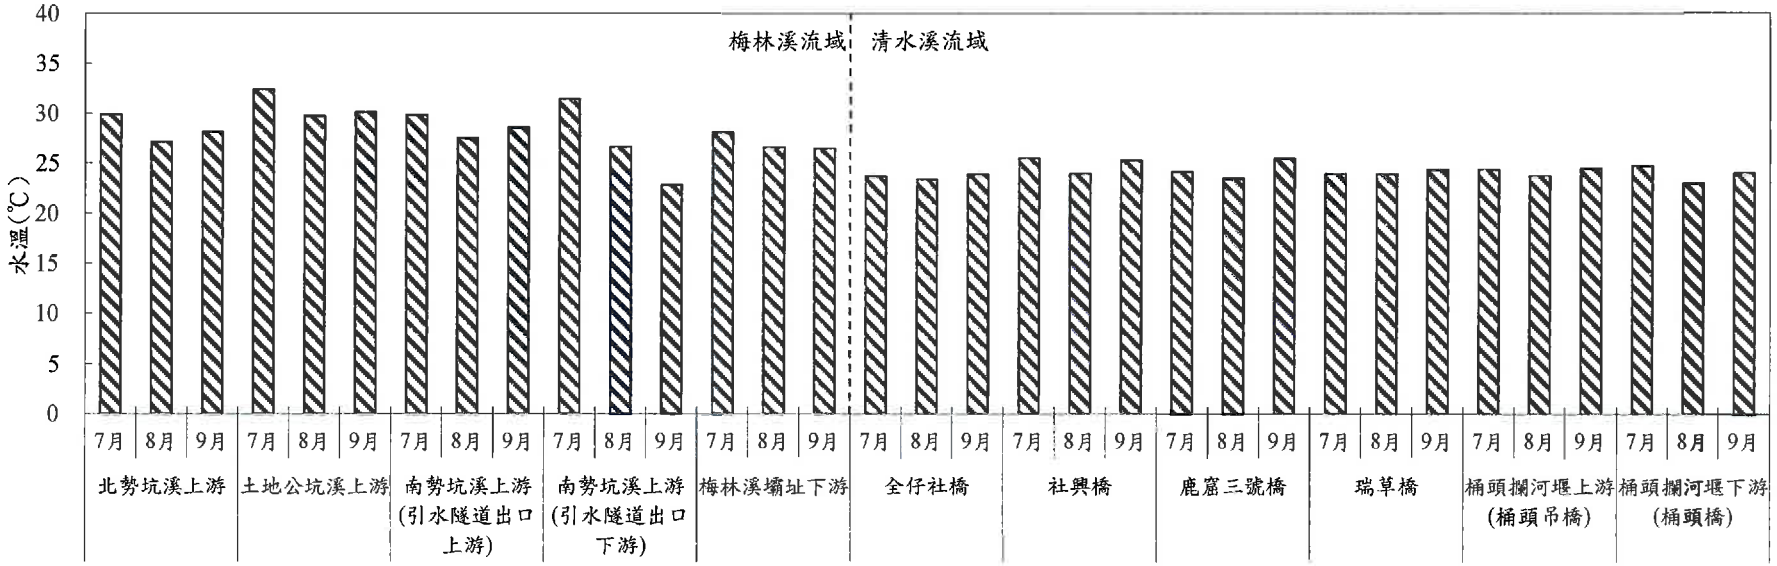

圖 2.3-1 本季河川水質水溫監測結果比較圖

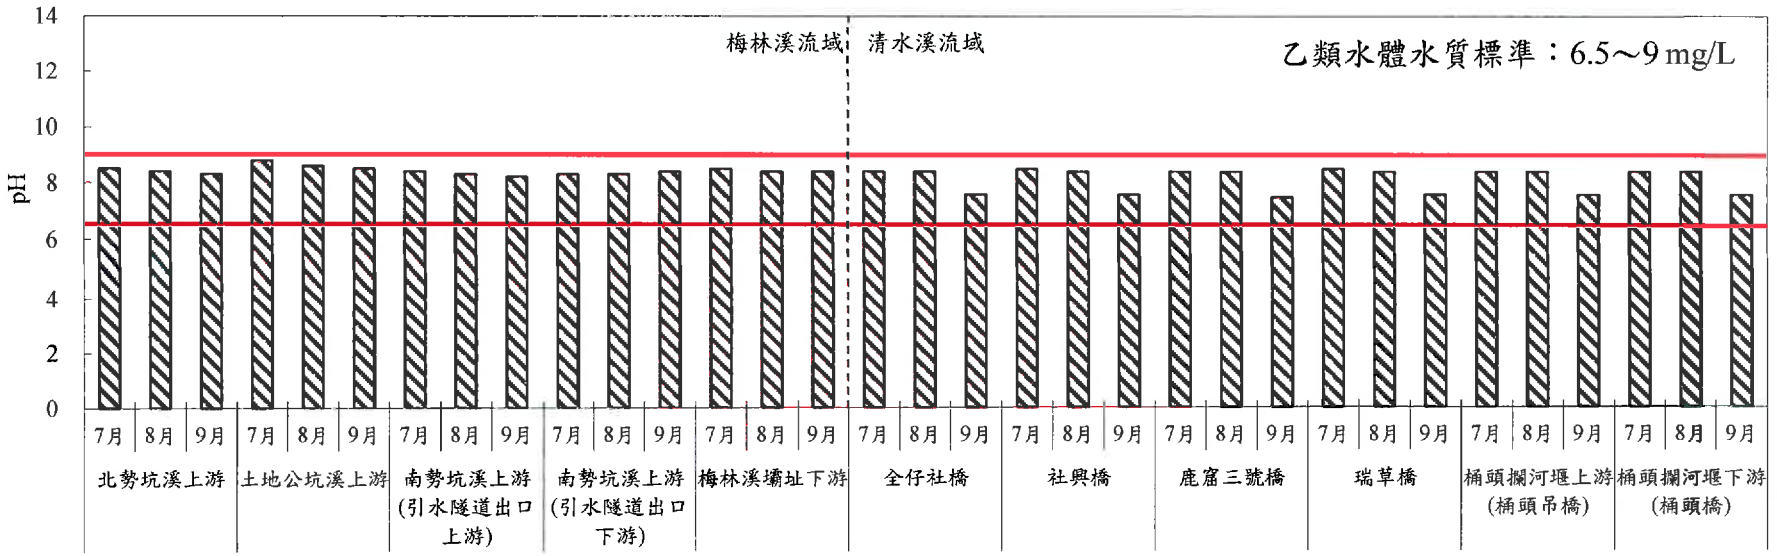

圖 2.3-2 本季河川水質 pH 監測結果比較圖

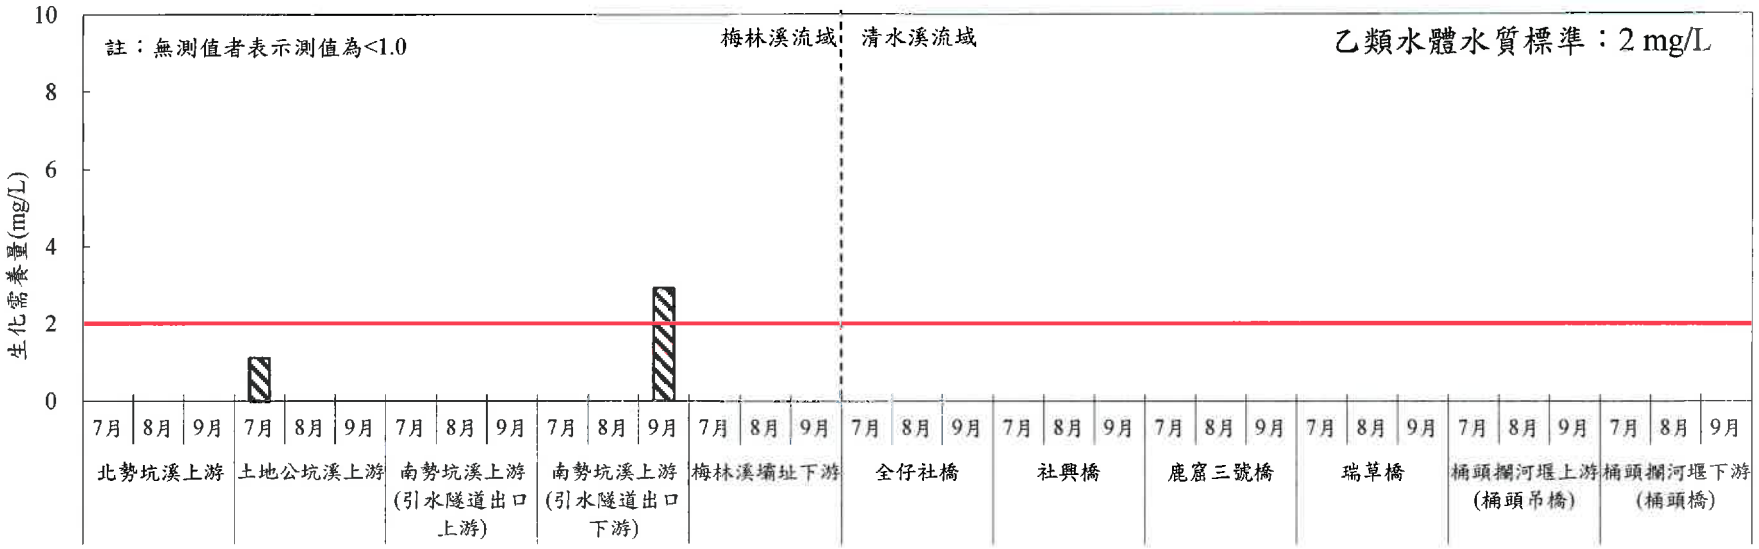

圖 2.3-3 本季河川水質生化需氧量監測結果比較圖

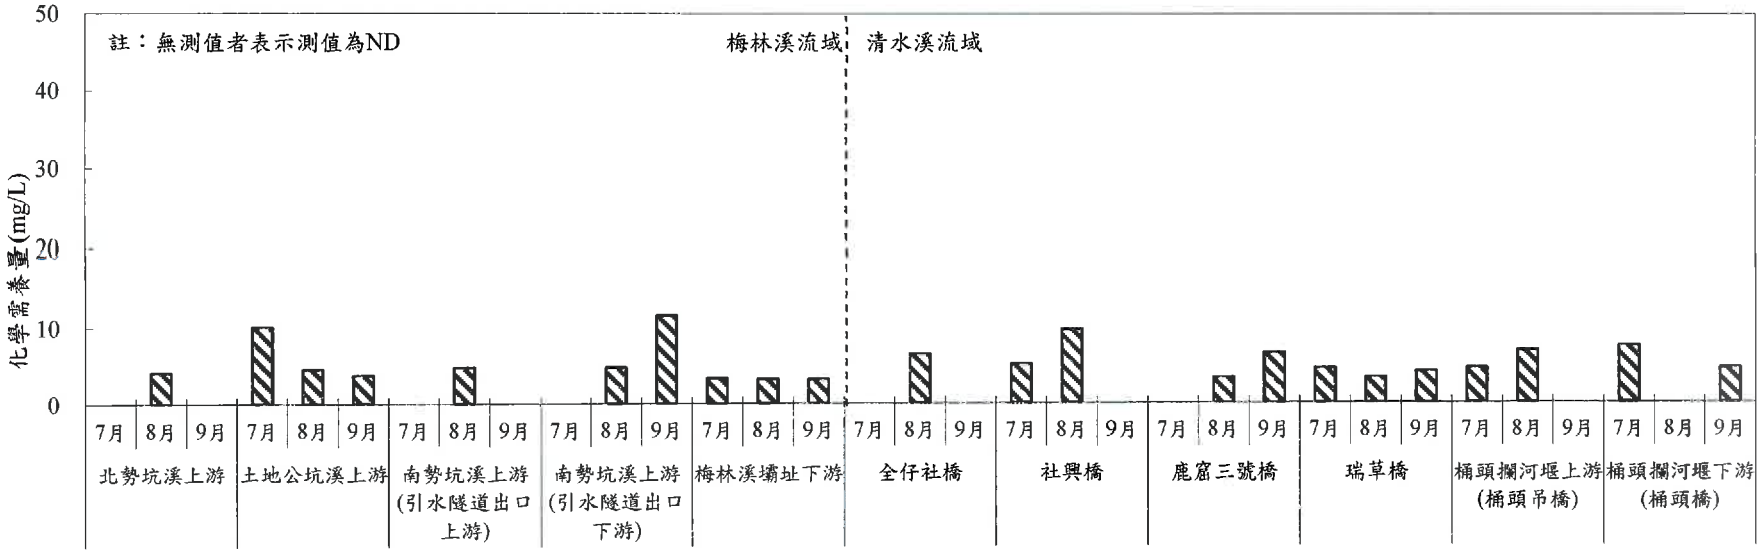

圖 2.3-4 本季河川水質化學需氧量監測結果比較圖

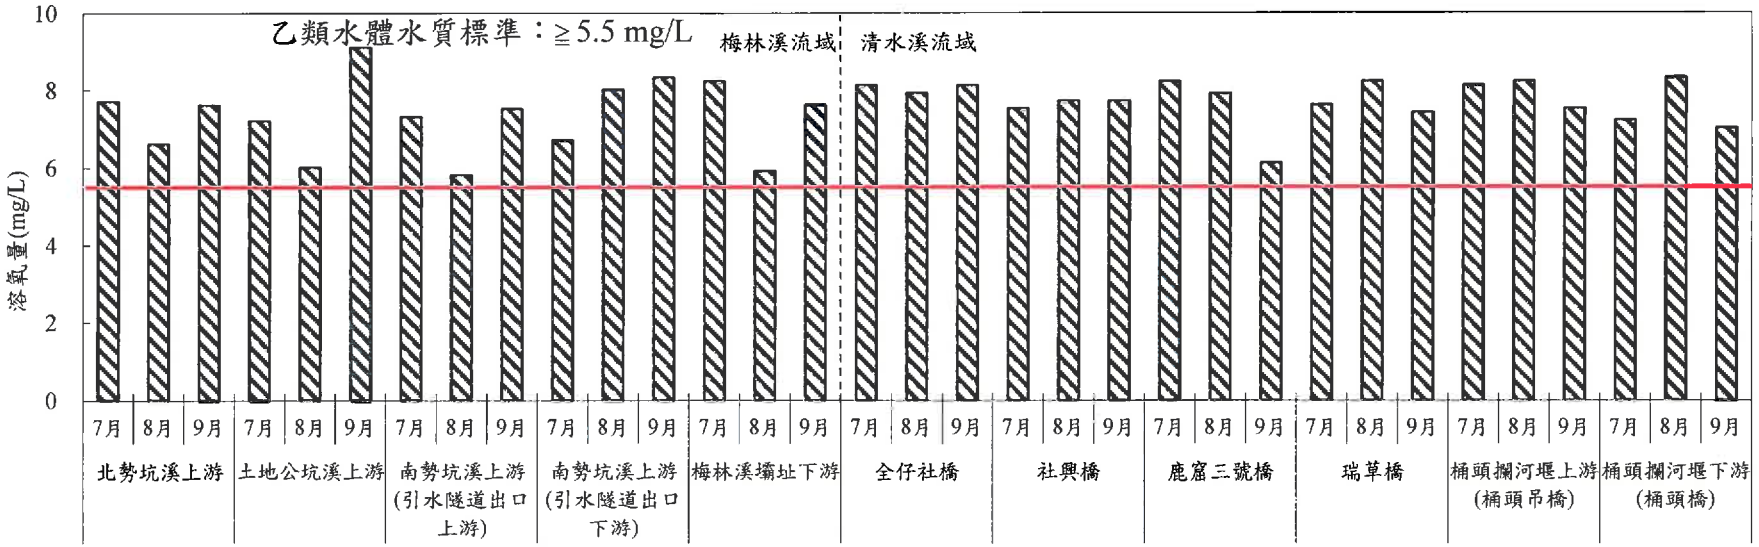

圖 2.3-5 本季河川水質溶氧量監測結果比較圖

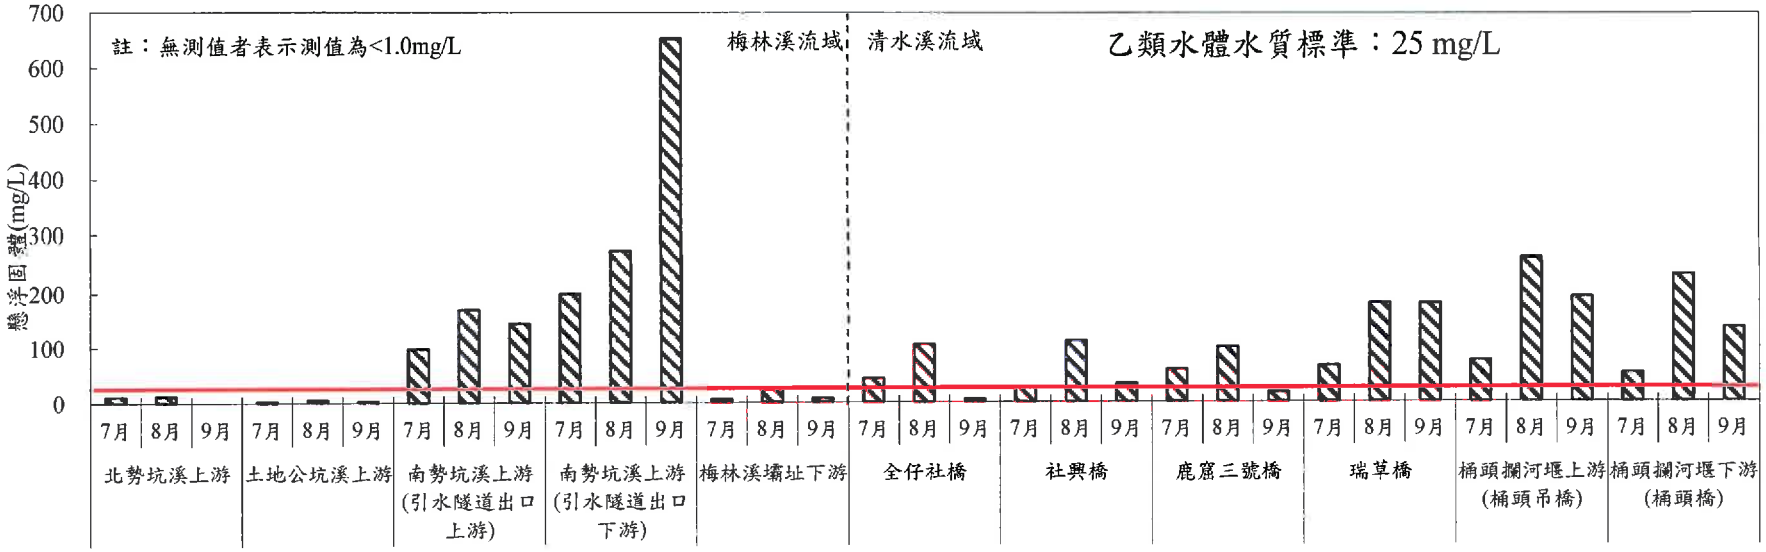

圖 2.3-6 本季河川水質懸浮固體監測結果比較圖

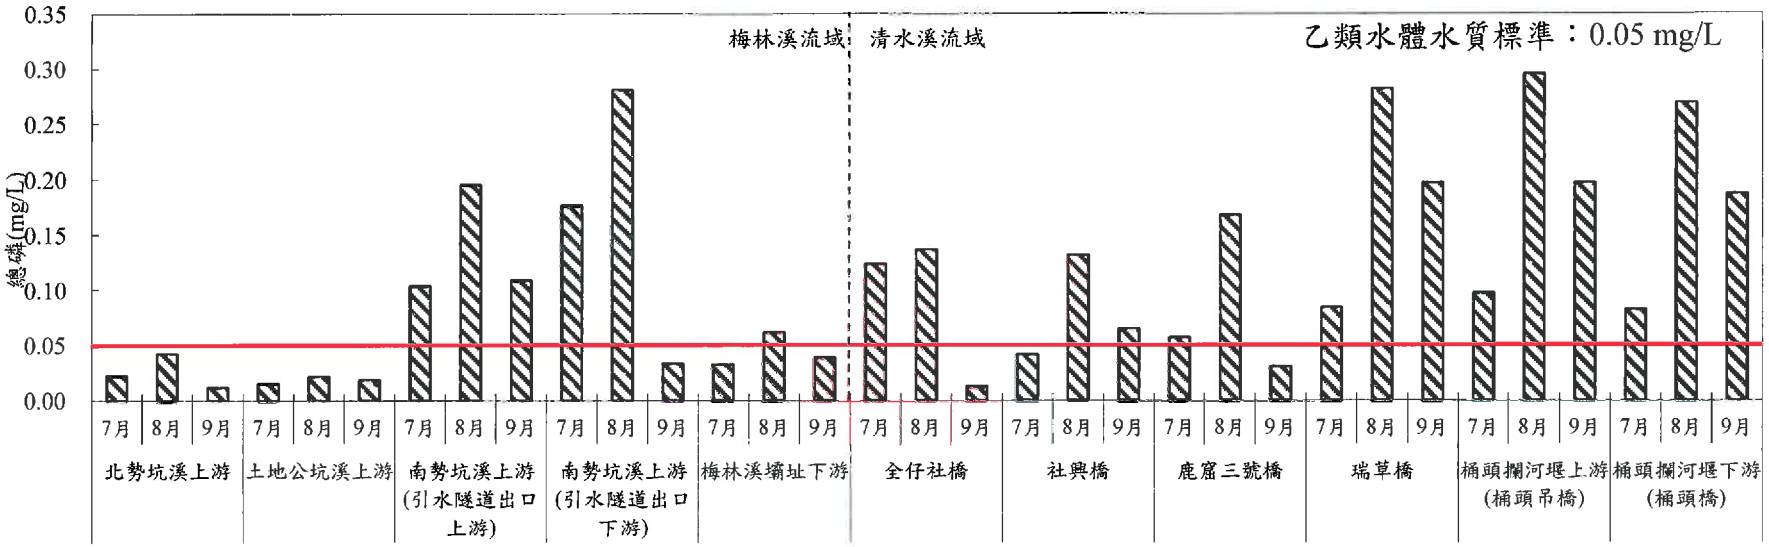

圖 2.3-7 本季河川水質總磷監測結果比較圖

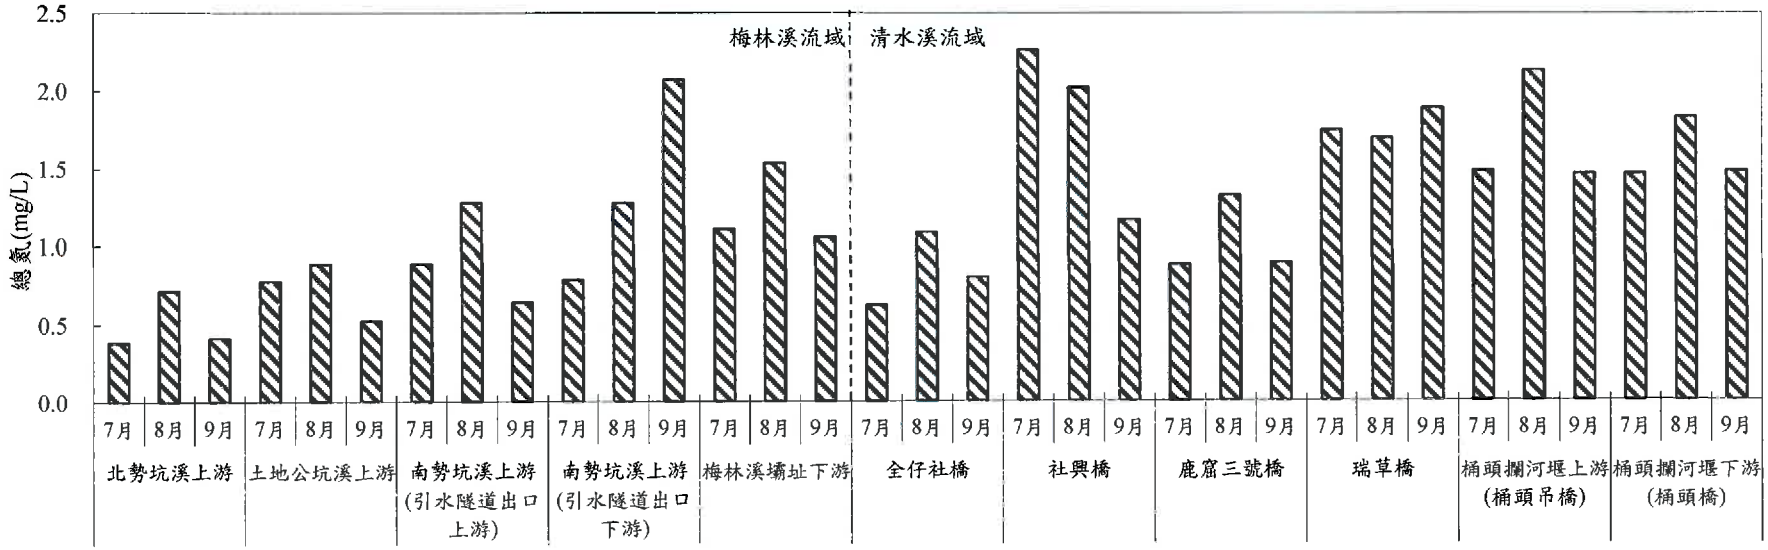

圖 2.3-8 本季河川水質總氮監測結果比較圖

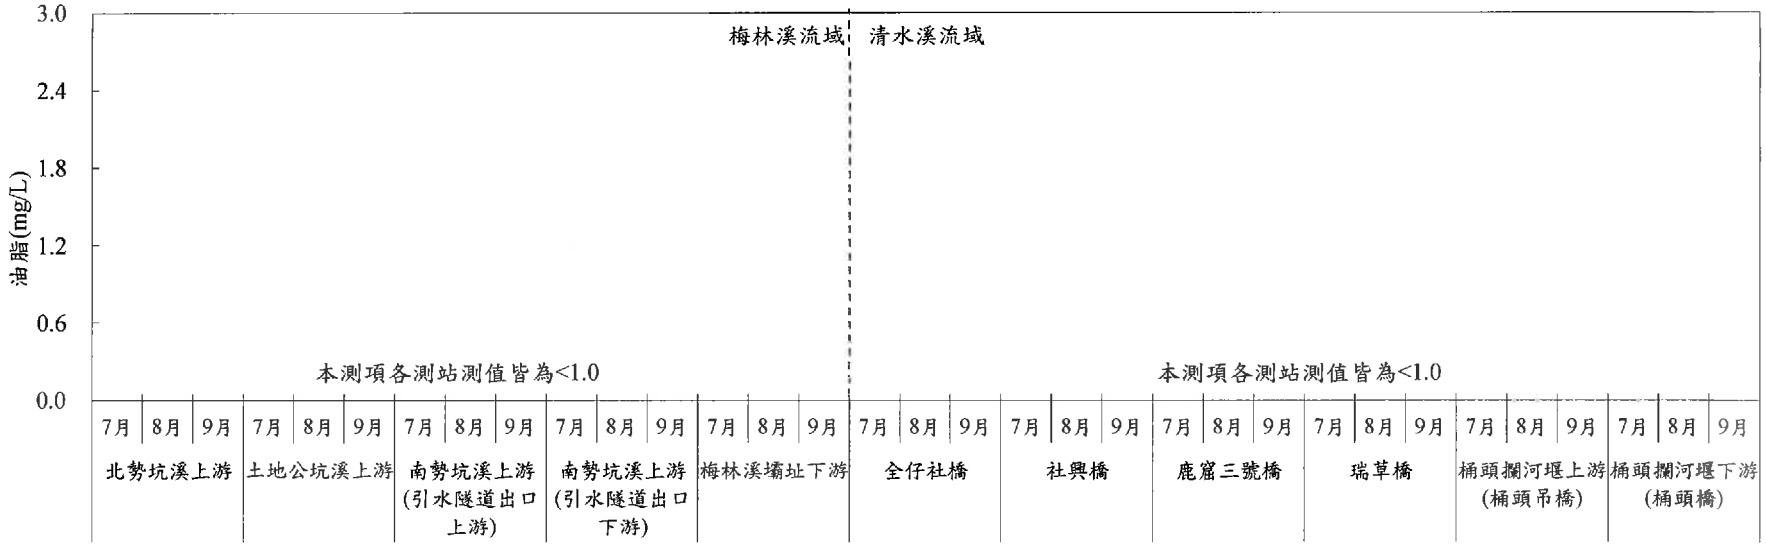

圖 2.3-9 本季河川水質油脂監測結果比較圖

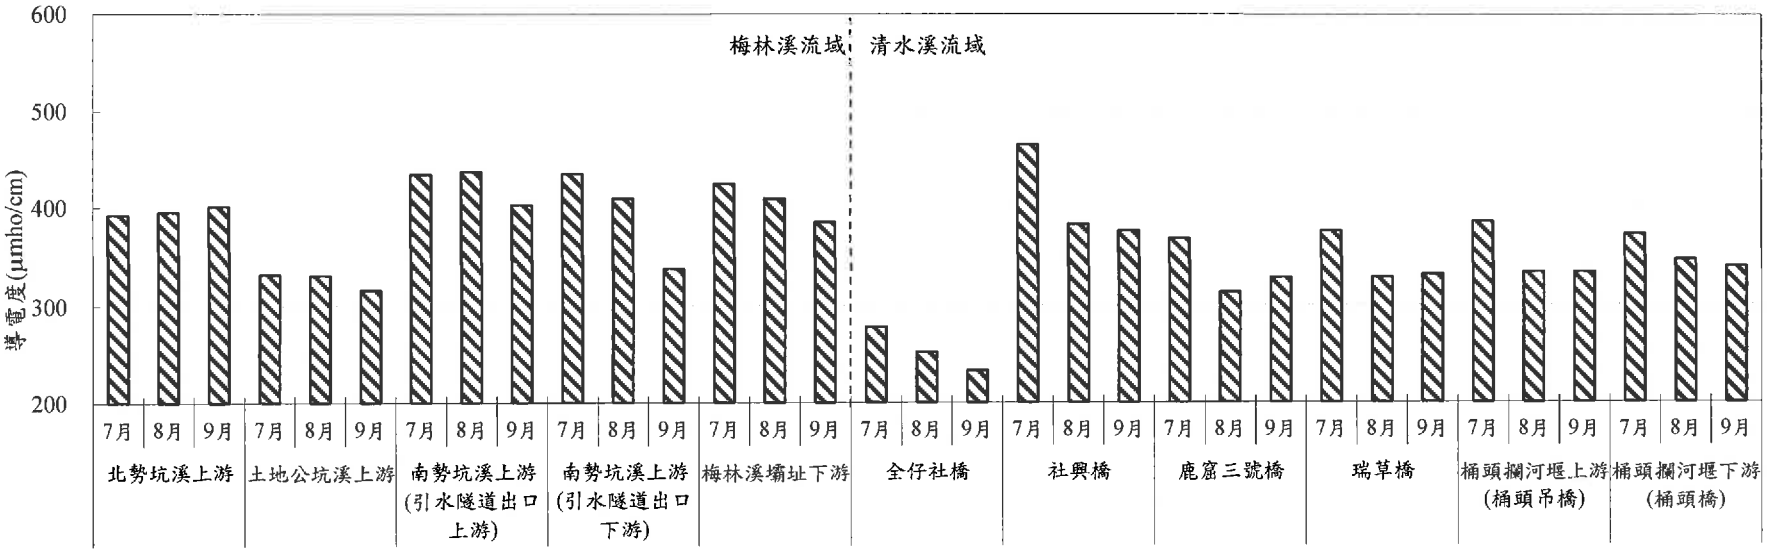

圖 2.3-10 本季河川水質導電度監測結果比較圖

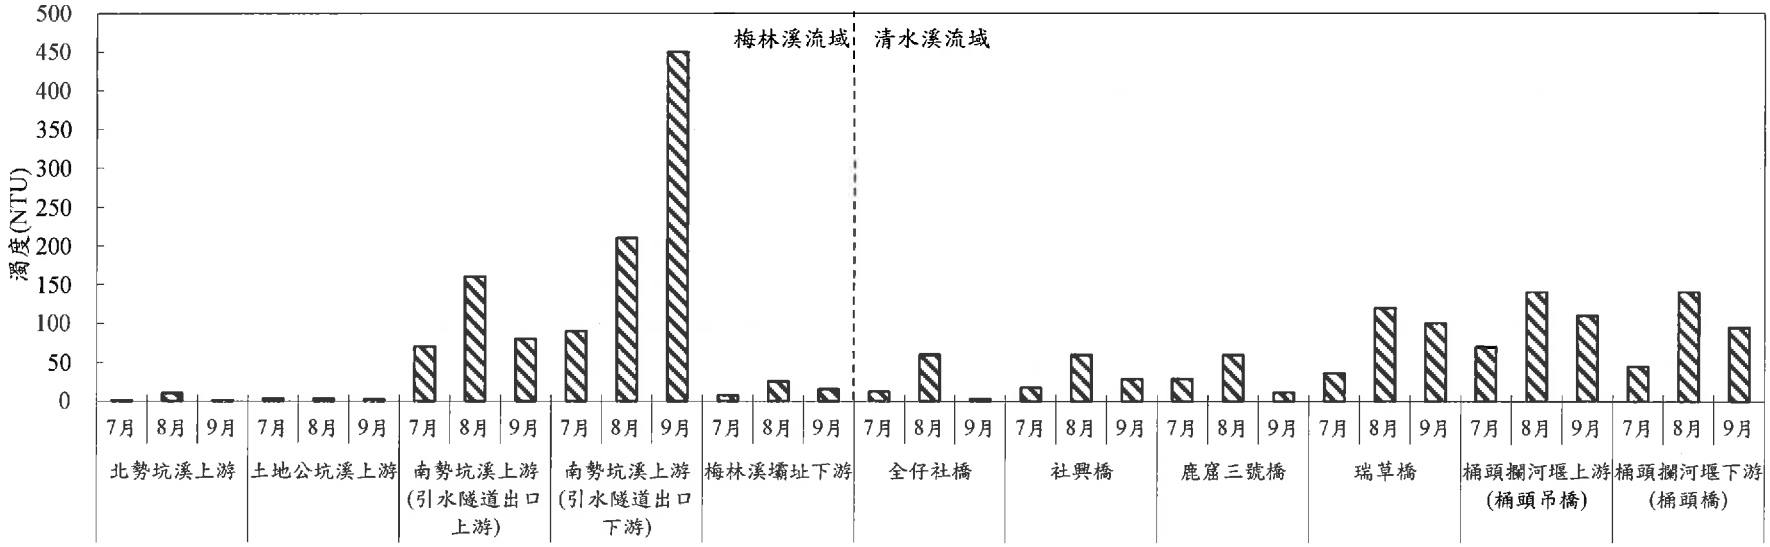

圖 2.3-11 本季河川水質濁度監測結果比較圖

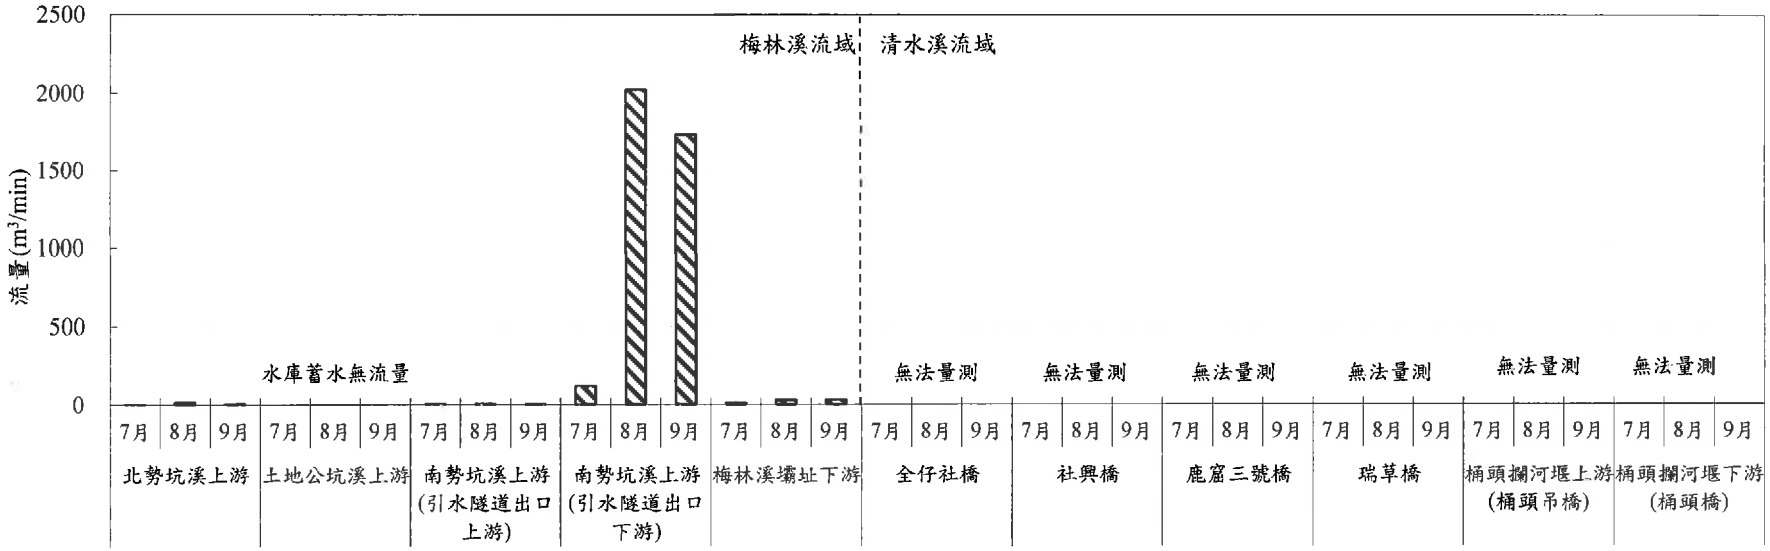

圖 2.3-12 本季河川水質流量監測結果比較圖

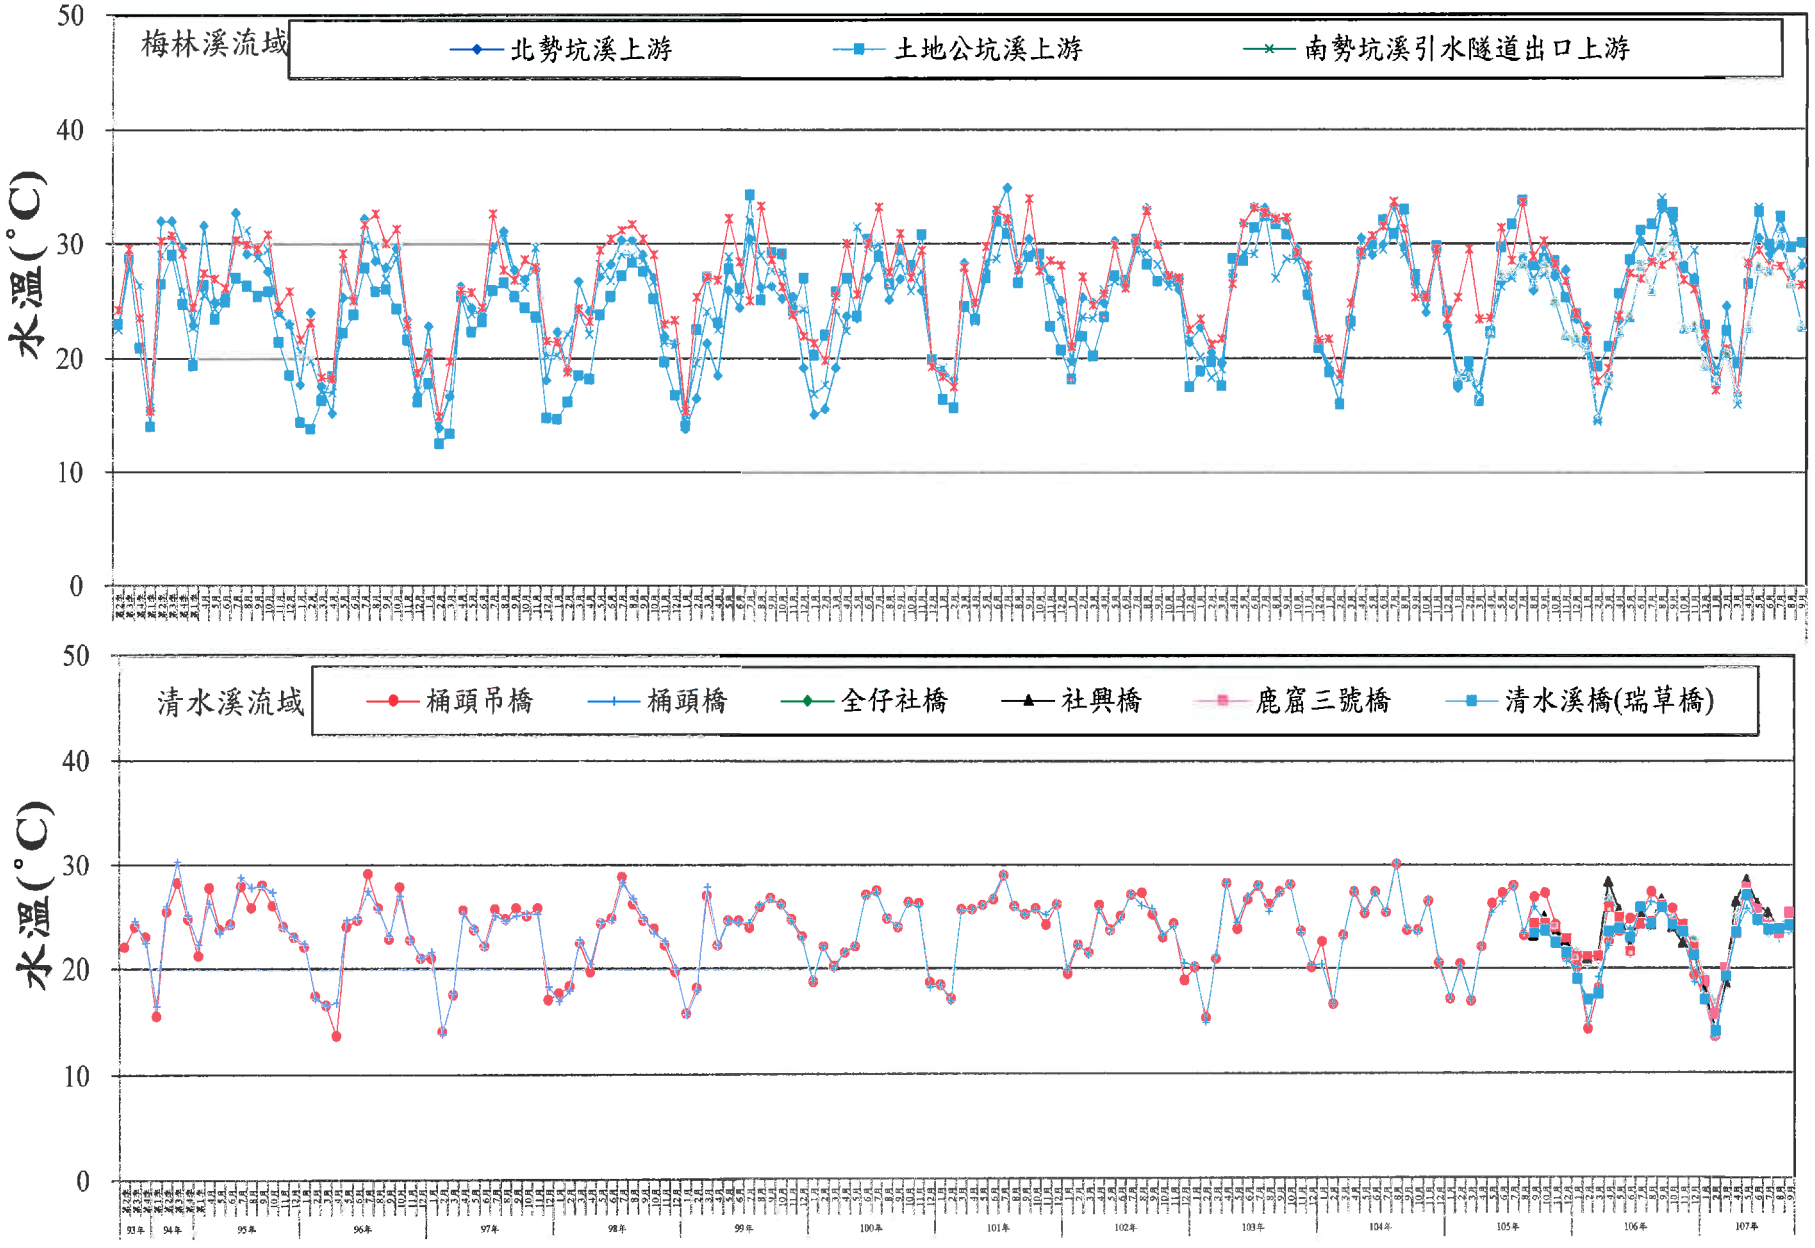

圖 2.3-13 歷年河川水質水溫監測成果

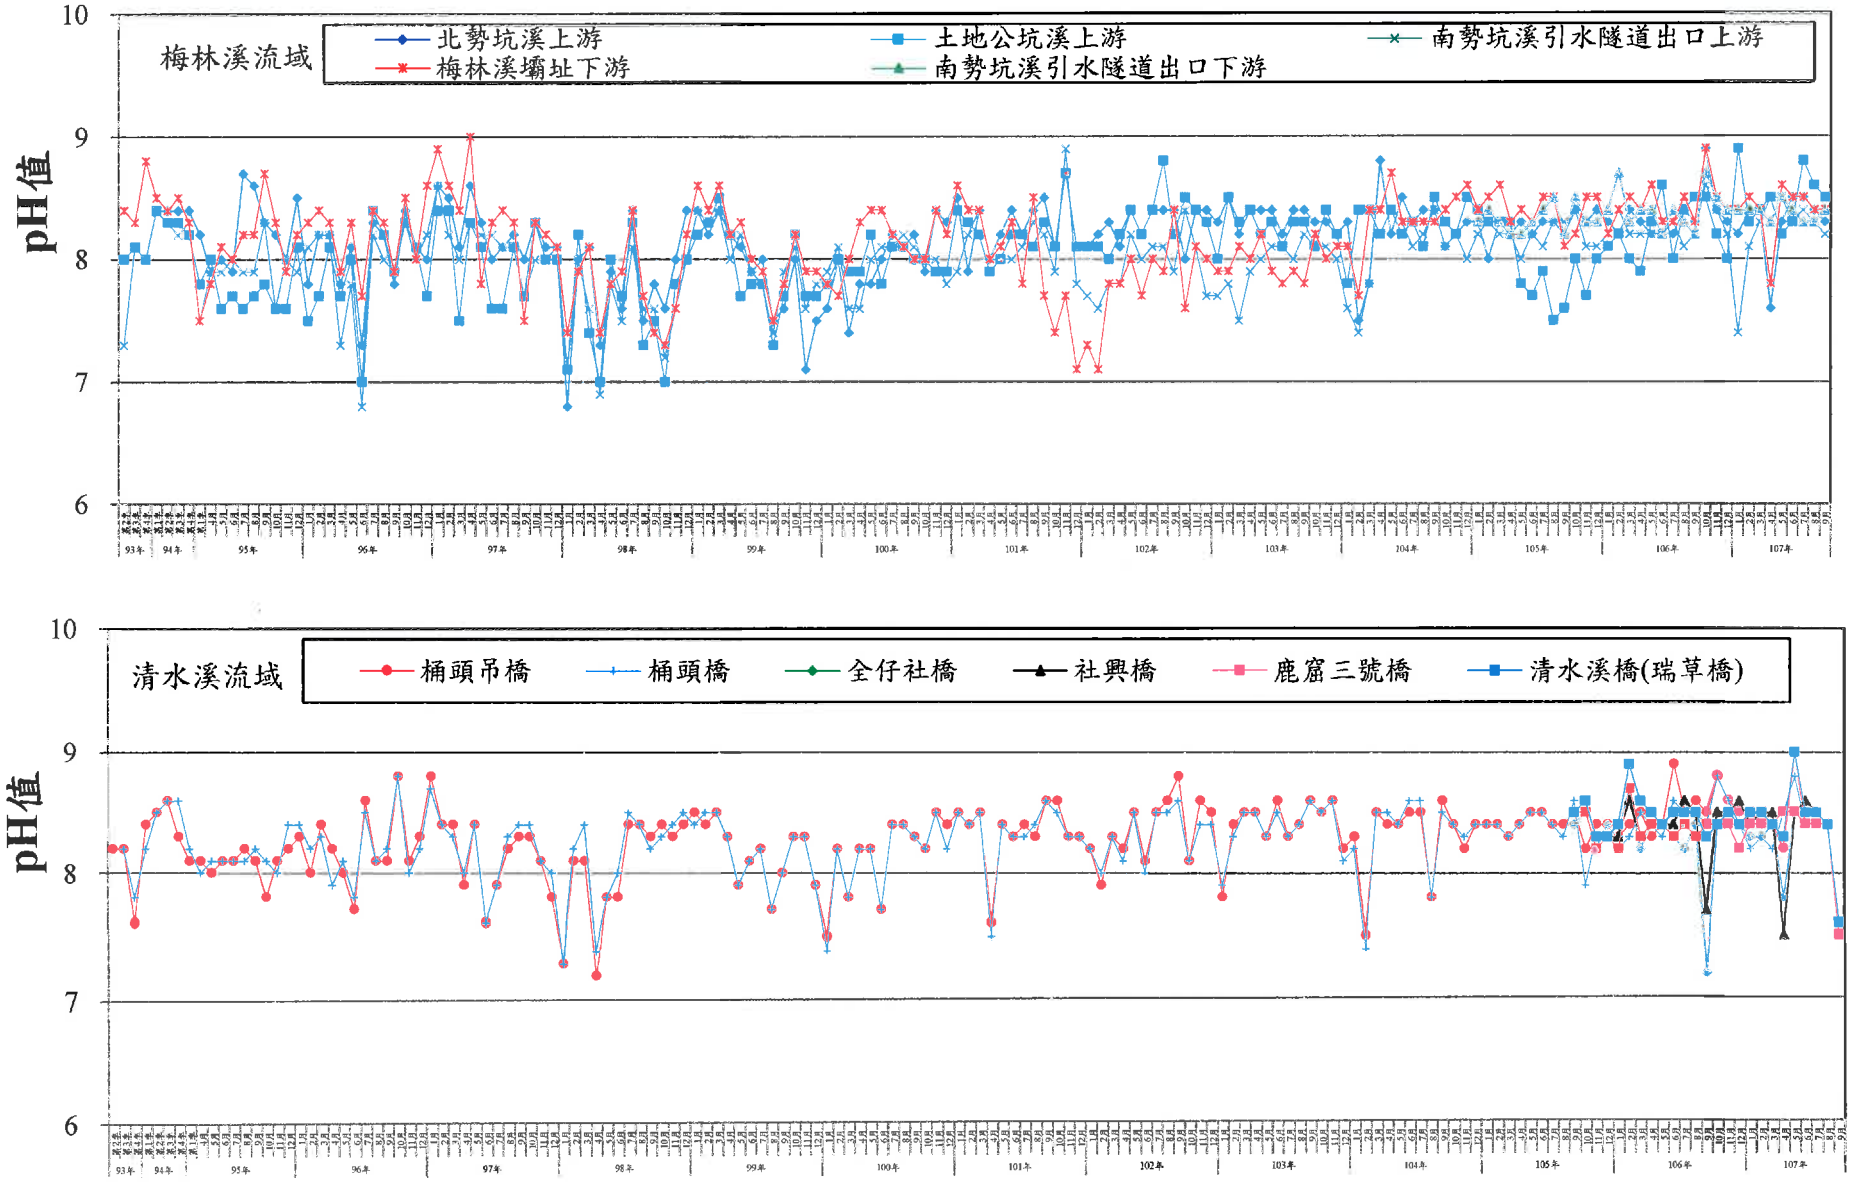

圖 2.3-14 歷年河川水質 pH 值監測成果

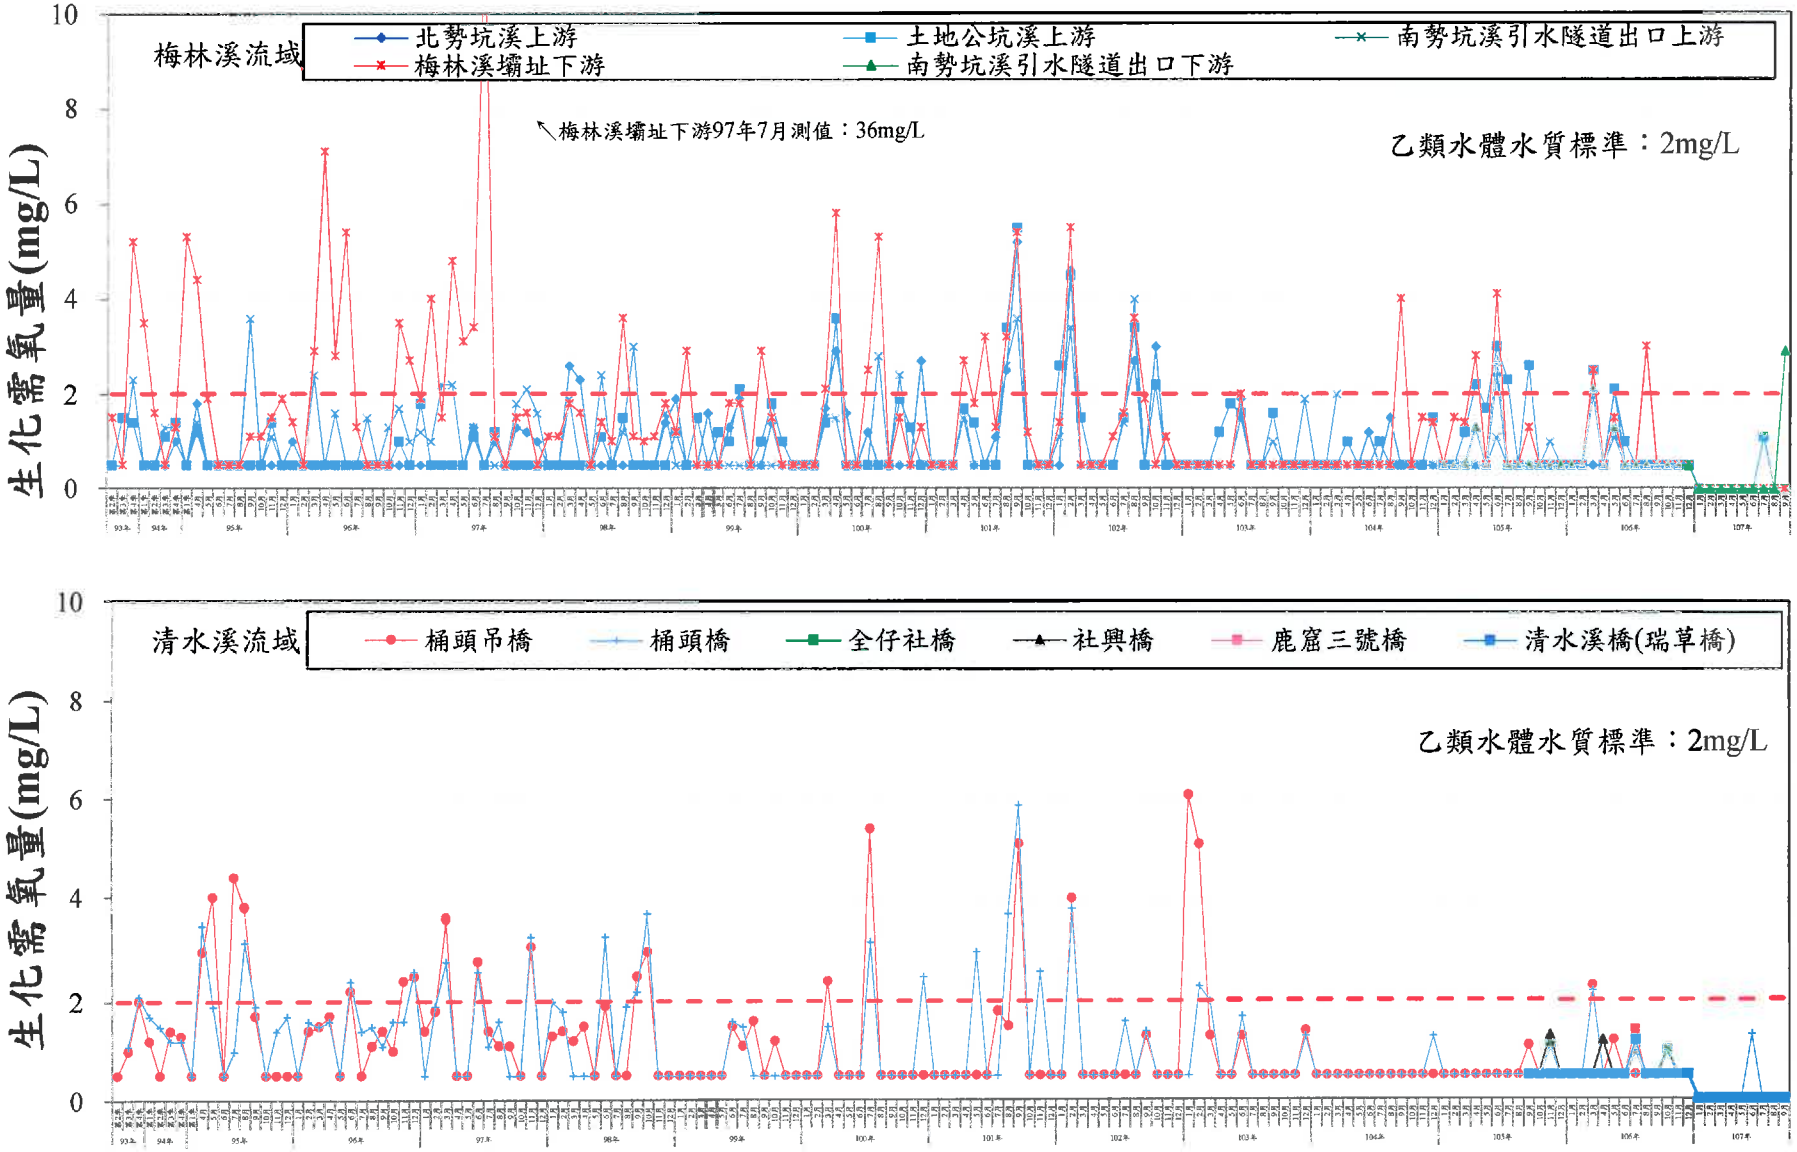

圖 2.3-15 歷年河川水質生化需氧量監測成果

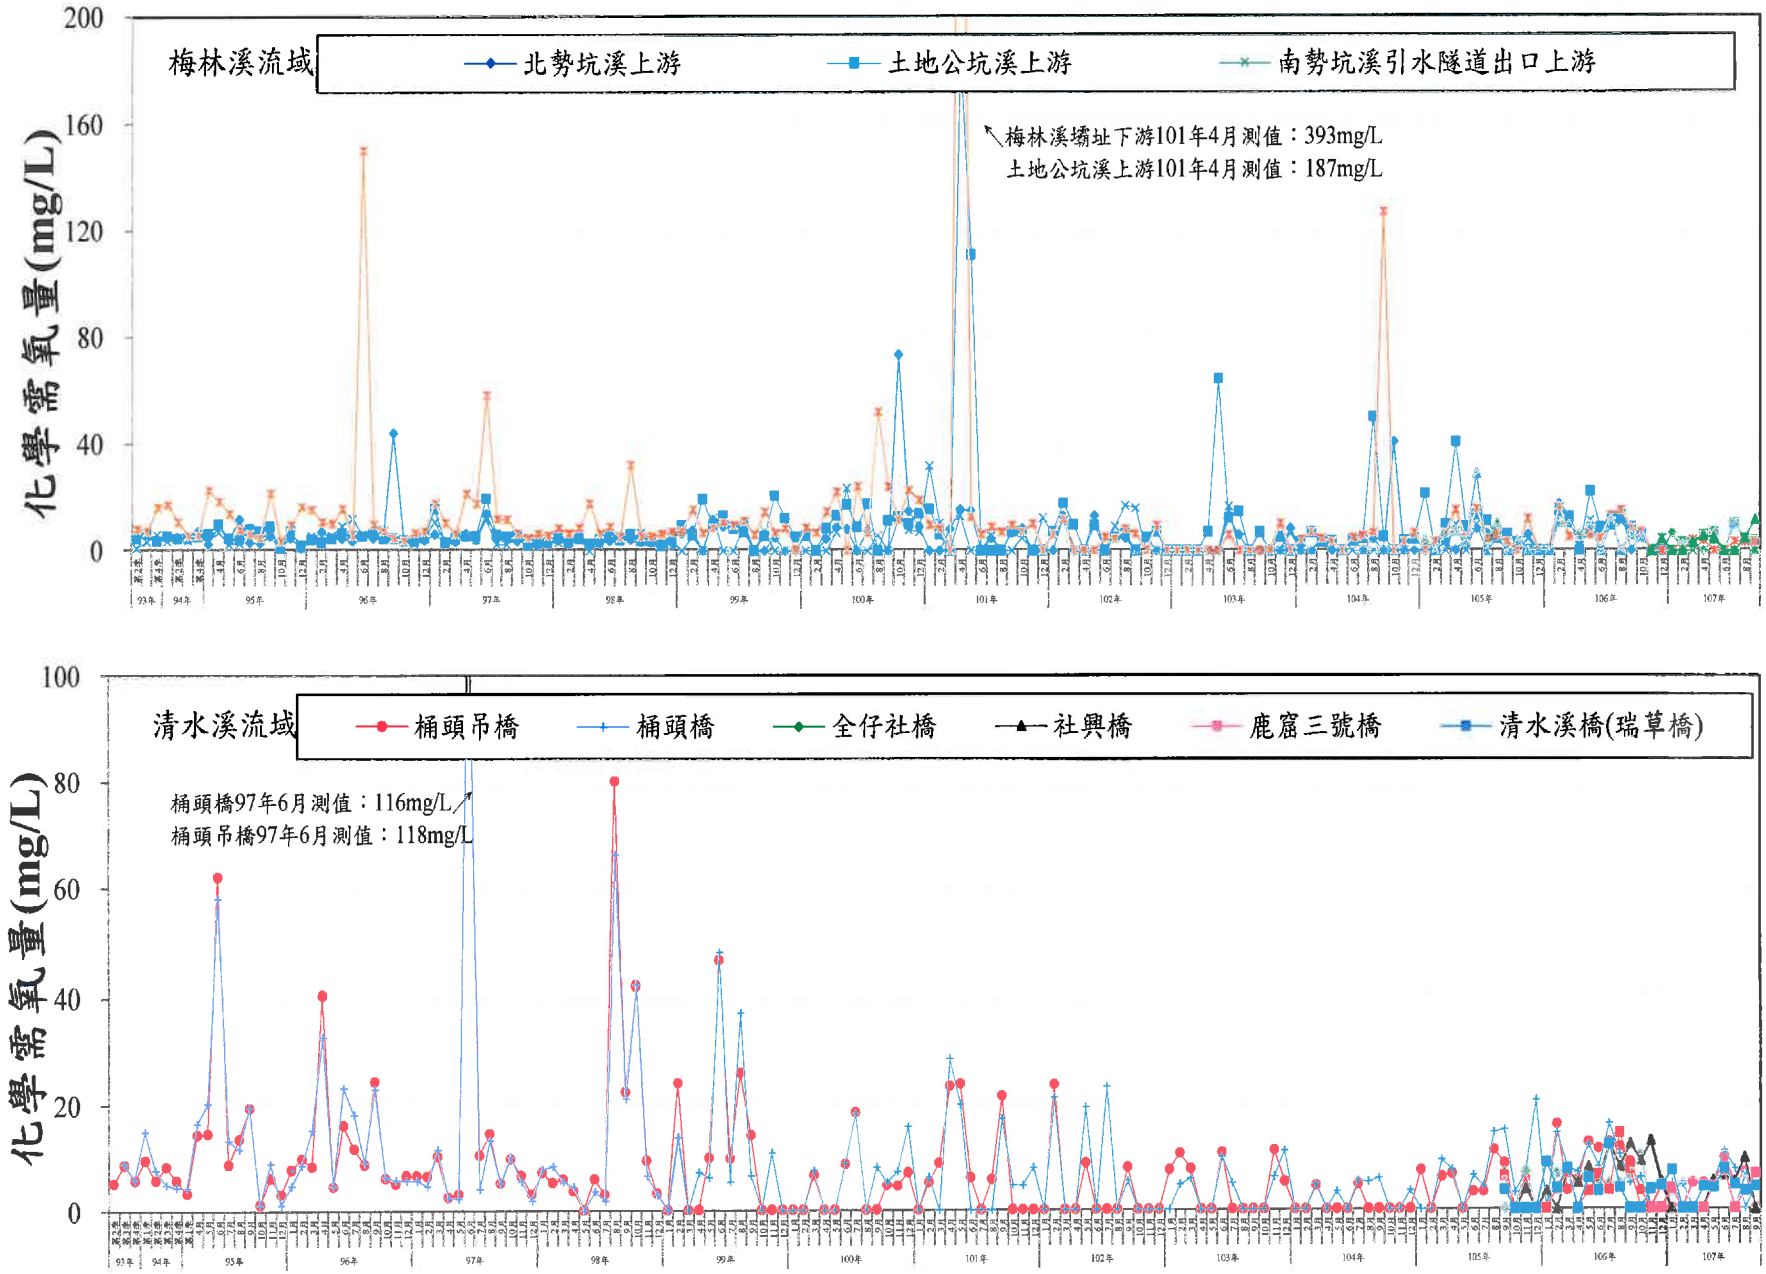

圖 2.3-16 歷年河川水質化學需氧量監測成果

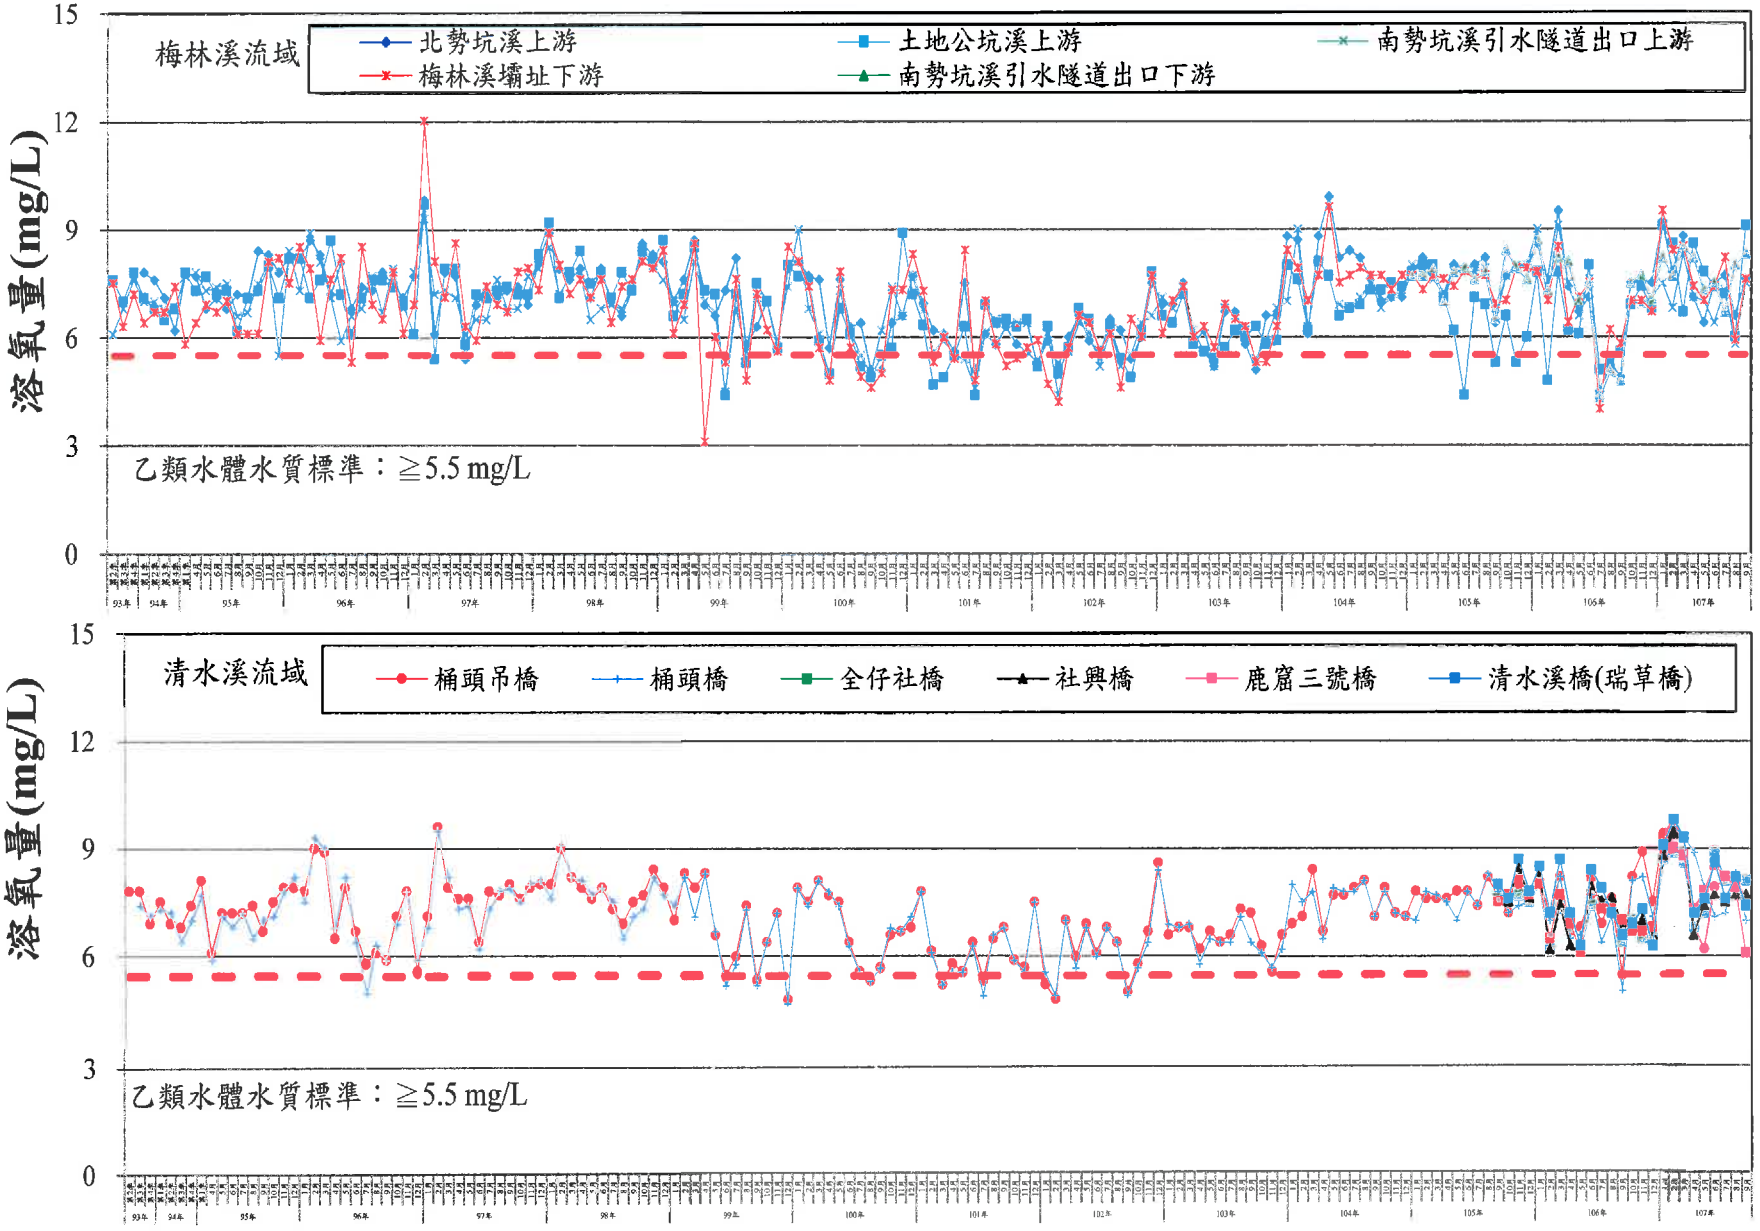

圖 2.3-17 歷年河川水質溶氧量監測成果

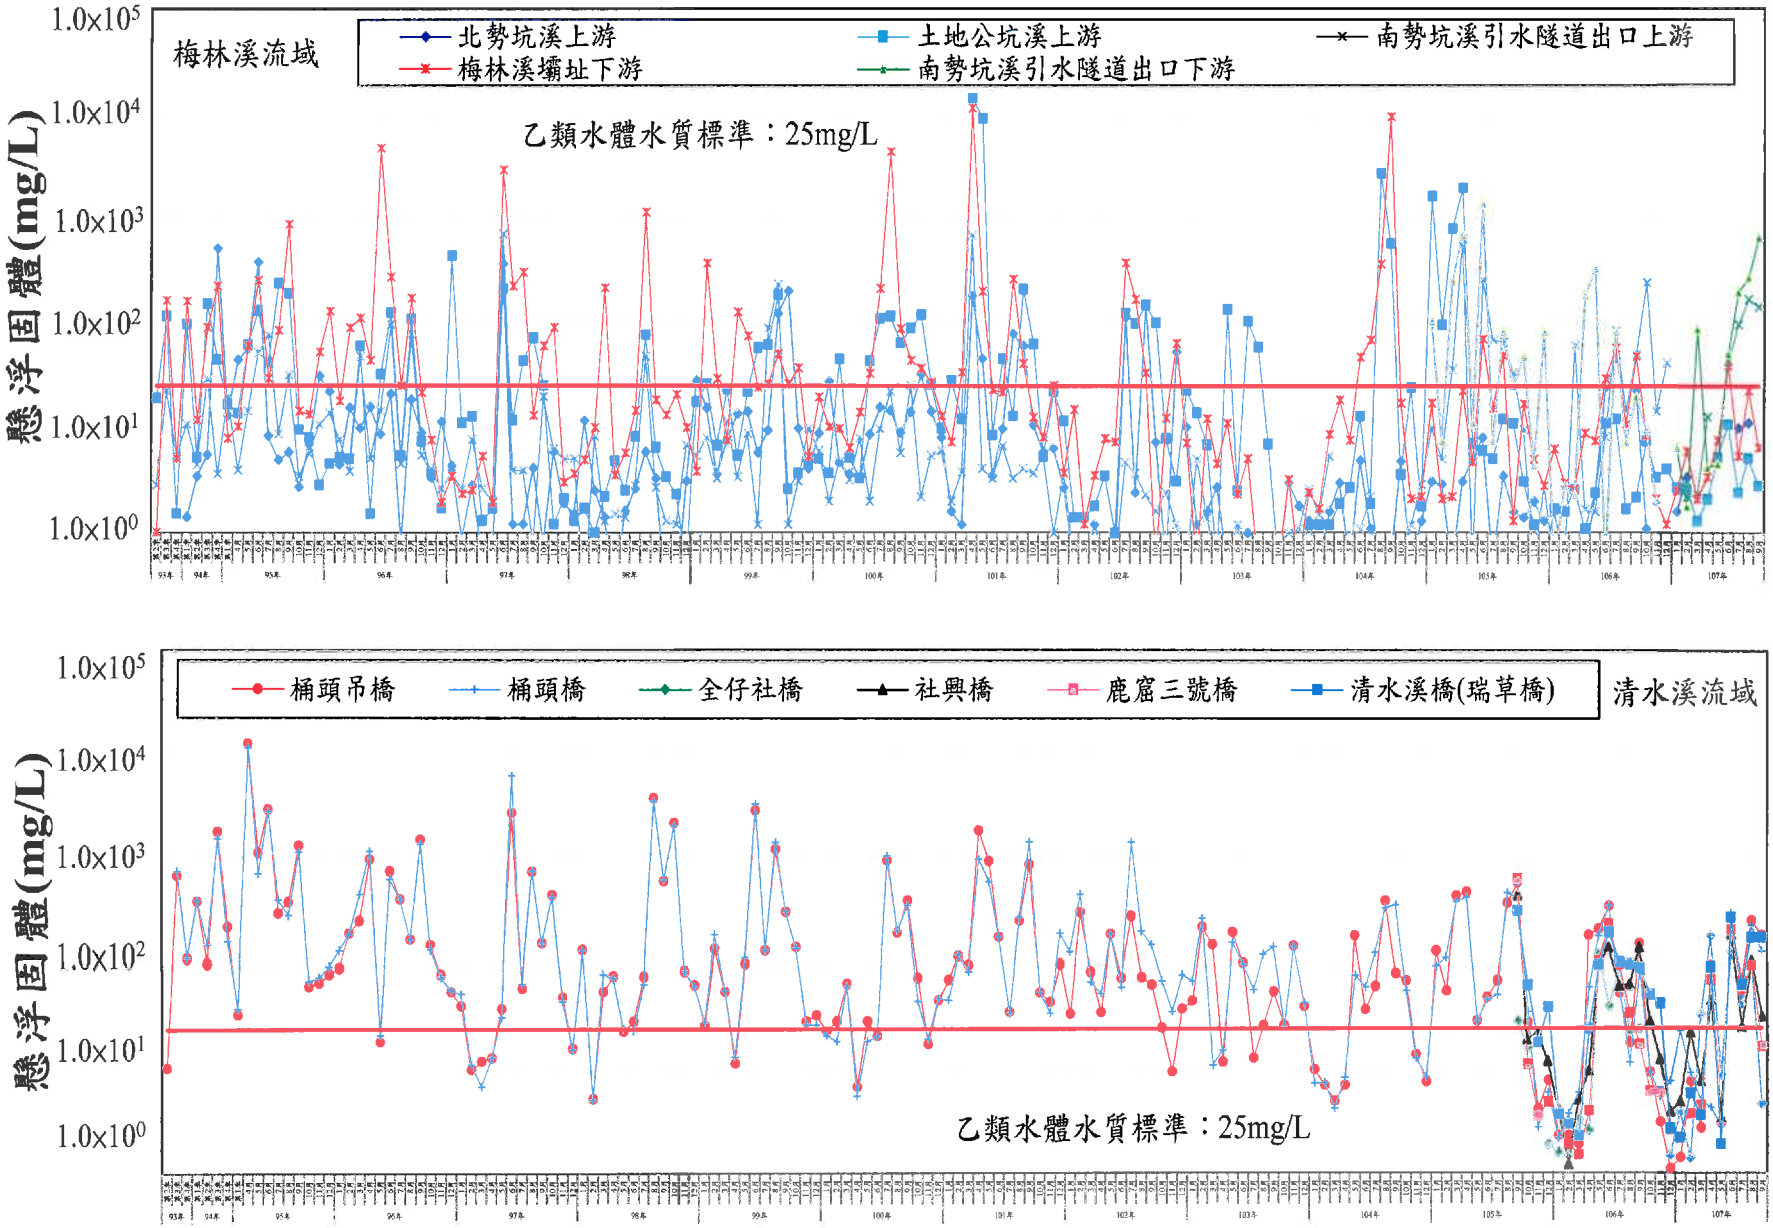

圖 2.3-18 歷年河川水質懸浮固體監測成果

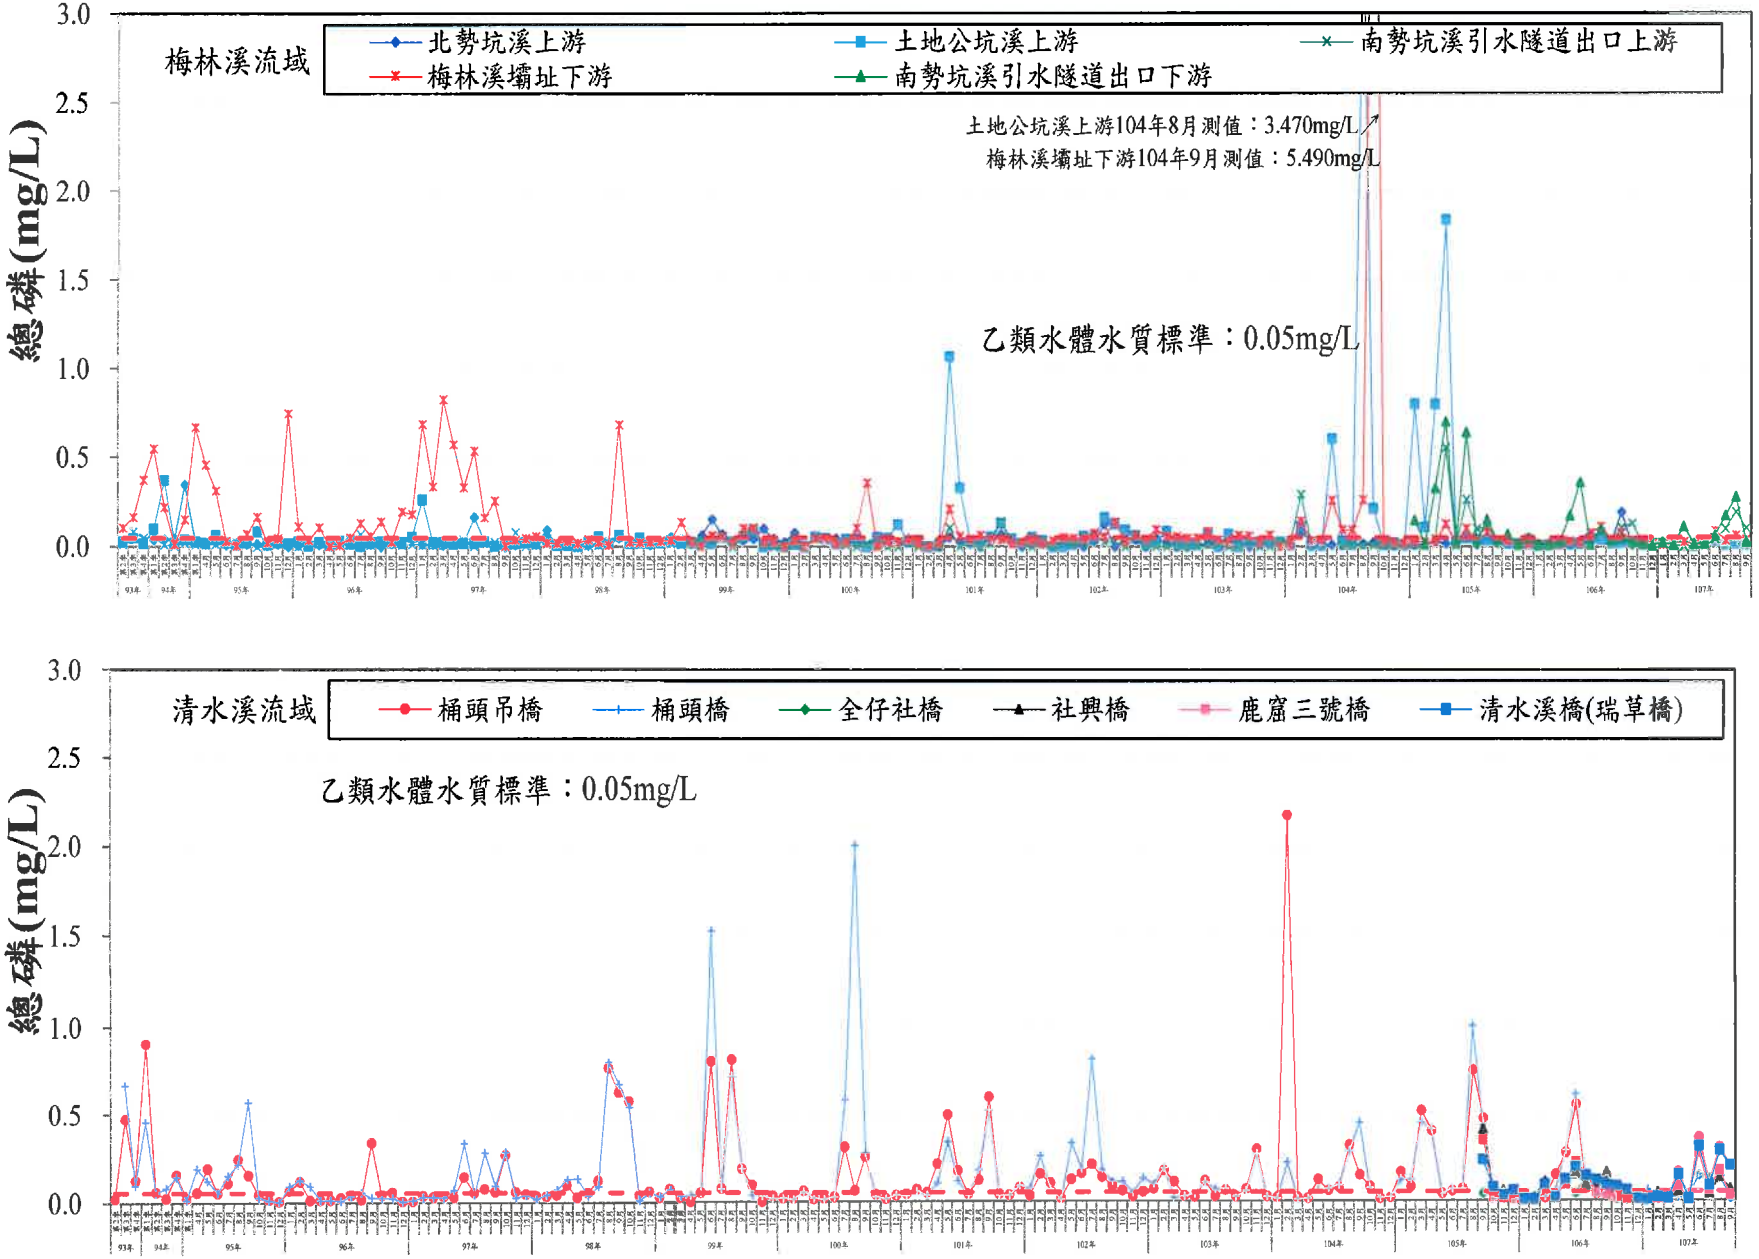

圖 2.3-19 歷年河川水質總磷監測成果

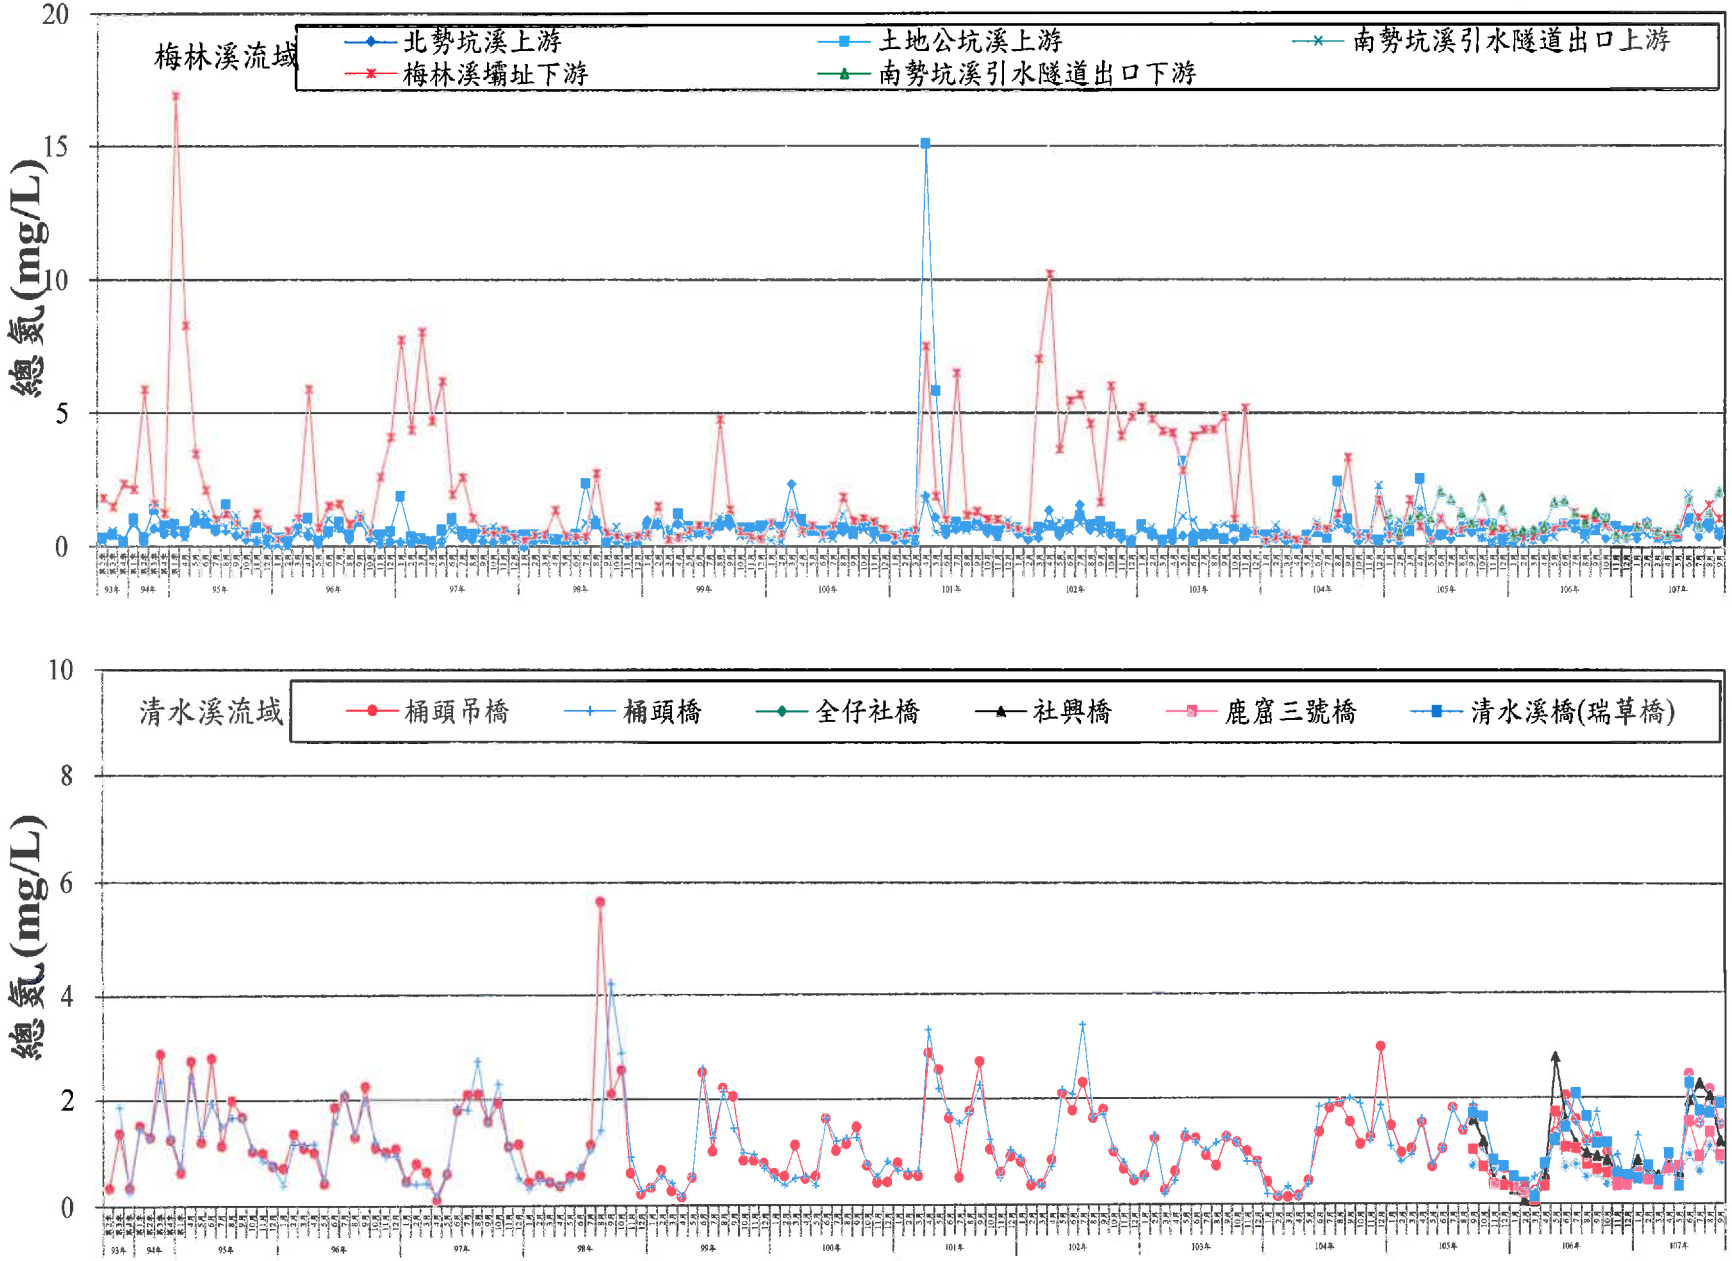

圖 2.3-20 歷年河川水質總氮監測成果

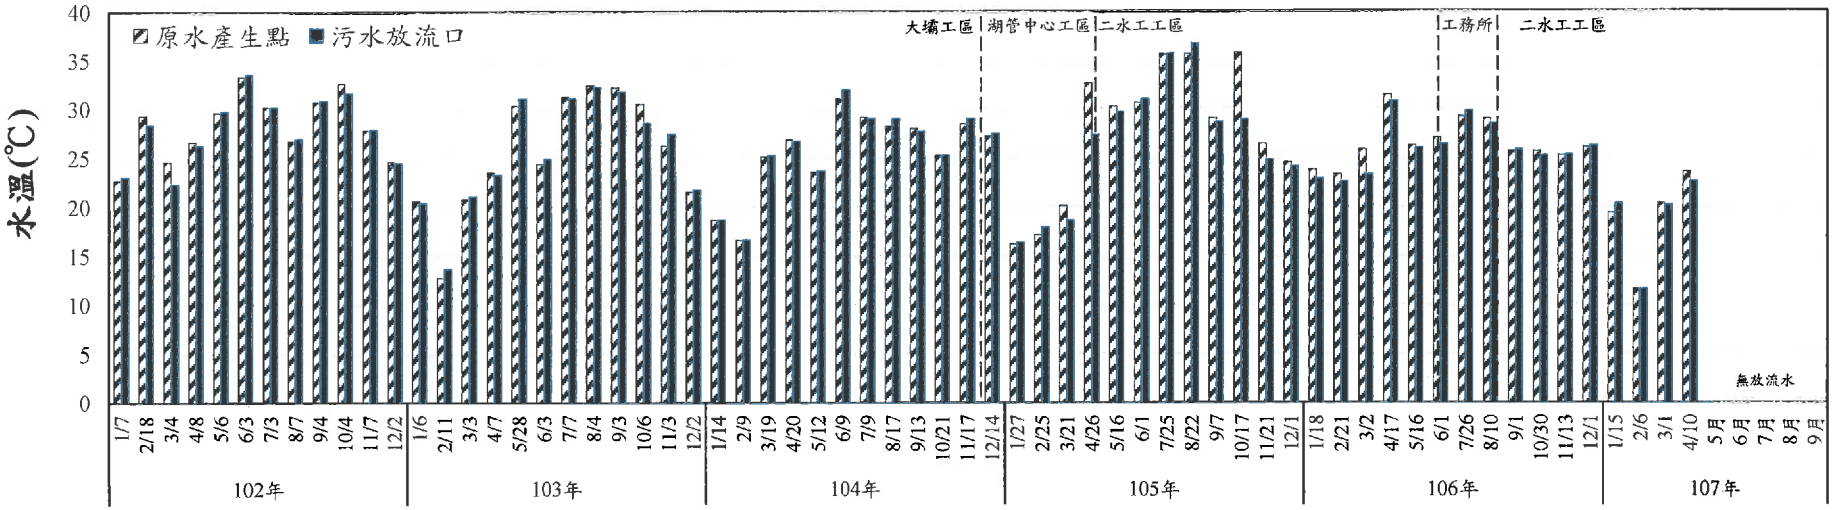

圖 2.3-21 歷次工地水質水溫監測結果比較圖

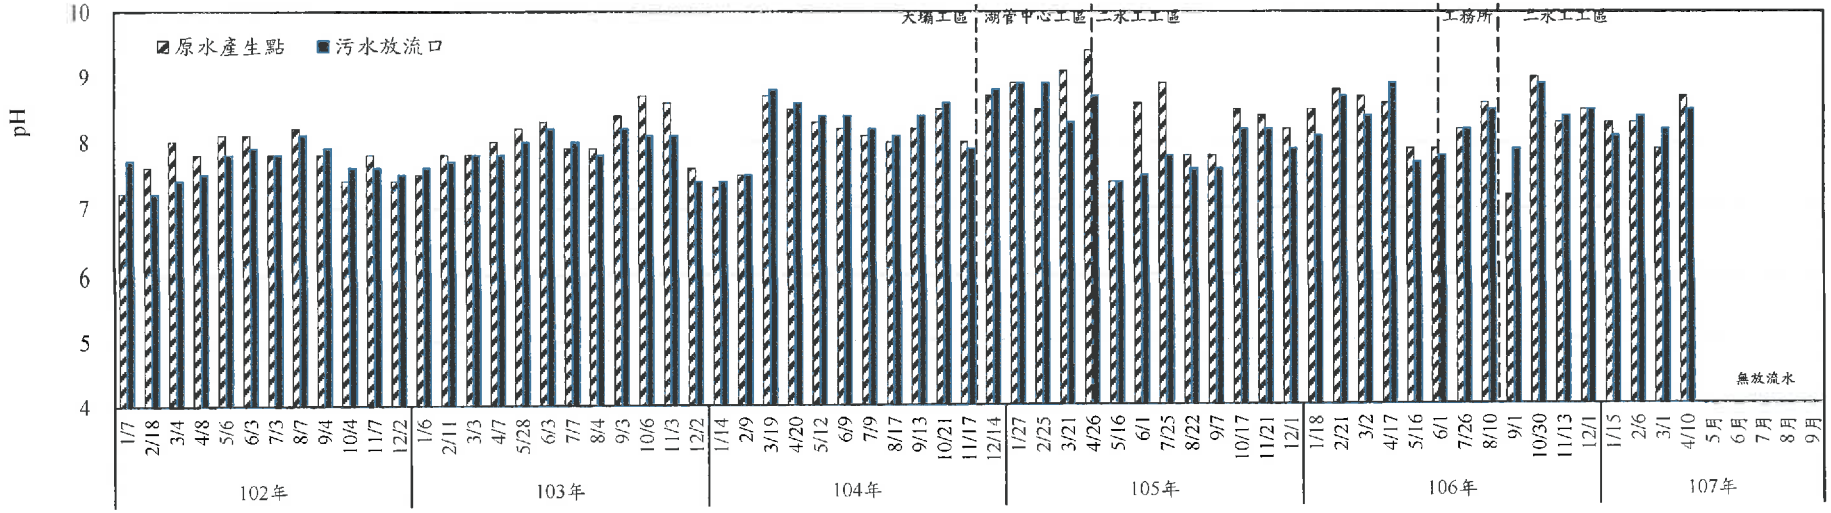

圖 2.3-22 歷次工地水質 pH 值監測結果比較圖

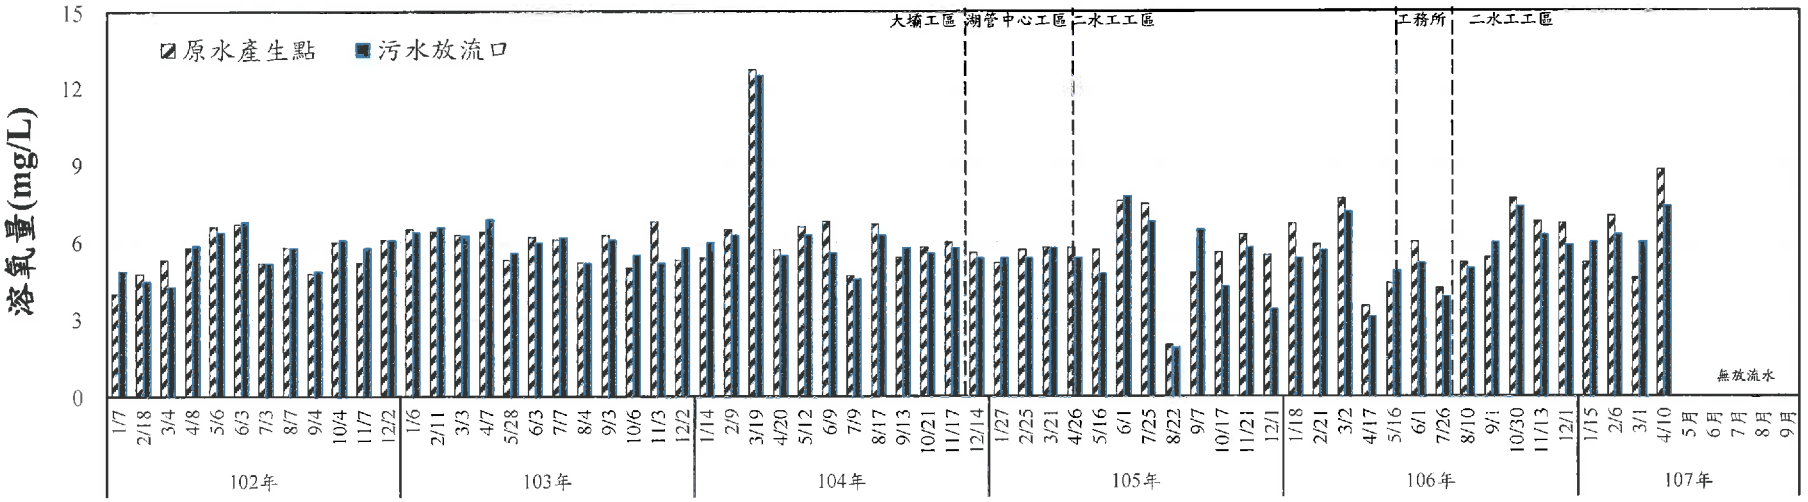

圖 2.3-23 歷次工地水質溶氧量監測結果比較圖

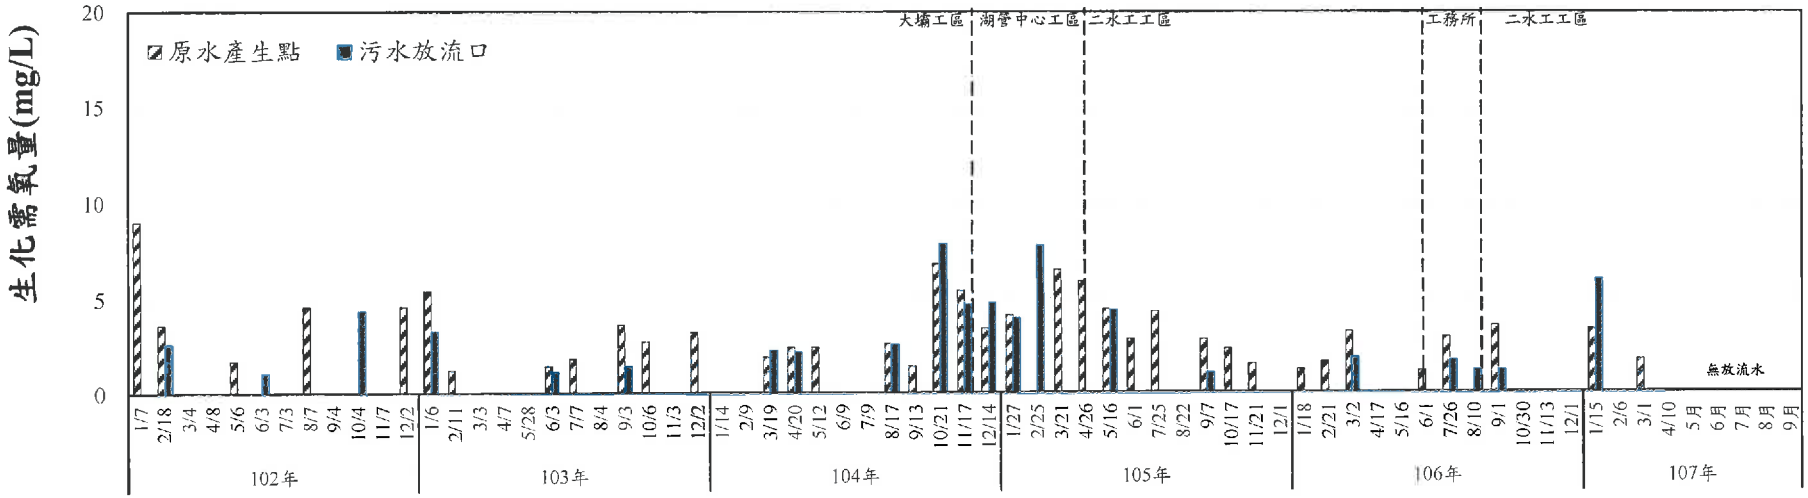

圖 2.3-24 歷次工地水質生化需氧量監測結果比較圖

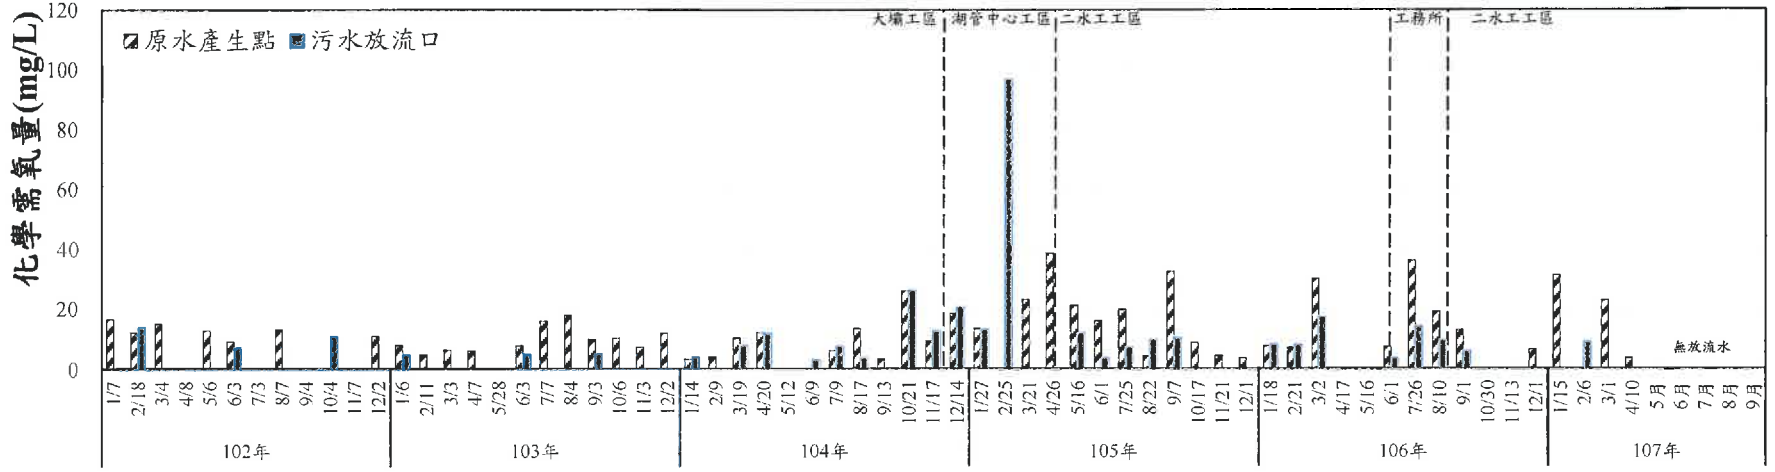

圖 2.3-25 歷次工地水質化需氧量監測結果比較圖

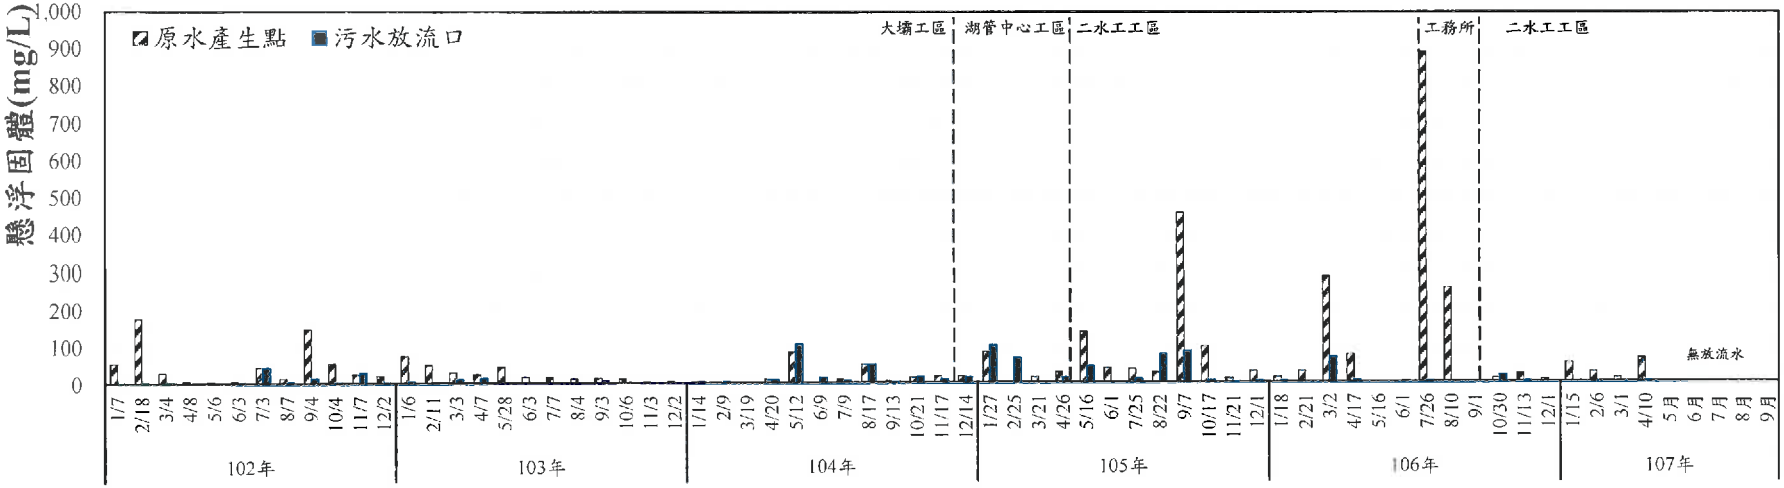

圖 2.3-26 歷次工地水質懸浮固體監測結果比較圖

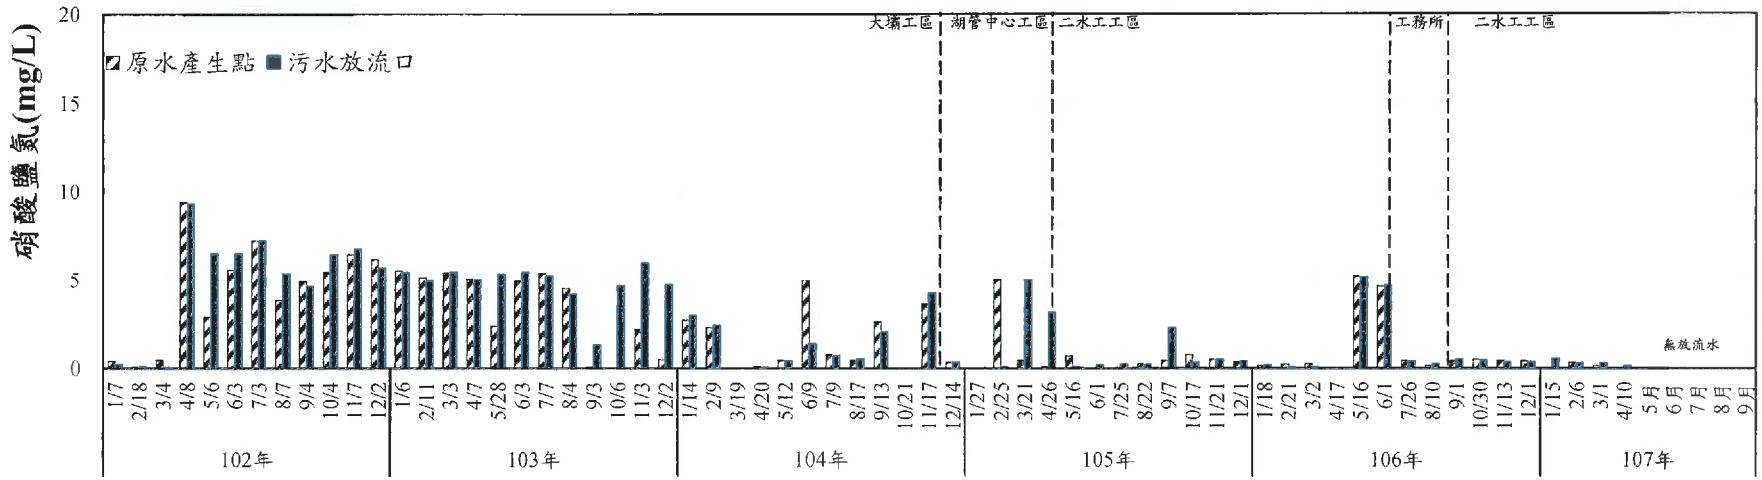

圖 2.3-27 歷次工地水質硝酸鹽氮監測結果比較圖

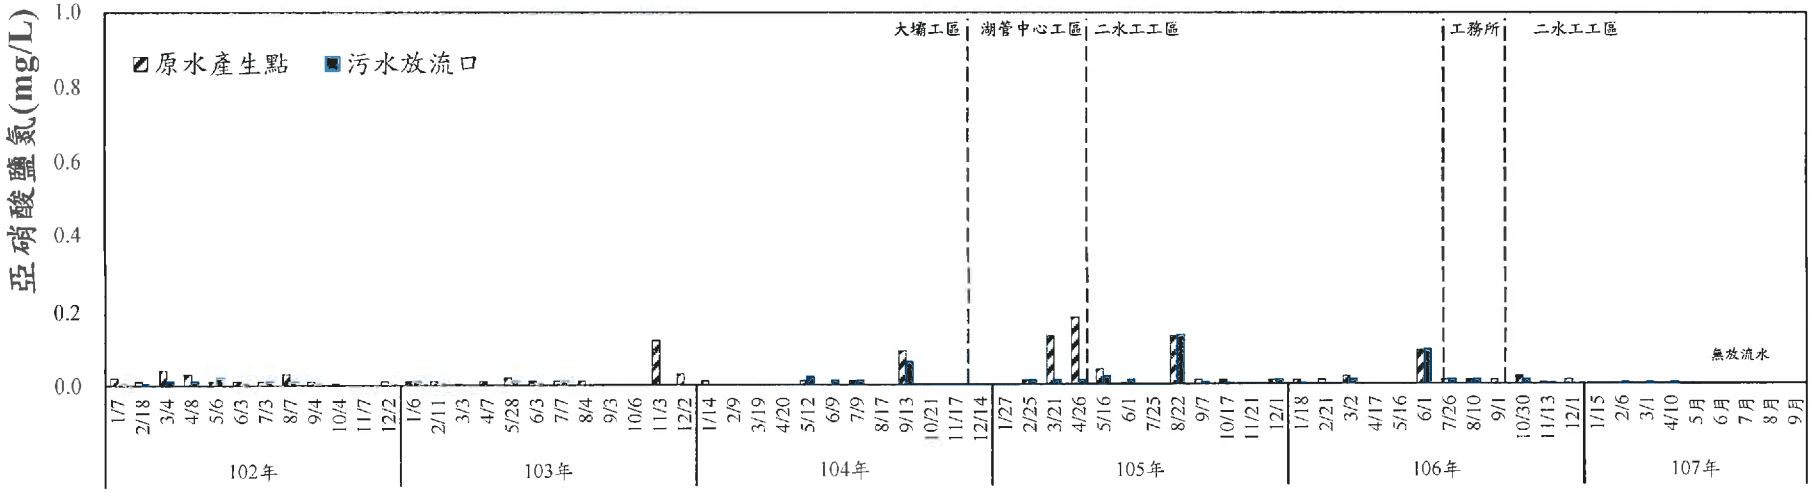

圖 2.3-28 歷次工地水質亞硝酸鹽氮監測結果比較圖

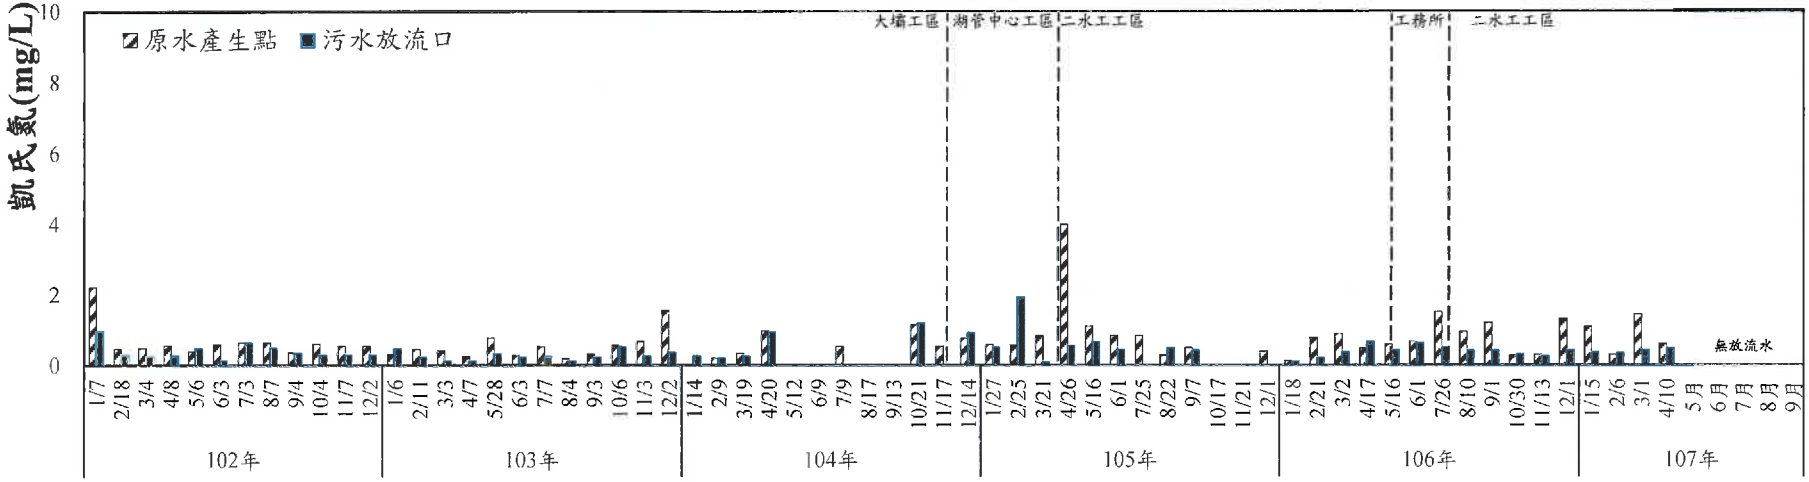

圖 2.3-29 歷次工地水質凱氏氮監測結果比較圖

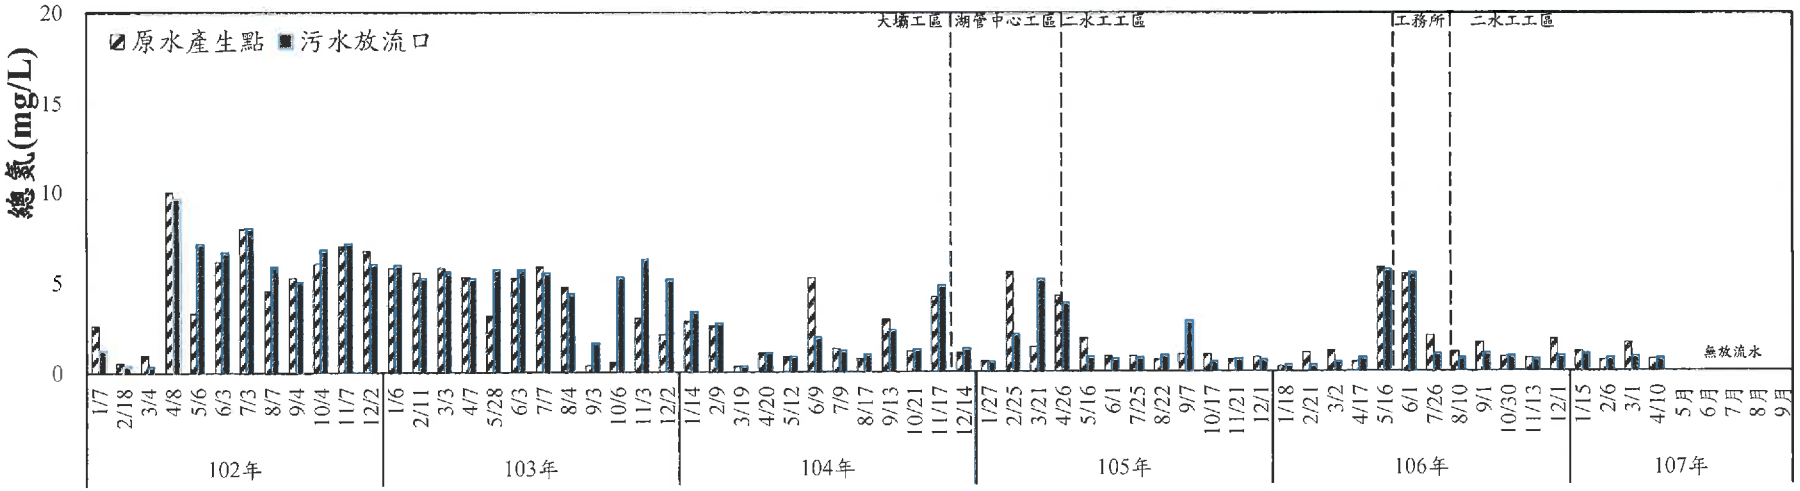

圖 2.3-30 歷次工地水質總氮監測結果比較圖

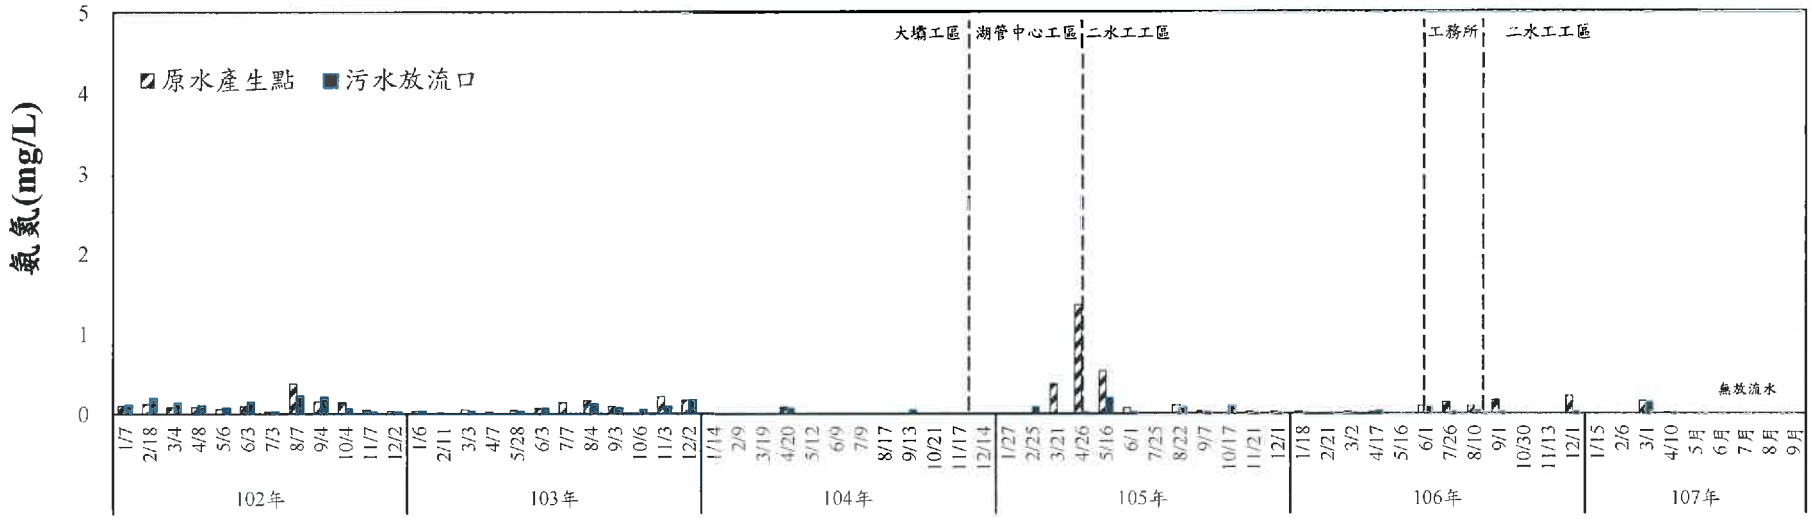

圖 2.3-31 歷次工地水質氨氮測結果比較圖

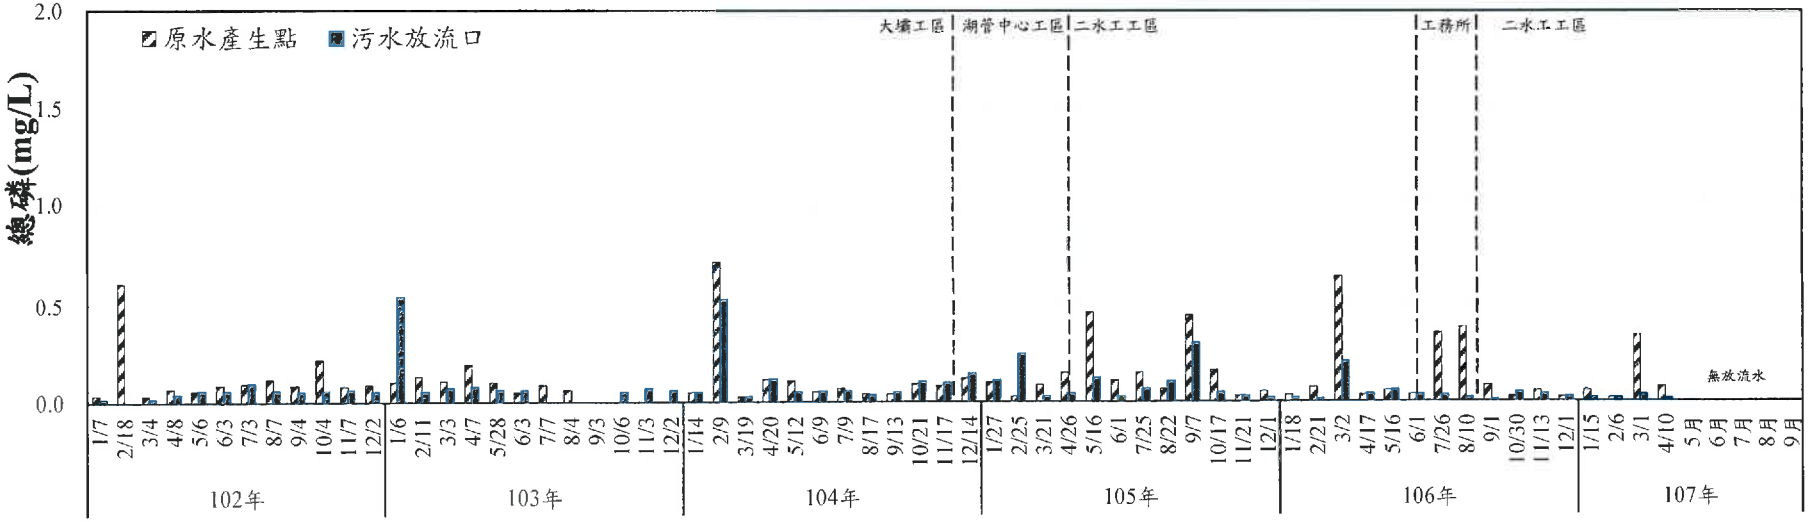

圖 2.3-32 歷次工地水質總磷監測結果比較圖

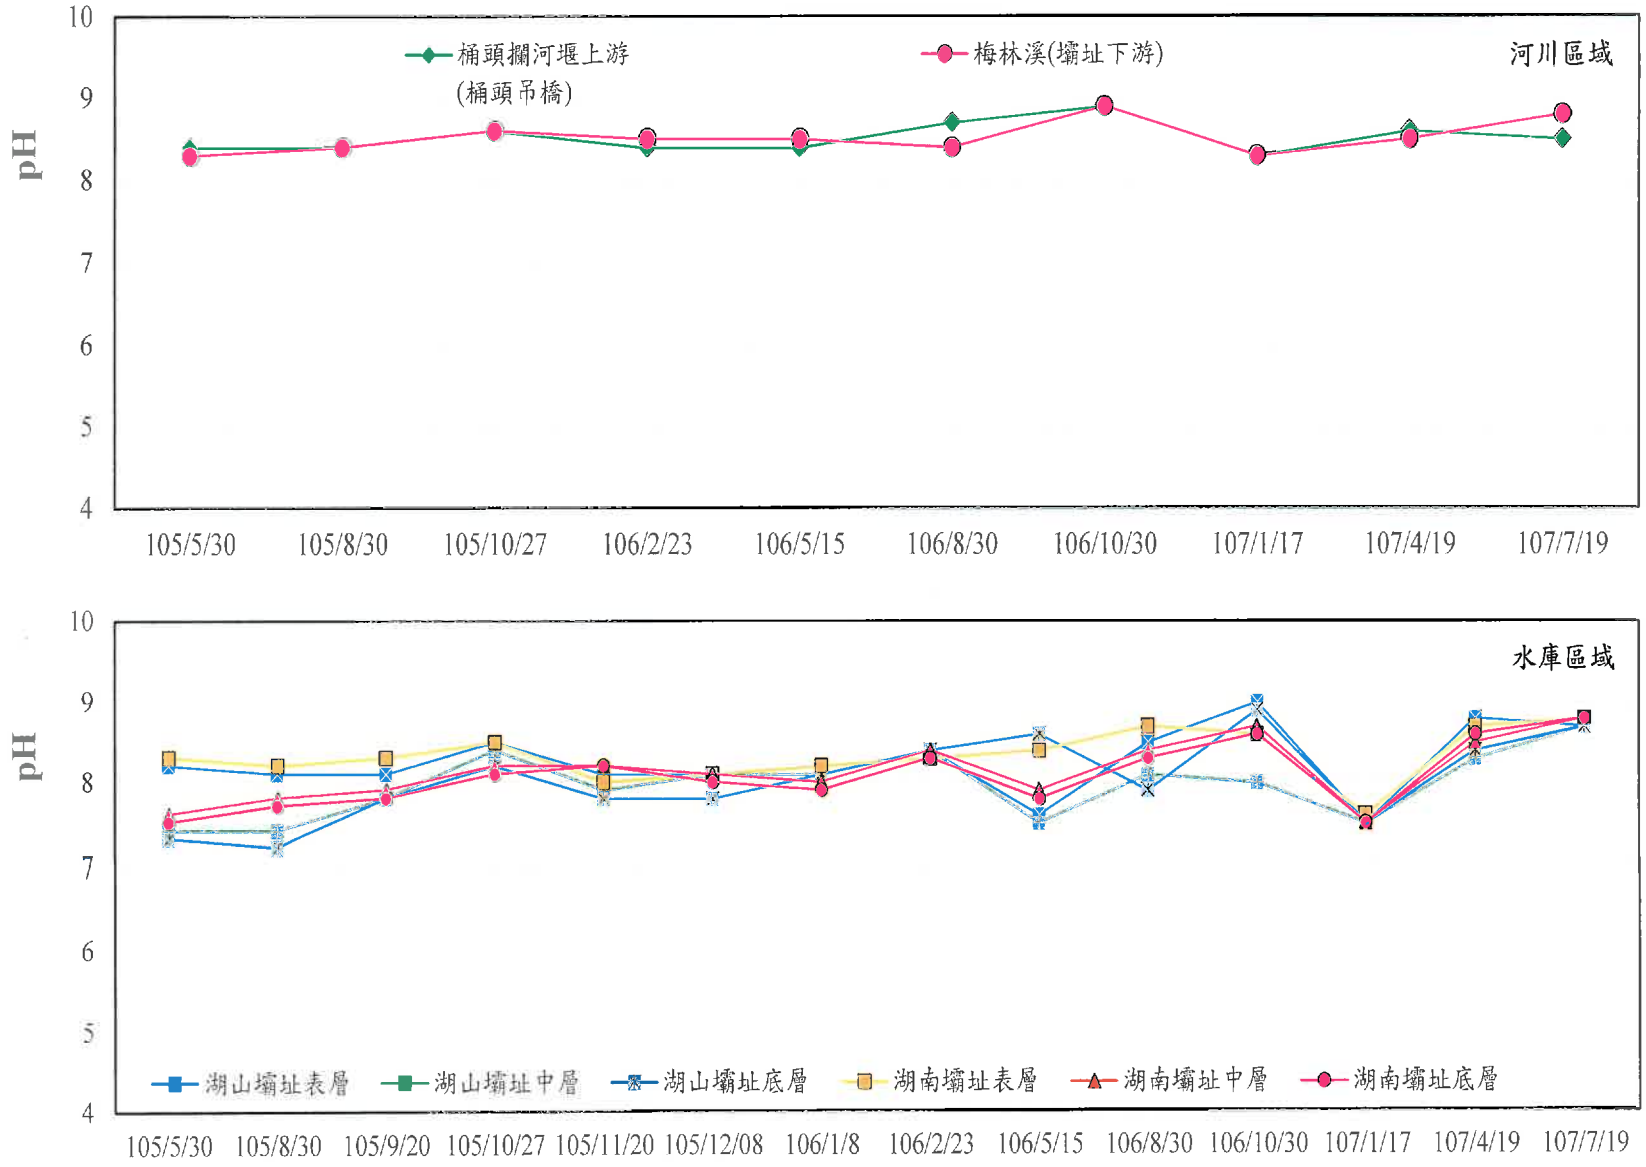

圖 2.3-33 歷次地面水質 pH 監測成果比較圖

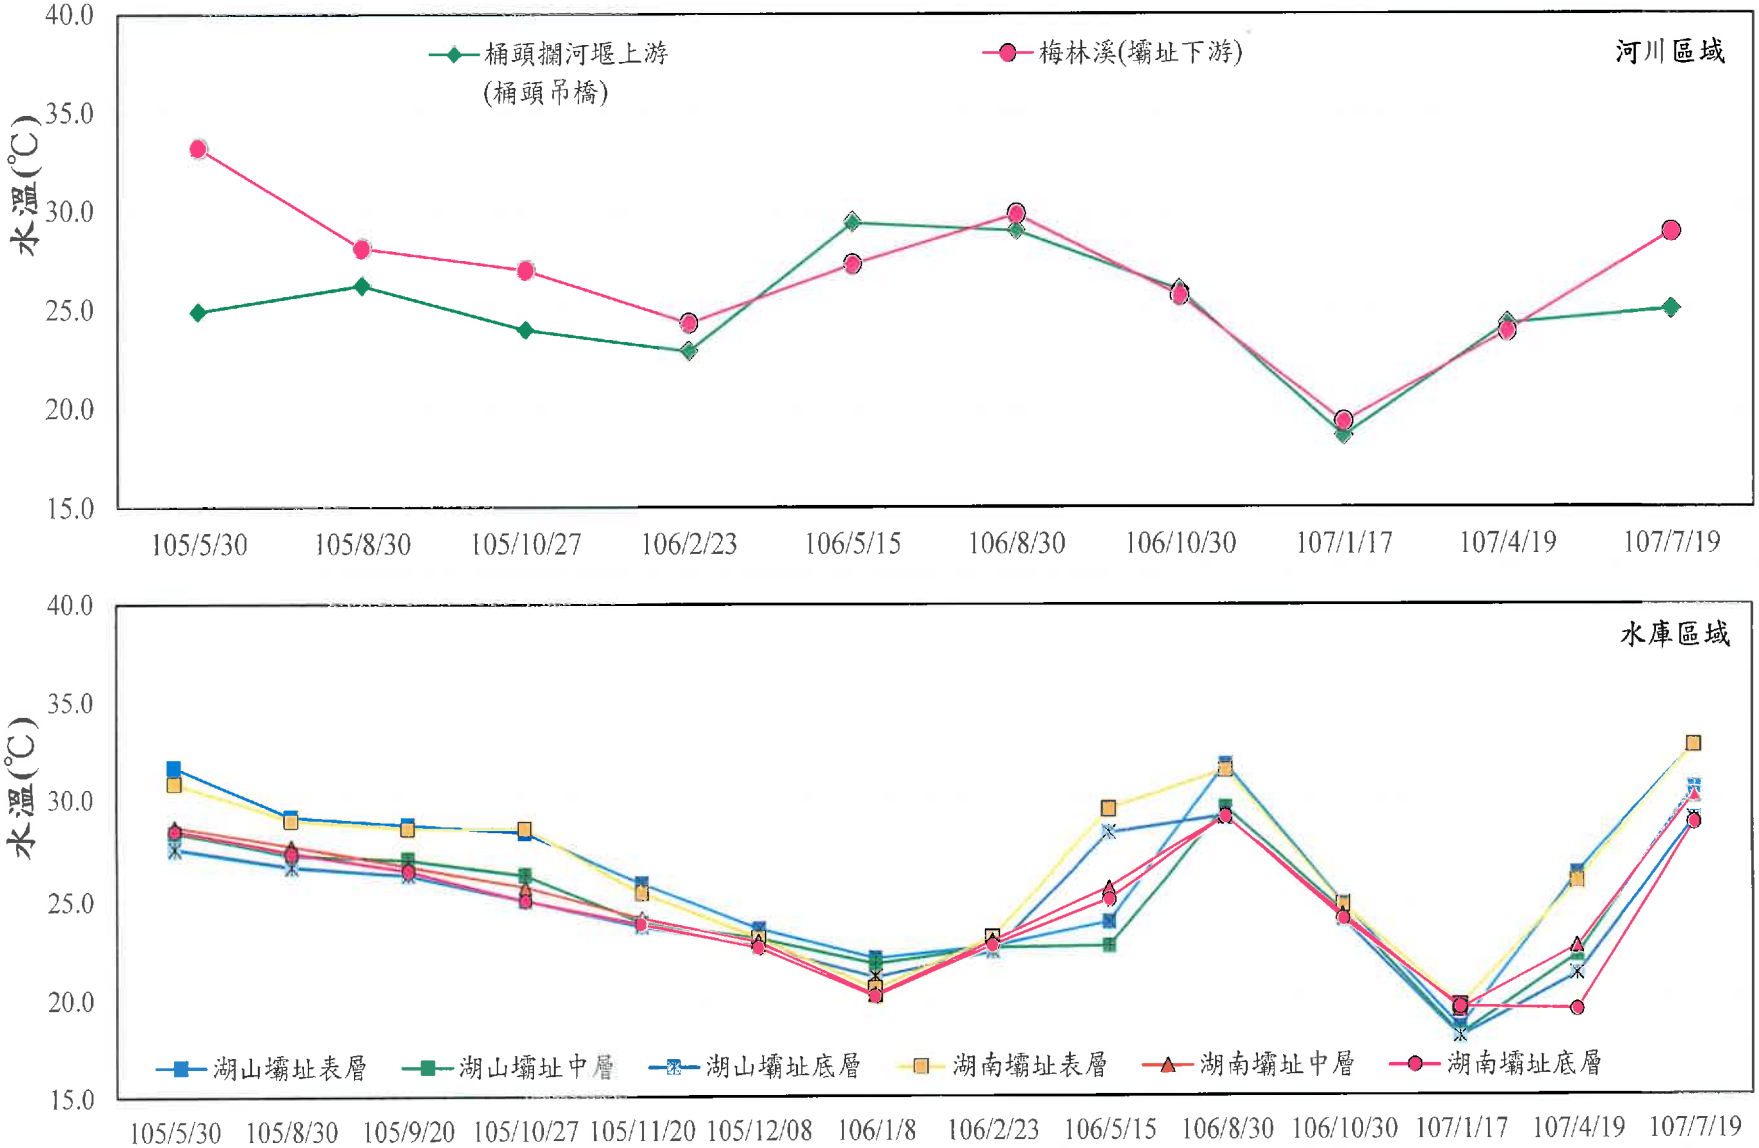

圖 2.3-34 歷次地面水質水溫監測成果比較圖

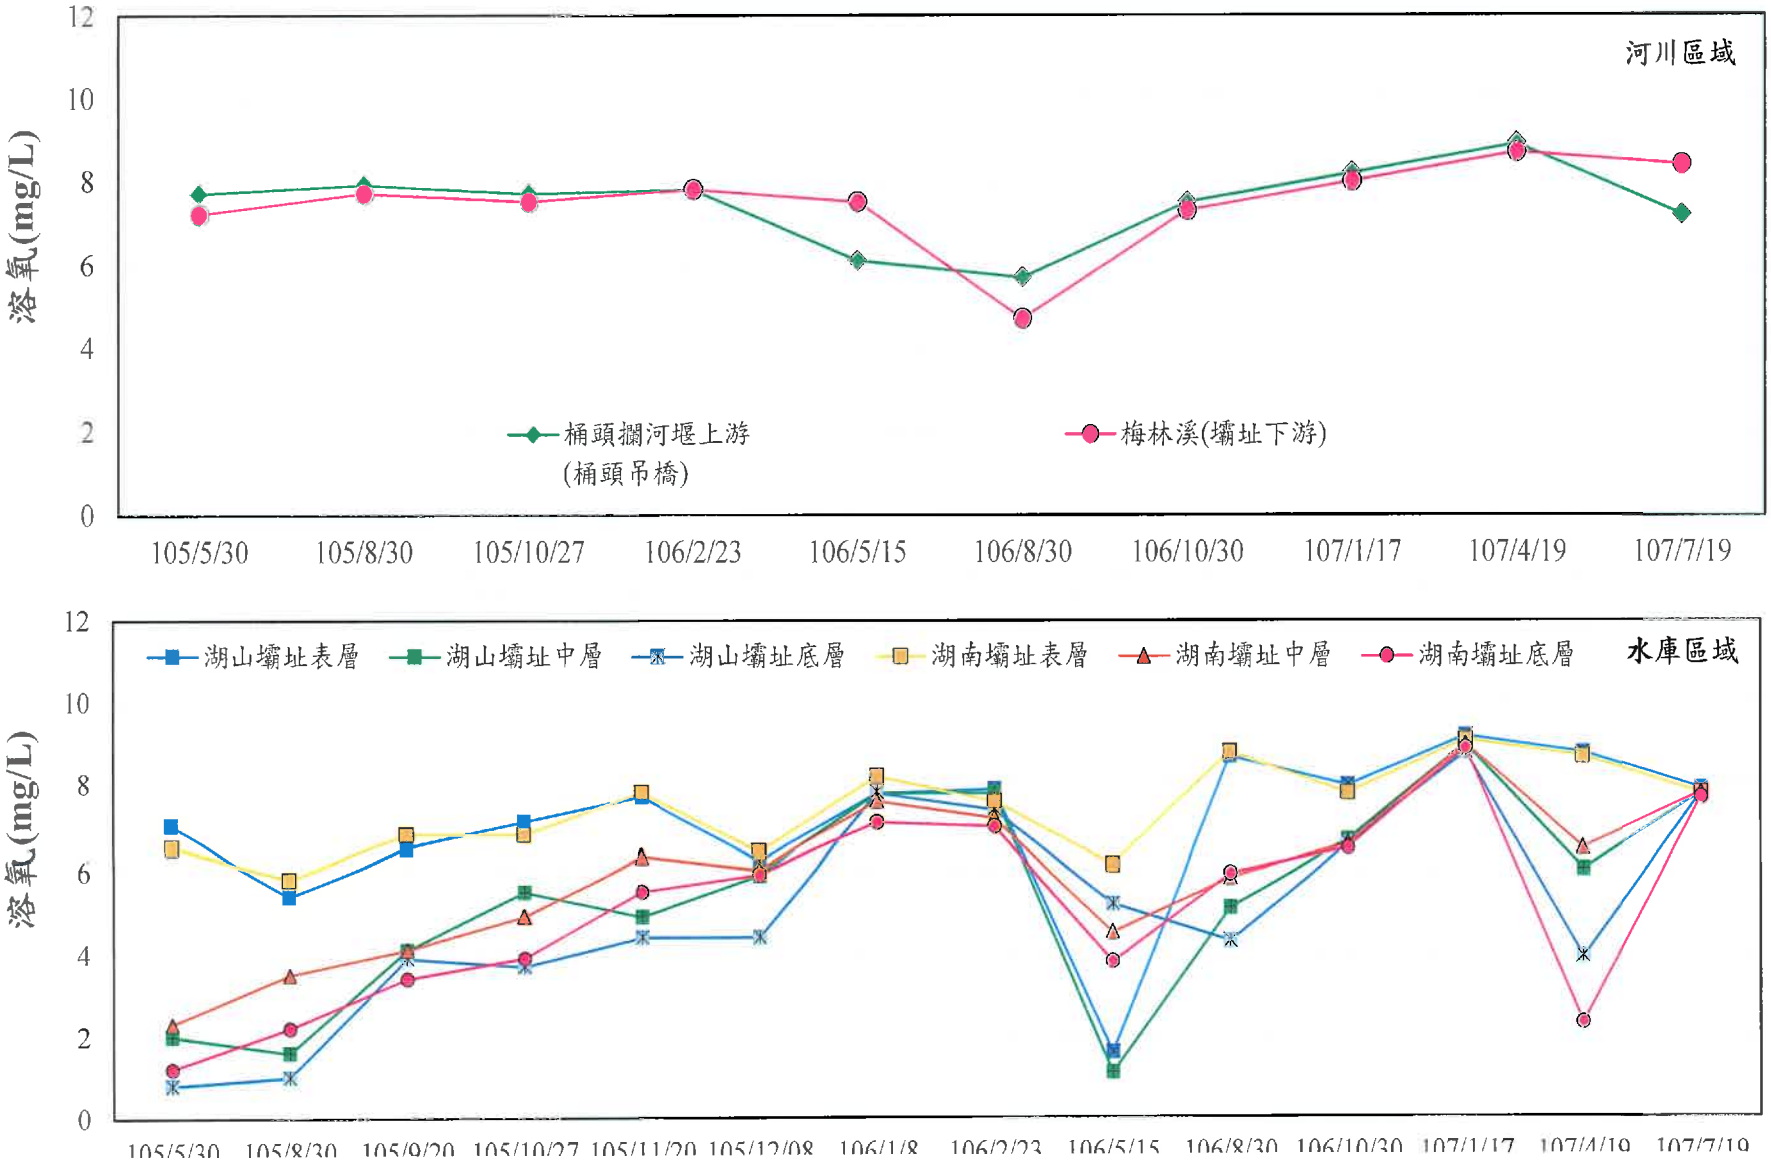

圖 2.3-35 歷次地面水質溶氧監測成果比較圖

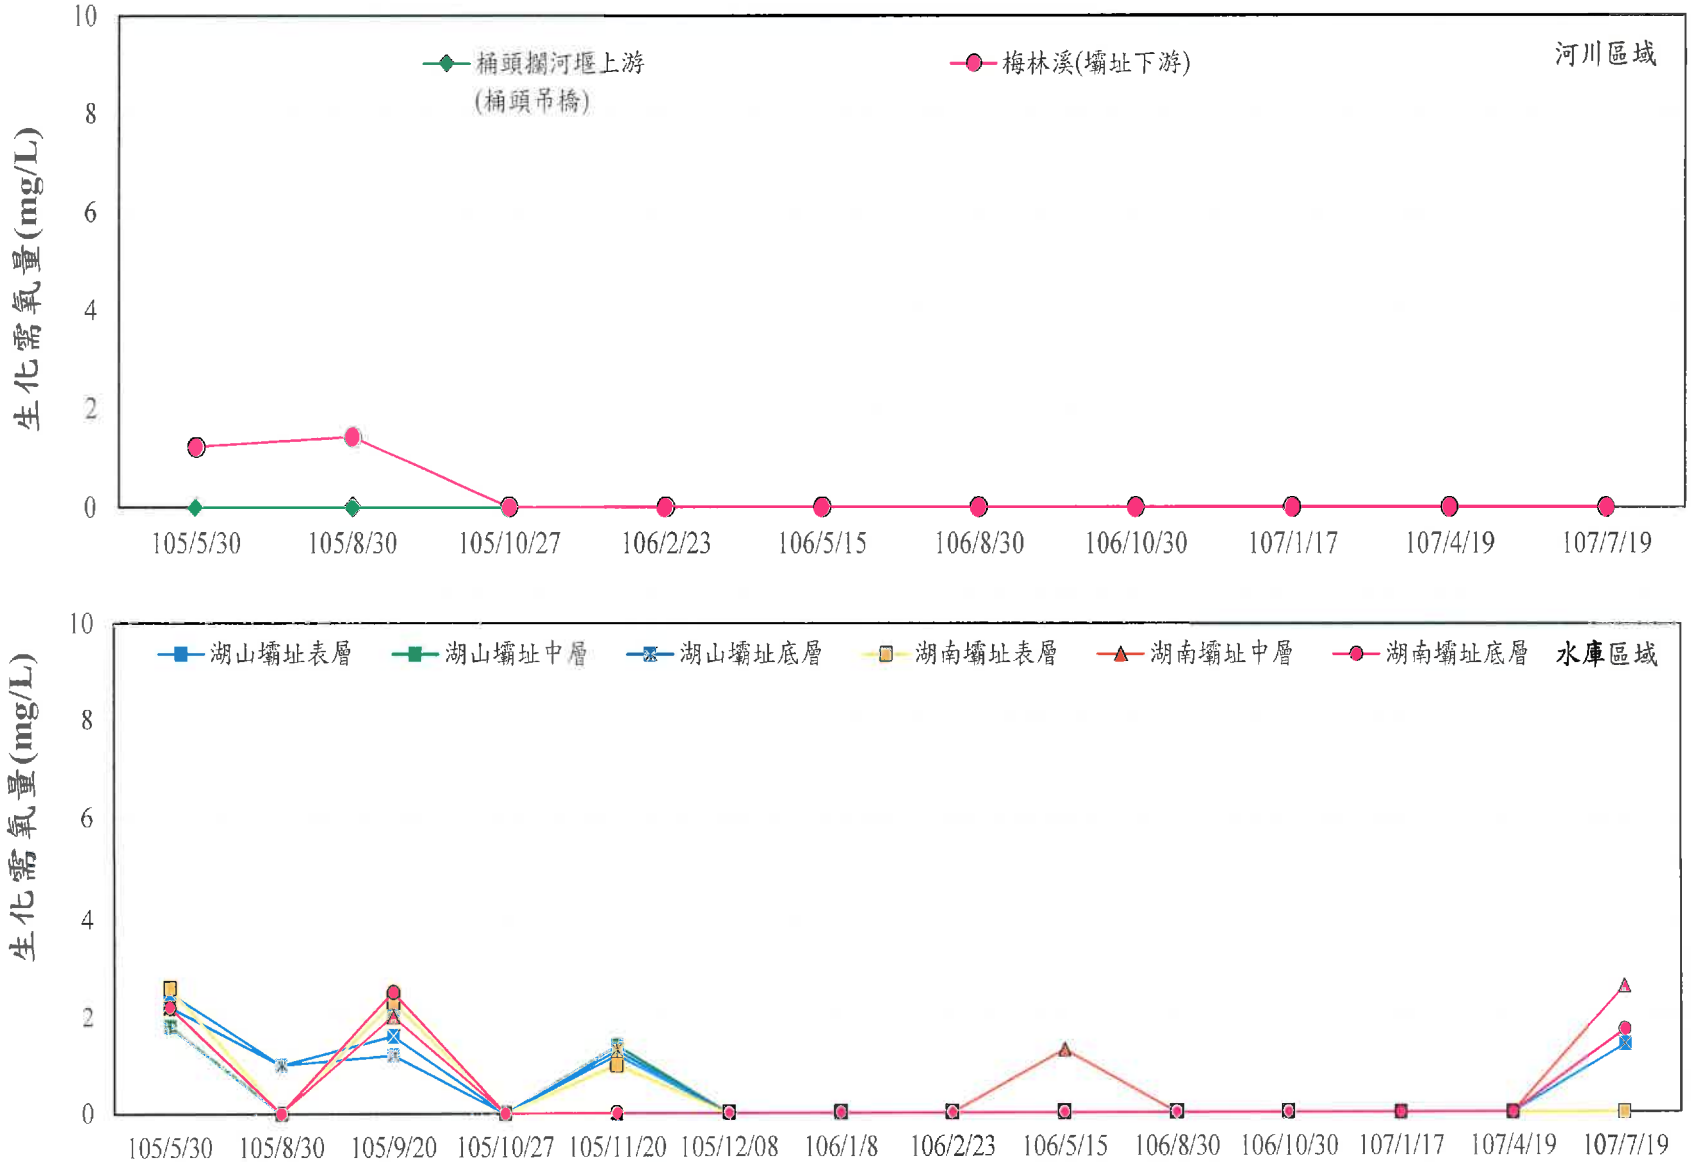

圖 2.3-36 歷次地面水質生化需氧量監測成果比較圖

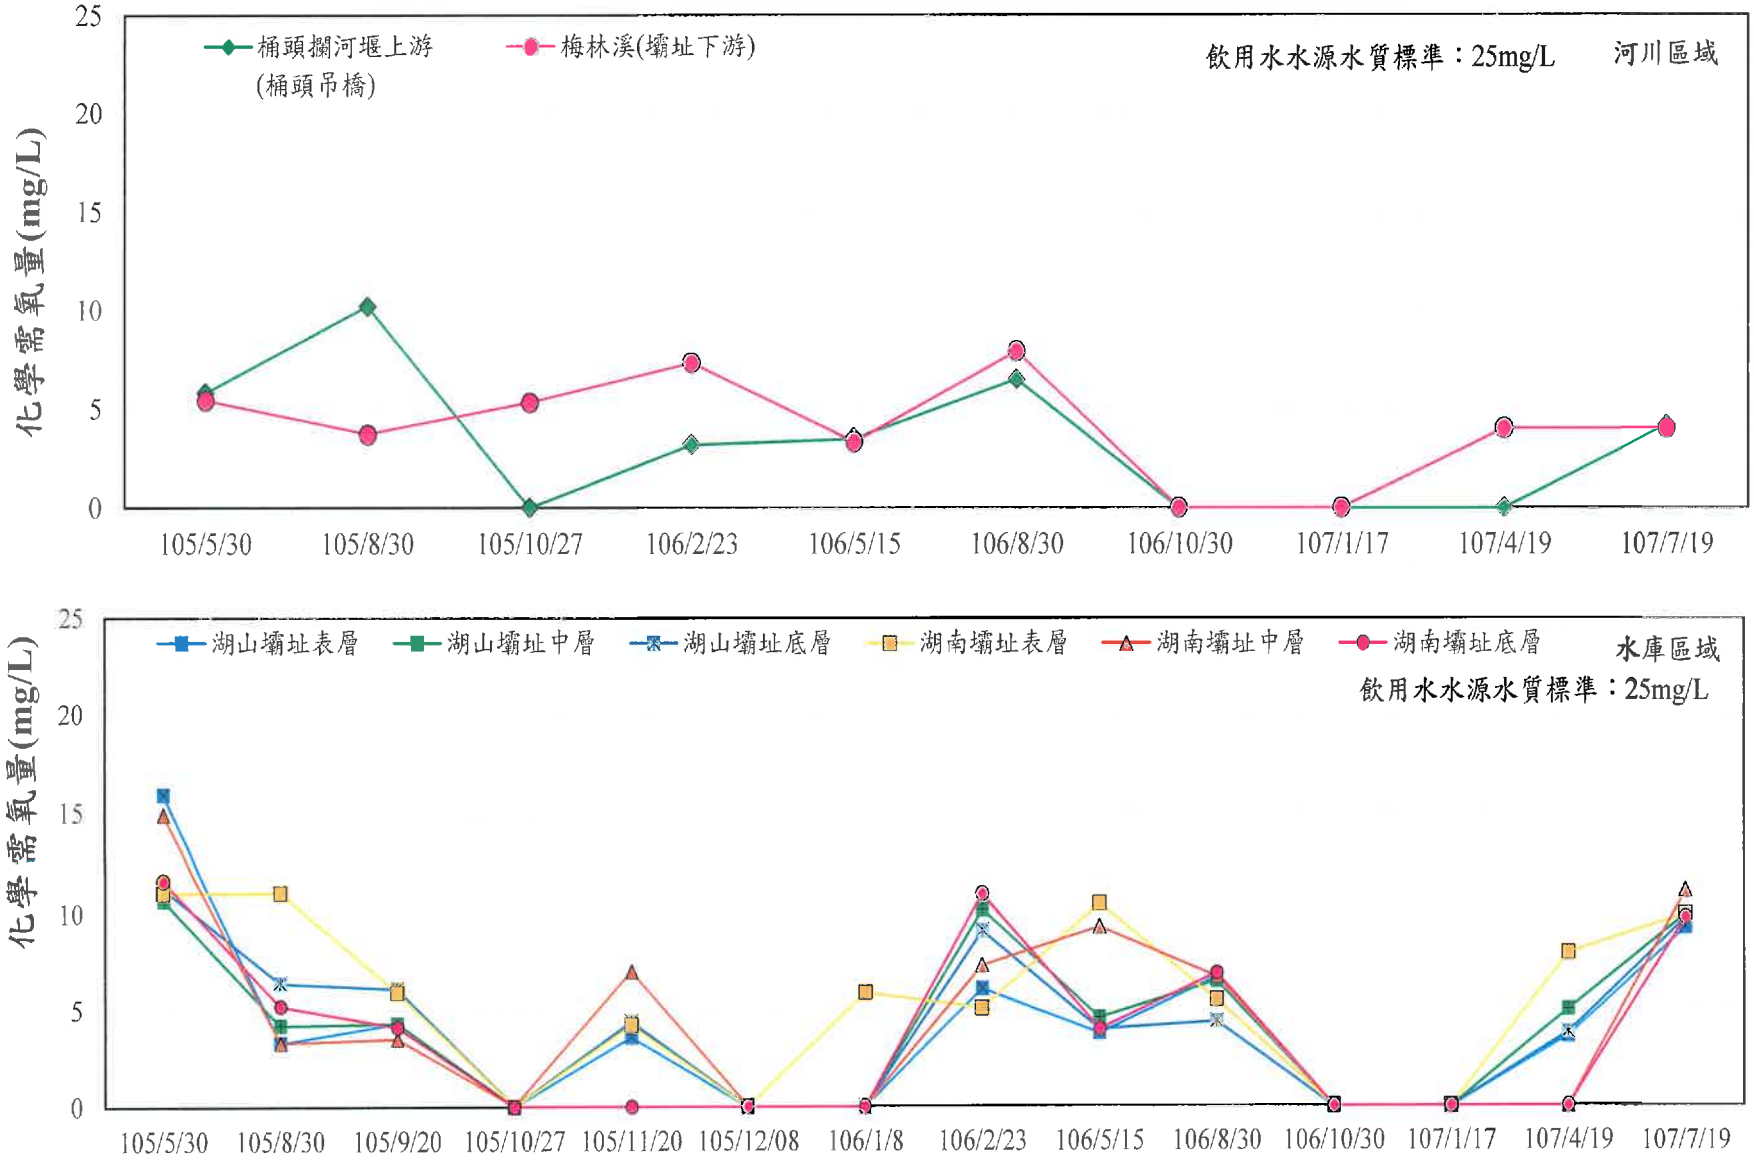

圖 2.3-37 歷次地面水質化學需氧量監測成果比較圖

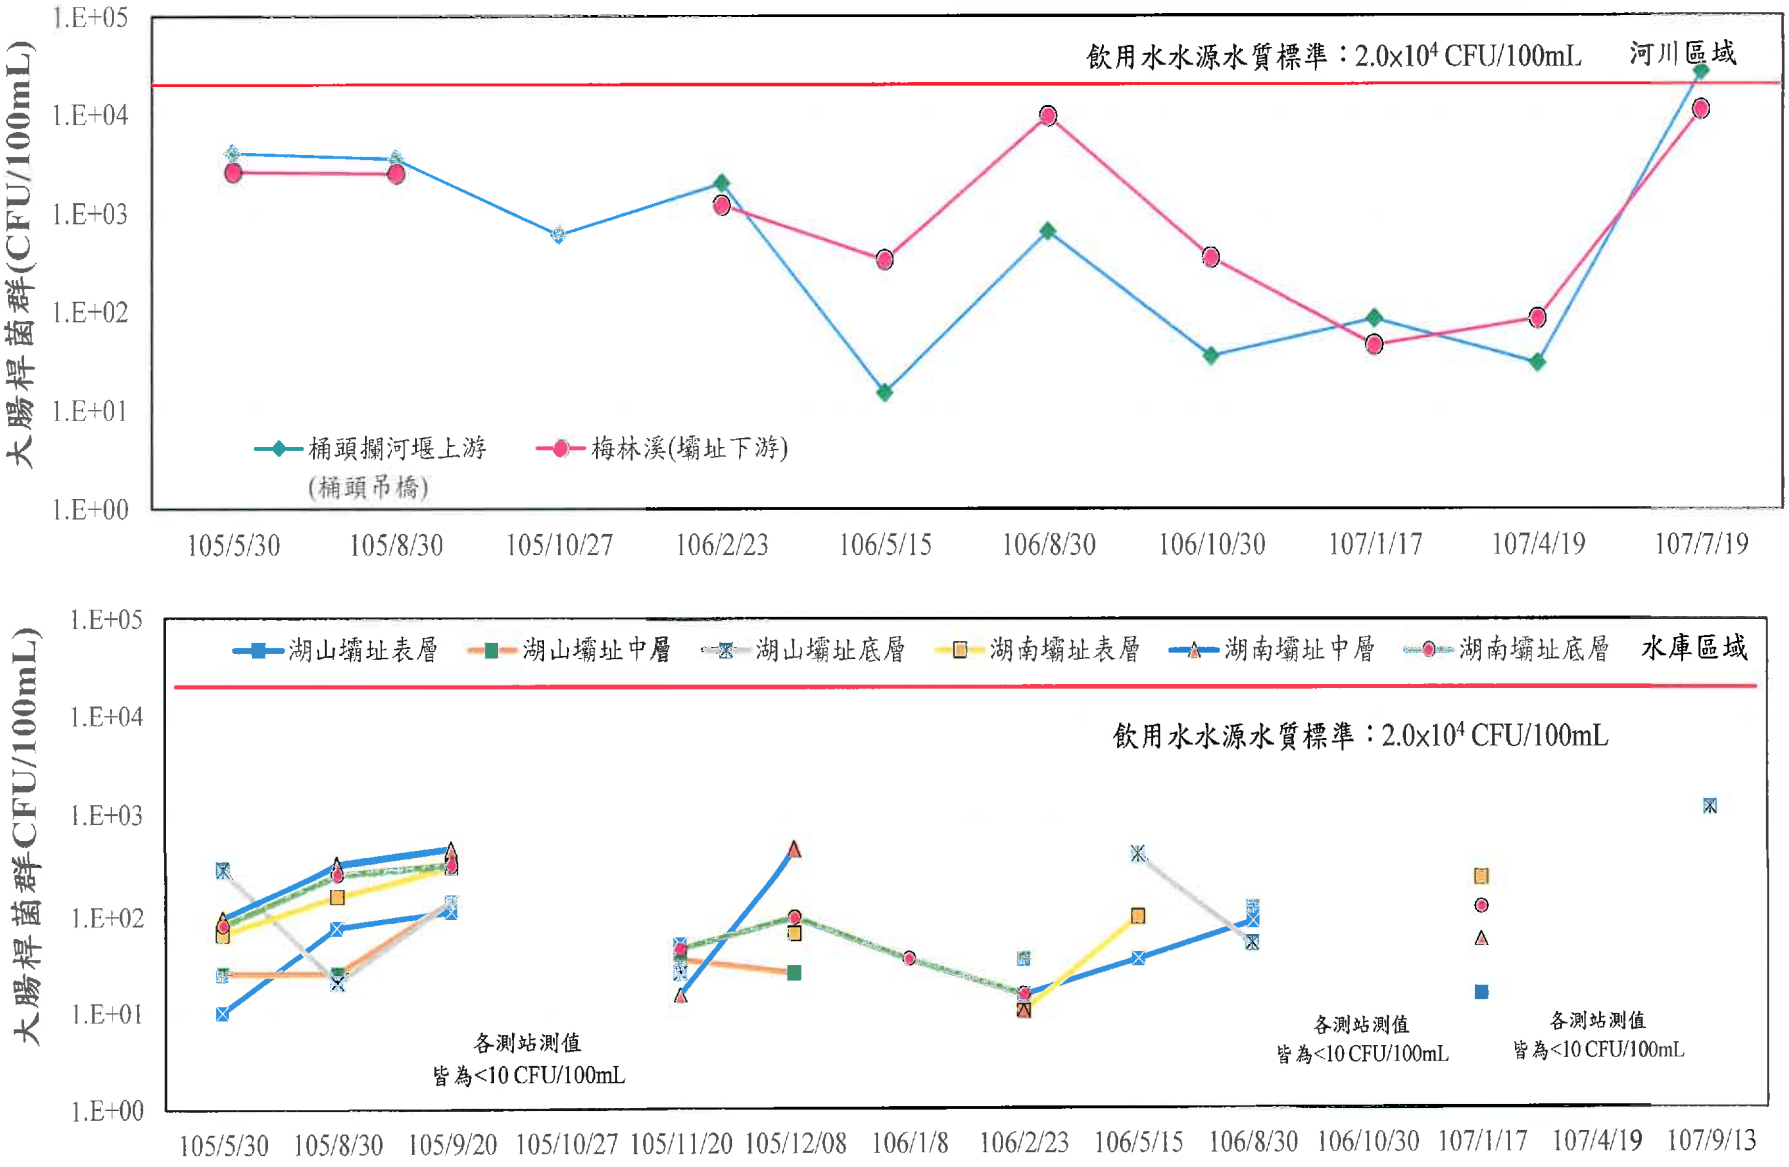

圖 2.3-38 歷次地面水質大腸桿菌群監測成果比較圖

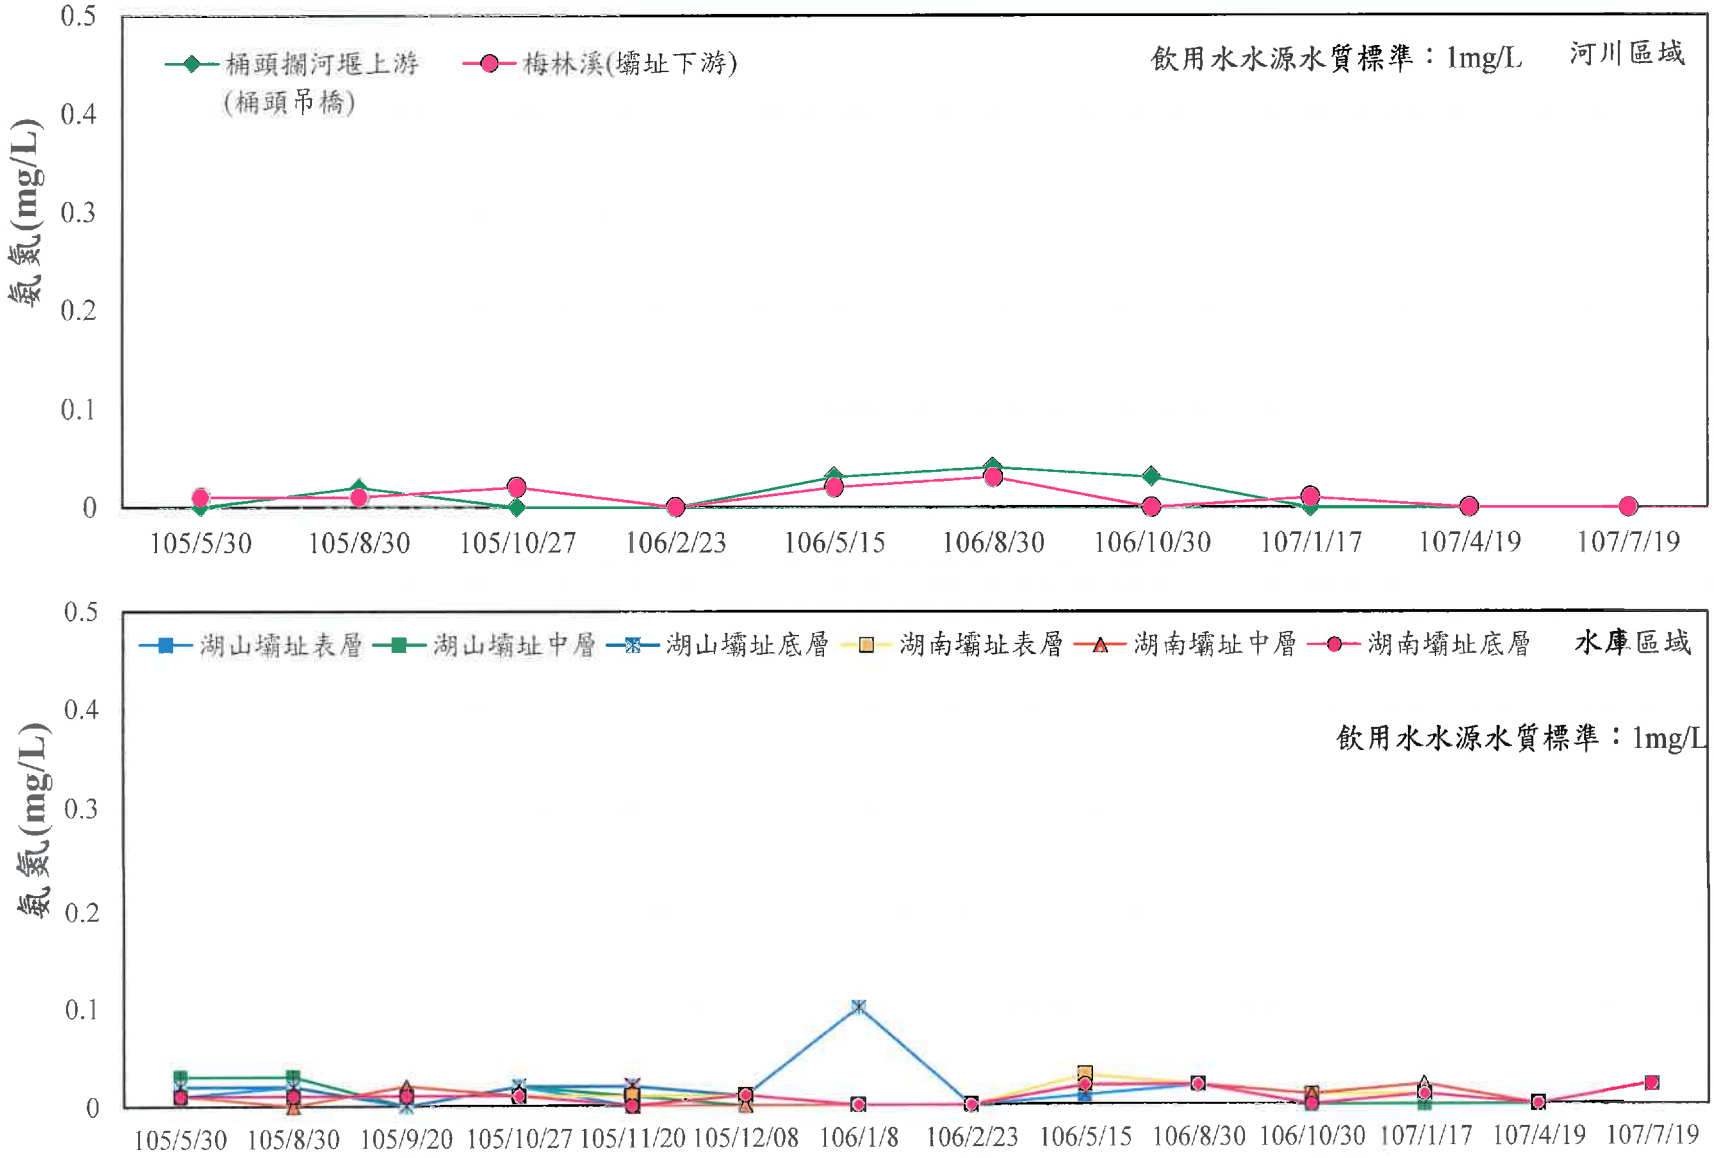

圖 2.3-39 歷次地面水質氨氮監測成果比較圖

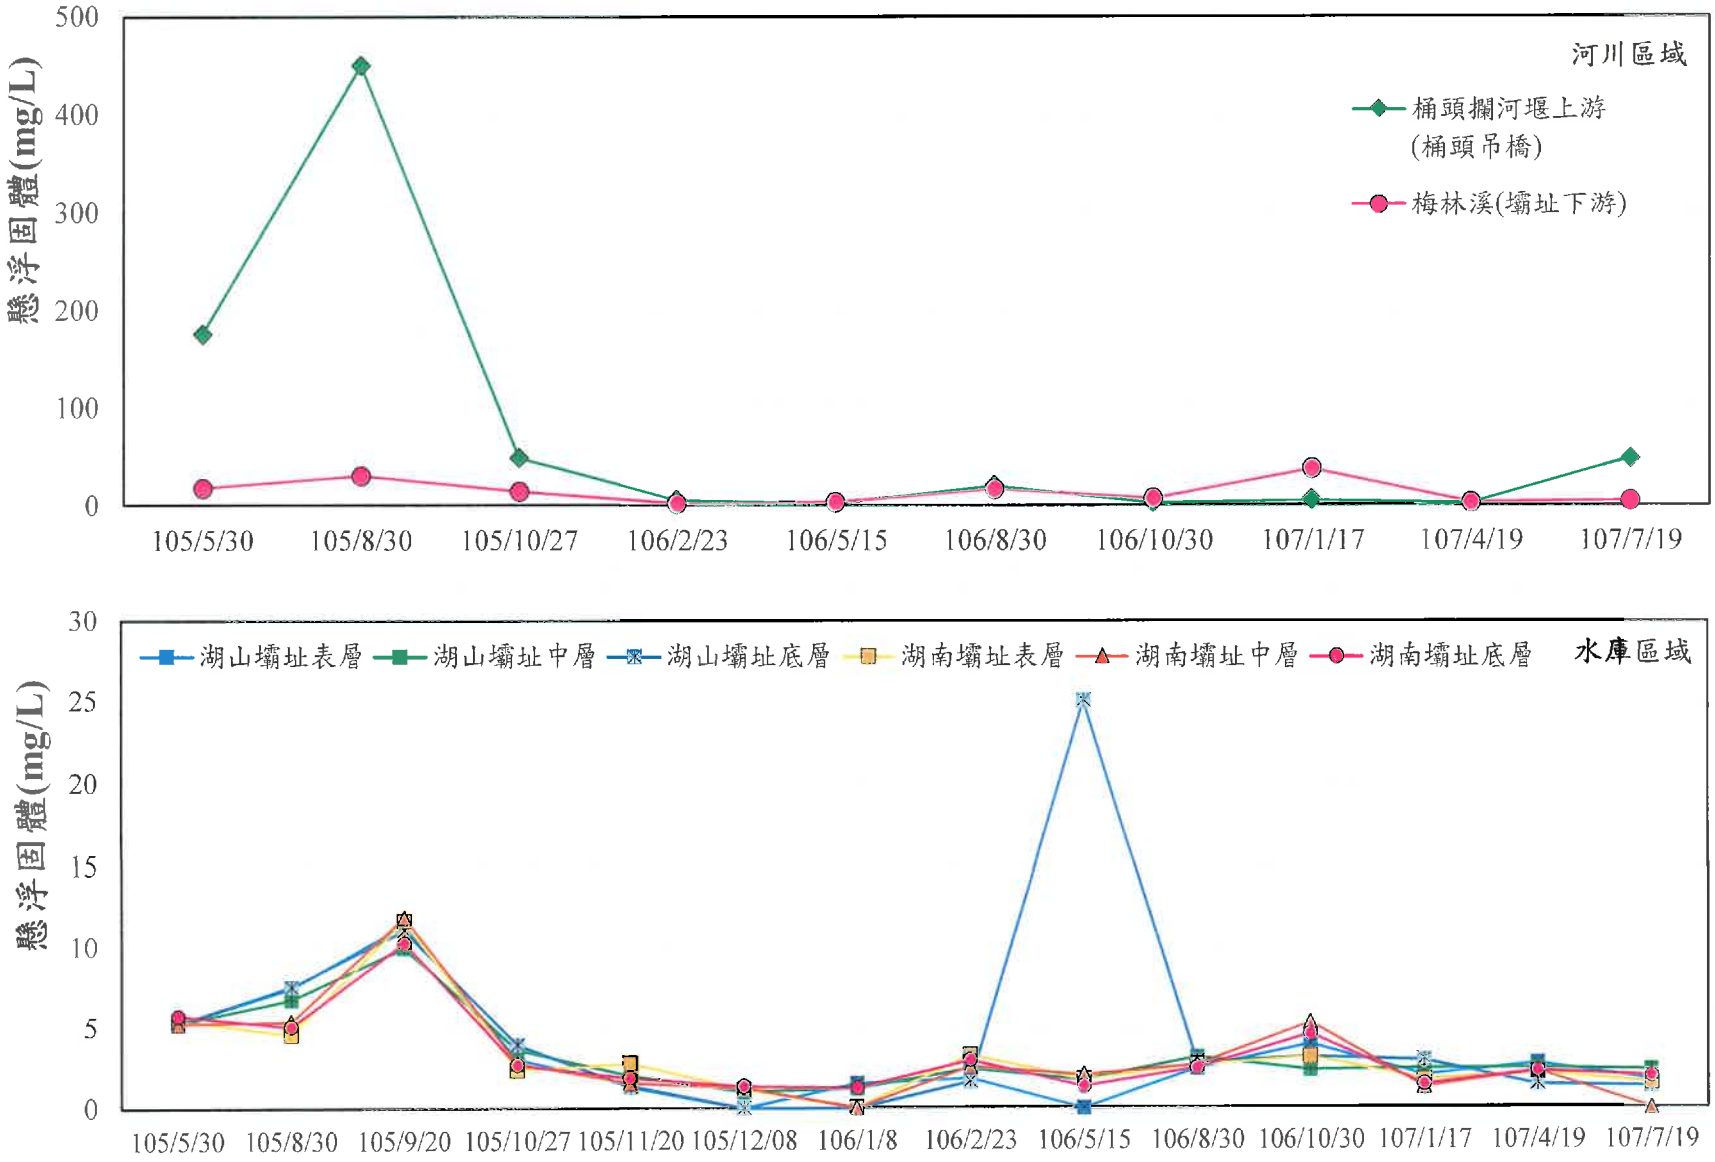

圖 2.3-40 歷次地面水質懸浮固體監測成果比較圖

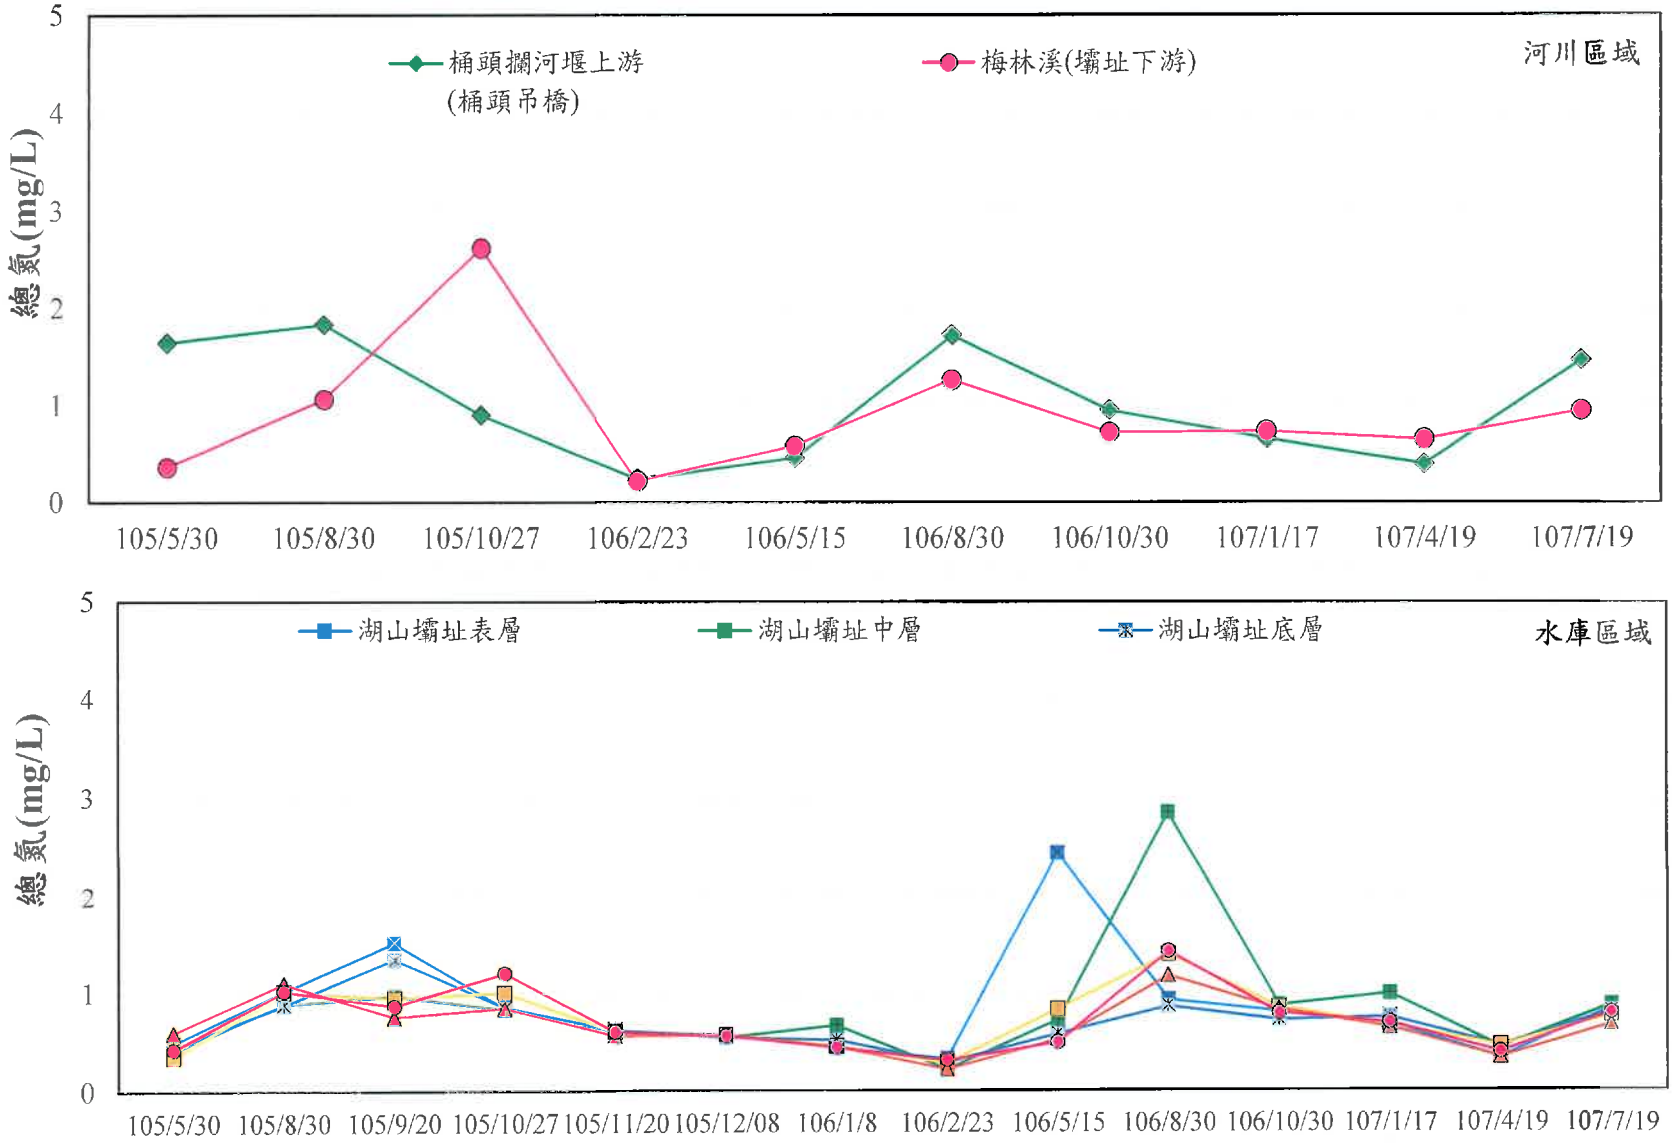

圖 2.3-41 歷次地面水質總氮監測成果比較圖

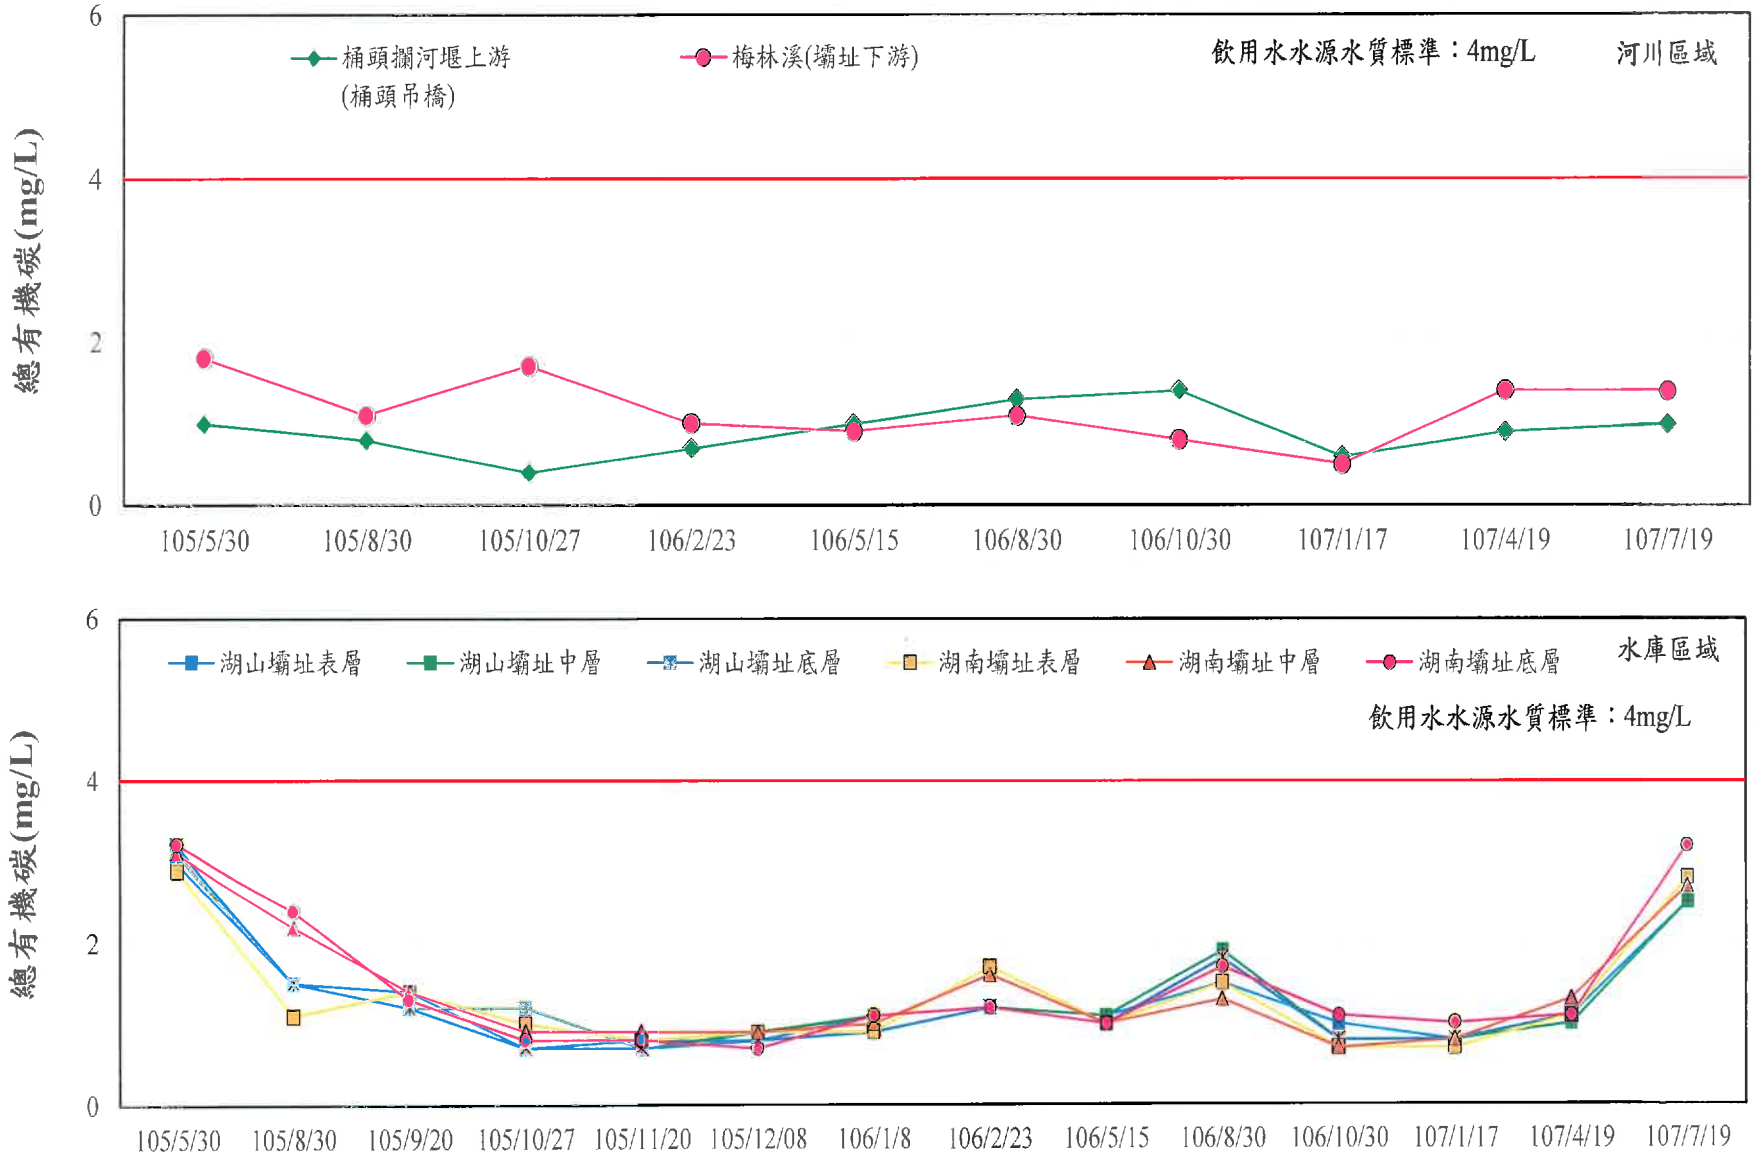

圖 2.3-42 歷次地面水質總有機碳監測成果比較圖

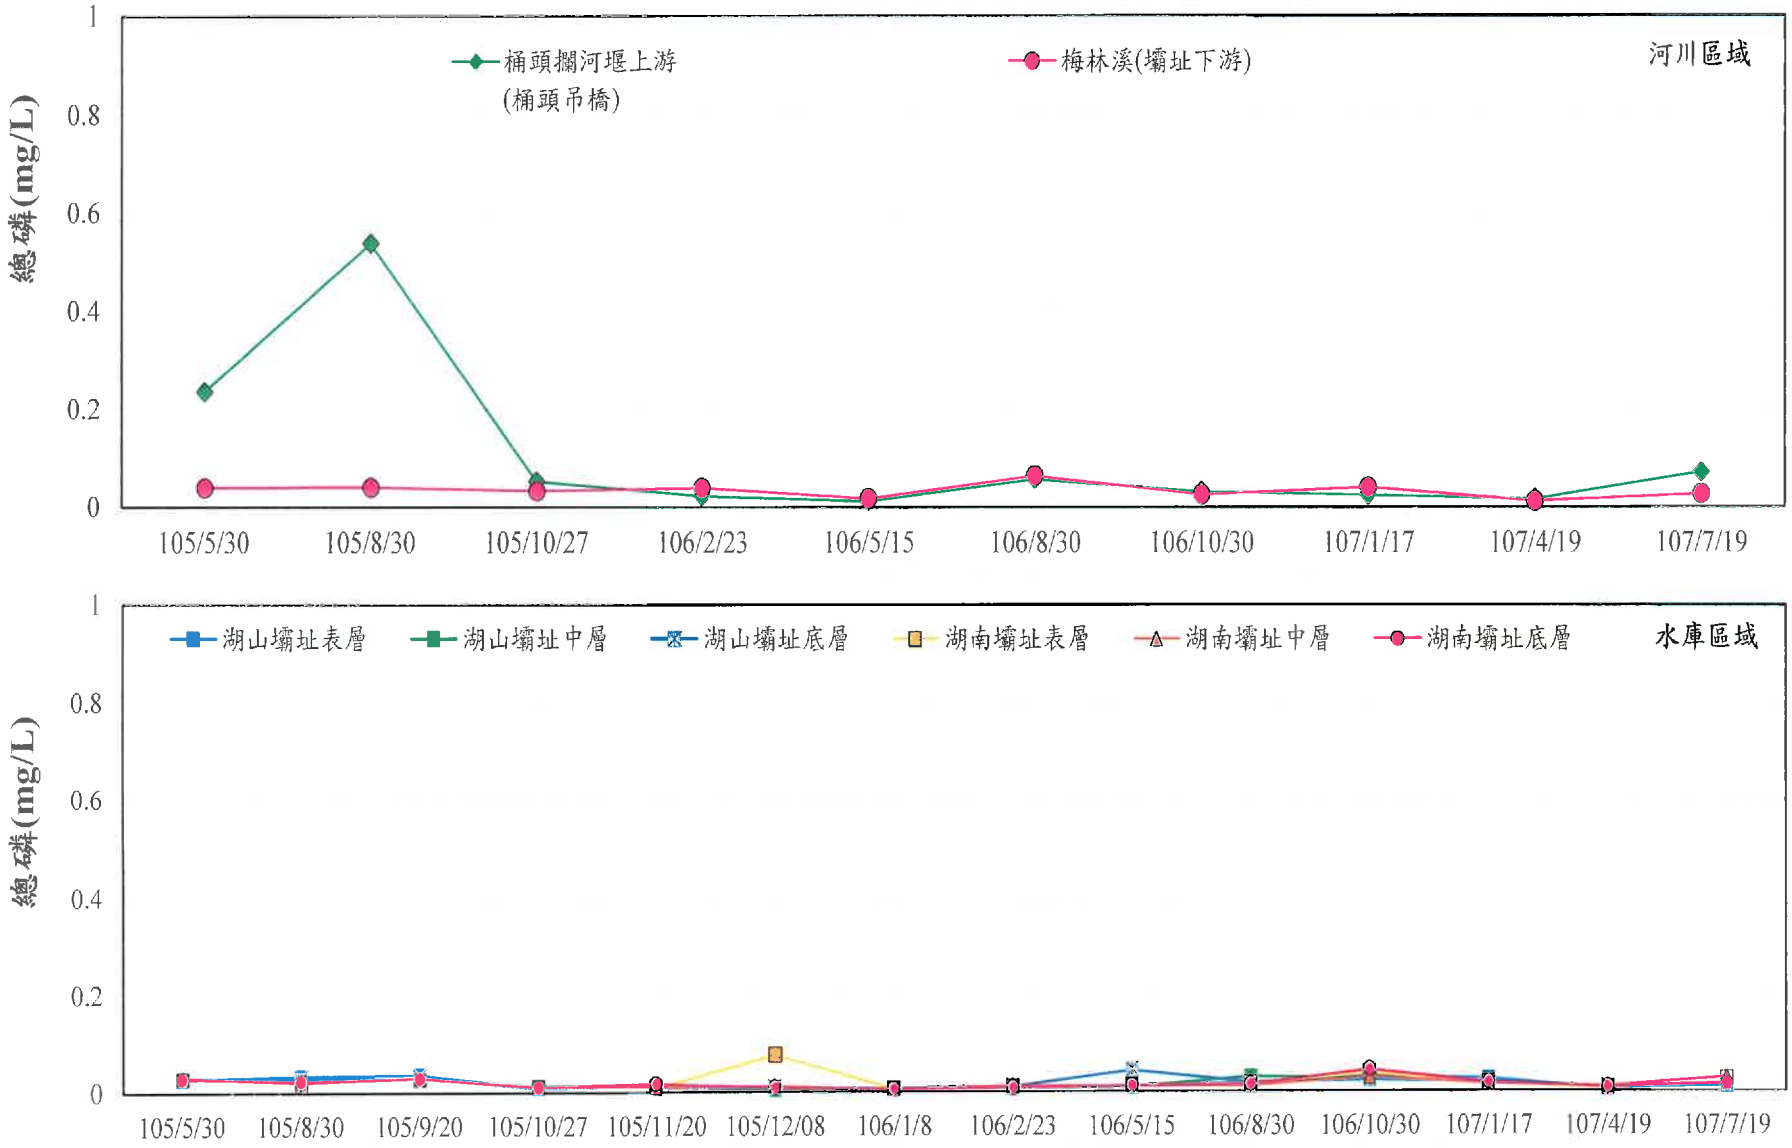

圖 2.3-43 歷次地面水質總磷監測成果比較圖

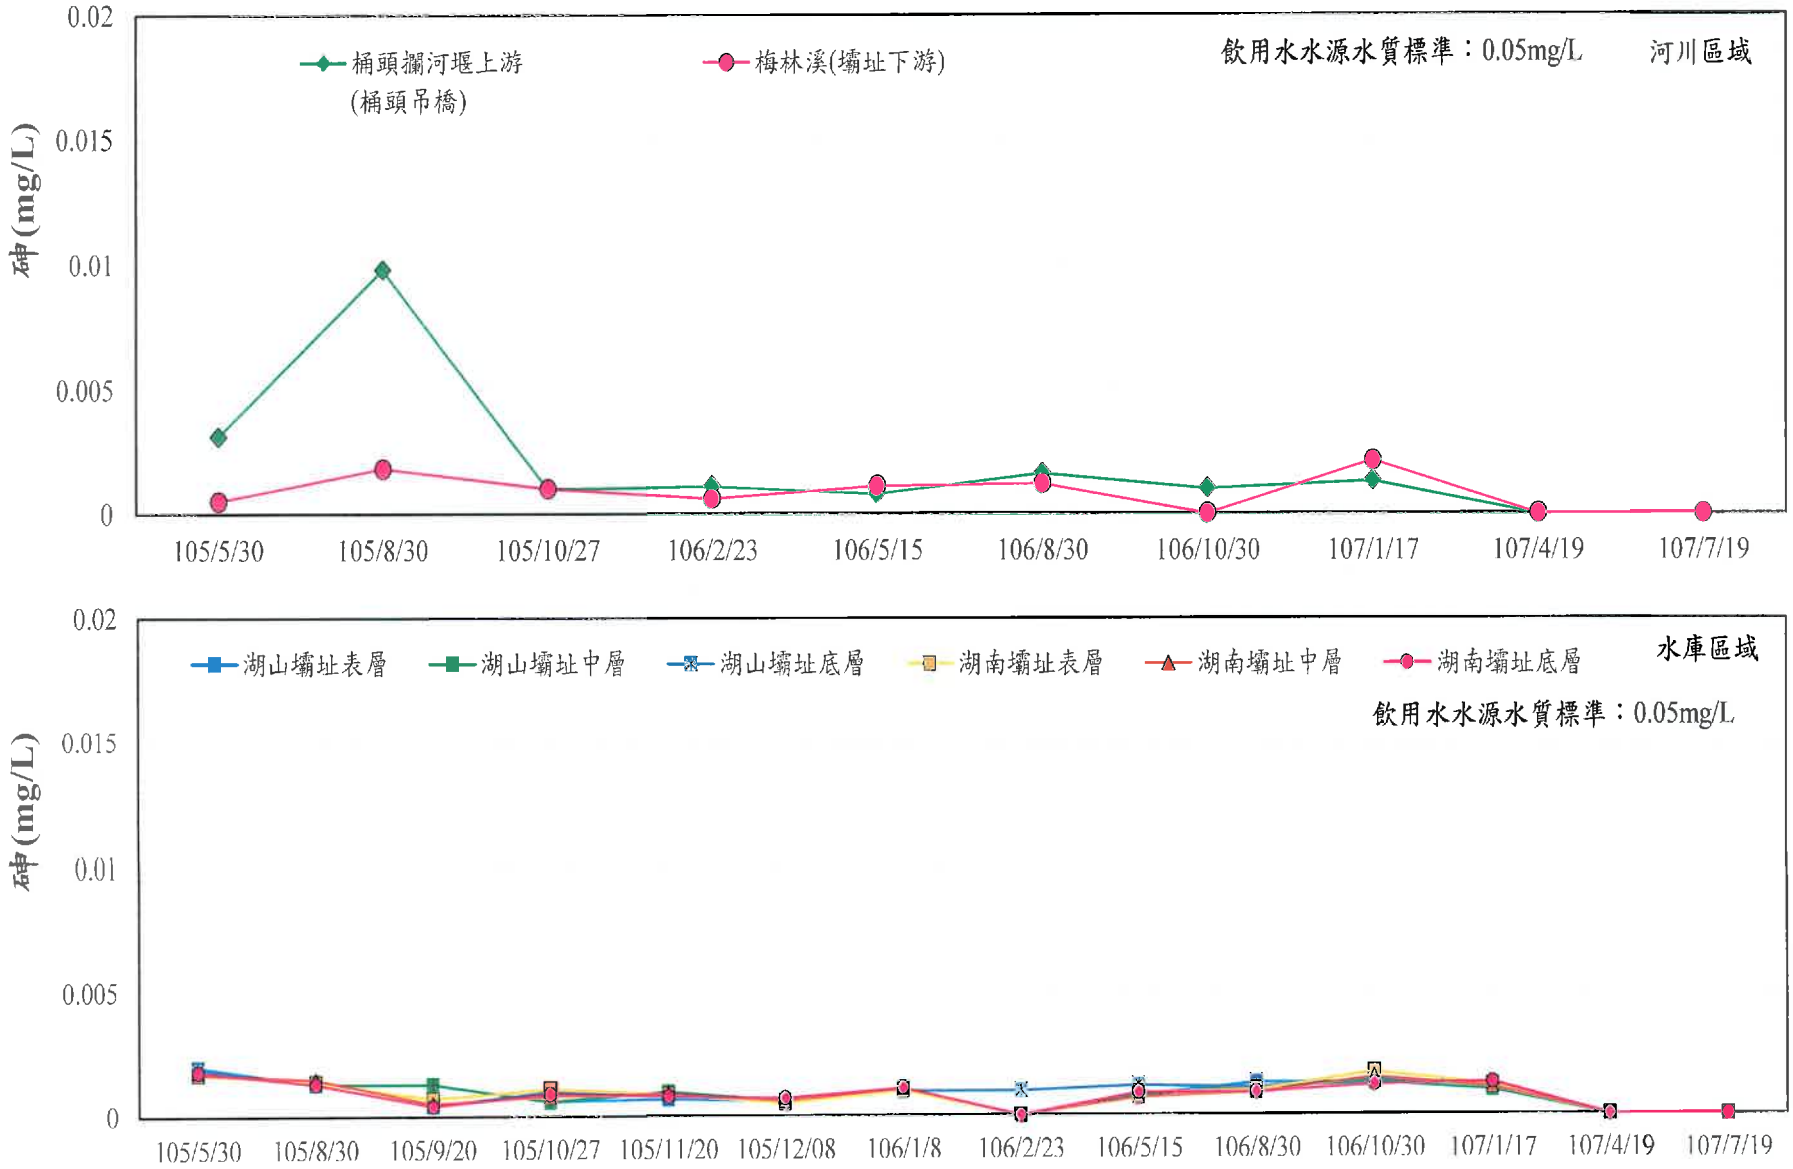

圖 2.3-44 歷次地面水質砷監測成果比較圖

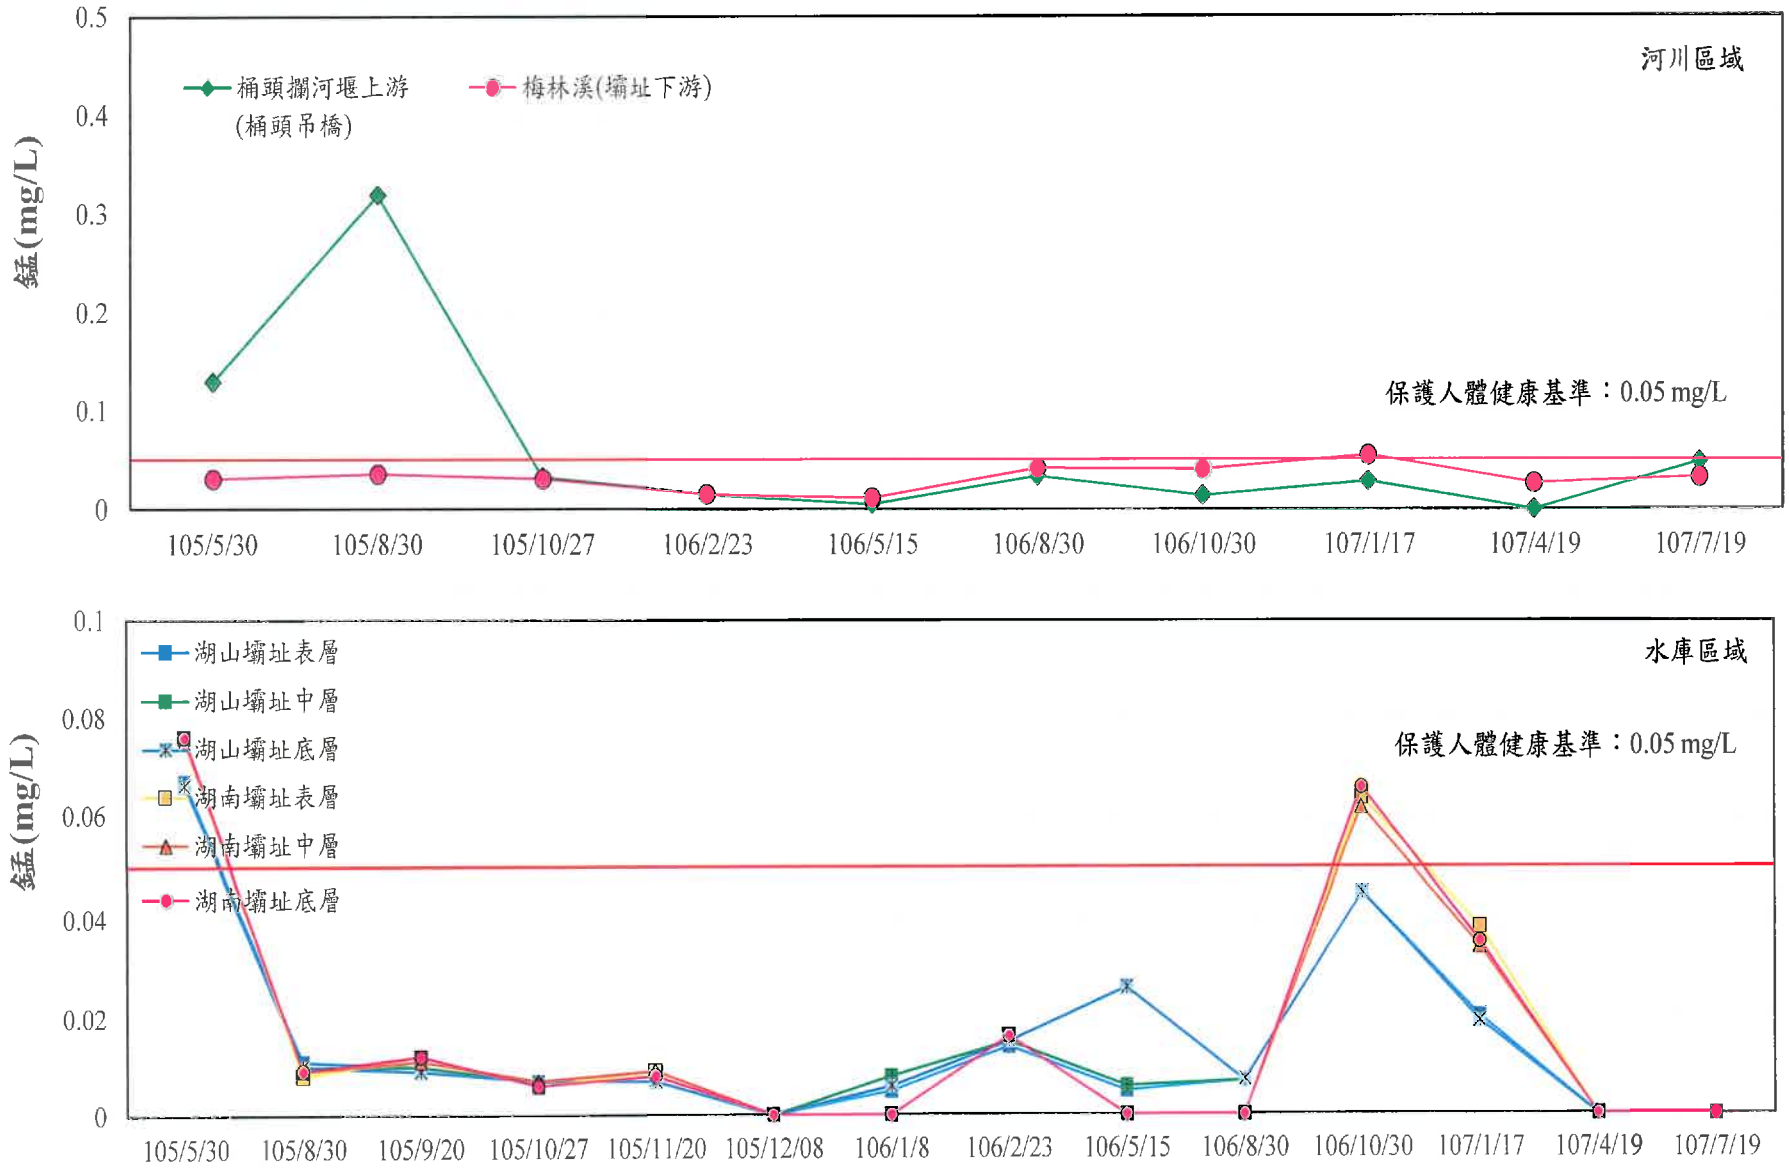

圖 2.3-45 歷次地面水質錳監測成果比較圖

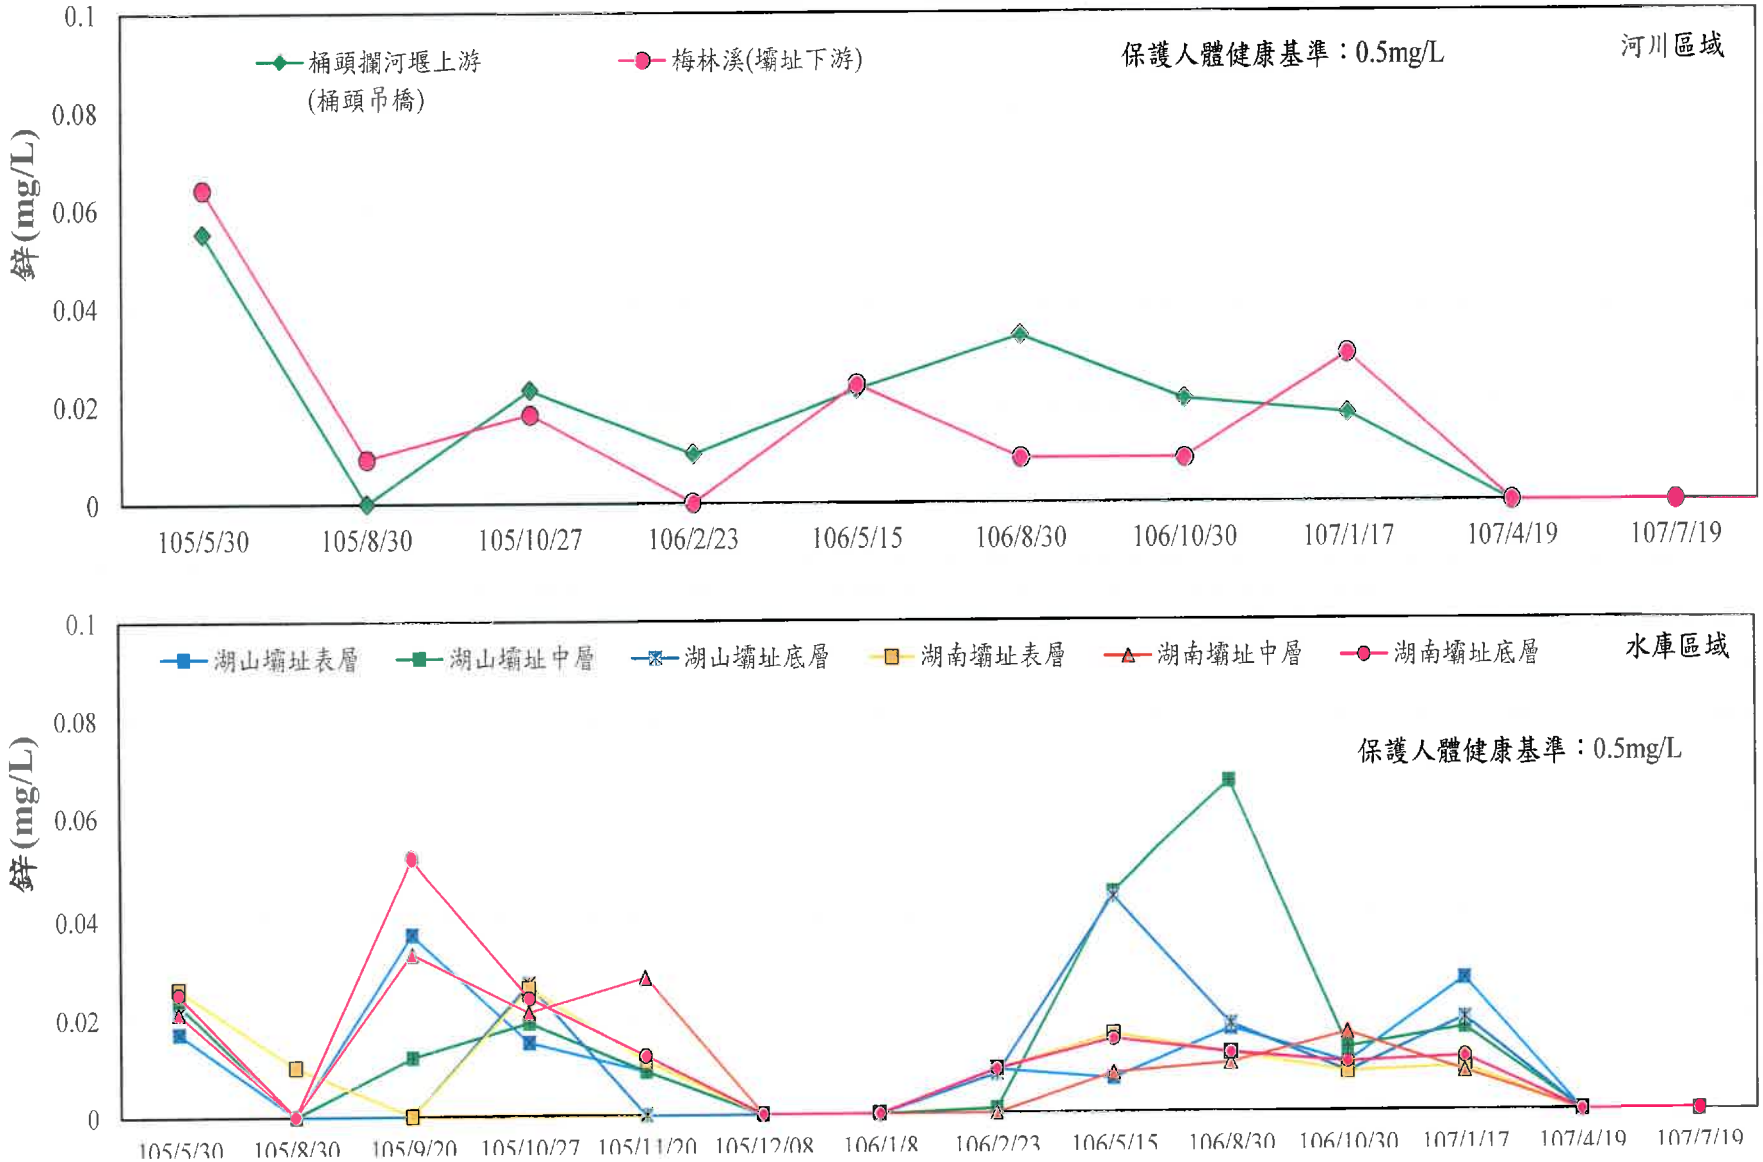

圖 2.3-46 歷次地面水質鋅監測成果比較圖

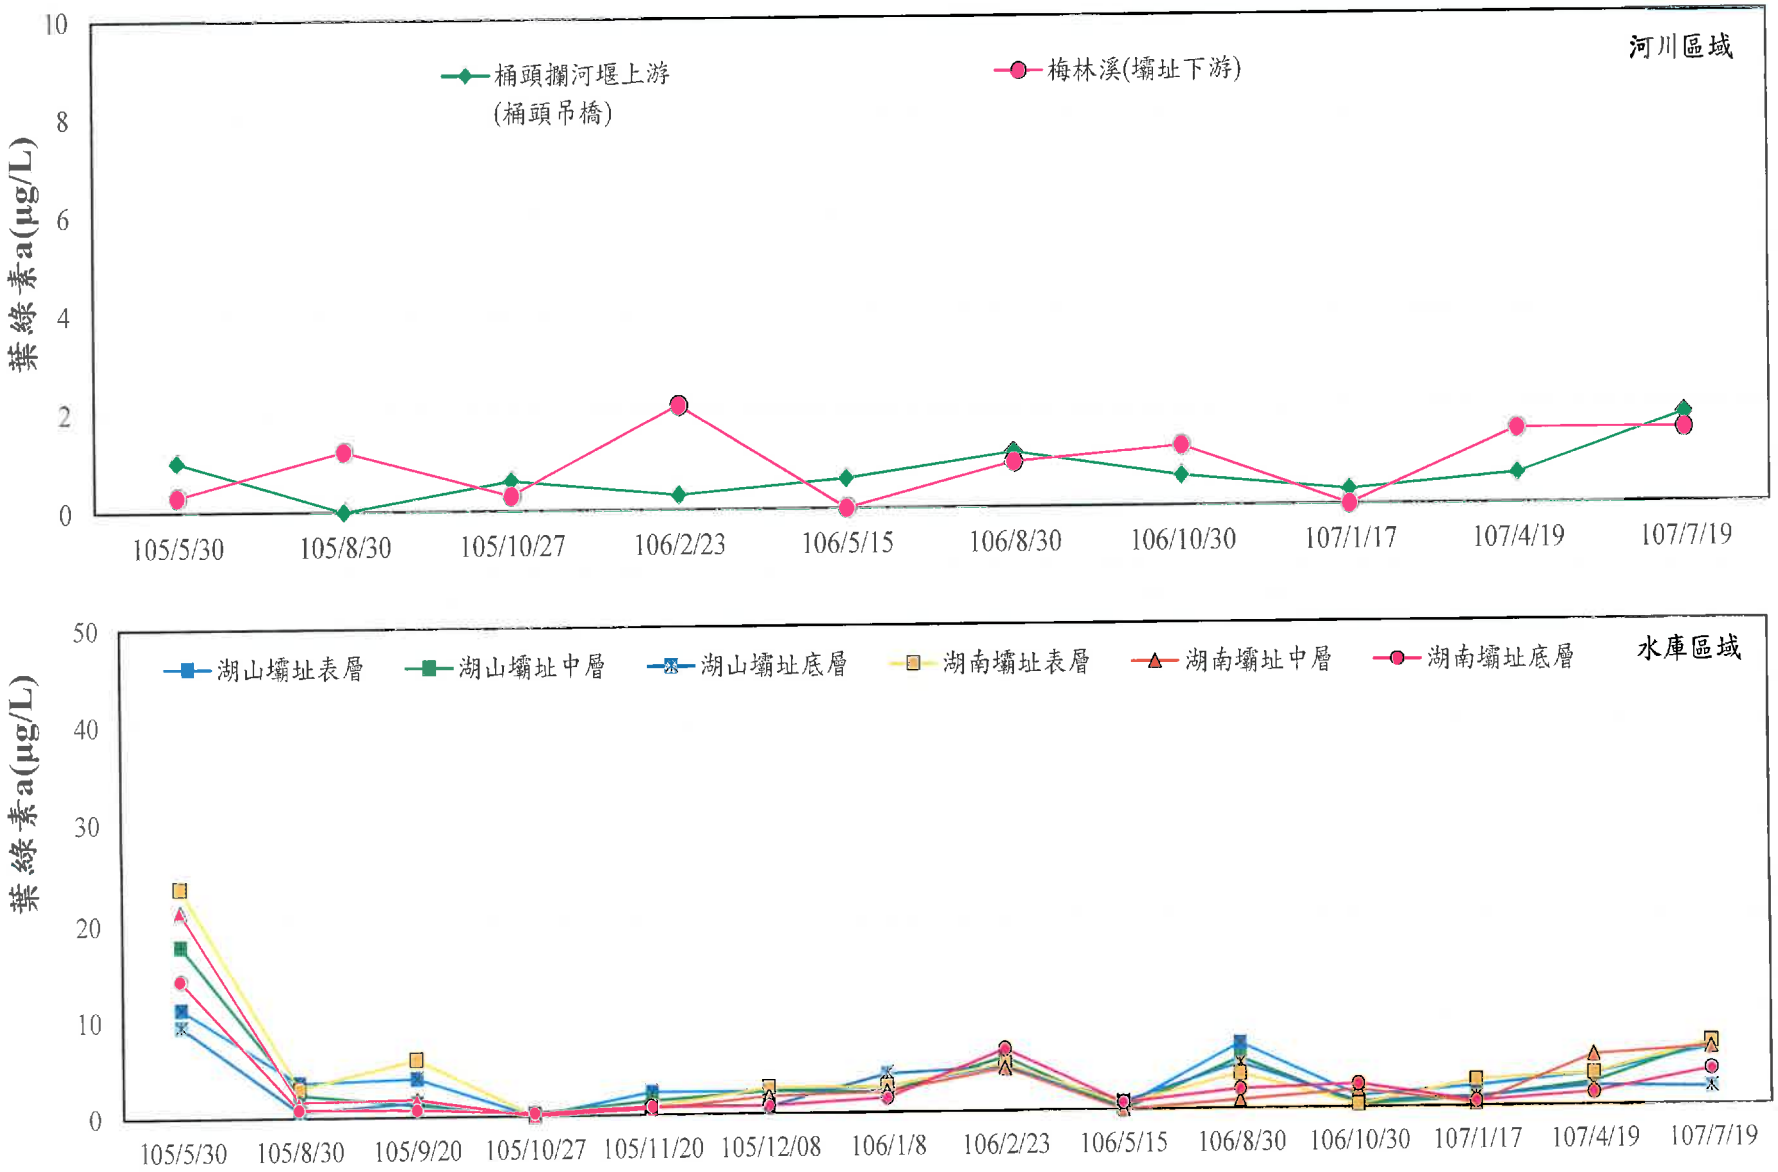

圖 2.3-47 歷次地面水質葉綠素-a 監測成果比較圖

2.4 交通量

本計畫交通量監測分為路段及路口測站，路段監測包含行車速度及路段交通量；路口監測包含路口延滯及路口交通量。監測頻率為每季 1 次，監測位置係依據本計畫環境影響報告書及歷次環差報告規定進行定期監測；綜此，本季於雲 214 鄉道(雲 55 鄉道交會口至玉當山)、149 縣道(投 52 鄉道交會口至 158 甲縣道交會口)及材料運輸道路(台 3 省道交會口至光復路)等 3 處進行路段監測，而路口監測則於「台 3 省道與雲 55 鄉道路口」、「台 3 省道與 149 縣道路口」、「台 3 省道與雲 214 鄉道路口」及「台 3 省道與雲 67-1 路口」等 4 處進行監測。本季於 7 月 13 日進行監測，路段監測成果如表 2.4-1、路口監測成果則如表 2.4-2 所示，另歷年各路段交通流量之尖峰小時服務水準及各路口平均延滯服務水準彙整如圖 2.4-1~圖 2.4-7 及附錄四，茲將各監測項目本季及歷次監測成果分別說明如下：

2.4.1 路段

一、行車速率

(一)雲 214 鄉道(雲 55 鄉道交會口至玉當山段)

本路段之平均總旅行速率介於 26.4~29.9km/hr；平均總行駛速率介於 24.9~36.5km/hr，以 17:00～19:00 時段往東方向為最低。本路段歷次監測之平均總旅行速率介於 26.0~47.8km/hr，平均總行駛速率介於 26.6~49.8km/hr，顯示本次部分時段監測速率稍慢但無明顯異常。

(二)149 縣道(投 52 鄉道交會口至 158 甲縣道交會口段)

本路段之平均總旅行速率介於 35.9~39.2km/hr 之間；平均總行駛速率介於 36.7~42.2km/hr 之間，以 7:00~9:00 往南方向為最低。本路段歷次監測之平均總旅行速率介於 33.5~48.8km/hr，平均總行駛速率介於 33.6~51.3km/hr，顯示本次監測無明顯異常。

(三)材料運輸道路(台 3 省道交會口至光復路)(現已更名為水庫路)

本路段之平均總旅行速率介於 43.0~48.3km/hr 之間；平均總行駛速率介於 40.0~48.9km/hr 之間，以 7:00～9:00 時段往西北方向為最低。本路段歷次監測之平均總旅行速率介於 31.8~50.1km/hr，平均總行駛速率介於 34.5~47.8km/hr，顯示本次監測速率稍快但無明顯異常。

二、交通量

(一)雲 214 鄉道(雲 55 鄉道交會口至玉當山段)

本路段晨、昏峰之交通流量介於 225~312PCU/hr 之間，以昏峰時段 17:00～18:00 往西方向(斗六)之交通流量最大，晨、昏尖峰時段之道路服務水準均為 C 級。

(二)149 縣道(投 52 鄉道交會口至 158 甲縣道交會口段)

本路段晨、昏峰之交通流量介於 136~167PCU/hr 之間，以昏峰時段 17:00～18:00 往南方向(桶頭)之交通流量最大，晨、昏尖峰時段之道路服務水準介於 A~B 之間。

(三)材料運輸道路(台 3 省道交會口至光復路)(現已更名為水庫路)

本路段晨、昏峰之交通流量介於 53~144PCU/hr 之間，以晨峰時段 08:00～09:00 往東南方向(湖山)之交通流量最大，晨、昏尖峰時段道路服務水準均為 B 級。

2.4.2 路口

一、路口延滯

由「台灣地區公路容量手冊技術報告」之號誌化交叉口服務水準評估等級如下表所示，各路口之路口延滯詳如表 2.4-2 所示。

服 務 水 準	平均停止延滯（秒）
A	～15
B	15～30
C	30～45
D	45～60
E	60～80
F	80～

資料來源：交通部運輸研究所，「台灣地區公路容量手冊」，100 年 10 月。

(一)台 3 省道及雲 55 鄉道路口

本路段之晨、昏峰之交叉路口平均延滯分別為 19.3 及 24.0 秒/PCU，服務水準均為 B 級；本路段歷次監測之路口平均延滯分別為 9.0~40.0 秒/PCU，服務水準介於 A~C 級。

(二)台 3 省道及 149 縣道路口

本路段之晨、昏峰之交叉路口平均延滯分別為 9.5 及 14.8 秒/PCU，服務水準均為 A 級；本路段歷次監測之路口平均延滯分別為 7.5~122 秒/PCU，服務水準介於 A~F 級。

(三)台 3 省道及雲 214 鄉道路口

本路段之晨、昏峰之交叉路口平均延滯分別為 12.0 及 10.3 秒/PCU，服務水準均為 A 級；本路段歷次監測之路口平均延滯分別為 11.0~41.0 秒/PCU，服務水準介於 A~C 級。

(四)台 3 省道與雲 67-1 路口

本路段之晨、昏峰之交叉路口平均延滯分別為 21.0 及 18.5 秒/PCU，服務水準均為 B 級；本路段歷次監測之路口平均延滯分別為 5.3~78.0 秒/PCU，服務水準介於 A~E 級。

二、路口交通量

依據 2011 年台灣地區公路容量手冊所訂之「一般區段車種小客車當量值」進行各車種交通量之轉換計算各路口之交通量詳如表 2.4-2 所示。

(一)台 3 省道及雲 55 鄉道路口

本路段晨、昏峰之交通流量介於 379~1,158PCU/hr 之間，以台 3 省道昏峰 18:00～19:00 來自二高方向之交通流量最大。

(二)台 3 省道及 149 縣道路口

本路段晨、昏峰之交通流量介於 465~596PCU/hr 之間，以台 3 省道昏峰 17:00～18:00 來自林內方向之交通流量最大。

(三)台 3 省道及雲 214 鄉道路口

本路段晨、昏峰之交通流量介於 241~1,273PCU/hr 之間，以台 3 省道昏峰 17:00～18:00 來自林內方向之交通流量最大。

(四)台 3 省道與雲 67-1 路口

本路段晨、昏峰之交通流量介於 276~543PCU/hr 之間，以台 3 省道晨峰 8:00～9:00 來自林內方向之交通流量最大。

表 2.4-1 本季各路段交通量監測成果表

路段	方向		監測日期	時程	平均總旅行速率(KPH)	平均總行駛速率(KPH)	發生時間	交通流量PCU/H(V)	設計容量PCU/H(C)	V/C	服務水準
雲214鄉道	雲55鄉道～玉當山	往東(玉當山)	107.7.13	7:00~9:00	26.4	36.5	晨峰 07:00~08:00	244	1200	0.204	C
				17:00~19:00	27.1	24.9	昏峰 17:00~18:00	225	1200	0.188	C
		往西(斗六)		7:00~9:00	29.3	29.1	晨峰 08:00~09:00	266	1200	0.222	C
				17:00~19:00	29.9	29.8	昏峰 17:00~18:00	312	1200	0.260	C
149縣道	投52鄉道～158甲縣道	往南(桶頭)	107.7.13	7:00~9:00	35.9	36.7	晨峰 08:00~09:00	136	3600	0.038	A
				17:00~19:00	39.2	39.7	昏峰 17:00~18:00	167	3600	0.046	B
		往北(竹山)		7:00~9:00	39.0	41.4	晨峰 08:00~09:00	157	3600	0.044	B
				17:00~19:00	37.3	42.2	昏峰 17:00~18:00	144	3600	0.040	B
材料運輸道路(現更名為水庫路)	台3省道～光復路	往東南(湖山)	107.7.13	7:00~9:00	48.3	44.0	晨峰 08:00~09:00	144	1200	0.120	B
				17:00~19:00	44.0	45.5	昏峰 17:00~18:00	122	1200	0.101	B
		往西北(台3線)		7:00~9:00	45.0	40.0	晨峰 08:00~09:00	71	1200	0.059	B
				17:00~19:00	43.0	48.9	昏峰 18:00~19:00	53	1200	0.044	B

表 2.4-2 本季各路口交通量監測成果表

調查日期		發生時間		方向	交叉路口		
					交通流量 PCU/H	平均延滯秒/PCU	服務水準
台3雲55路口 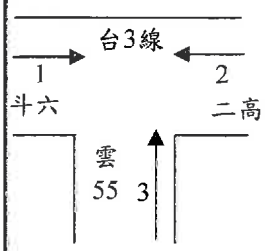 	107.7.13	晨峰	07:00~08:00	1	1,046	19.3	B
				2	931		
				3	379		
		昏峰	18:00~19:00	1	1,153	24.0	B
				2	1,158		
				3	402		
台3縣149路口 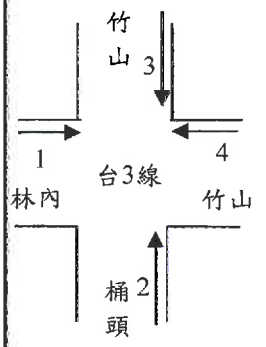 	107.7.13	晨峰	07:00~08:00	1	577	9.5	A
				2	527		
				3	465		
				4	508		
		昏峰	17:00~18:00	1	596	14.8	A
				2	522		
				3	503		
				4	533		
台3雲214路口 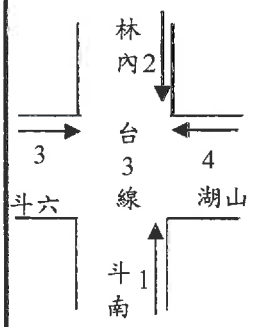 	107.7.13	晨峰	07:00~08:00	1	1,246	12.0	A
				2	1,164		
				3	241		
				4	470		
		昏峰	17:00~18:00	1	880	10.3	A
				2	1,273		
				3	299		
				4	527		
台3雲67-1路口 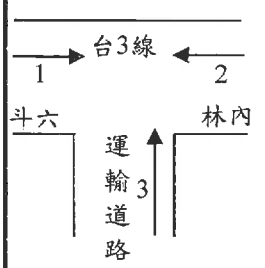 	107.7.13	晨峰	08:00~09:00	1	357	21.0	B
				2	543		
				3	276		
		昏峰	18:00~19:00	1	415	18.5	B
				2	454		
				3	283		

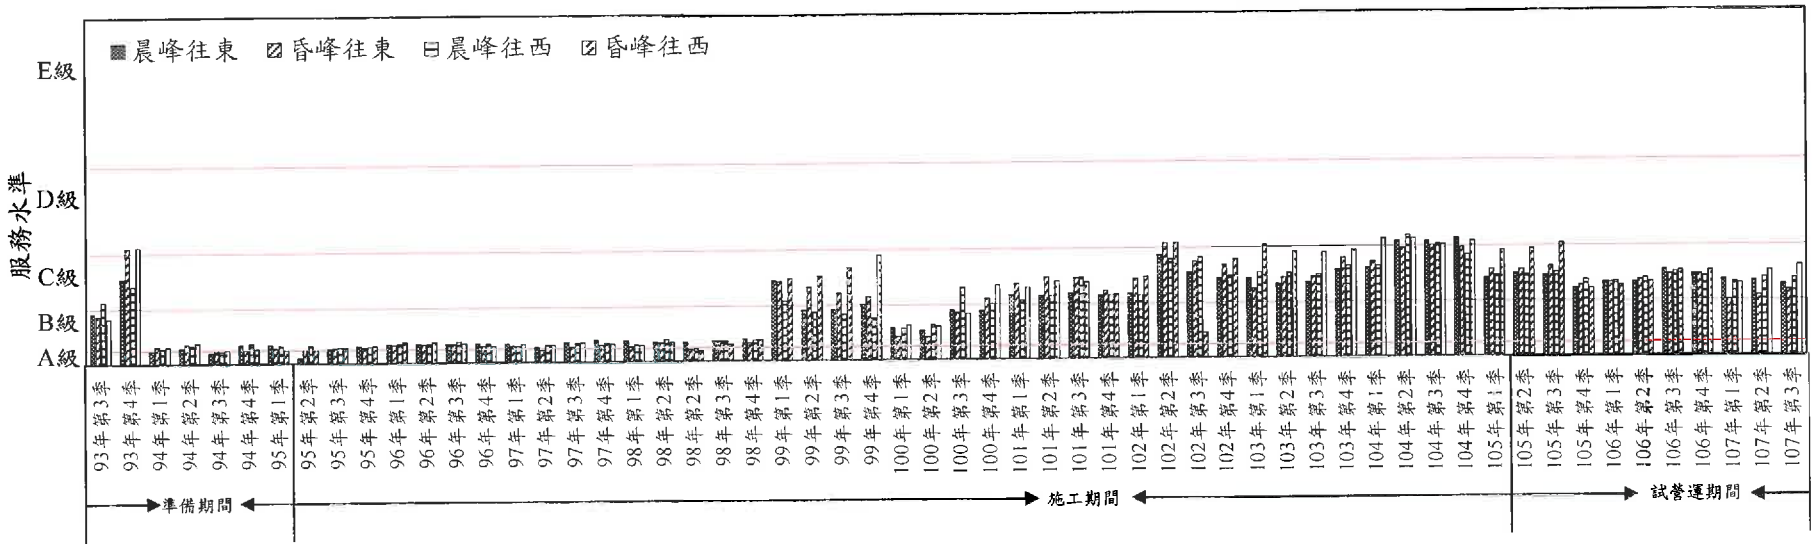

圖 2.4-1 歷年雲 214 鄉道尖峰小時服務水準

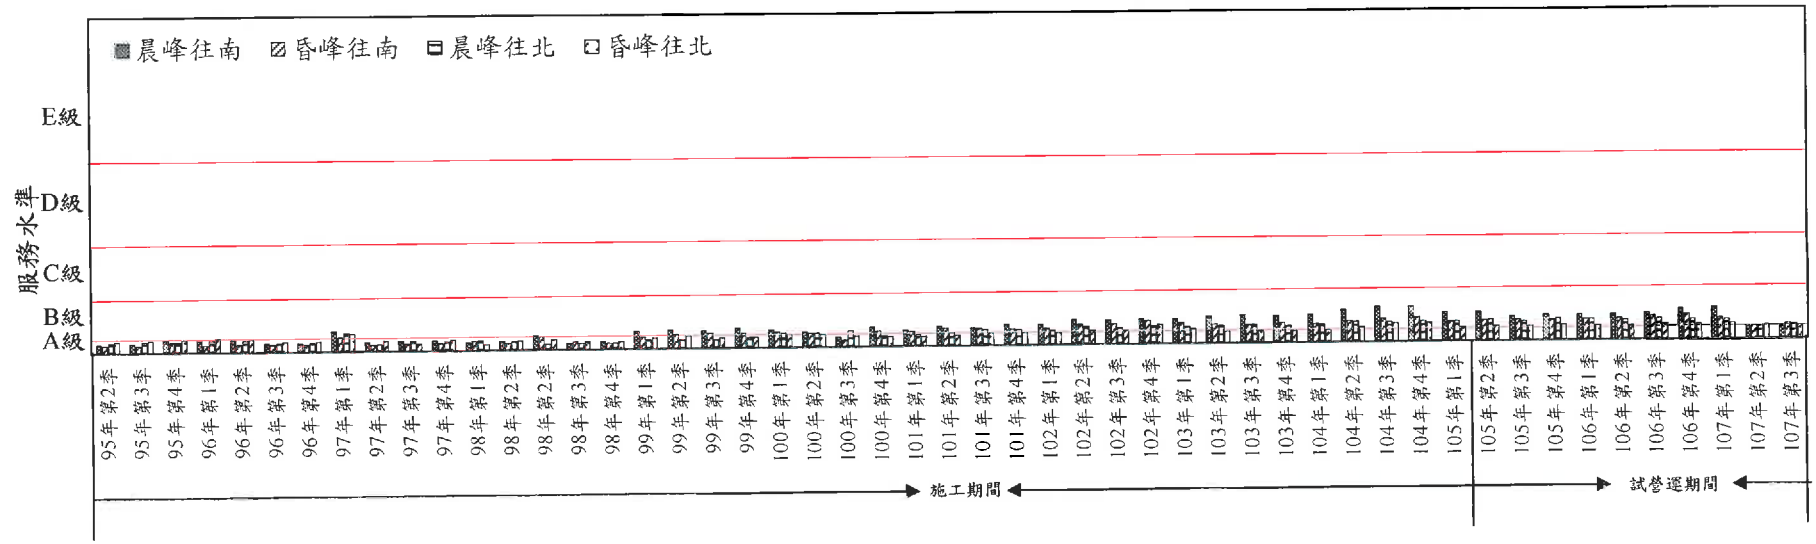

圖 2.4-2 歷年 149 縣道尖峰小時服務水準

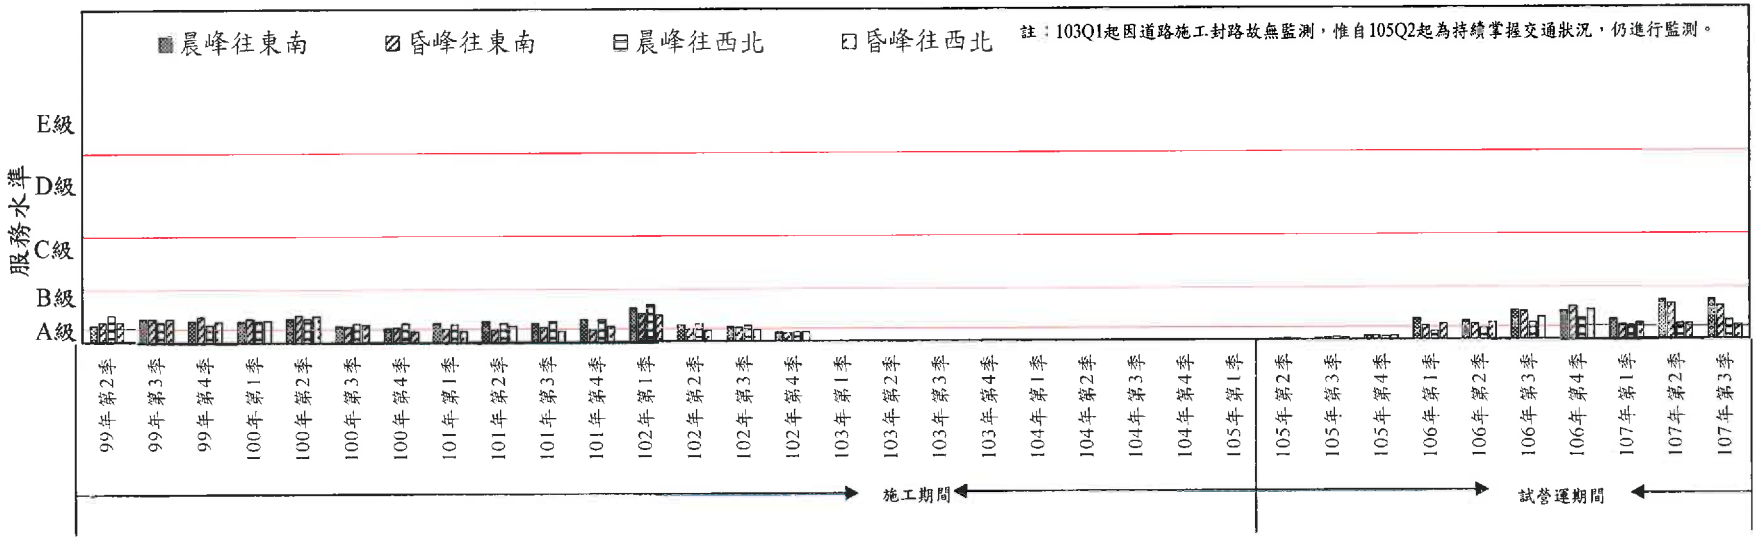

圖 2.4-3 歷年材料運輸道路尖峰小時服務水準

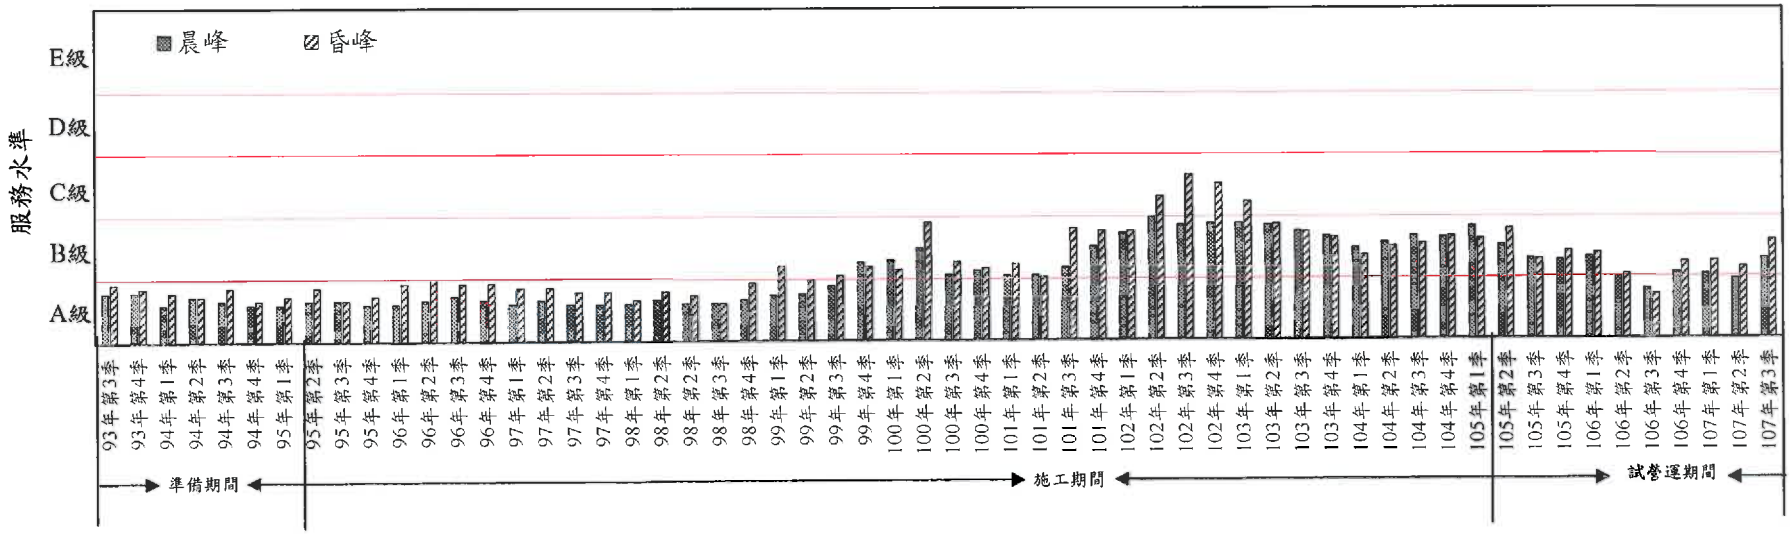

圖 2.4-4 歷年台 3 省道-雲 55 鄉道路口平均延滯服務水準

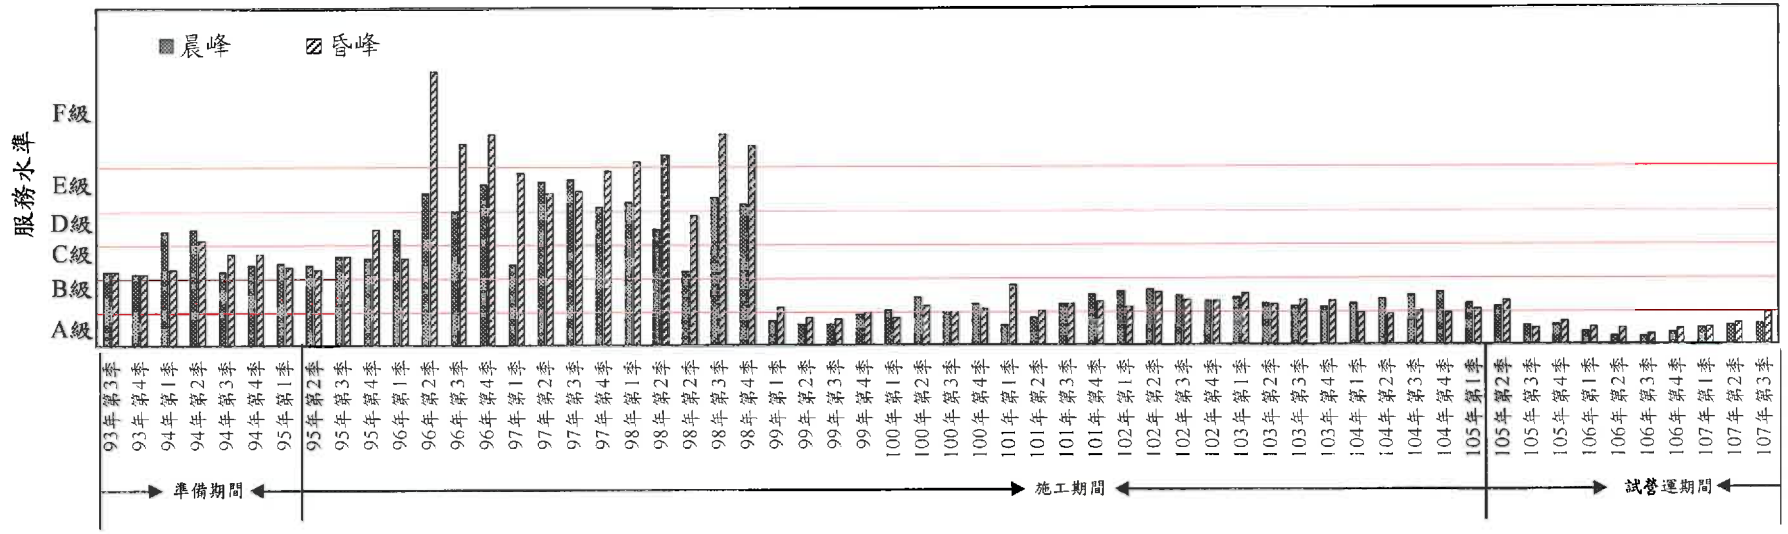

圖 2.4-5 歷年台 3 省道-149 縣道路口平均延滯服務水準

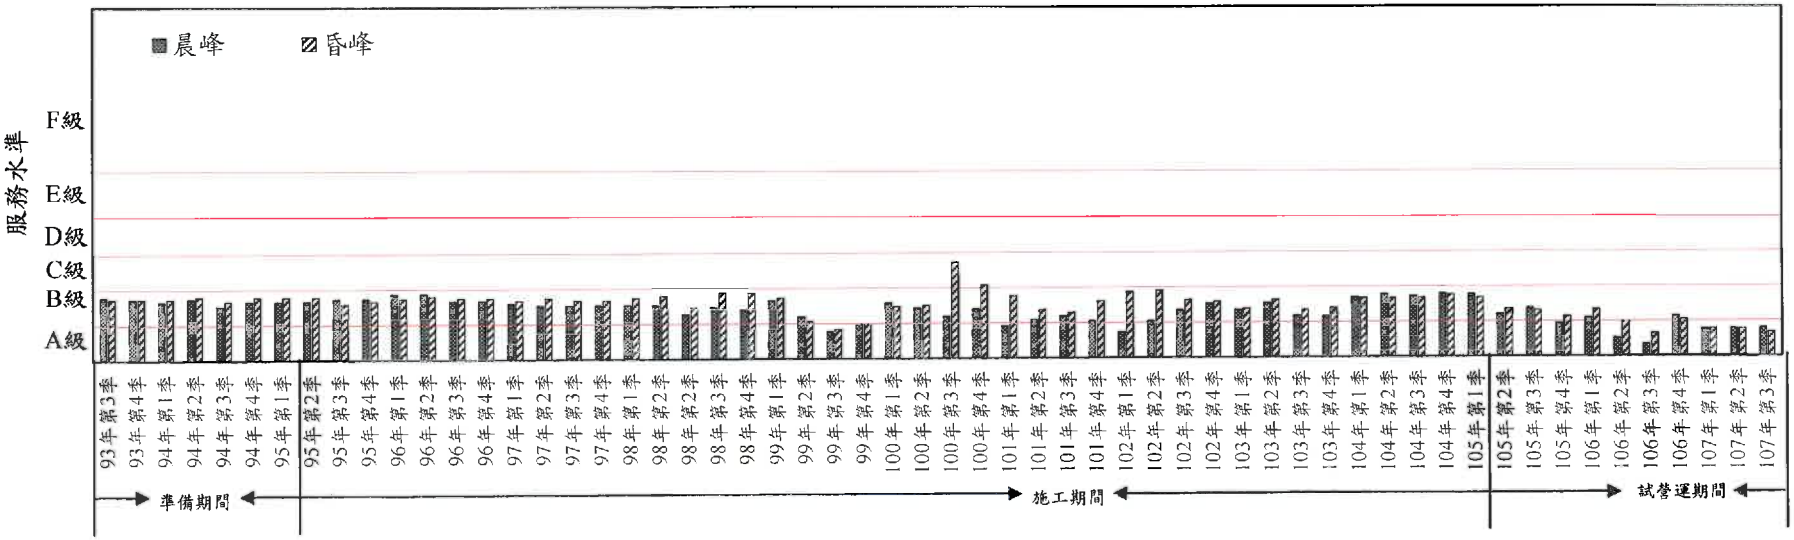

圖 2.4-6 歷年台 3 省道-雲 214 鄉道路口平均延滯服務水準

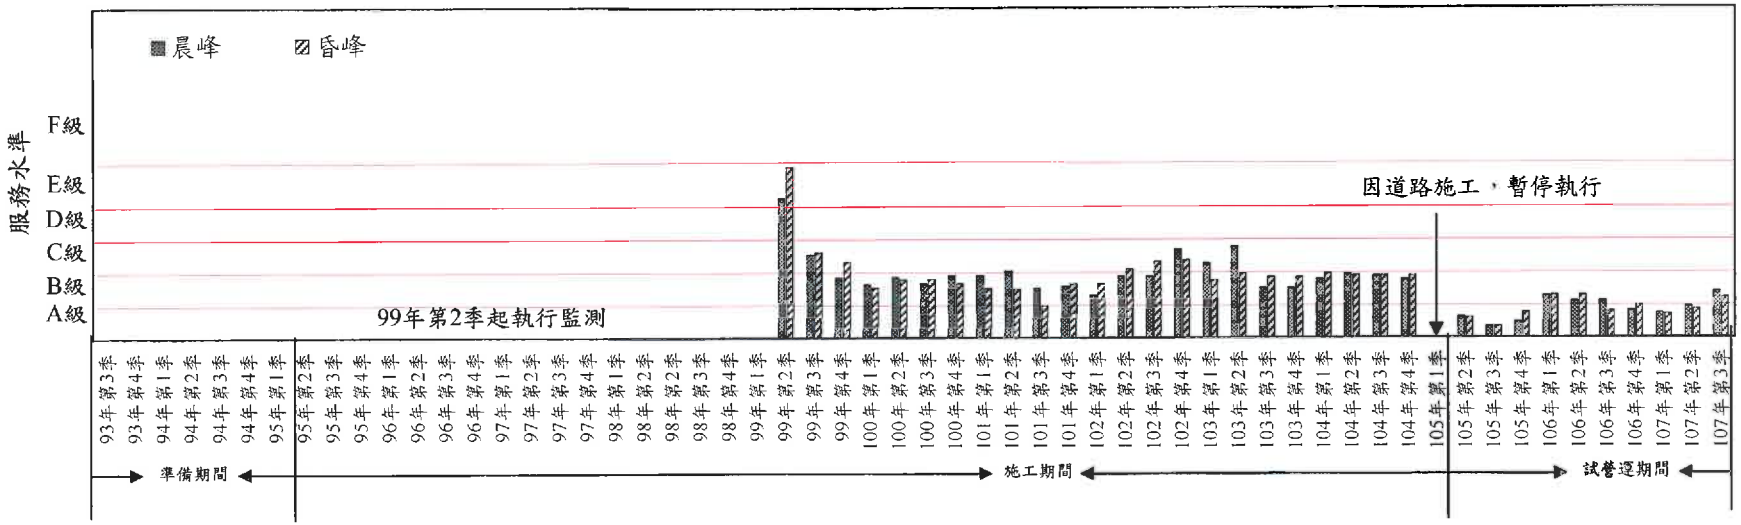

圖 2.4-7 歷年台 3 省道-雲 67-1 鄉道路口平均延滯服務水準

2.5 水域生物

本計畫水域生物監測項目為魚類、水生昆蟲、蝦蟹螺貝類、浮游藻類、附著性藻類、浮游動物及蜻蜓，監測地點為清水溪流域(桶頭吊橋、桶頭橋及桶頭橋下游測站)、雷公坑溪(上游天心橋、下游)及梅林溪(梅南橋測站)等 6 處測站，監測頻率為每季 1 次，清水溪則於每年 2、5、9 月各增加 1 次監測。此外，因應湖山水庫工程計畫第三次環境影響差異分析報告之變更，故自 100 年第 2 季起新增引水工程沿線之環境監測計畫，增加蝦蟹螺貝類、浮游動植物、附著性藻類之監測項目；因應湖山水庫工程計畫第四次環境影響差異分析報告之變更，新增蜻蜓類監測項目及自 101 年第 3 季起依環保署 100 年 7 月新修訂公告「動物生態評估技術規範」(公告字號環署綜字第 1000058655C 號)。由於水庫 2016 年 5 月開始進入試營運期間，因此增加水庫區的監測，監測地點為湖南(第一)取出水工附近、湖山(第二)取出水工附近與引水隧道出口附近等 3 處測站，監測頻率為每季 1 次。每次監測均進行三重複次數努力量，各項動物監測數量資料則以每次監測三日之最大值呈現，但是為避免水域生物之損傷，電氣捕魚法每季每一測站，進行一次努力量。本季水域生物監測時間如表 2.5-1 所示，測站分別為清水溪(桶頭吊橋、桶頭橋及桶頭橋下游)、梅林溪(梅南橋)、雷公坑溪(上游天心橋、下游)等 6 處測站，水庫區分別為湖南(第一)取出水工附近、湖山(第二)取出水工附近與引水隧道出口附近等 3 處測站(如圖 1.4-5 所示)，相關監測結果說明如下。

本季監測桶頭橋下游於 7 月 10 日至 13 日完成，桶頭吊橋、桶頭橋及水庫區於 7 月 17 日至 20 日完成；雷公坑溪與梅林溪則於 7 月 10 日至 13 日完成；9 月份的補充監測於 9 月 3 至 6 日完成，魚道效益評估則於 9 月 4 至 7 日完成。本季監測時已為夏季，所以天氣主要為晴至多雲狀態，中午以後也經常有午後雷陣雨，氣溫也明顯偏高。整體而言，本季已進入雨季，7 月常有午後雷陣雨，所以清水溪的水域面積與水流量明顯增加，水體出現較為混濁的情形，另 9 月補充監測發現清水溪水體明顯混濁且含沙量高。此外，桶頭橋下游測站的地形也出現變化，原先因大水沖刷而形成的陡坡再次因為大水而被沖平。雷公坑溪則無太大的變化，梅林溪的河道景觀工程已完工，並恢復為有水的狀態，惟棲地環境已出現非常大的改變，由原先水域面積較窄且有流速的狀態，轉變為較寬的水域面積，且水體深度卻變淺呈幾乎靜止的狀態，且水體也明顯較施工前混濁。

水庫區方面，本季監測時水位介於 184.75 至 184.91 公尺之間，水位較上一季(107 年第 2 季 174.62 至 174.66 公尺之間)上升，庫區內環境維持穩定而無明顯變動，而水色呈現藍灰色。而位在南勢坑溪的引水隧道出口因為受到取水與否的影響，因此水流量與水域面積的變化較為明顯，水體在取水時因水流量非常大而較為混濁，未取水時則水流量明顯減少且較為清澈，棲地環境也大致與上一季相同無明顯的變

動。本季水域生物各物種名錄詳見附錄三，而各物種歷次監測結果比較如附錄四及內文圖 2.5-1、圖 2.5-3、圖 2.5-5、圖 2.5-7、圖 2.5-9、圖 2.5-11、圖 2.5-13 所示；歷年同季監測結果比較如附錄四及內文圖 2.5-2、圖 2.5-4、圖 2.5-6、圖 2.5-8、圖 2.5-10、圖 2.5-12、圖 2.5-14 所示；相關監測結果比對分析說明如下：

2.5.1 魚類

由於部份魚類的中文名已有所變更，因此本文撰寫時將根據「臺灣物種名錄」變更之中文名做為依據。中文名已有所變更之魚類，分別為臺灣馬口魚變更為臺灣鬚鱲(2012 年 4 月 10 日變更)；高身鏟柄魚變更為高身小鰾鮈(2012 年 4 月 10 日變更)；臺灣鏟頜魚變更為臺灣白甲魚(2012 年 3 月 5 日變更)；粗首鱲變更為粗首馬口鱲(2012 年 3 月 29 日變更)；臺灣鮀變更為短臀瘋鱨(2016 年 12 月 25 日變更)。

一、河川水域生物

(一)本季監測成果

桶頭吊橋測站 7 月共記錄 3 科 5 種 31 隻次(其中手抄網、蝦籠法與長沉籠法共發現 2 科 3 種 6 隻次、電魚法發現 3 科 5 種 25 隻次)，數量以明潭吻鰕虎(*Rhinogobius candidianus*)為優勢種。9 月共記錄 4 科 9 種 35 隻次(其中手抄網、蝦籠法與長沉籠法共發現 2 科 5 種 10 隻次、電魚法發現 4 科 9 種 25 隻次)，數量以粗首馬口鱲(*Opsariichthys pachycephalus*)為優勢種。本季監測到的魚類除了臺灣白甲魚(*Onychostoma barbatulum*)之外，其他皆為臺灣特有種(如臺灣間爬岩鰍(*Sinogastromyzon puliensis*)、臺灣石魚賓(*Acrossocheilus paradoxus*)、粗首馬口鱲、明潭吻鰕虎等)，保育類為埔里中華爬岩鰍(*Sinogastromyzon puliensis*)。桶頭吊橋測站 7 月多樣性指數為 1.22，均勻度指數為 0.76，IBI 指數為 40，水質屬於普通(Fair)的等級。9 月多樣性指數為 2.04，均勻度指數為 0.89，IBI 指數為 40，水質屬於普通(Fair)的等級。

桶頭橋測站 7 月共記錄 2 科 4 種 17 隻次(其中手抄網、蝦籠法與長沉籠法共發現 1 科 2 種 3 隻次、電魚法發現 2 科 4 種 14 隻次)，數量以臺灣鬚鱲(*Candidia barbata*)為優勢種。9 月僅記錄 1 科 1 種 6 隻次(其中手抄網、蝦籠法與長沉籠法共發現 1 科 2 種 2 隻次、電魚法發現 1 科 1 種 2 隻次)，為高身小鰾鮈(*Microphysogobio alticorpus*)。本季監測到的魚類皆為臺灣特有種(臺灣石魚賓、臺灣鬚鱲、高身小鰾鮈、明潭吻鰕虎)，，但是未監測到保育類。桶頭橋測站 7 月多樣性指數為 1.03，均勻度指數為 0.74，IBI 指數為 38，水質屬於普通(Fair)的等級。9 月因為僅監測到 1 種魚類，所以多樣性指數為 0，均勻度指數無法計算，IBI 指數為 32，水質屬於較差(Poor)的等級。

桶頭橋下游測站 7 月共記錄 2 科 5 種 40 隻次(其中手抄網、蝦籠法與長沉籠法共發現 2 科 4 種 5 隻次、電魚法發現 2 科 5 種 35 隻次)，數量以粗首馬口鱲為優勢種。9 月共記錄 3 科 5 種 33 隻次(其中手抄網、蝦籠法與長沉籠法共發現 1 科 3 種 6 隻次、電魚法發現 3 科 4 種 27 隻次)，數量以明潭吻鰕虎為優勢種。本季所監測到的魚類皆為臺灣特有種(臺灣間爬岩鰍、臺灣石魚賓、高身小鰾鮈、粗首馬口鱲、何氏棘魚(*Spinibarbus hollandi*)、明潭吻鰕虎)，但是未監測到保育類。桶頭橋下游測站 7 月多樣性指數為 1.54，均勻度指數為 0.96，IBI 指數為 38，水質屬於普通(Fair)的等級。9 月多樣性指數為 1.38，均勻度指數為 0.86，IBI 指數為 38，水質屬於普通(Fair)的等級。

梅南橋測站 7 月共記錄 2 科 2 種 2 隻次(其中手抄網、蝦籠法與長沉籠法共發現 2 科 2 種 2 隻次)，無優勢種。梅南橋測站 7 月多樣性指數為 0.69，均勻度指數為 1.00，IBI 指數為 22，水質屬於極差(Very Poor)的等級。

雷公坑溪上游(天心橋)測站 7 月共記錄 2 科 5 種 58 隻次(其中手抄網、蝦籠法與長沉籠法共發現 1 科 3 種 9 隻次、電魚法發現 2 科 4 種 49 隻次)，數量以粗首馬口鱲最為優勢。本季所監測到的魚類皆屬於臺灣特有種魚類(臺灣石魚賓、臺灣鬚鱲、粗首馬口鱲、明潭吻鰕虎、短吻紅斑吻鰕虎(*R. rubromaculatus*))，不過並無保育類的魚類。雷公坑溪上游(天心橋)測站 7 月多樣性指數為 1.55，均勻度指數為 0.96，IBI 指數為 40，水質屬於普通(Fair)的等級。

雷公坑溪下游測站 7 月共記錄 3 科 6 種 77 隻次(其中手抄網、蝦籠法與長沉籠法共發現 2 科 5 種 16 隻次、電魚法發現 3 科 6 種 61 隻次)，數量以粗首馬口鱲最為優勢。本季所監測到的魚類皆屬於臺灣特有種魚類(臺灣石魚賓、高身小鰾鮈、粗首馬口鱲、何氏棘魚、短臀瘋鱨(*Tachysurus brevianalis*)、明潭吻鰕虎)，不過並無保育類的魚類。雷公坑溪下游測站 7 月多樣性指數為 1.56，均勻度指數為 0.87，IBI 指數為 40，水質屬於普通(Fair)的等級。

(二)歷次監測結果檢討

1.與歷年各次比對

歷年清水溪桶頭吊橋測站之監測結果，種數介於 0~11 種之間。由歷年監測結果可知，每年在第 2~4 季時易因為水域面積增加，梅雨及颱風或其他降雨的影響，使得魚類數量及種數出現較明顯的減少。而 97 年第 3 季(7 月) 與 99 年受到颱風破壞的固床工復建工程完工，使得桶頭吊橋至桶頭橋間河段有所變動。104 年第 1 季因為受到乾旱的影響，使得

水域面積明顯縮小，因此種數與數量明顯增加。105 年第 4 季因為颱風(莫蘭蒂、梅姬)帶來的豪雨將泥沙沖刷至下游，許多石塊再次裸露出來，使得爬鰍科的數量明顯變多。

本季桶頭吊橋測站受雨季影響，使得水體已較為混濁，且水域面積增加許多，以致魚類的種數與數量都較為減少，但仍維持在歷年的變動之內。整體而言，桶頭吊橋測站歷年的魚類監測來看種數大多都能維持在 5~8 種之間，以每年第 1 季與第 2 季的 4 月所監測到的數量會較多。但是雨季之後，依然會受到上游崩塌地的輸沙的影響，使得水體常有混濁的現象且底質受到泥沙覆蓋的情形仍在，長久而言對於需要有大量縫隙做為微棲地的臺灣間爬岩鰍與埔里中華爬岩鰍生存較為不利。

歷年清水溪桶頭橋測站之監測結果，種數介於 2~12 種之間，種數及數量變化相當大。本測站由歷年監測結果同樣可以發現每年在第 2~4 季時易受梅雨及颱風或其他降雨的影響，以致水域面積增加，使得魚類數量及種數較明顯減少。97 年第 3 季(7 月) 與 99 年因颱風影響而毀損的固床工，其工程復健已完工，也使得魚類棲地環境有減少趨勢。104 年第 1 季因為受到乾旱的影響，使得水域面積明顯縮小，因此種數與數量則有所增加。105 年第 4 季，因為受到颱風(莫蘭蒂、梅姬)所帶來的影響，棲地環境受到大量泥沙覆蓋，使得數量為歷次監測以來最少的一季。

本季桶頭橋測站的種數與數量與歷年監測結果相比，大致呈現穩定的狀態，數量同樣較為減少，但是都仍在歷年的變化內。整體而言，由於河道在桶頭橋測站轉為開闊且深，再加上桶頭固床工完成後，使得水流在此受到攔截，水流速到此測站後明顯減緩並形成深潭的棲地類型。因此，自上游而來的泥沙會在此大量沉澱累積，並覆蓋原有的硬底質棲地，而水體也經常出現較為混濁的現象。本季監測時曾發生籠具一夜之間就被泥沙給掩埋的情形，顯示水體中泥沙的含量明顯偏高。本測站於 103 年以後已幾乎未見臺灣間爬岩鰍與埔里中華爬岩鰍，顯示棲地形態的改變與覆蓋已使得該棲地較不適合臺灣間爬岩鰍與埔里中華爬岩鰍生存，取而代之的則為明潭吻鰕虎、高身小鰾鮈為主、粗首馬口鱲與臺灣鬚鱲等魚類。

自 101 年第 2 季起新增的桶頭橋下游測站，種數介於 2~9 種之間。由歷年監測結果可知，每年於第 2~4 季時易因梅雨及颱風或其他降雨的影響，促使水域面積增加，使得魚類數量及種數出現較明顯的變動。此外，102 年第 4 季與 103 年第 1~4 季受到上游引水工程施作的影響，使得魚類數量較為

減少。104 年第 1 季因為乾旱使得水域面積縮小，數量明顯增加。本測站係清水溪三處測站中有監測到血鸚鵡(*Amphilophus citrinellus* x *Paraneetroplus synspilus*)、巴西珠母麗魚(*Geophagus brasiliensis*)與尼羅口孵非鯽(*Oreochromis niloticus niloticus*)等外來種，其數量仍屬稀少。

本季桶頭橋下游測站 7 月棲地環境大致維持穩定，由於受到降雨的影響，以致水域面積與水勢明顯變大，故魚類的種數與數量較為下降，但仍維持在歷年的變化之內。9 月監測時，因為受到 8 月 23 日與 24 日大雨的影響，使得棲地環境因而改變，再加上水體也轉為混濁，故魚類的種數與數量都較為減少。本季未再監測到外來種的尼羅口孵非鯽。整體而言，桶頭橋下游測站距離攔河堰與桶頭固床距離較遠，施工期間受到的影響較小，泥沙覆蓋的情形較上游的兩處測站(桶頭吊橋測站與桶頭橋測站)輕微，爰種數與數量為清水溪三處測站中最豐富的測站，魚類的種數大都能維持在 5 種以上且以底棲性(明潭吻鰕虎、高身小鰾鮈、臺灣間爬岩鰍及埔里中華爬岩鰍)魚類為主

歷年梅林溪梅南橋測站之監測結果，種數介於 0~10 種之間。梅南橋測站的魚類種數與數量在施工前與停工期間，較施工期間 (95 年第 2 季~103 年第 3 季)豐富，而施工期間後期(103 年第 3 季以後)因工程已逐漸減少，魚類的種數與數量皆較為豐富。本測站係所有測站中監測到最多外來種種數的測站(如高體高鬚魚(*Hypsibarbus pierrei*)、線鱧(*Channa striata*)、尼羅口孵非鯽等，亦是唯一監測到花鰻鱺(*Anguilla marmorata*)的測站。本測站於 105 年第 2 季湖山水庫開始蓄水後，由於河道一直能維持在基本流量的情形之下，魚類的種數與數量逐漸豐富，惟受到五河局進行河道景觀工程施作影響，使得梅南橋測站於 107 年第 1 季與第 2 季呈現完全乾涸的狀態。

本季梅南橋測站因五河局河道景觀工程已完工，現已恢復為有水的狀態，由於棲地已經整平，以致環境出現明顯的改變，棲地環境已由工程前流動型態的水域轉變為水域面積廣大的靜止水域，再加上水體呈現混濁的狀態，故魚類的種數與數量明顯減少，而回到 103 年第 3 季以前受河道整治干擾的狀態。此外，河道中出現數道橫斷河道且有所落差的的人工構造物(固床工)，可能影響魚類的洄游或區域間的移動。整體而言，梅南橋測站在雨季水量較豐沛且穩定期間，可發現較多魚類，但是在非雨季時因水量減少或乾涸時則會出現魚類的種數與數量減少或未監測到的情形。105 年第 2 季湖山水庫進入試營運期間後，使得本測站在非雨季時仍能保持穩一定的水流量，也使得魚類的種數與數量有上升的趨

勢。但是 106 年第 4 季至 107 年第 2 季因五河局進行河道景觀工程，棲地環境已明顯改變，後續將持續監測了解魚類種數與數量變化的情形。

歷年雷公坑溪上游測站之監測結果，種數介於 1~6 種之間，種數大多都能維持 5 種以上，歷年的第 1 季與第 2 季因棲地環境非常穩定，故數量會有所增加。歷年監測結果，數量除了在 97 年第 3 季至 98 年第 2 季間較為稀少之外，自 98 年第 3 季之後數量則開始逐漸穩定增加。104 年第 2 季因為乾旱的影響使得水域面積縮小，故數量明顯增加。106 年第 3 季因為棲地受到洪水的影響，使得棲地出現明顯的變動，造成數量有明顯的減少。本季棲地環境穩定，但因水域面積增加且流速較快的影響，魚類的數量則較為減少，但仍在歷年的變化之內。整體而言，本測站的棲地環境相對於其他測站明顯都較為穩定，而且水體大致都能維持清澈的狀態，也未有泥沙覆蓋棲地的問題，所以魚類的數量大多能比鄰近的清水溪豐富。歷年監測結果種數在 100 年以後幾乎都能穩定維持在 5 種以上。每年第 1 季跟第 4 季因為水域面積縮小與補充群(recruitmen)加入的關係，數量有時會有大量增加的現象，但是測站的前後各有一座高度較高的壩體，對於魚類、蝦蟹類的縱向移動容易產生阻斷的情形。

歷年雷公坑溪下游測站之監測結果，種數介於 0~8 種之間。由於本測站在每年的第 1 季與第 4 季會因降雨量不足而出現斷流的現象，所以種數與數量的變動大。自 98 年第 3 季，在有水流的情形大多都能維持 4 種以上，數量則有逐漸增加的趨勢。本季因為已經恢復為有水的狀態，所以監測到的魚類種數與數量尚屬豐富。整體而言，本測站在工程結束後已少有人為擾動的影響，棲地品質已逐漸好轉，種數與數量呈現逐漸增加的狀態，但是因為水流量變化較大，所以種數與數量的變動幅度也較大。此外，本測站 106 年第 4 季之前曾有四河局的工程擾動，但是本季種數與數量尚屬豐富，因此四河局的工程擾動應該未產生太大的影響。

此外，比對本計畫清水溪及梅林溪水質監測結果，懸浮固體及總磷之測值常有超過法規標準，主要多受自然因素(如梅雨、暴雨或颱風影響等)及人為因子(如農業行為、河床工程進行等)相互作用所致。因此，水域生物監測期間水質狀況較差時，優勢物種多可發現中度污染指標性生物(如粗首馬口鱲、搖蚊科(Chironomidae)、水蟲科(Corixidae)等)，於水質污染較輕微期間之監測結果，優勢物種可發現輕度污染指標性生物(如臺灣間爬岩鰍、臺灣石魚賓、短臀瘋鱨、扁蜉蝣科(Heptageniidae)與長鬚石蠶科(Stenopsychidae)等)。

桶頭吊橋及桶頭橋測站在 98 年以後因為水體中泥沙含量偏高，使得棲地受到泥沙覆蓋，導致臺灣間爬岩鰍與埔里中華爬岩鰍的數量減少，雖然 105 年第 4 季因 9 月的颱風帶來豪雨使得水流量與流速大增，並將原本覆蓋在石塊上的泥沙沖刷至下游，使得許多石塊重新裸露出來，臺灣間爬岩鰍與埔里中華爬岩鰍因此增加，但是受上游崩塌地的影響，仍舊會有泥沙量重新覆蓋石塊，使得棲地環境受到影響，使得桶頭橋下游測站的臺灣間爬岩鰍與埔里中華爬岩鰍的數量較桶頭吊橋測站與桶頭橋測站豐富。桶頭橋測站因為泥沙淤積嚴重，本季甚至發生一夜之間籠具幾乎掩埋的現象，使得該測站已鮮少監測到臺灣間爬岩鰍與埔里中華爬岩鰍。長時間懸浮固體過高可能導致水生生物的呼吸作用不良影響，對於棲地亦產生覆蓋的作用，對於偏好生活在懸浮固體較低的物種，如臺灣間爬岩鰍、埔里中華爬岩鰍、臺灣石魚賓、臺灣鬚鱲、短臀瘋鱨等容易產生不良的影響。

本季監測時亦同時測量水質因子，結果發現本季各測站的營養鹽都屬偏低，但是清水溪三處測站的懸浮物都較為偏高，故也成為魚類的種數與數量都較為減少的原因之一。梅林溪梅南橋測站的河道景觀工程雖已完工，但由於棲地型態已出現明顯的改變，水體也相當混濁，所以魚類的種數與數量明顯減少。雷公坑溪兩處測站(雷公坑溪上游測站與雷公坑溪下游測站)水體大致維持清澈的狀態，雷公坑溪下游測站的四河局工程目前並未造成太大的影響。整體而言，各測站本季監測時水域面積都較為增加，清水溪三處測站的水體也較為混濁，所以魚類的種數與數量都較為減少，而梅林溪梅南橋測站也因為工程緣故，棲地型態已出現明顯的改變，所以種數與數量都明顯減少。

2.與歷年同季比對

清水溪三處測站的種數在歷年同季(第 3 季)的比較中，大致都穩定呈現 4~8 種之間，而數量則是有呈現穩定的狀態。梅南橋測站因為受到工程擾動而大幅改變棲地的情形，使得魚類的種數與數量又回復到 104 年第 3 季受河道整治期間較為貧乏的狀態。雷公坑溪上游測站環境相對穩定，因此自 98 年以後種數都呈現穩定，但是本季的的數量則較為偏低，但是應屬於自然的變動。雷公坑溪下游測站種數同樣大致維持穩定，而數量雖然較 104 年第 3 季(7 月)與 105 年第 3 季(7 月)少，但是仍較 103 年第 3 季(7 月)以前豐富。

3.與上季比對

本季清水溪三處測站與雷公坑溪上游測站的魚類種數大致維持穩定狀態，但數量較為減少。梅南橋測站上一季因為處於施工而無水的狀態，所以無法進行比較。而雷公坑溪下游測站同樣因為呈現乾涸的狀態，所以亦無法進行比較。

4.與環評期間比對

原環評報告於桶頭記錄 16 種魚類，本監測於桶頭吊橋測站共累計記錄 14 種魚類，其中實際差異共有 16 種。原環評報告有記錄而本監測未記錄的為花鰻鱺、短吻小鰾鮈(*M. brevirostris*)、泥鰍(*Misgurnus anguillicaudatus*)、鯰(*Silurus asotus*)、長脂擬鱨(*T. adiposalis*)、食蚊魚(*Gambusia affinis*)、黃鱔(*Monopterus albus*)、吉利非鯽(*Tilapia zillii*)、褐吻鰕虎(*R. brunneus*)；原環評報告無而本監測有記錄的為短吻紅斑吻鰕虎、明潭吻鰕虎、短臀瘋鱨、埔里中華爬岩鰍、臺灣間爬岩鰍、平頜鱲(*Zacco platypus*)、高身小鰾鮈、何氏棘魚。由差異物種生物特性來看，泥鰍、黃鱔、食蚊魚等均為棲息於流速較緩或靜止之水域，而吉利非鯽則多屬於河川中下游的物種。此外，埔里中華爬岩鰍、高身小鰾鮈、平頜鱲、短臀瘋鱨等，為河川中上游流動水域的物種，由於原環評報告中無明確測站位址。因此由物種特性差異看來，應是河川棲地型態因大水而改變使得物種的組成出現差異。但是若將每季監測到的種數與環評其間相比，可以發現每季監測到的種數都比環評期間低，由此顯示水庫建立的過程中或是因梅雨與颱風帶來的大水，改變原有的棲地後魚類的群聚便會產生變化，使得種數減少並由某些種類成為優勢種，雖然大多數的測站其種數有增加或穩定持平的現象，但是魚類群聚可能仍是較為脆弱，容易受到環境變動而產生種數或數量大量減少的現象。不過目前桶頭攔河堰的工程已經結束，目前已無工程擾動，原先消失的物種是否可能再回到本棲地，將會持續監測。

原環評報告中，梅林溪僅記錄 2 種(粗首馬口鱲、褐吻鰕虎)，但本監測累計共記錄 13 種魚類，而比對差異共達 14 種，分別為花鰻鱺、臺灣石魚賓、鯽魚(*Carassius auratus auratus*)、高身小鰾鮈、臺灣鬚鱲、高體高鬚魚、何氏棘魚、鯰、中華花鰍(*Cobitis sinensis*)、食蚊魚、吉利非鯽、明潭吻鰕虎、短吻紅斑吻鰕虎與線鱧。差異較大的原因應與梅林溪水量不穩定有關，當監測遇到豐水期或暴雨時，上游的魚種會隨著水流移動至監測測站，豐水期時，該測站可提供不同的棲地類型吸引魚類利用，故豐水期時的種數也會增加，因此會記錄到原環評中未發現之魚種。而本測站也是外來種數量較多的測站，目前已監測 5 種外來種，分別為高體高鬚魚、食蚊魚、吉利非鯽、線鱧，而何氏棘魚雖然屬於臺灣特有種，但是分布於南部及東部的溪流，後來因人為放流的緣故而出現於中部的溪流，因此何氏棘魚在梅林溪亦屬於外來種。

桶頭橋下游測站、雷公坑溪上游測站及下游測站並無環評期間的相關資料，因此無法進行比對。

整體而言，有關所記錄魚種與環評期間之差異，應受長時間河川棲地型態改變，例如洪水或暴雨導致河道及棲地變遷等。另外，監測時間(如努力量)不同，亦為物種差異之主要原因之一；因此，在鑑識能力方面，將以較為資深及專業人員為主，且監測人員均盡可能相同；而較為相似不易辨識之物種於發現後，亦將謹慎辨別記錄，以減少在人為分類上之落差。此外，由魚類群聚可看出清水溪三處測站與雷公坑溪兩處測站都是低耐污性的魚類為主，顯示清水溪與雷公坑溪的水質狀態屬於未受污染至輕度污染的狀態。而梅林溪梅南橋測站在 106 年種數與數量都已經有所增加，但是受到 106 年第 4 季至 107 年第 2 季五河局工程改變棲地的影響，使得魚類的種數與數量出現明顯的減少，後續將持續監測，以追蹤種數與數量是否會逐漸恢復。

二、水庫區水域生物

(一)本季監測成果

湖南(第一)取出水工附近測站 7 月共監測到 2 科 2 種 2 隻次。本季監測到的魚類有特有種 2 種(臺灣鬚鱲與粗首馬口鱲)，而外來種則有尼羅口孵非鯽。湖南(第一)取出水工附近測站 4 月多樣性指數為 0.69，均勻度指數 1.00，IBI 指數為 22，水質屬於較極差(Very Poor)的等級。

湖山(第二)取出水工附近測站 7 月監測到 2 科 3 種 7 隻次。本季監測到的魚類有特有種 2 種(臺灣鬚鱲與粗首馬口鱲)，而外來種則有尼羅口孵非鯽。湖山(第二)取出水工附近測站 7 月多樣性指數為 1.08 均勻度指數為 0.98，IBI 指數則為 28，水質屬於較差(Poor)的等級。

引水隧道出口附近測站 7 月共記錄 3 科 6 種 60 隻次，數量以明潭吻鰕虎為優勢種。本季監測到的魚類皆為臺灣特有種魚類(臺灣石魚賓、高身小鰾鮈、粗首馬口鱲、短臀瘋鱨、明潭吻鰕虎、短吻紅斑吻鰕虎)，但是並無保育類。引水隧道出口附近測站 7 月多樣性指數為 1.58，均勻度指數則為 0.88，IBI 指數為 40，水質屬於普通(Fair)的等級。

(二)歷次監測結果檢討

1.與歷年各次比對

本季水庫區內湖南(第一)取出水工附近測站與湖山(第二)取出水工附近測站監測到的魚類無太大差異。本季因為

水位上升蓄水量明顯增加，水域面積明顯增加，以致監測到的魚類數量略微減少。湖山(第二)取出水工附近測站監測到的魚類以粗首馬口鱲為主，也是該測站自監測以來首次以原生種為優勢種。由於水庫區內兩處測站仍在蓄水的緣故，水體環境仍處於變動的狀態，所以數量上仍有較大的變動。

引水隧道出口附近測站方面，歷年各次幾乎都是以臺灣特有種為主，優勢種則是以短吻紅斑吻鰕虎或明潭吻鰕虎為主。而本季監測到的種數與數量都較為偏多，但是仍在歷年的變化之內，但是受到引水與否的影響，數量上會有較大的變動。

2.與歷年同季比對

湖南(第一)取出水工附近測站與湖山(第二)取出水工附近測站種數與數量在歷年同季中並無太大的變化，優勢種主要還是以外來種為主。而引水隧道出口附近測站的種數呈現增加的現象，但是數量上則是有較大的變動，優勢種則是以臺灣特有種為主(臺灣石魚賓、高身小鰾鮈、粗首馬口鱲、短臀瘋鱨、明潭吻鰕虎、短吻紅斑吻鰕虎等)。

3.與上季比對

湖南(第一)取出水工附近測站與湖山(第二)取出水工附近測站跟上一季(107 年第 2 季)相比種數維持穩定，但是數量則較為減少，由於庫區內有所管制，棲地狀態非常穩定，應是水域面積增加後產生的自然現象。引水隧道出口附近測站的種數與數量都較上一季有所增加。

湖南(第一)取出水工附近測站與第二取出水工測站跟上一季(107 年第 2 季)相比，監測到的魚類種數與數量都有所增加，又以臺灣特有種的臺灣鬚鱲與粗首馬口鱲增加較為明顯。引水隧道出口附近測站的種數雖然較上一季略微減少，但是數量則維持穩定，仍舊以底棲性(明潭吻鰕虎、短吻紅斑吻鰕虎)的魚類為主。

2.5.2 水生昆蟲

一、河川水域生物

(一)本季監測成果

桶頭吊橋測站 7 月共記錄 6 目 6 科 8 種 110 隻次，以四節蜉科(Baetidae)的雙尾小蜉蝣(*Pseudocloeon* sp.)為數量最多的優勢種。9 月共記錄 2 目 3 科 4 種 18 隻次，以紋石蛾科(Hydropsychidae)的小繩石蠶(*Cheumatopsyche* sp.)與 *Hydropsyche* sp.為數量較多的優

勢種。桶頭吊橋測站 7 月多樣性指數為 1.55，均勻度指數為 0.75，FBI 指數為 4.00，水質屬於優良的水質(Very good)等級。9 月多樣性指數為 1.14，均勻度指數為 0.82，FBI 指數為 3.33，水質屬於極佳的水質(Excellent)等級。

桶頭橋測站 7 月共記錄 3 目 4 科 4 種 47 隻次，以四節蜉科的 *Baetis* sp.為優勢種。9 月共到記錄 2 目 3 科 3 種 31 隻次，以紋石蛾科的小縞石蠶最多的優勢種。桶頭橋測站 7 月多樣性指數為 1.03，均勻度指數為 0.74，FBI 指數為 4.94，水質屬於好的水質(Good)等級。9 月多樣性指數為 0.87，均勻度指數為 0.79，FBI 指數為 4.00，水質屬於優良的水質(Very good)等級。

桶頭橋下游測站 7 月共記錄 4 目 5 科 6 種 93 隻次，以扁蜉科的 *Ecdyonurus* sp.為數量最多的優勢種。9 月共記錄 3 目 4 科 5 種 20 隻次，以四節蜉蝣科的 *Baetis* sp.為數量最多的優勢種。桶頭橋下游測站 7 月多樣性指數為 1.54，均勻度指數為 0.86，FBI 指數為 3.78，水質屬於優良的水質(Very good)等級。9 月多樣性指數為 1.41，均勻度指數為 0.87，FBI 指數為 3.98，水質屬於優良的水質(Very good)等級。

梅南橋測站 7 月共記錄 5 目 8 科 10 種 155 隻次，以搖蚊科的紅搖蚊(*Chironomus* spp.)為數量最多的優勢種。梅南橋測站 7 月多樣性指數為 1.49，均勻度指數指數為 0.65，FBI 指數為 6.52，水質屬於尚待改善的水質(Fairly poor)等級。

雷公坑溪上游(天心橋)測站 7 月共記錄 5 目 11 科 11 種 237 隻次，以紋石蛾科的 *Hydropsyche* sp.為數量最多的優勢種。雷公坑溪上游(天心橋)測站 7 月多樣性指數為 2.06，均勻度指數指數為 0.86，FBI 指數為 3.74，水質屬於優良的水質(Very good)等級。

雷公坑溪下游測站 7 月共記錄 6 目 9 科 11 種 133 隻次，以四節蜉科的雙尾小蜉蝣為數量最多的優勢種。雷公坑溪下游測站 7 月多樣性指數為 2.01，均勻度指數指數為 0.84，FBI 指數為 5.11，水質屬於好的水質(Good)等級。

(二)歷次監測結果檢討

1.與歷年各次比對

歷年清水溪桶頭吊橋測站之監測結果，科數介於 0~14 科之間。由歷年資料發現水生昆蟲在每年的雨季開始之後，科數與數量都會略微減少因為水域面積增加或大水的影響，。98 年第 4 季以後優勢種由原本的長鬚石蠶科變為四節蜉蝣科。而水體含泥砂量過高，或是因為梅雨或颱風產生的大水與棲地的變動等，都會造成水生昆蟲在的科數與數量減

少，而人為工程施作造成的河道縮減，使得水流速度加快，也是水生昆蟲在的科數與數量減少的原因之一。而 104 年第 1 季與第 2 季因為乾旱造成水域縮小，雖然使得水生昆蟲在的科數與數量短期之內大量增加，但是長期而言卻會產生棲地不足問題。

本季監測時因處於雨季期間，桶頭吊橋測站水域面積明顯增加，且水體的濁度也較為升高，惟水生昆蟲的科數雖維持穩定，但是數量則較為減少，其變動大致符合歷年監測的結果，科數與數量也在歷年的變化範圍之內。整體而言，施工期間大多在 3~5 科之間，但是工程結束後，目前科數大多可以維持在 6 科以上。此外，每年的第 1 季與第 2 季梅雨來臨之前，以及進入非雨季的第 4 季，因為氣候相對穩定無強降雨的發生，也使得棲地維持穩定的狀態，所以水生昆蟲的科數與數量在這段期間也較為豐富，而石蠅科(Perlidae)、扁蜉蝣科、長鬚石蠶科、指石蛾科(Philopotamidae)與流石蛾科(Rhyacophilidae)等偏好清澈水質的物種也較容易於此段期間監測到。目前影響本測站的水生昆蟲群聚主要來自於自然因素(如降雨)與攔河堰的運作。此外，上游崩塌地的輸沙作用也使得水體混濁，並覆蓋棲地，也使得水生昆蟲群聚轉變為較能適應水體環境較為混濁的物種(如搖蚊科、四節蜉蝣科與細蜉蝣科(Caenidae)等)為主。

歷年清水溪桶頭橋測站之監測結果，科數介於 0~11 科之間。由歷年資料同樣發現水生昆蟲在每年的雨季開始之後，科數與數量都會略微減少因為水域面積增加或大水的影響，。92 年第 2 季至 98 年第 4 季的優勢種發生數次的轉變，但是仍以輕度污染指標生物為主，但是 101 年以蚋科為多數，顯示當時水質狀態有較差的現象。而水體含泥砂量過高，或是因為梅雨或颱風產生的大水與棲地的變動等，都會造成水生昆蟲在的科數與數量有較明顯的變動。而人為工程施作造成的棲地改變，也是造成水生昆蟲在的科數與數量出現較大變動的原因之一。河道縮減，使得水流速度加快，也是水生昆蟲在的科數與數量減少的原因之一。104 年第 1~2 季因為乾旱造成水域縮小，雖然使得水生昆蟲在的科數與數量短期之內大量增加，但是長期而言卻會產生棲地不足問題。

本季桶頭橋測站監測的的科數雖大致維持穩定，數量則較為偏少，但仍在歷年的變動範圍之內，而水體中的泥沙含量偏高與棲地的覆蓋，應是數量較為偏少的主要原因。整體而言，桶頭橋測站因為水域較為開闊再加上桶頭固床工的攔阻，使得水流速明顯減緩，使得泥沙覆蓋與堆積的情況明顯，所以自 101 年後扁蜉蝣科與長鬚石蠶科等物種幾乎已消

失，取而代之的為能適應水體環境較為混濁的物種為主(如四節蜉蝣科、細蜉蝣科、搖蚊科與水蟲科等)。

自 101 年第 2 季開始新增的桶頭橋下游測站，水生昆蟲科數介於 3~17 科之間。由歷年資料同樣發現水生昆蟲在每年的雨季開始之後，因為水域面積增加或大水的影響，科數與數量都會略微減少。每年梅雨與颱帶來的大雨造成水體變得湍急且混濁都會使得科數與數量較為減少，尤其是大水沖刷使得棲地樣貌出現明顯的改變後，科數與數量減少的情形就會更加明顯(如 104 年、105 年與 106 年的第 3~4 季)。而 104 年第 1~2 季因為旱災使得水域面積明顯縮小，所以科數與數量有明顯增加的現象，但是卻容易使得棲地資源不足而產生負面影響。

本季桶頭橋下游測站 7 月監測已有較明顯的降雨，所以科數與數量較為減少，而 9 月因為受到 8 月底大雨之影響，棲地已經因為大水而有較大的改變，故數量明顯減少，但是仍在歷年的變化之內。整體而言，本測站在每年第 1 季與第 2 季梅雨來臨之前以及第 4 季大致是水生昆蟲的科數與數量最豐富的期間。桶頭橋下游測站水生昆蟲的科數與數量為清水溪三處測站中最為豐富的測站。主要在於本測站棲地環境相對穩定，泥沙覆蓋棲地的狀況也較另外兩處測站少，所以除非有颱風或梅雨帶來的大水改變棲地，否則水生昆蟲群聚大致呈現相對較為豐富的狀態。

歷年梅林溪梅南橋測站之監測結果，科數介於 0~12 科之間。但是因為本測站的水量變化明顯受到降雨的影響，因此水生昆蟲的族群數量不穩定，大部分多呈現貧乏狀態，科數與數量也呈現較大的波動，但是 105 年第 2 季水庫進入試營運期以後因為水流量維持穩定，所以水生昆蟲的科數與數量逐漸轉為較豐富的狀態。

本季梅南橋測站的五河局河道景觀工程已經完工，且恢復為有水種狀態，但是棲地已經出現非常大的變動，由原先為較狹窄且水體流動較快的河道，轉變為開擴水域但流速去幾乎靜止的狀態，科數與數量雖然大致穩定，但是群聚組成已由原先扁蜉蝣科與四節蜉蝣科等耐污性較低的群聚組成轉變為耐污性較高的搖蚊科。整體而言，本測站在 105 年第 2 季水庫進入試營運期間之後，梅林溪在非雨季時仍保持有常流水的狀態，使得水生昆蟲的科數與數量已逐漸豐富且大多能維持在 8 科以上。不過受到 106 年第 4 季至 107 年第 2 季五河局河道景觀工程施作的影響，科數與數量雖然大致穩定，但是群聚組成已出現轉變。

歷年雷公坑溪上游測站之監測結果，科數介於 2~18 科之間，大多以紋石蛾科與四節蜉蝣科等較低耐污性的物種為主。由歷年資料同樣發現水生昆蟲在每年的雨季開始之後，因為水域面積增加或大水的影響，科數與數量都會略微減少。97 年第 3 季至 99 年水生昆蟲的科數與數量較為偏少，但是自 100 年後科數與數量有增加的現象，但是 101 年第 1 季至第 3 季科數與數量較為減少且以搖蚊科為優勢種，顯示該期間水質可能有轉差的現象。102 年以後，科數與數量皆開始增加，並恢復以紋石蛾科與四節蜉蝣科為優勢種，且維持穩定的狀態。

本季雷公坑溪上游測站棲地環境同樣呈現穩定的狀態，所以科數與數量皆屬穩定而豐富，優勢種同樣是乾淨水域的指標物種(紋石蛾科、扁蜉科)。整體而言，由於本測站棲地環境相對穩定且人為擾動少，所以水生昆蟲的科數與數量都較其他測站豐富，並呈現逐漸增加的趨勢。優勢種大多以低耐污性的蜉蝣目(Ephemeroptera)與毛翅目(Trichoptera)為主，而乾淨水域的指標物種(如石蠅科、扁蜉蝣科、指石蛾科、鱗石蛾科(Lepidostomatidae)與指石蛾科等)也都較清水溪與梅林溪豐富，顯示水質狀態大致都能維持在良好的狀態。

歷年雷公坑溪下游測站之監測結果所示，科數介於 0~13 科之間，歷季主要優勢物種為搖蚊科、紋石蛾科及四節蜉蝣科為主。本測站因為明顯受到降雨影響，以致水流量較不穩定，使得水生昆蟲的科數及數量變動較大。本測站在 102 年第 1 季以前科數與數量都較為偏少。而 100 年第 1 季則是因為受到居民於雷公坑溪河床(安溪橋)飼養大量家禽影響水質明顯轉差，因此只監測到要搖蚊科。104 年第 1~2 季因乾旱的關係，使得河床呈現乾涸的狀態而未監測到水生昆蟲。

本季雷公坑溪下游測站已恢復為有水流的狀態，故監測到的水生昆蟲的科數與數量尚屬豐富。整體而言，由歷年的資料來看，自 102 年第 2 季之後，科數與數量在有水流的情形下，都能較 102 年第 1 季以前豐富。水生昆蟲的科數與數量在第 3~4 季水流量較多的期間，則是較第 1 季非雨季與第 2 季雨季初期期間來的豐富。而 105 年以後在沒有工程擾動且人為干擾少的情況下，水生昆蟲的科數大致都能維持在 7 科以上，數量也較 104 年施工期間以前豐富。而 106 年第 4 季的四河局工程目前則是未對水生昆蟲產生太大的影響。

2.與歷年同季比對

清水溪三處測站的水生昆蟲在歷年同季比較中，桶頭吊

橋測站與桶頭橋下游測站的科數與數量在 104 年至 107 年 4 月都呈現比其他歷年同季豐富的狀態，而 107 年 5 月則與 103 年以前無太大的差異，其原因應與各項工程在 104 年以後已大致完工，在工程擾動減少後，科數與數量都逐漸增加，但是優勢種也由原本偏好清澈水質的物種(扁蜉蝣科、長鬚石蠶科)逐漸轉變為較能適應混濁水體的物種(四節蜉蝣科)。而桶頭橋測站雖然也在 104 年以後科數與數量都逐漸增加，但是數量增加主要是因為棲地受到泥沙覆蓋後，促使較能適應混濁水體的物種(四節蜉蝣科、水蠟科、搖蚊科)大量增加，並取代了原本偏好清澈水質的物種(扁蜉蝣科、長鬚石蠶科)所導致。

梅南橋測站在103年以前因為水流量在雨季與非雨季差異較大，所以水生昆蟲的科數與數量都較為不穩定且貧乏，但是在 105 年湖山水庫進入試營運期後，水流量全年都能維持大致穩定的狀態，所以 105 年以後的水生昆蟲科數與數量都明顯較為豐富。本季五河局河道景觀工程雖已完工，雖然科數與數量仍維持穩定，但是優勢種已由四節蜉蝣科轉變為耐污性較高的搖蚊科。

雷公坑溪上游測站因為棲地相對穩定，所以自 102 年以後，科數與數量機乎都能維持在 10 科以上，僅 106 年較少，而優勢種也由搖蚊科轉變為石蠅科、四節蜉蝣科與扁蜉蝣科為主，而本季的科數與數量也維持穩定的狀態。雷公坑溪下游測站在 102 年以後的科數與數量都較 101 年以前豐富，但是因為受到雨季與非雨季水流量差異較大的影響，而呈現較大的變動，但是在 105 年以後棲地有水流的情形下，科數則是呈現逐漸增加的狀態，而本季則是歷年同季以來科數最多的一季。

3.與上季比對

清水溪三處測站本季與上一季(107 年第 2 季)相比，因為水域面積明顯增加再加上水體較為混濁，所以水生昆蟲的科數與數量較上一季(107 年第 2 季)減少。梅林溪梅南橋因為上一季仍有五河局的河道景觀工程而呈現無水的狀態，故未監測到任何水生昆蟲，尚無法進行比較。雷公坑溪上游測站與上一季相比，棲地也呈現穩定的狀態，雖然科數與數量略微減少，但是仍屬穩定。雷公坑溪下游測站因為上一季也呈現乾涸的狀態，所以未監測到任何水生昆蟲，亦無法進行比較。

二、水庫區水域生物

(一)本季監測成果

湖南(第一)取出水工附近測站7月監測到3目3科3種10隻次，以龍蝨科(Dytiscidae)的 *Leiodytes* sp.為優勢種。湖南(第一)取出水工附近測站7月多樣性指數為0.97，均勻度指數為0.98，FBI指數因為監測到的水生昆蟲並無FBI指數的相關耐受值，故無法計算。

湖山(第二)取出水工附近測站7月共記錄2目2科2種7隻次，優勢種為四節蜉科的 *Baetis* sp.。湖山(第二)取出水工附近測站7月多樣性指數為0.52，均勻度指數為0.75，FBI指數為3.15，水質屬於極佳的水質(Excellent)等級。

引水隧道出口附近測站7月記錄4目4科4種75隻次，優勢種為長角泥蟲科(Elmidae)的 Elmidae gen. sp.。引水隧道出口附近測站7月多樣性指數為1.06，均勻度指數為0.76，FBI指數為5.70，水質屬於尚可的水質(Fair)等級。

(二)歷次監測結果檢討

1.與歷年各次比對

本季水庫區湖南(第一)取出水工附近測站水生昆蟲的科數與數量大致維持穩定的狀態，而湖山(第二)取出水工附近測站的科數雖然大致穩定，但是數量卻較為減少。由於此兩處測站皆屬於靜水域且棲地類型為大型石塊與人造的水泥構造物，當水位逐漸升高後，原生生長在陸地上的植物沒入水中成為四節蜉蝣科與細蟌科(Coenagrionidae)的微棲地，但是當水位越高則越缺乏水生植物可提供微棲地。所以水生昆蟲的科數與數量相對較少，主要以能夠適應該棲地型態的種類為主，如在水面上活動的水蟲科與仰蝽科(Notonectidae)，以及棲息在大型石塊表面泥砂裡的搖蚊科為主。

引水隧道出口附近測站歷次監測到的科數大致在 3~6 科之間，本季監測到的科數與數量大致維持在歷年的變動之間，但是優勢種由原本的蜉蝣目轉變為鞘翅目(Coleoptera)。由於該測站容易受到引水與否的影響，所以科數雖然大致都穩定維持在3~6科之間，但是數量則有較大的變動。由於水源引自清水溪在豐水期時水體會有較為混濁的情形，所以優勢種則是以四節蜉蝣科為主，不過在枯水期濁度較低時則會有扁蜉蝣科成為優勢種的情形，但都是以耐污性較低的物種為主。

2.與歷年同季比對

本季與歷年同季比較，水庫區湖南(第一)取出水工附近測站與湖山(第二)取出水工附近測站的水生昆蟲的科數仍屬偏少，而數量也因為缺乏天然的微棲地再加上水位仍在上升階段，所以數量除了106年第3季的湖南(第一)取出水工附近測明顯較多之外，其他季次都較為稀少。本季引水隧道出口附近測站水生昆蟲的科數與歷同季比較，科數大致呈現穩定的狀態，但是數量上仍有較大的變動。由於目前此三處測站都僅有三季(105年至107年)的監測資料，尚無法看出其明顯的變化趨勢。

3.與上季比對

本季與上季(107年第2季)相比，水庫區湖南(第一)取出水工附近測站水生昆蟲科數與數量都維持穩定的狀態，但是湖山(第二)取出水工附近測站的數量則較為減少。引水隧道出口附近測站水生昆蟲科數與數量都比上一季較為減少，除了自然的變動之外，引水時水流量明顯變大且流速加快，使得水生昆蟲暫時移棲他處也是潛在原因之一

2.5.3 蝦蟹螺貝類

由於部份蝦蟹類的中文名已有所變更，因此本文撰寫時將根據「臺灣物種名錄」變更之中文名做為依據。中文名已有所變更之蝦蟹類，分別為擬多齒米蝦變更為假鋸齒米蝦(2011年3月1日變更)；拉氏清溪蟹變更為拉氏明溪蟹(2010年10月4日變更)。

一、河川水域生物

(一)本季監測成果

桶頭吊橋測站7月共監測到3目4科5種24隻次，其中蝦蟹類1目2科3種8隻次，以匙指蝦科(Atyidae)的假鋸齒米蝦(*Caridina pseudodenticulata*)最多，螺貝類則有2目2科2種16隻次，無明顯優勢種。9月共僅監測到蝦蟹類有1目2科2種2隻次，但是未監測到螺貝類。本季臺灣特有種有匙指蝦科的假鋸齒米蝦。桶頭吊橋測站7月多樣性指數為1.18，均勻度指數為0.73。9月多樣性指數為0.69，均勻度指數為1.00。

桶頭橋測站7月僅監測到蝦蟹類1目2科2種16隻次，未監測到螺貝類；9月同樣僅監測到蝦蟹類有1目1科1種2隻次，未監測到螺貝類。本季臺灣特有種有假鋸齒米蝦。桶頭橋測站7月多樣性指數為0.45，均勻度指數為0.65。9月因為僅監測到1種，故多樣性指數為0，均勻度指數無法計算。

桶頭橋下游測站7月共監測到2目2科3種22隻次，其中蝦蟹類1目1科2種3隻次，以粗糙沼蝦(*Macrobrachium asperulum*)的數量較多，螺貝類則有1目1科1種19隻次。9月僅監測到蝦蟹類1目1科1種2隻次，為長臂蝦科(Palaemonidae)的粗糙沼蝦。桶頭橋下游測站7月多樣性指數為0.40，均勻度指數為0.37。9月因為僅監測到1種，故多樣性指數為0，均勻度指數無法計算。

梅南橋測站7月共監測到2目3科3種18隻次，其中蝦蟹類1目2科2種4隻次，螺貝類則有1目1科1種14隻次。臺灣特有種則有假鋸齒米蝦。梅南橋測站7月多樣性指數為0.63，均勻度指數為0.57。

雷公坑溪上游(天心橋)測站7月共監測到2目2科2種16隻次，其中蝦蟹類1目1科1種8隻次，螺貝類則有1目1科1種8隻次，數量上並無優勢種。臺灣特有種則有假鋸齒米蝦。雷公坑溪上游(天心橋)測站7月多樣性指數為0.69，均勻度指數為1.00。

雷公坑溪下游測站7月共監測到2目3科3種56隻次，其中蝦蟹類1目2科2種36隻次，優勢種為假鋸齒米蝦，螺貝類則有1目1科1種20隻次。雷公坑溪下游測站7月多樣性指數為0.75，均勻度指數為0.69。

(二)歷次監測結果檢討

1.與歷次比對

歷次監測的資料可看出，桶頭吊橋測站100年第2季至103年第4季，種數都在2種以下，數量較為偏少但是較為穩定，在104年至105年第3季大多能維持在3-6種之間，數量也較為豐富，但是在105年第4季至106年第1季的種數與數量都較為偏少，而106年第2季以後則有略微增加的趨勢，但是在部分季次的種數與數量依舊偏少(106年第3季(9月)與107年第1季(2月))。本季的監測結果桶頭吊橋測站的種數與數量雖然都在歷年的變化之內，但是7月的種數與數量都為豐富，9月受到水流量明顯變大且混濁的影響，以致種數與數量則較為減少。另外，大量泥沙覆蓋棲地，導致微棲地減少的情形，係為種數與數量都較為減少之原因。

桶頭橋測站蝦蟹類種數在100年第2季至103年第4季的種數與數量都較為偏少，104年以後大多能維持在2-4種之間，數量特別少的102年至103年第1季與104年第3季至105年第1季主要分別受到河川工程與颱風及大雨的影響而減少。本季7月的種數與數量大致維持穩定的狀態，但9

月因水體中的泥沙含量高，大量的泥沙在本測站沉積，導致棲地受到泥沙覆蓋，而籠具也受到泥沙覆蓋而影響採集的效率，使得蝦蟹螺貝類的種數與數量都因此較為減少。

桶頭橋下游測站的蝦蟹類種數大多維持在2-4種之間，數量以104年第1~2季、105年第1~2季較為豐富，主要因為調大量的假鋸齒米蝦。而105年第3季(9月)至106年第1季、106年第2季(5月)至106年第4季(10月)因為先後受到寒流與洪水的影響，所以數量較為稀少。本季監測結果與歷次相比，7月種數與數量大致維持穩定的狀態，9月因為8月23至25日大雨帶來的大水，造成棲地出現明顯的變動，使得種數與數量皆出現明顯的減少，雖然在歷年的變化範圍內，但是卻相對偏少。優勢種在106年第1季以前都是以蝦類(粗糙沼蝦與大和沼蝦(*Macrobrachium japonicum*))為主，但是在106年第2季以後開始出現轉變為螺貝類(瘤蜷(*Tarebia granifera*)或小椎實螺(*Austropeplea ollula*)的情形。

梅南橋測站在102年第2季以前未監測到任何蝦蟹螺貝類，102年第3季至103年第4季所監測到的種類與數量也非常稀少，自湖山水庫進入試營運期間之後，因全年都能維持在有常流水的情形下，種數大致都能維持在3種以上，但是在106年第4季至107年第2季期間，因為五河局河道景觀工程施作，導致河道呈完全乾涸狀態，未監測到任何蝦蟹螺貝類。本季雖然恢復為有水的狀態，但是因為棲地型態已經出現非常大的變化，種數與數量雖然仍屬穩定，但是優勢種由原先的蝦蟹類轉變為螺貝類，推估應是水流速明顯轉為近乎靜止的狀態，且原有的濱溪植物又近乎消失而缺少蝦蟹類微棲地所導致，後續將持續監測以了解後續蝦蟹螺貝類種數與數量的變化。

雷公坑溪上游測站由於棲地環境相較其他測站較為穩定，因此種數與數量大致屬於較為豐富且穩定的狀態，僅104年第4季與105年第1季受到颱風與寒流，以及106年第3季受到洪水影響，而有所減少。本季監測期間棲地大致都呈現穩定的狀態，所以種數與數量都維持穩定的狀態。由於本測站有較多的濱溪植物，可提供蝦類做為微棲地，但是在非雨季(第1季或第2季雨季來臨前)時，水域面積明顯縮小，部份蝦類(如假鋸齒米蝦)因缺乏濱溪植物被水體淹沒所產生微棲地而移棲他處，使得蝦類的數量較為減少。

雷公坑溪下游測站在102年以前所監測到的蝦蟹螺貝類非常稀少，但是在103年以後種數與數量則有逐漸增加，目前在有水流的情形下，大多能維持在4種以上。本季因為河道已呈現有穩定水流的狀態，所以蝦蟹螺貝類的種數與數量

與歷年監測相比大致呈現穩定的現象。

2.與歷年同季比對

歷年同季監測結果，桶頭吊橋測站在103年與105年間測到的數量較多。本季9月所監測到的數量因為受到大水的影響(8月23~25日)與106年9月受到降雨影響且水體混濁，使得蝦蟹類暫時移棲他處的緣故，使得此兩季同為歷年同季監測以來，最少的一季。桶頭橋測站則是以104年至106年的數量較為豐富，本季9月的數量則與100年7月同樣為歷年同季監測以來，最少的一季。而桶頭橋下游測站的數量在104年與105年的7月數量明顯較多，而本季9月則與106年9月同為為歷年同季監測以來，最少的一季。三處測站的優勢種有由105年以前都是蝦類為主，106年以後開始出現部分計次以螺貝類為優勢種的情形。

梅南橋測站的數量因為在104年與106年監測到較多的假鋸齒米蝦而較為豐富之外，本季因為受到前期五河局河道景觀工程的影響，與其他季次相比，本季監測到的數量則較為偏少。

雷公坑溪上游測站因為棲地與水質都呈現穩定而無異狀，所以本季的種數與數量與歷年同季相比雖然略微偏少，但是仍屬穩定，而102年至105年因為監測到較多的粗糙沼蝦與假鋸齒米蝦，所以數量明顯較為偏多。雷公坑溪下游測站本季因為已經恢復為有水的狀態，所以監測到蝦蟹螺貝類種數與數量呈現穩定的狀態，優勢種則以蝦蟹類為主。

3.與上季比對

本季清水溪三處測站7月的蝦蟹螺貝類的種數與數量與上一季(107年第2季)相比，大致都呈現穩定的狀態，但是9月因為受到8月23日至25日大水的影響，使得種數與數量都明顯減少。雷公坑溪上游測站的棲地呈現穩定的狀態，所以數量較上一季(107年第2季)較為減少。雷公坑溪上游測站與梅南橋測站因為都恢復為有水的狀態，所以種數與數量都較上一季增加。

二、水庫區水域生物

(一)本季監測成果

湖南(第一)取出水工附近測站7月共監測到2目2科2種30隻次，其中蝦蟹類有1目1科1種2隻次，為粗糙沼蝦。螺貝類則有1目1科1種28隻次，為囊螺科(Physidae)的囊螺(*Physa acuta*)。外來種有1種，為囊螺科的囊螺。湖

南(第一)取出水工附近測站7月多樣性指數為0.27，均勻度指數為0.39。

湖山(第二)取出水工附近測站7月共監測到2目3科3種15隻次，其中蝦蟹類有1目2科2種9隻次，數量以粗糙沼蝦較多，螺貝類則有1目1科1種6隻次，為囊螺科的囊螺。臺灣特有種有假鋸齒米蝦，外來種則囊螺。湖山(第二)取出水工附近測站7月多樣性指數為0.80，均勻度指數為0.73。

引水隧道出口附近測站7月監測到2目2科2種8隻次，其中蝦蟹類有1目1科1種5隻次，螺貝類則有1目1科1種3隻次，以椎實螺科(Lymnaeidae)的小椎實螺數量較多。引水隧道出口附近測站7月多樣性指數為0.65，均勻度指數為0.94。

(二)歷次監測結果檢討

1.與歷次比對

水庫區內的湖南(第一)取出水工附近測站的種數大致穩定維持在3~5種之間，本季的種數較歷次監測偏少，但是數量大致維持穩定，而優勢種以螺貝類為主。湖山(第二)取出水工附近測站的種數則大致維持在2~4種之間，本季種數與歷次監測結果相比大致穩定，但是數量則較為偏少，而優勢種在106年第2季以前為囊螺，106年第3季以後則轉為假鋸齒米蝦，應是測站周圍有少部分植物沒入水中後形成假鋸齒米蝦的微棲地所致。引水隧道出口附近測站歷次監測的種數大致在3~4種之間，本季的種數與歷次監測相比則略微減少，數量則是歷次監測以來最少的一季，推估應與水位上升且水域面積增加，假鋸齒米蝦缺乏微棲地有關。本季優勢種由螺貝類轉為粗糙沼蝦，應是雨季時引水量較大，使得螺貝類受到較大的水流沖刷而減少。

2.與歷年同季比對

歷年同季的比較中，湖南(第一)取出水工附近測站與湖山(第二)取出水工附近測站的種數大致維持穩定的狀態，但是數量則略微減少。而本季因為水位有明顯的升高，所以該現象是否與蓄水期間水位變動有關或單純為自然的變動，後續將持續監測。

引水隧道出口附近測站的種數與數量在近三季(105年至107年)呈現減少的趨勢，而本季則是歷年同季最少的一季。但是因為目前僅有三季(105年至107年)的資料，所以尚無法斷定其種數與數量變動的趨勢，後續將持續監測以了解種數與數量的變動趨勢。

3.與上季比對

本季與上季(107 年第 2 季)相比，湖南(第一)取出水工附近測站的種數與數量都大致維持穩定的狀態。而湖山(第二)取出水工附近測站的種數雖然維持穩定，但是數量則較上一季略微減少。而引水隧道出口附近測站與上季相比，種數與數量都明顯較為減少，以螺貝類減少較為明顯，應是雨季時引水量較大，使得螺貝類受到較大的水流沖刷而減少，才使得數量有較明顯的減少。

2.5.4 浮游植物

一、河川水域生物

(一)本季監測成果

桶頭吊橋測站 7 月共監測到 1 門 14 種，數量 52,000 細胞數/公升，但是無優勢種。9 月共監測到矽藻門(Bacillariophycea)16 種，數量 52,000 細胞數/公升，亦無優勢種。桶頭吊橋測站 7 月多樣性指數為 2.58，均勻度指數為 0.98。9 月多樣性指數為 2.68，均勻度指數為 0.97。

桶頭橋測站 7 月共監測到 1 門 15 種，數量 124,800 細胞數/公升，優勢種為針杆藻(*Synedra ulna*)。9 月共監測到矽藻門 16 種，數量 39,000 細胞數/公升，但是無優勢種。桶頭橋測站 7 月多樣性指數為 2.22，均勻度指數為 0.82。9 月多樣性指數為 2.71，均勻度指數為 0.98。

桶頭橋下游測站 7 月共監測到 1 門 15 種，數量 257,400 細胞數/公升，數量以舟形藻(*Navicula pupula*)與針杆藻較多。9 月共記錄矽藻門 16 種，數量 45,500 細胞數/公升，但是無明顯的優勢種。桶頭橋下游測站 7 月多樣性指數為 1.83，均勻度指數為 0.68。9 月多樣性指數為 2.72，均勻度指數為 0.98。

梅南橋測站 7 月記錄矽藻門 16 種，數量 62,400 細胞數/公升，但是無優勢種。梅南橋測站 7 月多樣性指數為 2.72，均勻度指數為 0.98。

雷公坑溪上游(天心橋)測站 7 月共記錄矽藻門 16 種，數量 98,800 細胞數/公升，但是無優勢種。雷公坑溪上游(天心橋)測站 7 月多樣性指數為 2.65，均勻度指數為 0.96。

雷公坑溪下游測站 7 月共記錄矽藻門 12 種，數量 41,600 細胞數/公升，優勢種為針杆藻。雷公坑溪下游測站 7 月多樣性指數為 2.43，均勻度指數為 0.98。

(二)歷次監測結果檢討

1.與歷次比對

歷次清水溪桶頭吊橋測站監測結果，種數介於 3~38 種之間，種數以 107 年第 2 季(4 月)的 38 種最多，數量以 103 年第 1 季(2 月) 884,800 細胞數/公升最多。本季的 7 月與 9 月分別有 14 種與 16 種，數量為 52,000 細胞數/公升與 52,000 細胞數/公升。本季監測結果與歷次監測相比呈現穩定的狀態，但是並無明顯的優勢種。本季桶頭吊橋測站因為進入雨季之後，水流量明顯變大且混濁，再加上水流速快，所以種數與數量都相對非雨季較為偏少，而歷年的監測結果也呈現相同的現象，所以本季的變動大致呈現正常的自然變動，種數與數量的也維持在歷年監測變動的正常範圍內。

長期而言，桶頭吊橋測站 103 年以前攔河堰工程進行時，因為工程對棲地產生擾動，使得浮游植物的種數較少，而沉積在地表的營養鹽也容易隨著降雨而進入水體中提供浮游植物利用，造成浮游植物的數量容易有較大的變動。而 104 年攔河堰工程結束後，棲地逐漸穩定，影響浮游植物種數與數量主要受到自然因子(如氣候、雨量與日照時間等)的影響。因此，浮游植物的種數雖然會有較大的變動，但是種數則是較 103 年以前增加，而數量的變動也較為穩定。歷次監測物種組成為中耐污物種的菱形藻(*Nitzschia* spp.)及低耐污染物種的舟形藻(*Navicula* spp.)、橋彎藻(*Cymbella* spp.)與針杆藻為主，顯示此測站為輕度至中度污染的水質。

歷次清水溪桶頭橋測站監測結果，種數介於 5~38 種之間，種數以 107 年第 2 季(4 月)38 種最多，數量則以 103 年第 1 季(2 月) 824,000 細胞數/公升最多。而本季的 7 月與 9 月分別有 15 種與 16 種，數量為 124,800 細胞數/公升與 39,000 細胞數/公升，本季桶頭橋測站 7 月的優勢種為針杆藻，9 月則無優勢種。本季棲地除了受到泥沙在此測站沉澱而覆蓋棲地外，水體水質無明顯變動，所以種數與數量大致都維持在歷年的變動之內，而 9 月的數量明顯較為減少主要是受到水流量明顯變大且混濁所導致。

長期而言，桶頭橋測站與桶頭吊橋測站變化大致相同，104 年以後種數有所增加象，但是數量則有減少且變動幅度較小的現象。值得留意的是，本測站的水流受到固床工的攔阻，再加上水域明顯轉為開闊且深，故水流在此測站會明顯減緩且接近靜止的狀態，形成深潭的棲地型態。在非雨季時甚至會出現水位低於固床工的情形，導致僅以固床工魚道與下游連通的情形，因此應留意在非雨季時是否有可能出現優養化的情形。此外，該測站位在桶頭攔河堰下游不遠處，攔

河堰排沙時容易造成水體混濁且流速加快，且降雨造成水體的混濁，皆會影響浮游植物生長。歷次監測物種組成為中耐污物種的菱形藻及低耐污染物種的舟形藻與橋彎藻為主，顯示此測站為輕度至中度污染水質。

歷次清水溪桶頭橋下游測站歷次監測結果，種數介於2~37種之間，種數以107年第2季(4月)37種最多，數量則以103年第1季(2月) 968,000細胞數/公升最多。而本季的7月與9月分別有15種與16種，數量為293,800細胞數/公升與45,500細胞數/公升。本季桶頭橋測站7月的優勢種為舟形藻，9月則無優勢種。本季棲地7月時大致維持穩定，水體較為混濁，所以種數較為減少，但是數量則維持穩定。而9月因為受到8月時的大水且持續有降雨的發生，所以種數雖然維持穩定，但是數量則較為減少。不過本季種數與數量仍維持在歷年的變動之內。長期而言，桶頭橋下游測站104年以後種數較103年以前增加，但是變動幅度較大，數量則較102年與103年減少，但是變動相對較為穩定，目前本測站種數與數量主要受到降雨或水流量大的影響而容易有較大的變動。歷次監測物種組成為中耐污物種的菱形藻及低耐污染物種的橋彎藻與舟形藻為主，顯示此測站為輕度至中度污染水質。

歷次梅林溪梅南橋測站監測結果，種數介於0~56種之間，種數以105年第2季56種最多，數量以102年第4季(10月1,844,800細胞數/公升)較多。本季梅南橋測站的工程已經結束並恢復為有水的狀態，監測到的種數與數量與歷年監測結果相比大致呈現穩定的狀態。長期而言，由歷年資料可看出本測站的種數在104年以後逐漸增加，在105年第2季達到高峰，而106年第3季與第4季因為受到降雨與五河局工程的影響，使得種數有略微減少，而107年前兩季因為受到五河局工程呈現無水的狀態，而未監測到浮游植物。而數量的變動則是在104年以後也較為穩定。歷次監測大致以中耐污物種的菱形藻及低耐污染物種的橋彎藻與舟形藻為主，顯示此測站為輕度至中度污染水質。

歷次雷公坑溪上游測站監測結果，種數介於3~52種之間，種數以104年第4季(10月)52種最多，數量以103年第2季(4月688,000細胞數/公升)最多。而本季種數有16種，數量為98,800胞數/公升，種數與數量的變化都在歷年的變化範圍內，但是無優勢種。本季雷公坑溪上游測站棲地環境呈現穩定的狀態，水體也維持清澈，但是水流速因為與季的關係明顯較快，所以浮游植物的種數與數量都有略微減少的狀態。由歷年資料可看出104年的種數有較多的現象，而105年以後種數與數量則是大致維持穩定的變動。歷次監測優勢

種以低耐污染物種的舟形藻、橋彎藻與針杆藻為主，顯示此測站為未(稍)受至輕度污染水質。

歷次雷公坑溪下游測站監測結果，種數介於 2~50 種之間，種類數以 105 年第 4 季與 106 年第 4 季 32 種較多，數量以 102 年第 4 季(10 月 662,400 細胞數/公升)較多。而本季種數有 12 種，數量為 41,600 胞數/公升，種數與數量的變化都在歷年的變化範圍內，優勢種為針杆藻。本季本測站因為恢復為有水的狀態，但是監測到的浮游植物與 104 年以後的監測結果相比，種數雖然較為減少，但是數量則維持穩定的狀態，而與歷年監測結果相比也都還呈現穩定的狀態。由歷次監測結果來看，本測站因為在雨季與非雨季的水流量差異甚大，所以各季次監測結果種數或數量也有較大的差異，在雨季有水流且水體清澈的狀態時，浮游植物尚屬豐富，但是在進入非雨季時，水流量明顯減少且流速緩時，則容易有大量絲狀藻出現的優養化現象發生，但是該現象通常在降雨來臨，水流量增加後即會消失。歷次監測優勢種為低耐污染物種的舟形藻、橋彎藻與針杆藻為主，顯示此測站為未(稍)受至輕度污染水質。

2.與歷年同季比對

歷年同季比較方面，清水溪三處測站三處測站的 7 月與 9 月的監測結果，種數大致都呈現穩定的狀態。9 月的數量雖然受到水流量明顯較大的影響，但是也仍屬穩定。梅南橋測站的種數與數量的變動也同樣呈現穩定的狀態。而雷公坑溪上游測站在 100 年至 103 年的種數較為減少，而 104 年為明顯較多的一年，105 年至本季則維持穩定的狀態，數量上也大致維持穩定。而雷公坑溪下游測站因同季的水流量大多呈現穩定的狀態，所以歷年同季的監測結果種數也都呈現穩定的狀態，僅數量上在部分季次有較大的變動。

3.與上季比對

本季與上一季(107 年第 2 季)比較，清水溪三處測站與雷公坑溪上游測站因為進入雨季後，水流量與水流速都明顯增加，再加上水體明顯較為混濁，所以浮游植物的種數與數量都較上一季略微減少，屬於自然的變動。而梅南橋測站與雷公坑溪下游測站則是因為本季重新恢復為有水的狀態，所以浮游植物的種數與數量都較上一季增加。

二、水庫區水域生物

(一)本季監測成果

湖南(第一)取出水工附近測站 7 月共監測 4 門 28 種，其中矽藻門 15 種、綠藻門(Chlorlphyta)11 種、隱藻門(Cryptophyte)1 種與裸藻門(Euglenophytes)1 種，數量 663,000 細胞數/公升，以卵囊藻(*Oocystis polymammilatum*)為優勢種。湖南(第一)取出水工附近測站 7 月多樣性指數為 2.16，均勻度指數為 0.65，藻類優養指數(ATSI)評估結果為 0.50，係為「中養」的狀態。

湖山(第二)取出水工附近測站 7 月共監測 3 門 27 種，其中矽藻門 15 種、綠藻門 11 種與隱藻門 1 種，數量 470,600 細胞數/公升，以卵囊藻為優勢種。湖山(第二)取出水工附近測站 7 月多樣性指數為 2.55，均勻度指數為 0.77，藻類優養指數(ATSI)評估結果為 0.46，係為「優養」的狀態。

引水隧道出口附近測站 7 月共監測到矽藻門 1 門 15 種，數量 65,000 細胞數/公升，但是無優勢種。引水隧道出口附近測站 7 月多樣性指數為 2.66，均勻度指數為 0.98，本季未監測到優養指標藻種，故無法計算藻類優養指數(ATSI)。

三處測站的藻類優養指數(ATSI)在湖南(第一)取出水工附近測站與湖山(第二)取出水工附近測站分別為「中養」與「優養」的狀態，而引水隧道出口附近測站卻未監測到優養指標藻種。推估應是水體來源的清水溪優養指標藻種數量稀少，且水體為流動狀態，故藻類不易孳生，惟水體的總磷偶爾有超標現象，主要係在湖南(第一)取出水工附近測站與湖山(第二)取出水工附近測站的水體呈現靜止狀態，促使藻類較易孳生，而出現優養現象，但是庫區優養化的情形目前仍屬輕微。

(二)歷次監測結果檢討

1.與歷次比對

本季水庫區內兩處測站(湖南(第一)取出水工附近測站與湖山(第二)取出水工附近測站)監測到的種數為歷次監測以來最多的一季，而且最近三季都呈現增加的狀態，而數量也同樣呈現相同的狀態。原因應是水位雖然持續升高，但是原先沉積於灘地的營養鹽進入水體後，因為水溫較為溫暖且日照時間長，再加上水庫區為靜止水域，所以浮游植物可在水體內繁殖而不會有被水流帶走的問題，使得浮游植物的種數與數量呈現增加的狀態。湖南(第一)取出水工附近測在 105 年第 2 季與第 4 季與湖山(第二)取出水工附近測站在 105 年第 4 季與 106 年第 4 季，因為蓄水初期，水位變化較大，所以種數也較為偏少，其他季次則大致維持穩定。

依照藻類優養指數(ATSI)計算結果水庫區內湖南(第一)取出水工附近測站與湖山(第二)取出水工附近測站分別為 0.46(中養)與 0.50(優養)的狀態，但是兩處測站的差異並不大，不過較上一季的狀態以較為好轉。雖然仍有監測到經常大量出現在優養化水體的隱鞭藻(*Cryptomonas* sp.)，但是所佔的比例以非常少，顯示庫區內有出現優養化的現象以較為好轉，監測過程中檢視水體，透明度仍高而水色也呈現藍灰色，所以判斷水體優養化的現象，仍屬輕微，不過後續仍須留意水質的變化情形。有關歷次藻類優養指數變化，庫區內兩處測站都在 0~0.50 即中養至優養間變動，隨著水位逐漸升高將持續監測藻類優養指數的變化。

引水隧道出口附近測站的浮游植物的種數在 105 年第 4 季以後大致呈現穩定的狀態，數量除了 106 年第 2 季明顯較其他季次多之外，其他季次則大致都維持穩定的狀態。而本季的種數與數量與歷次監測結果相比也呈現穩定的狀態，但是並未有優勢種。

2.與歷年同季比對

水庫區三處測站在歷年同季的監測中，本季水庫區內兩處測站的種數與數量皆為歷年同季監測以來最多的一季，而且數量都呈現增加的趨勢。而引水隧道出口附近測站在 105 年第 3 季並未監測到浮游植物，而最近兩季的種數與數量則呈現穩定的狀態。由於目前此三處測站都僅有三季有紀錄到浮游植物，所以尚無法看出其明顯的變化趨勢。

3.與上季比對

本季水庫區內湖南(第一)取出水工附近測站與湖山(第二)取出水工附近測站本季的種數與數量跟上一季(107 年第 2 季)相比都較為增加。由於本季水位雖然較為升高，但是水體透明度偏高，再加上氣溫與水溫溫暖，且日照時間長，所以浮游植物的種數與數量都較為增加。而引水隧道出口附近測站在本季浮游植物的種數與數量與上一季相比大致維持穩定的狀態。

2.5.5 附著性藻類

一、河川水域生物

(一)本季監測成果

桶頭吊橋測站 7 月共監測到 2 門 33 種，分別為矽藻門 31 種與藍綠藻門(Cyanophy)2 種，數量 3,379,200 細胞數/100 平方公分，以舟形藻為優勢種。9 月共監測到 2 門 37 種，分別為

矽藻門 34 種與藍綠藻門 3 種，數量 5,043,200 細胞數/100 平方公分，以針杆藻為優勢種。桶頭吊橋測站 7 月多樣性指數為 3.37，均勻度指數為 0.96，GI 值為 0.90，屬於中度污染水質，SI 值為 2.63，屬於中度污染水質。9 月多樣性指數為 2.20，均勻度指數為 0.61，GI 值為 3.38，屬於輕污染水質，SI 值為 2.16，屬輕度污染水質。

桶頭橋測站 7 月共監測到 2 門 28 種，分別為矽藻門 26 種與藍綠藻門 2 種，數量 1,971,200 細胞數/100 平方公分，以菱形藻(*Nitzschia palea*)為優勢種。9 月共監測到 2 門 33 種，分別為矽藻門 30 種與藍綠藻門 3 種，數量 4,480,000 細胞數/100 平方公分，亦以菱形藻為優勢種。桶頭橋測站 7 月多樣性指數為 3.16，均勻度指數為 0.95，GI 值為 0.47，屬於嚴重污染水質，SI 值為 2.79，屬於中度污染水質。9 月多樣性指數為 2.45，均勻度指數為 0.70，GI 值為 0.19，屬於嚴重污染水質，SI 值為 2.94，屬於中度污染水質。

桶頭橋下游測站 7 月共監測到 2 門 31 種，分別為矽藻門 29 種與藍綠藻門 2 種，數量為 2,380,800 細胞數/100 平方公分，以菱形藻的數量較多。9 月共監測到 2 門 33 種，分別為矽藻門 30 種與藍綠藻門 3 種，數量 1,612,800 細胞數/100 平方公分，但是無明顯的優勢種。桶頭橋下游測站 7 月多樣性指數為 3.30，均勻度指數為 0.96，GI 值為 0.56，屬於中度污染水質，SI 值為 2.89，屬於中度污染水質。9 月多樣性指數為 3.35，均勻度指數為 0.96，GI 值為 0.89，屬於中度污染水質，SI 值為 2.83，屬於中度污染水質。

梅南橋測站 7 月共監測到 2 門 21 種，分別為矽藻門 19 種與藍綠藻門 2 種，數量為 1,100,800 細胞數/100 平方公分，優勢種為布紋藻(*Gyrosigma* sp.)。梅南橋測站 7 月多樣性指數為 2.83，均勻度指數為 0.93，GI 值為 0.43，屬於嚴重污染水質，SI 值為 2.90，屬於中度污染水質。

雷公坑溪上游(天心橋)測站 7 月共監測到 3 門 31 種，分別為矽藻門 28 種、綠藻門 1 種與藍綠藻門 2 種，數量為 1,843,200 細胞數/100 平方公分，優勢種為鼓藻(*Cosmarium* sp.)。雷公坑溪上游(天心橋)測站 7 月多樣性指數為 3.21，均勻度指數為 0.93，GI 值為 2.20，屬於輕度污染水質，SI 值為 2.64，屬於中度污染水質。

雷公坑溪下游測站 7 月共監測到 2 門 26 種，分別為矽藻門 24 種與綠藻門 2 種，數量為 947,200 細胞數/100 平方公分，但是無優勢種。雷公坑溪下游測站 7 月多樣性指數為 3.20，均勻度指數為 0.98，GI 值為 0.83，屬於中度污染水質，SI 值為 2.55，屬於中度污染水質。

(二)歷次監測結果檢討

1.與歷次比對

歷次清水溪桶頭吊橋測站監測結果，種數介於 1~46 種之間，種數以 105 年第 3 季(9 月)46 種最多，數量以 101 年第 1 季(1 月)14,150,000 細胞數/100 平方公分最多。107 年第 3 季的 7 月與 9 月種數分別有 33 種與 37 種，數量有 3,379,200 與 5,043,200 細胞數/100 平方公分。本季監測到的種數與數量與歷年監測結果相比大致維持穩定，本季雖然水流量與水流速都明顯增加，但是在岸邊的緩流區仍有大量附著性藻類大量生長，所以監測到的種數與數量仍屬穩定。

本季清水溪桶頭吊橋 GI 計算結果也與歷年同樣維持在輕度至中度污染之間，優勢種也為低耐污性的橋彎藻、舟形藻與針杆藻。由歷次的監測發現，102 年至 103 年間種數明顯減少，而 104 年後開始增加後，大致都能維持在 30 種以上。歷次監測優勢物種以中耐污物種的菱形藻及低耐污物種的羽紋藻(*Pinnularia* sp.)、橋彎藻、舟形藻與針杆藻最為常見，顯示此測站呈現輕度至中度污染的水質。

歷次清水溪桶頭橋測站監測結果，種數介於 1~39 種之間，種數以 106 年第 1 季(2 月)與本季(107 年第 1 季(2 月))39 種最多，數量以 104 年第 1 季(2 月)45,642,240 細胞數/100 平方公分最多。107 年第 3 季的 7 月與 9 月種數分別有 28 種與 33 種，數量有 1,971,200 與 4,480,000 細胞數/100 平方公分。本季監測到的種數與數量與歷年監測結果相比大致維持穩定，本測站的情形與桶頭吊橋測站大致相同，在岸邊的緩流區仍有大量附著性藻類大量生長，所以監測到的種數與數量仍屬穩定。但是本測站泥沙覆蓋棲地的情形仍非常明顯，長期而言仍會使得附著性藻類受到泥沙覆蓋，而影響附著性藻類的生長。

本季桶頭橋 GI 計算結果為嚴重污染，較歷年監測結果的輕度至中度污染之間略差，優勢種也為中耐污性的菱形藻，顯示本季桶頭橋測站水質有略微轉差的狀態，推估應是受到水體明顯較為混濁且泥沙大量沉澱影響，使得低耐物性的藻種較為減少，而非有外源性污染所致，監測過程中也未發現有新增的污染源。歷次的監測發現，在 102 年至 103 間因為施工影響，使得種數明顯減少，而 104 年工程逐漸完工後種數開始逐漸增加，105 年以後大致都能穩定維持在 30 種以上。歷次監測優勢物種以中低耐污物種的舟形藻、羽紋藻與橋彎藻及中耐污物種的菱形藻最為常見，而 104 年以後，優勢種大多以低耐污物種的橋彎藻、舟形藻與針杆藻為主，顯示此測站為輕度至中度污染水質。

桶頭橋下游測站，種數介於 2~44 種之間，種數以 105 年第 3 季(9 月)的 44 種最多，數量以 105 年第 1 季(2 月)25,036,800 細胞數/100 平方公分最多。107 年第 3 季的 7 月與 9 月種數分別有 31 種與 33 種，數量有 2,380,800 與 1,612,800 細胞數/100 平方公分。本季的棲地形態因為 8 月 23 日至 25 日的大水而產生較大的變動，但是種數與數量與歷年監測結果相比仍大致維持穩定的狀態。

GI 的計算結果也與歷年同樣維持在輕度至中度污染之間，優勢種 7 月為中耐污性的菱形藻，但是 9 月則無明顯的優勢種，顯示本季桶頭橋下游測站水質呈現輕度至中度污染的狀態，而未受到明顯的污染。由歷年資料來看，種數在 104 年後較為豐富，大致都能維持在 30 種以上。歷次監測優勢種以中耐污物種的菱形藻及低耐污物種的舟形藻、橋彎藻與羽紋藻為主，顯示此測站為輕度至中度污染水質。

歷次梅林溪梅南橋測站監測結果，種類數介於 0~71 種之間，種數以 105 年第 2 季的 71 種最多，數量以 105 年第 4 季(10 月)29,900,800 細胞數/100 平方公分最多。本季監測時五河局的工程已經結束，所以恢復為有水的狀態，而附著性藻類的種數與數量也大致維持穩定的狀態，將持續監測種數與數量的變化，以了解附著性藻類的種數與數量是否已確實恢復穩定。本測站自 105 年湖山水庫開始進入試營運期間後，水流量全年能為維持較為穩定的狀態，種數與數量都有逐漸增加的現象，但是變動仍然較大，而 107 年第 1~2 季因為五河局的工程，使得棲地呈現完全乾涸的狀態。歷次監測優勢物種以中耐污物種的菱形藻及低耐污物種的舟形藻為主，顯示此測站為輕度至中度污染水質。

歷次雷公坑溪上游測站監測結果，種類數介於 7~51 種之間，種數以 104 年第 1 季(1 月)51 種最多，數量以 105 年第 3 季(7 月) 42,777,600 細胞數/100 平方公分最多。107 年第 3 季的種數有 31 種，數量則是有 1,843,200 細胞數/100 平方公分。本季因為棲地狀態呈現穩定，所以種數維持穩定的狀態，與歷年監測相比都在歷年的變化範圍內，較 103 年以前的種數較為增加，而數量上略微偏少，但是都在歷年的變化之內。GI 的計算呈現輕度污染的狀態，優勢種為低耐污性鼓藻，顯示水質呈現輕度至中度污染的狀態，與歷年計算結果多維持在輕度至中度污染之間相符。歷次監測結果顯示本測站因為環境穩定，無太多的人為干擾，因此種數與數量主要受自然因素影響而變動，目前種數都能穩定維持在 30 種以上。歷次監測優勢物種以低耐污物種的舟形藻與橋彎藻為主，除了部分季次以顫藻為優勢種，顯示水質較為轉差之外，此測站的水質大致維持在輕度至中度污染水質，大多處於輕度污染水質狀態。

歷次雷公坑溪下游測站監測結果，種類數介於 5~42 種之間，種數以 107 年第 1 季有 54 種最多，數量以 105 年第 3 季(7 月)43,212,800 細胞數/100 平方公分最多。107 年第 3 季的種數有 26 種，數量則是有 947,200 細胞數/100 平方公分。本季因為進入雨季後恢復為有水的狀態，所以有監測到附著性藻類，而種數與數量與也歷次監測結果相比也呈現穩定的狀態。GI 計算結果呈現中度污染的狀態，但是無明顯的優勢種，顯示水質呈現輕度至中度污染的狀態，與歷年計算結果多維持在輕度至中度污染之間相符。歷次監測結果，本測站在 104 年工程結束逐漸後，人為的擾動已經明顯減少，目前在有水流的情形下，種數大致都能穩定維持在 30 種以上。歷次監測優勢種以中耐污物種的菱形藻及低耐污物種的橋彎藻與舟形藻為主，顯示此測站為輕度至中度污染水質，但是在水流量少或大雨帶來大水過後，水質容易有轉差的現象，如 104 年第與 106 年第 3 季就監測到大量的水綿(*Spirogyra* sp.)與顫藻(*Oscillatoria* sp.)。

2.與歷年同季比對

本季與歷年同季相比，清水溪的三處測站的種數在 104 年以後隨著工程擾動減少以後，都能較 100 年至 103 年工程期間豐富，目前大多能維持在 30 種以上。數量上除了部分季次有較大的變動外，也大多呈現穩定的狀態，本季的種數與數量與歷年同季相比則維持穩定狀態。

梅南橋測站在 104 年以後種數也較為增加，除了 105 年的種數較為偏少外，目前種數都較 103 年以前豐富，本季的種數與數量與歷年同季相比也同樣維持穩定狀態。

雷公坑溪兩處測站的種數在 104 年以後都較 100 年至 103 年豐富，但是數量的變化則較大。本季的種數與歷年同季相比大致維持穩定，但是數量則有較大的變化。

3.與上季比對

清水溪三處測站本季與上季(107 年第 2 季)比對中，種數與數量都呈現穩定的狀態，主要在於水流量與水流速雖然明顯增加，但是在岸邊的緩流區仍有許多附著性藻類生長所致。本季清水溪三處測站之 GI 計算結果介於輕度至中度污染之間，而優勢種則是以耐污性低的物種為主，也與上一季大致相同，僅桶頭測站轉為嚴重污染，較上一季略為轉差。

梅林溪梅南橋測站本季五河局的河道景觀工程已完工，並恢復為有水流的狀態，故本季監測到的種數與數量都較上一季增加。

雷公坑溪兩處測站，雷公坑溪上游測站的種數與數量呈現穩定的狀態，優勢種以中耐污性的菱形藻轉為以低耐污性的鼓藻為主，本季 GI 計算結果也呈現輕度污染的狀態，顯示水質較上一季好轉。而雷公坑溪下游測站本季都恢復微有水的狀態，所以監測到的種數與數量都較上一季增加。

二、水庫區水域生物

(一)本季監測成果

湖南(第一)取出水工附近測站 7 月共監測到 2 門 20 種，分別為矽藻門 19 種與綠藻門 1 種，數量 6,118,400 細胞數/100 平方公分，以卵囊藻(*Oocystis* sp.)的數量最多。湖南(第一)取出水工附近測站 7 月多樣性指數為 0.76，均勻度指數為 0.25，GI 值為 1.33，屬於中度污染水質，SI 值為 2.29，屬於輕度污染水質。

湖山(第二)取出水工附近測站 7 月共監測到 2 門 22 種，分別為矽藻門 20 種與綠藻門 2 種，數量 3,788,800 細胞數/100 平方公分，以卵囊藻的數量最多。湖山(第二)取出水工附近測站 7 月多樣性指數為 1.89，均勻度指數為 0.61，GI 值為 2.00，屬於輕度污染水質，SI 值為 2.24，屬於輕度污染水質。

引水隧道出口附近測站 7 月共監測到 2 門 20 種，分別為矽藻門 19 種與藍綠藻門 1 種，數量 1,024,000 細胞數/100 平方公分，優勢種為隱頭舟形藻(*Navicula cryptocephala*)。引水隧道出口附近測站 7 月多樣性指數為 2.93，均勻度指數為 0.98，GI 值為 1.20，屬於中度污染水質，SI 值為 2.71，屬於中度污染水質。

(二)歷次監測結果檢討

1.與歷次比對

107 年第 3 季監測結果，水庫區內的湖南(第一)取出水工附近測站與湖山(第二)取出水工附近測站本季監測到的種數與歷年監測結果相比大致維持穩定的狀態，但是數量雖然也在歷年的變動之內，但是明顯較為偏多。由於水庫區內兩處測站的水位因配合取水、蓄水安全檢查，所以仍會有較大的變動，當水位剛上升時，附著性藻類剛開始生長在剛沒入水中的石塊與水泥建構物上，監測到的種數與數量會較為稀少，但是當水位在某一高度附近停留較久的時間後，附著性藻類已生長一段時間，監測到的種數與數量則會較多，所以現階段(試營運)水庫之附著性藻類仍屬較不穩定。

本季引水隧道出口附近測站的附著性藻類的種數與數量跟歷年監測結果相比維持穩定的狀態。由於受到取水與否的影響，水流量的變動非常大，因此部分季次的種數與數量有較大的變動，如105年第2季、105年第3季與106年第2季的種數就明顯偏低許多。

2.與歷年同季比對

水庫區內的2處測站在105年皆未監測到附著性藻類，而在106年以後才有監測到附著性藻類。由本季與106年同季相比，兩處測站的種數都維持穩定的狀態，僅湖南(第一)取出水工附近測站的數量有較大的差異。引水隧道出口附近測站的附著性藻類在歷年同季的比較上，種數呈現逐漸增加的狀態，而數量在105年明顯較106年與107年多。由於目前此三處測站都僅有三季有記錄附著性藻類的監測資料，所以尚無法看出其明顯的變化趨勢。

3.與上季比對

水庫區內2處測站，湖南(第一)取出水工附近測站的種數維持穩定，但是數量較上一季(107年第2季)增加。而湖山(第二)取出水工附近測站則是種數與數量都維持穩定的狀態。引水隧道出口附近測站則是因為引水量較為增加，產生沖刷的程度也較大，所以種數與數量跟上一季相比略微減少。

2.5.6 浮游動物

一、河川水域生物

(一)本季監測成果

本季清水溪三處測站皆未監測到浮游動物，主要原因係清水溪浮游動物數量較為稀少，且本季監測正值雨季時期，清水溪河川流量大且快，故未採集到浮游動物。

梅南橋測站7月監測到原生動物(Protozoa)5種，數量為28個體數/公升，以匣殼蟲(*Centropyxis* sp.)的數量較多。梅南橋測站7月的多樣性指數為0.47，均勻度指數為0.43。

雷公坑溪上游(天心橋)測站與雷公坑溪下游測站7月皆未監測到浮游動物，原因應是浮游動物數量原本就屬稀少，且本季監測正值雨季時期，水域面積增加且流速較快，因此未監測到浮游動物。

(二)歷次監測結果檢討

1.與歷次比對

歷次各測站種數及數量均發現不多，桶頭吊橋測站種數0~3種，以100年第3季(9月)的136個體數/公升較多，桶頭橋測站種數0~4種，以103年第1季(2月)56個體數/公升較多，桶頭橋下游測站種數0~3種，以102年第5季(9月)、103年第1季(2月)與106年第1季(2月)的16個體數/公升較多，梅南橋測站種數0~7種，以104年第1季(1月)710個體數/公升較多，雷公坑溪上游測站種數0~6種，以106年第2季(4月)的40個體數/公升較多，雷公坑溪下游測站種數0~7種，以104年第1季(1月)390個體數/公升較多。本季清水溪三處測站與雷公坑溪兩處測站都未監測到浮游動物，由歷年的資料顯示清水溪與雷公坑溪的浮游動物本就稀少，再加上本季水域面積增加且受水流速較快之影響，本季未監測到浮游動物，仍屬自然的現象。梅林溪梅南橋測站雖已恢復為有水的狀態，但本季監測到的浮游動物較為稀少，與之前的監測結果相比大致維持穩定的狀態。整體而言，所有測站的浮游動物的種類與數量大多呈現稀少的狀態，依舊無法看出明顯的變化趨勢，主要係以上測站皆屬於流水域型態的測站，在水流速較快的狀態下，浮游動物較難生存，而較不易留在該水域中。

2.與歷年同季比對

本季清水溪三處測站都未監測到浮游動物，與歷年同季比對，種數與數量都屬稀少的狀態，並無太大差異。雷公坑溪兩處測站本季與歷年同季相比，數量都屬於稀少的情形。由於清水溪與雷公坑溪的浮游動物皆屬稀少，無法看出其變化趨勢。梅南橋測站為浮游動物相對較為豐富的測站，但因為數量的變動頗大，亦無法看出其變化的趨勢。

3.與上季比對

清水溪三處測站與雷公坑溪兩處測站跟上一季(107年第2季)相比皆未監測到浮游動物，所以種數與數量都較為減少。梅南橋測站上一季完全乾涸，本季雖已恢復為有水的狀態，雖有監測到浮游動物，但是數量仍屬稀少。

二、水庫區水域生物

(一)本季監測成果

湖南(第一)取出水工附近測站7月共監測到3大類8種，分別為原生動物3種、輪形動物(Trochelminthes)2種與甲殼類

(Crustacea)3 種，數量為 96 個體數/公升，以甲殼類的猛水蚤(Harpacticoida)為優勢種。湖南(第一)取出水工附近測站 7 月多樣性指數為 0.66，均勻度指數為 0.41。

湖山(第二)取出水工附近測站 7 月共監測到 3 大類 7 種，分別為原生動物 3 種、輪形動物 3 種與甲殼類 1 種，數量為 48 個體數/公升，以猛水蚤為優勢種。湖山(第二)取出水工附近測站 7 月多樣性指數為 1.50，均勻度指數則為 0.84。

引水隧道出口附近測站本季未監測到浮游動物。於本測站的水流速明顯較快，而且容易受到引水時水流量大且湍急的影響，所以浮游動物的種數與數量都明顯稀少。

(二)歷次監測結果檢討

1.與歷次比對

107 年第 3 季監測結果與歷次比對，湖南(第一)取出水工附近測站與湖山(第二)取出水工附近測站浮游動物的種數都較為偏多，但是數量較為偏少，但都還在歷年的變化之內。由於該兩處測站屬於湖泊靜水域型態，浮游動物相對於溪流較易生長留存，但是因為水位升高後水域面積有明顯增加，所以浮游動物的數量也略微下降亦屬正常現象。引水隧道出口附近測站本季未監測到浮游動物，主要係本測站屬於流動型水域，引水與否將會明顯影響水流量與水流速，以致種數與數量大多呈現稀少的狀態。整體而言，水庫區內浮游動物的種數與數量因屬於靜水域型態，適合浮游動物生長流存，但是受到水位升降的影響，數量會有較大的變動，但種數大致可維持穩定。引水隧道出口附近測站則是屬於流水域型態，浮游動物容易順著水流被帶往下游，再加上引水時水流量與水流速明顯增加的影響，種數與數量也較為稀少。

2.與歷年同季比對

水庫區的湖南(第一)取出水工附近測站與湖山(第二)取出水工附近測站的浮游動物的種數大致維持穩定的狀態，但是數量的變動頗大。引水隧道出口附近測站的種數與數量則是都呈現稀少的狀態。目前也因為僅有三季有記錄到浮游動物之監測資料，而且數量的變動大，目前尚無法看出浮游動物種數與數量的變化趨勢。

3.與上季比對

湖南(第一)取出水工附近測站與湖山(第二)取出水工附近測站的種數與上一季相比(107 年第 2 季)，數量明顯減少，但都維持穩定的狀態。引水隧道出口附近測站本季未監測到浮游動物，推估應是受到引水時水流量大而快的影響。

2.5.7 蜻蜓類

一、河川水域生物

(一)本季監測成果

桶頭吊橋測站7月共監測到4科10種35隻次，優勢種為蜻蜓科(Libellulidae)的紫紅蜻蜓(*Trithemis aurora*)。9月則是監測到3科9種108隻次，以蜻蜓科的薄翅蜻蜓(*Pantala flavescens*)數量最多。本季監測到的臺灣特有種有幽蟌科(Euphaeidae)的短腹幽蟌(*Euphaea formosa*)。桶頭吊橋測站7月多樣性指數為2.02，均勻度指數為0.88，9月多樣性指數為1.10，均勻度指數為0.50。

桶頭橋測站7月僅監測到1科1種1隻次，為蜻蜓科的薄翅蜻蜓。9月則是監測到4科8種70隻次，仍以蜻蜓科的薄翅蜻蜓數量最多。本季監測到的臺灣特有種有幽蟌科的短腹幽蟌。桶頭橋測站7月因為僅監測1種，所以多樣性指數為0，均勻度指數則為1.00，9月的多樣性指數為1.22，均勻度指數為0.58。

桶頭橋下游測站7月監測到1科3種6隻次，數量以樂仙蜻蜓(*T. festiva*)較多。9月監測到4科7種64隻次，以蜻蜓科的薄翅蜻蜓數量最多。本季監測到的臺灣特有種有幽蟌科的短腹幽蟌。桶頭橋下游測站7月因為多樣性指數為1.01，均勻度指數則為0.92，9月多樣性指數為0.85，均勻度指數則為0.44。

梅南橋測站7月共監測到4科10種29隻次，以蜻蜓科的樂仙蜻蜓數量較多。臺灣特有種有1種，為幽蟌科的短腹幽蟌。梅南橋測站7月多樣性指數為2.08，均勻度指數為0.90。

雷公坑溪上游(天心橋)測站7月僅監測到1科1種3隻次，為臺灣特有種的幽蟌科的短腹幽蟌。雷公坑溪上游(天心橋)測站7月因為僅監測1種，多樣性指數為0，均勻度指數無法計算。

雷公坑溪下游測站7月共監測到1科1種1隻次，為蜻蜓科的薄翅蜻蜓。雷公坑溪下游測站7月因為僅監測1種，多樣性指數為0，均勻度指數無法計算。

(二)歷次監測結果檢討

1.與歷次比對

107年第3季與歷次比對，本季清水溪三處測站雖在7月的數量較為稀少，但是在9月監測到的數量為歷年監測以來最多的一次，主要是因為監測到大量的薄翅蜻蜓，而薄翅

蜻蜓會有成群聚集的現象，以致蜻蜓數量有大幅增加的現象。歷年監測結果也是在5月至10月之間的數量較為豐富，因此監測結果大致與歷年監測結果相符合。歷年監測結果也顯示桶頭橋測站因為受到泥沙覆蓋棲地影響，使得蜻蛉目(Odonata)幼蟲與成蟲都較少，所以蜻蜓數量較少。

梅南橋測站蜻蜓的種數與數量自104年第2季水庫相關工程逐漸完工後，種數大致維持穩定4~7種之間而數量亦不少。本測站在本季已恢復為有水的的狀態，蜻蜓的種數與數量也尚屬穩定。

雷公坑溪兩處測站方面，排除未監測到蜻蜓的季次，本季兩處測站所監測到的種數與數量為歷次監測以來最少的一季。雷公坑溪下游測站因為河床已經乾涸許久，本季雖然恢復為有水的狀態，但是蜻蜓的種數與數量仍屬稀少應屬自然。雷公坑溪上游測站種數與數量亦明顯減少，但是棲地環境係屬於穩定未曾改變，推估應屬自然的波動，後續將持續監測以了解種類與數量是否會有所恢復。

2.與歷年同季比對

107年第3季與歷年同季比對，清水溪的三處測站中蜻蜓的種數與數量大致維持穩定的狀態，僅107年第3季(7月)的種數與數量明顯偏低，本季9月三處測站的蜻蜓的數量為歷年同季監測以來最多的一季。梅南橋測站的種數與數量在104年以後種數與數量都有逐漸增加的趨勢，除了7月為蜻蜓成蟲大量出現活動的季節外，本測站有較大面積的草澤區域可做為蜻蜓棲息與產卵的棲地。另五河局的工程促使本棲地由無水狀態長出許多草叢，當本季恢復為有水並呈現靜水域的狀態時，將吸引許多蜻蜓前來棲息，使得本季的種數成為歷年同季監測以來最多的一季，後續仍須持續監測追蹤了解蜻蜓變化情形。

雷公坑溪上游測站的種數與歷季監測結果相比，種數與數量都是歷年同季最少的一季，但是因為棲地仍是呈現穩定並無變動的狀態，所以目前判斷應屬自然的波動，後續將持續監測以了解種類與數量是否會有所恢復。而雷公坑溪下游測站本季同樣是歷年同季最少的一季，雖然本季河道恢復為有水的狀態，但是因為河道乾涸許久，使得蜻蜓的對該棲地的利用性尚未恢復所致。

3.與上季比對

本季清水溪三處測站7月的蜻蜓的種數與數量除了桶頭吊橋測站維持穩定外，另外兩處測站都略微減少。9月時三

處測站因為監測到大量的薄翅蜻蜓，使得本季的9月數量較上一季(107年第2季)增加許多。梅南橋測站上一季因為仍呈現無水的狀態，故未監測到任何蜻蜓，本季已恢復有水的狀態，蜻蜓的種數與數量明顯的恢復。雷公坑溪兩處測站本季蜻蜓種數與數量都較上一季較為減少，應是自然的變動，但後續仍會持續監測以了解種類與數量是否會有所恢復。

二、水庫區水域生物

(一)本季監測成果

湖南(第一)取出水工附近測站7月監測到3科4種5隻次，數量以蜻蜓科的紫紅蜻蜓為優勢種。湖南(第一)取出水工附近測站7月多樣性指數為1.26，均勻度指數則為0.91。

湖山(第二)取出水工附近測站7月監測到2科5種9隻次，數量以蜻蜓科的紫紅蜻蜓為優勢種。湖山(第二)取出水工附近測站7月因為多樣性指數為1.56，均勻度指數則為0.97。

引水隧道出口附近測站7月監測到2科2種7隻次，以蜻蜓科的樂仙蜻蜓為優勢種。引水隧道出口附近測站7月多樣性指數為0.64，均勻度指數為0.92。

(二)歷次監測結果檢討

1.與歷次比對

水庫區域內本季湖南(第一)取出水工附近測站與湖山(第二)取出水工附近測站的蜻蜓種數與數量跟歷次監測比對，大致呈現較為稀少但是穩定的狀態。該兩處測站因為缺乏可供蜻蜓幼蟲棲息的草澤地且底質皆為大型石塊與水泥等硬底質，難以吸引蜻蜓在此處繁殖，故監測到的蜻蜓的種數與數量相對較少，爰監測到的蜻蜓大多是途經此區域，而鮮少觀察到產卵的行為。引水隧道出口附近測站的本季因為棲地維持穩定的狀態，所以種數與數量大致維持穩定。該棲地因為自然度較水庫區內的兩處測站高，但是引水時水流量大且流速快，所以監測到的蜻蜓應是在周圍的緩流域活動的個體，而觀察到的產卵行為也都是在引水以外的水流域。

2.與歷年同季比對

水庫區兩處測站在歷年同季的比較中，蜻蜓的種數在105年都較為稀少，但是106年與107年則較為穩定，但是數量上都仍有較大的變動。引水隧道出口附近測站種數與數量都呈現逐減少的狀態。目前因為僅有三季有記錄到蜻蜓之資料，較無法看出其變化趨勢。

3.與上季比對

水庫區兩處測站蜻蜓的種數與數量都較上一季(107 年第 2 季)相比種數與數量都有略微增加。引水隧道出口附近測站的種數與數量則大致維持穩定的狀態。

2.5.8 魚道效益評估

本季魚道效益評估監測測站如圖 2.5-15 所示，其中共包括 6 處測站，採測站分別為桶頭攔河堰上游(後簡稱：魚道上方)、桶頭攔河堰魚道(欄河堰魚道)、桶頭攔河堰下游(後簡稱：魚道下方)、桶頭固床工上游(後簡稱：固床工上方)、桶頭固床工魚道(後簡稱：固床工魚道)及桶頭固床工下游(後簡稱：固床工下方)。監測方式均以電魚法、籠具誘捕法為主；桶頭固床工魚道則僅以電魚法進行。攔河堰魚道與固床工魚道在考量人員安全以及避免對魚類及水中生物造成損傷的前提下，電魚法僅進行一次。本季監測時間為 9 月 4 至 7 日。

魚道效益評估監測結果不同方式捕獲法及捕獲魚類及蝦類之數量分別列於表 2.5-2 及表 2.5-3。本季共監測到 137 隻魚類及 45 隻沼蝦。本季監測共捕獲 11 種魚類，其中魚類部分以何氏棘魚(27 隻次)捕獲數量較多，沼蝦部分以粗糙沼蝦(42 隻次)最多。依據本季魚類的魚類組成資料，發現魚類組成以游泳性魚類為主，佔總捕獲量的 59%。在蝦類方面，以陸封型的粗糙沼蝦為主(93.3%)，洄游性的大和沼蝦共捕獲 3 隻(6.7%)。其中，電魚法捕獲魚類數量較多，蝦籠則以沼蝦捕獲數較多。

本季監測桶頭攔河堰魚道中的單向籠未捕獲到任何生物，但是以電氣法則監測到何氏棘魚、臺灣白甲魚、臺灣石魚賓、臺灣間爬岩鰍與埔里中華爬岩鰍。本季固床工魚道捕獲埔里中華爬岩鰍。上季(107 年第 2 季)首次於桶頭攔河堰魚道中監測到棲地未受阻隔重要指標之物種—「臺灣白甲魚」本季亦持續發現該魚種。臺灣白甲魚游泳能力強，跳躍能力佳，偏好激流水域，喜歡棲息在水流湍急的區域，如瀨區、潭頭等水域的中下水層中，尤其以落差稍大而水流湍急的河段最多。張世倉等(1997、1998)於烏石坑溪進行棲地改善之調查發現，臺灣白甲魚成魚有季節性洄游現象，在雨季末期(10 月)成魚上溯，而雨季初期(3 月)往下遷移，並同時以標識法證明臺灣白甲魚確實可以利用水池式魚道上溯洄游。雖然目前監測結果無法證實臺灣白甲魚是利用桶頭攔河堰魚道洄游，考量該魚種洄游習性及其他研究結果，本計畫將以臺灣白甲魚作為棲地環境未受阻隔之參考指標物種。

相較歷年魚類魚道上方、魚道下方、固床工上方及固床工下方各次監測游泳性魚類、底棲性魚類及魚類數量變化(圖 2.5-18)。分析游泳性魚類及底棲性魚類魚類比例，發現魚道上方及魚道下方游泳/底棲性物種比例約略為 40~60%左右穩定的變動，固床工上方游泳/底棲性物種為 90%以上，固床工下游則呈現較大的變動。由魚類特性可知，固床工上方棲地已呈現游泳性魚類適合生存的環境，固床工下方棲地則呈

現不穩定的狀況。此外，固床工上方及固床工下方的監測到的豐度有漸減的趨勢，須多加注意。

相較魚類魚道上方、魚道下方、固床工上方及固床工下方各次監測及各測站物種組成相似度變化(圖 2.5-19)。本季四處測站物種相似度均介於 42.5%~68.9%，由清水溪上游到下游分別為魚道上方與魚道下方、魚道下方與固床工上方及固床工上方與固床工下方等三區域，其物種相似度分別為 42.5%、64.2%及 57.1%。若以最上游及最下游兩處測站魚道上方與固床工下方分析，其物種相似度為 68.9%。若以歷次監測的資料顯示，清水溪環境中無太大的變動時，四處測站的物種組成相似度應維持在 50%以上，顯示具有魚道的桶頭攔河堰並無太大的縱向性阻隔。但是，若遭到颱風或強降雨等大環境擾動時，四處測站物種相似度將會明顯降低。因此，颱風或強降雨帶來豐沛的雨量後，使得多數的水生生物會順著大水往下游移動，部分區域洄游的種類是否可以利用魚道促使四處測站的族群恢復也是後續觀察的重點。而魚道下方與固床工上方兩處測站無人工構造物阻隔，但在兩處測站的魚類組成相似度卻自 106 年 6 月後降至 50%以下，主要原因在於桶頭固床工完成後改變原來的棲地類型，固床工上方由以前的流動水域轉變為靜水域且泥沙淤積明顯，而魚道下方則保持為流動水域，使得無人工構造物阻隔的兩處測站棲地類型出現明顯差異，魚類組成也出現明顯的差異。而由游泳性魚類與底棲性魚類比例也可知，魚道下方與固床工上方兩處測站棲地組成有極大的不同(圖 2.5-18)。至於為何兩處測站樣區雖相臨不遠，但是 106 年 6 月後棲地組成及魚類組成相似度有極大的改變，這是否與桶頭攔河堰或桶頭固床工有關，值得後續持續追蹤及探討

另一方面，本季監測到何氏棘魚個體大小及數量均明顯大於去年監測結果。何氏棘魚雖為臺灣特有種，原本分布於臺灣南部與東部的溪流，為許多溪釣釣客熱衷垂釣的魚種，因此後來因為有釣客為了能在臺灣的其他溪流也能垂釣何氏棘魚，而將該魚種引入北部與中部的溪流，故何氏棘魚在清水溪中屬於人為移入的外來魚種。何氏棘魚喜好棲息在水流稍急、河底為礫石之河段，且跳躍能力佳，棲息環境與清水溪原有的魚種相互重疊。因此何氏棘魚的出現可能經由主動掠食原生種及資源利用的壓縮造成臺灣石魚賓、臺灣鬚鱲、粗首馬口鱲及高身小鰾鮈等清水溪原生魚種減少，亦為需關注的議題。

表 2.5-1　本季水域生物監測時間一覽表－河川

測站＼時段	第一天 7/10	第二天 7/11	第三天 7/12	第四天 7/13
梅林溪 (梅南橋)	1.籠具布置 2.電氣捕魚 3.全項目之採樣(集)	1.全項目之採樣(集) 2.籠具回收與布置	1.全項目之採樣(集) 2.籠具回收與布置	籠具回收
桶頭橋固床工下游 (桶頭橋下游)	1.籠具布置 2.電氣捕魚 3.全項目之採樣(集)	1.全項目之採樣(集) 2.籠具回收與布置	1.全項目之採樣(集) 2.籠具回收與布置	籠具回收
雷公坑溪 引水路上游	1.籠具布置 2.電氣捕魚 3.全項目之採樣(集)	1.全項目之採樣(集) 2.籠具回收與布置	1.全項目之採樣(集) 2.籠具回收與布置	籠具回收
雷公坑溪 引水路下游	1.籠具布置 2.電氣捕魚 3.全項目之採樣(集)	1.全項目之採樣(集) 2.籠具回收與布置	1.全項目之採樣(集) 2.籠具回收與布置	籠具回收
測站＼時段	第一天 7/17	第二天 7/18	第三天 7/19	第四天 7/20
桶頭攔河堰上游 (桶頭吊橋)	1.籠具布置 2.電氣捕魚 3.全項目之採樣(集)	1.全項目之採樣(集) 2.籠具回收與布置	1.全項目之採樣(集) 2.籠具回收與布置	籠具回收
桶頭攔河堰下游 (桶頭橋)	1.籠具布置 2.電氣捕魚 3.全項目之採樣(集)	1.全項目之採樣(集) 2.籠具回收與布置	1.全項目之採樣(集) 2.籠具回收與布置	籠具回收

註：各項水域生物之動物監測項目均進行三重複次數努力量，其中電魚法則進行一次，主要係避免對魚類及水中生物造成損傷；相關監測係依據 100 年 7 月最新公告之動物生態評估技術規範執行。

表 2.5-1　本季水域生物監測時間一覽表－水庫 (續 1)

時段 / 測站	第一天 7/17	第二天 7/18	第三天 7/19	第四天 7/20
湖山壩址 (第二取出水工附近)	1.籠具布置 2.電氣捕魚 3.全項目之採樣(集)	1.全項目之採樣(集) 2.籠具回收與布置	1.全項目之採樣(集) 2.籠具回收與布置	籠具回收
湖南壩址 (第一取出水工附近)	1.籠具布置 2.電氣捕魚 3.全項目之採樣(集)	1.全項目之採樣(集) 2.籠具回收與布置	1.全項目之採樣(集) 2.籠具回收與布置	籠具回收
引水隧道出口附近	1.籠具布置 2.電氣捕魚 3.全項目之採樣(集)	1.全項目之採樣(集) 2.籠具回收與布置	1.全項目之採樣(集) 2.籠具回收與布置	籠具回收

表 2.5-1　本季水域生物監測時間一覽表－水庫(續 2)

時段 / 測站	第一天 9/3	第二天 9/4	第三天 9/5	第四天 9/6
桶頭攔河堰上游 (桶頭吊橋)	1.全項目之採樣(集) 2.籠具布置 3.電器捕魚	1.全項目之採樣(集) 2.籠具回收與布置	1.全項目之採樣(集) 2.籠具回收與布置	籠具回收
桶頭攔河堰下游 (桶頭橋)	1.全項目之採樣(集) 2.籠具布置 3.電器捕魚	1.全項目之採樣(集) 2.籠具回收與布置	1.全項目之採樣(集) 2.籠具回收與布置	籠具回收
桶頭橋固床工 下游	1.全項目之採樣(集) 2.籠具布置 3.電器捕魚	1.全項目之採樣(集) 2.籠具回收與布置	1.全項目之採樣(集) 2.籠具回收與布置	籠具回收

註：各項水域生物之動物監測項目均進行三重複次數，其中電魚法則進行一次，主要係避免對魚類及水中生物造成損傷，相關監測係依據 100 年 7 月最新公告之動物生態評估技術規範執行。

表 2.5-1　本季水域生物監測時間一覽表－魚道效益評估(續 3)

時段 / 測站	第一天 9/4	第二天 9/5	第三天 9/6	第四天 9/7
桶頭攔河堰上游 (魚道上方)	1.籠具布置 2.電氣捕魚	1.籠具回收與布置	1.籠具回收與布置	1.籠具回收
桶頭攔河堰魚道 (欄河堰魚道)	1.籠具布置 2.電氣捕魚	1.籠具回收與布置	1.籠具回收與布置	1.籠具回收
桶頭攔河堰下游 (魚道下方)	1.籠具布置 2.電氣捕魚	1.籠具回收與布置	1.籠具回收與布置	1.籠具回收
桶頭固床工上游 (固床工上方)	1.籠具布置 2.電氣捕魚	1.籠具回收與布置	1.籠具回收與布置	1.籠具回收
桶頭固床工下游 (固床工下方)	1.籠具布置 2.電氣捕魚	1.籠具回收與布置	1.籠具回收與布置	1.籠具回收
桶頭攔河堰上游 (魚道上方)	1.籠具布置 2.電氣捕魚	1.籠具回收與布置	1.籠具回收與布置	1.籠具回收

註：1.各項水域生物之動物監測項目均進行三重複次數，其中電魚法則進行一次，主要係考量人員安全與避免對魚類及水中生物造成損傷的前提下，相關監測係依據 100 年 7 月最新公告之動物生態評估技術規範執行。

2.由於桶頭固床工魚道並無法擺設籠具，因此只能以電氣採集法進行監測。

表 2.5-2　9 月湖山水庫魚道監測不同方式捕獲之魚類及蝦類

科	中名	魚道上方				攔河堰魚道		魚道下方				固床工上方			固床工魚道			固床工下方			總合
		蝦	長	電	釣	單	電	蝦	長	電	釣	蝦	長	電	蝦	長	電	蝦	長	電	
鯉科	臺灣白甲魚			1			2														3
鯉科	臺灣石魚賓	3	3	1			1	3				3								2	16
鯉科	臺灣鬚鱲	12						12		1											25
鯉科	高身小鰾鮈			2																1	3
鯉科	粗首馬口鱲			5																2	7
鯉科	何氏棘魞			3			3		3									3		15	27
鱨科	短臀擬鱨			3						1								3		1	8
爬鰍科	埔里中華爬岩鰍 III			1			7									1				1	10
爬鰍科	臺灣間爬岩鰍			1			11			3										5	20
鰕虎魚科	明潭吻鰕虎	3		2				6		6										1	18
長臂蝦科	粗糙沼蝦							9				18		2				12		1	42
長臂蝦科	大和沼蝦	3																			3

註：

1.魚類名錄及生息狀態參考自中央研究院之臺灣魚類資料庫 http://fishdb.sinica.edu.tw/

2. III 其他應予保育之野生動物

3.本季固床工魚道未監測到魚類與蝦蟹類

4.蝦：蝦籠；長：長沉籠；電：電氣法；釣：釣捕法；單：單向籠法

表 2.5-3　本年度 1~3 季湖山水庫魚道監測捕獲之魚類及蝦類數量

科	中名	學名	魚道上方			欄河堰魚道			魚道下方			固床工上方			固床工魚道			固床工下方			總數		
			3月	5月	9月	3月	5月	9月	3月	5月	9月	3月	5月	9月	3月	5月	9月	3月	5月	9月	3月	5月	9月
鯉科	臺灣白甲魚	*Onychostoma barbatulum*			1		3	2														3	3
鯉科	臺灣石魚賓	*Acrossocheilus paradoxus*	12	6	7		2	1	6	3	3	9		3				6		2	33	11	16
鯉科	臺灣鬚鱲	*Candidia barbata*		6	12					3	13	78	3						3		78	15	25
鯉科	高身小鰾鮈	*Microphysogobio alticorpus*	3		2					8								3	7	1	6	15	3
鯉科	粗首馬口鱲	*Opsariichthys pachycephalus*	1	1	5				1	3			3					11	3	2	13	10	7
鯉科	何氏棘魞*	*Spinibarbus hollandi*	25	5	3	4		3	2		3	3	3					45	20	18	79	28	27
鱨科	短臀擬鱨	*Pseudobagrus brevianalis*			3					1	1								1	4		2	8
爬鰍科	埔里中華爬岩鰍 III	*Sinogastromyzon puliensis*			1		1	7	2								1			1	2	1	10
爬鰍科	臺灣間爬岩鰍	*Hemimyzon formosanum*	3	5	1	10		11	6		3									5	19	5	20
鰕虎科	明潭吻鰕虎	*Rhinogobius candidianus*	18	16	5				6	15	12							1	15	1	25	46	18
長臂蝦科	粗糙沼蝦	*Macrobrachium asperulum*	57	57					9	127	9	45	154	20				15	91	13	126	416	42
長臂蝦科	大和沼蝦	*Macrobrachium japonicum*			3		1		1	6											1	7	3
長臂蝦科	日本沼蝦	*Macrobrachium nipponense*											3									3	
		物種小計	7	7	11	2	1	5	8	8	7	4	5	2	0	0	1	6	7	9	10	13	12
		數量小計	119	96	43	14	7	24	33	166	44	135	153	23	0	0	1	81	140	47	382	562	182

註：

1.魚類名錄及生息狀態參考自中央研究院之臺灣魚類資料庫 http://fishdb.sinica.edu.tw/

2.電氣捕魚法經換算後為 100 平方公尺之數量；單向籠僅使用於攔河堰魚道，而其他測站則使用一般蝦籠

3.數量小計 1：除固床工魚道及魚道外，其於測站均以 5 個蝦籠捕獲之 3 次總數量及電魚法(100m)1 次之捕獲數之總和

4.數量小計 2：固床工魚道以電魚法之捕獲最大值表示；魚道以兩個單向籠捕獲之數量及電魚法(100m)捕獲數之總和

5.臺灣馬口魚修訂為臺灣鬚鱲(2012 年 4 月 10 日修訂)；高身鰾柄魚修訂為高身小鰾鮈(2012 年 4 月 10 日修訂)；粗首鱲修訂為粗首馬口鱲(2012 年 3 月 29 日修訂)

6. III 其他應予保育之野生動物

7.本季固床工魚道未監測到魚類與蝦蟹類

8. *何氏棘魞雖為臺灣特有種，但是清水溪中屬於人為移入的外來魚種。

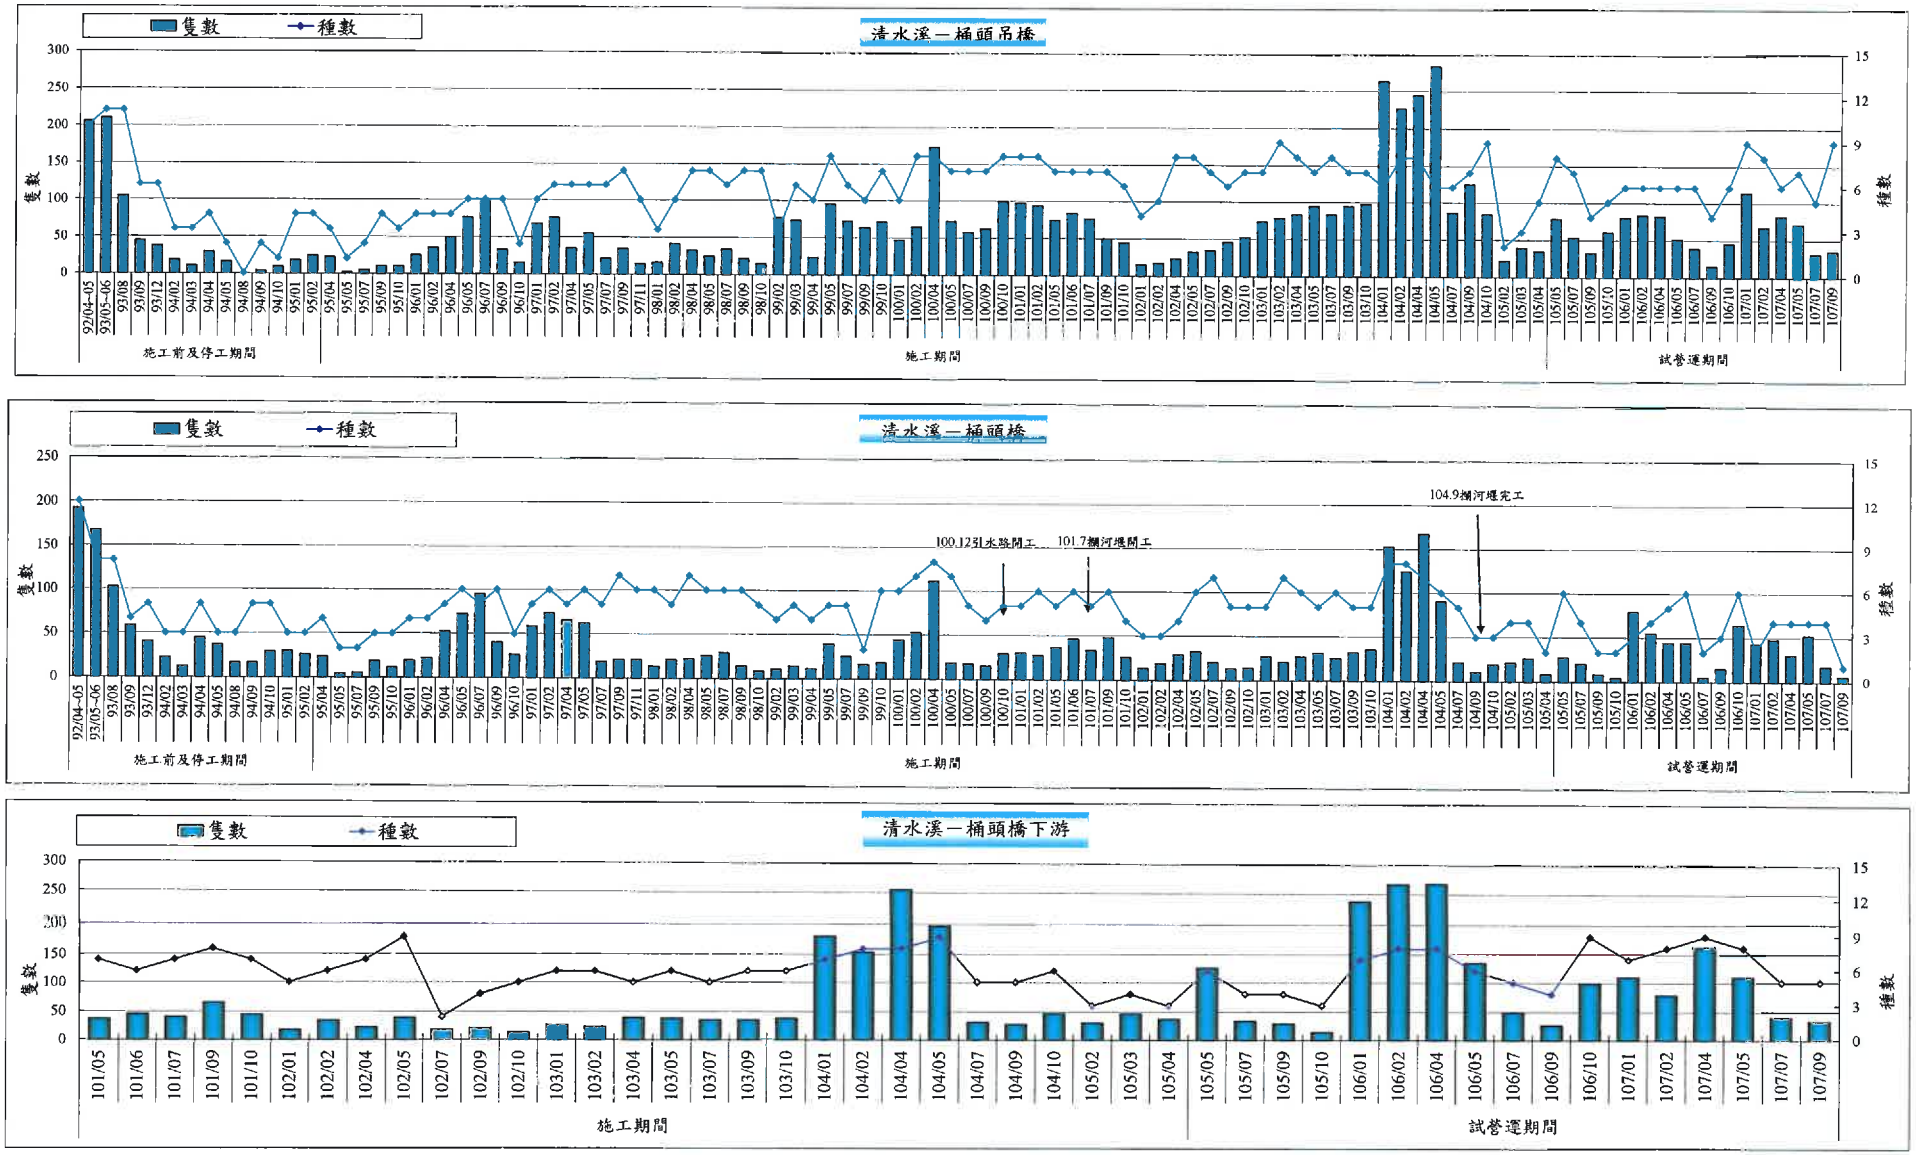

圖 2.5-1　歷次魚類監測結果比較

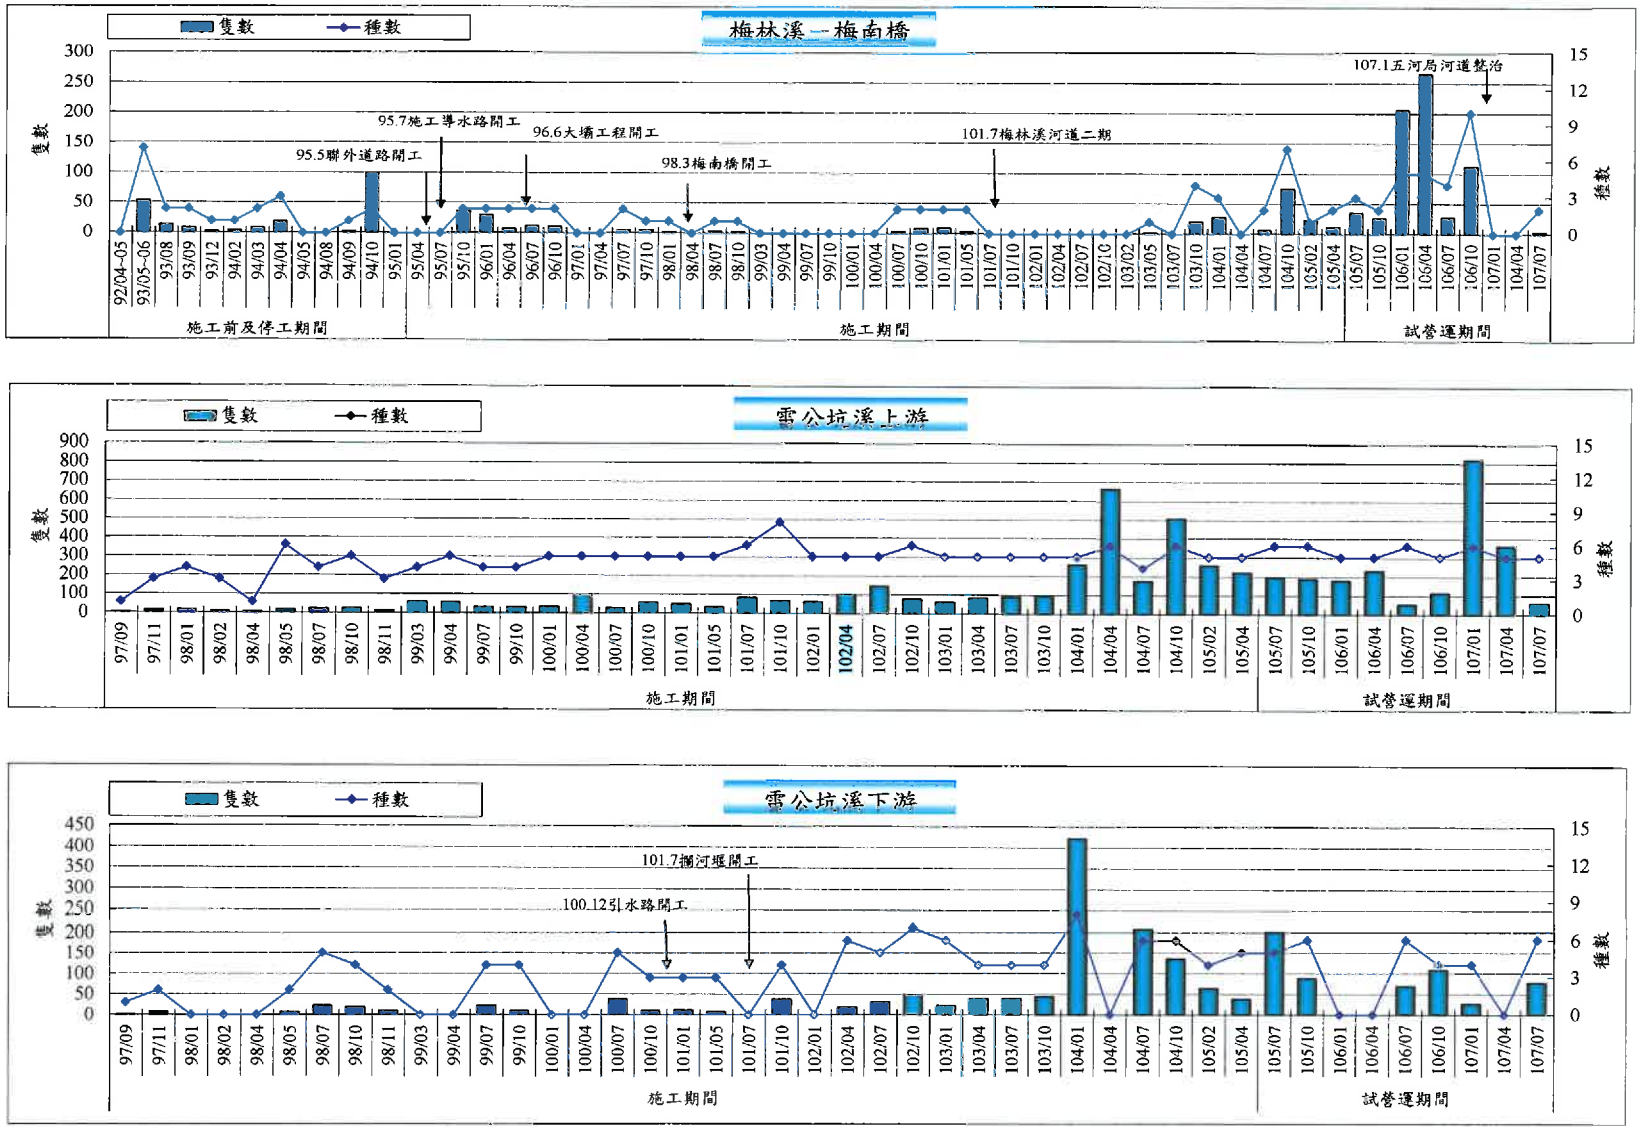

圖 2.5-1　歷次魚類監測結果比較(續)

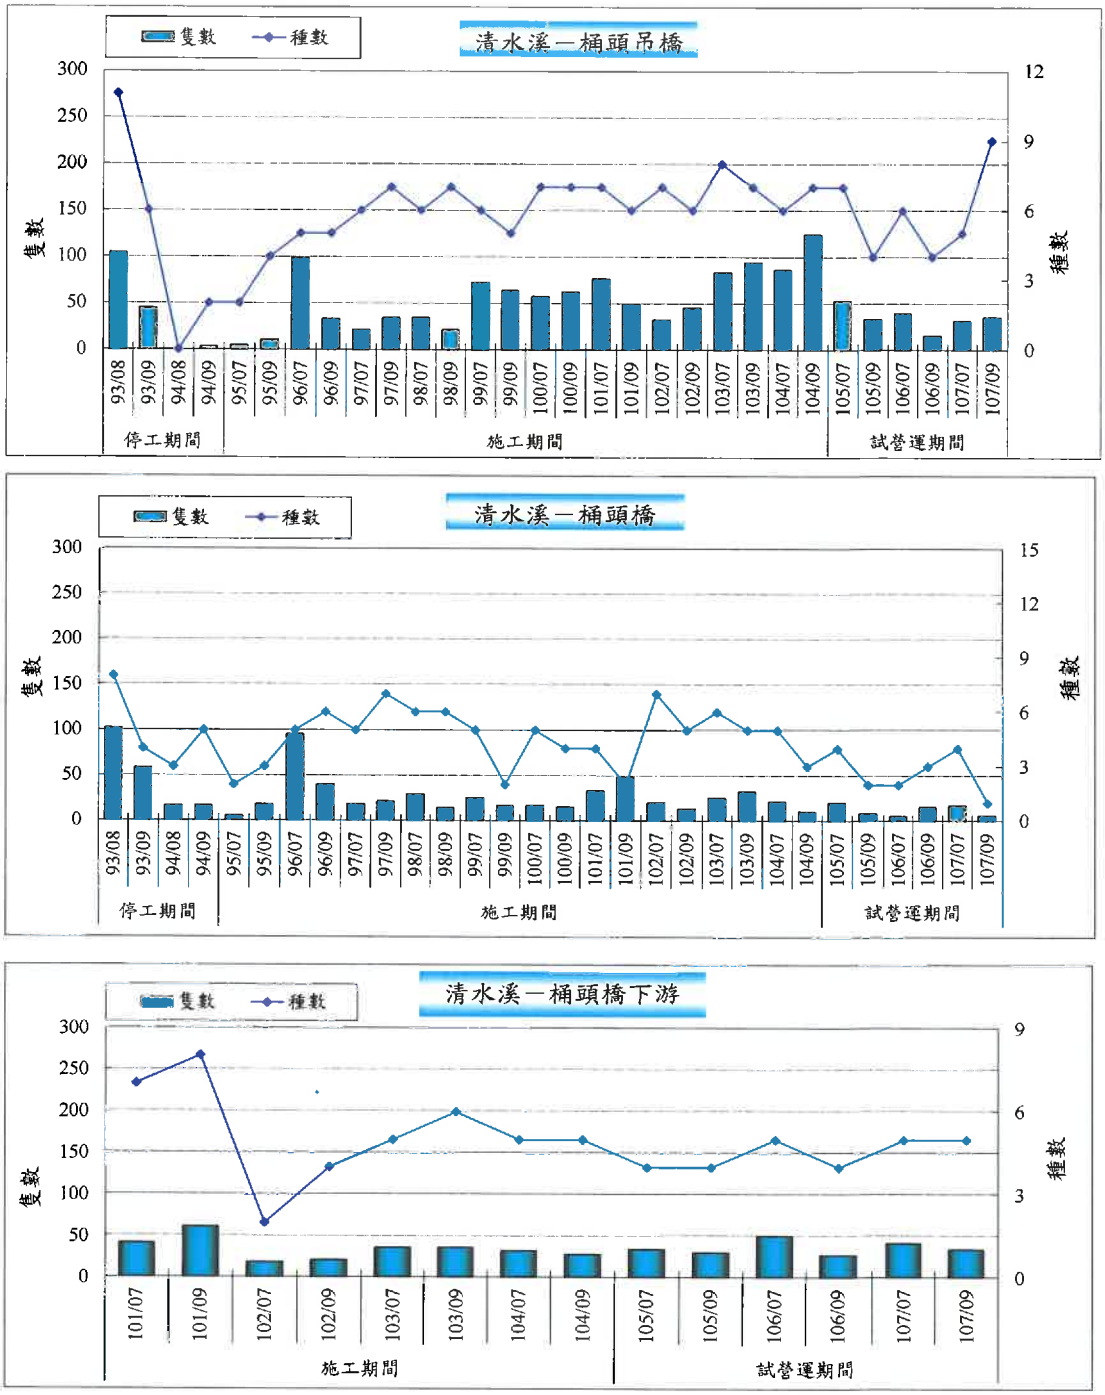

圖 2.5-2　歷年同季魚類監測結果比較

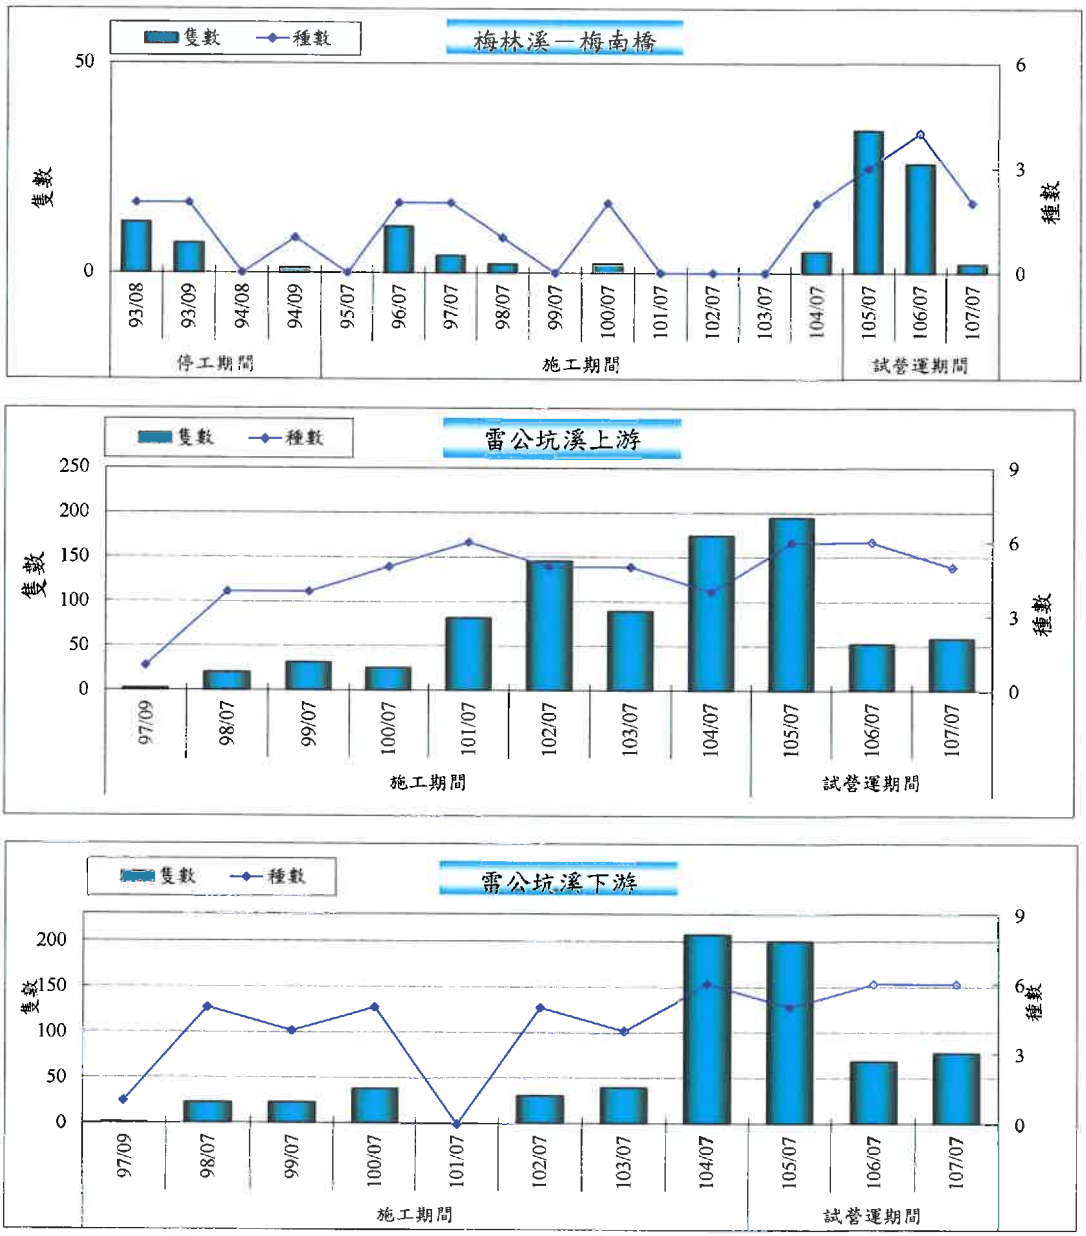

圖 2.5-2　歷年同季魚類監測結果比較(續)

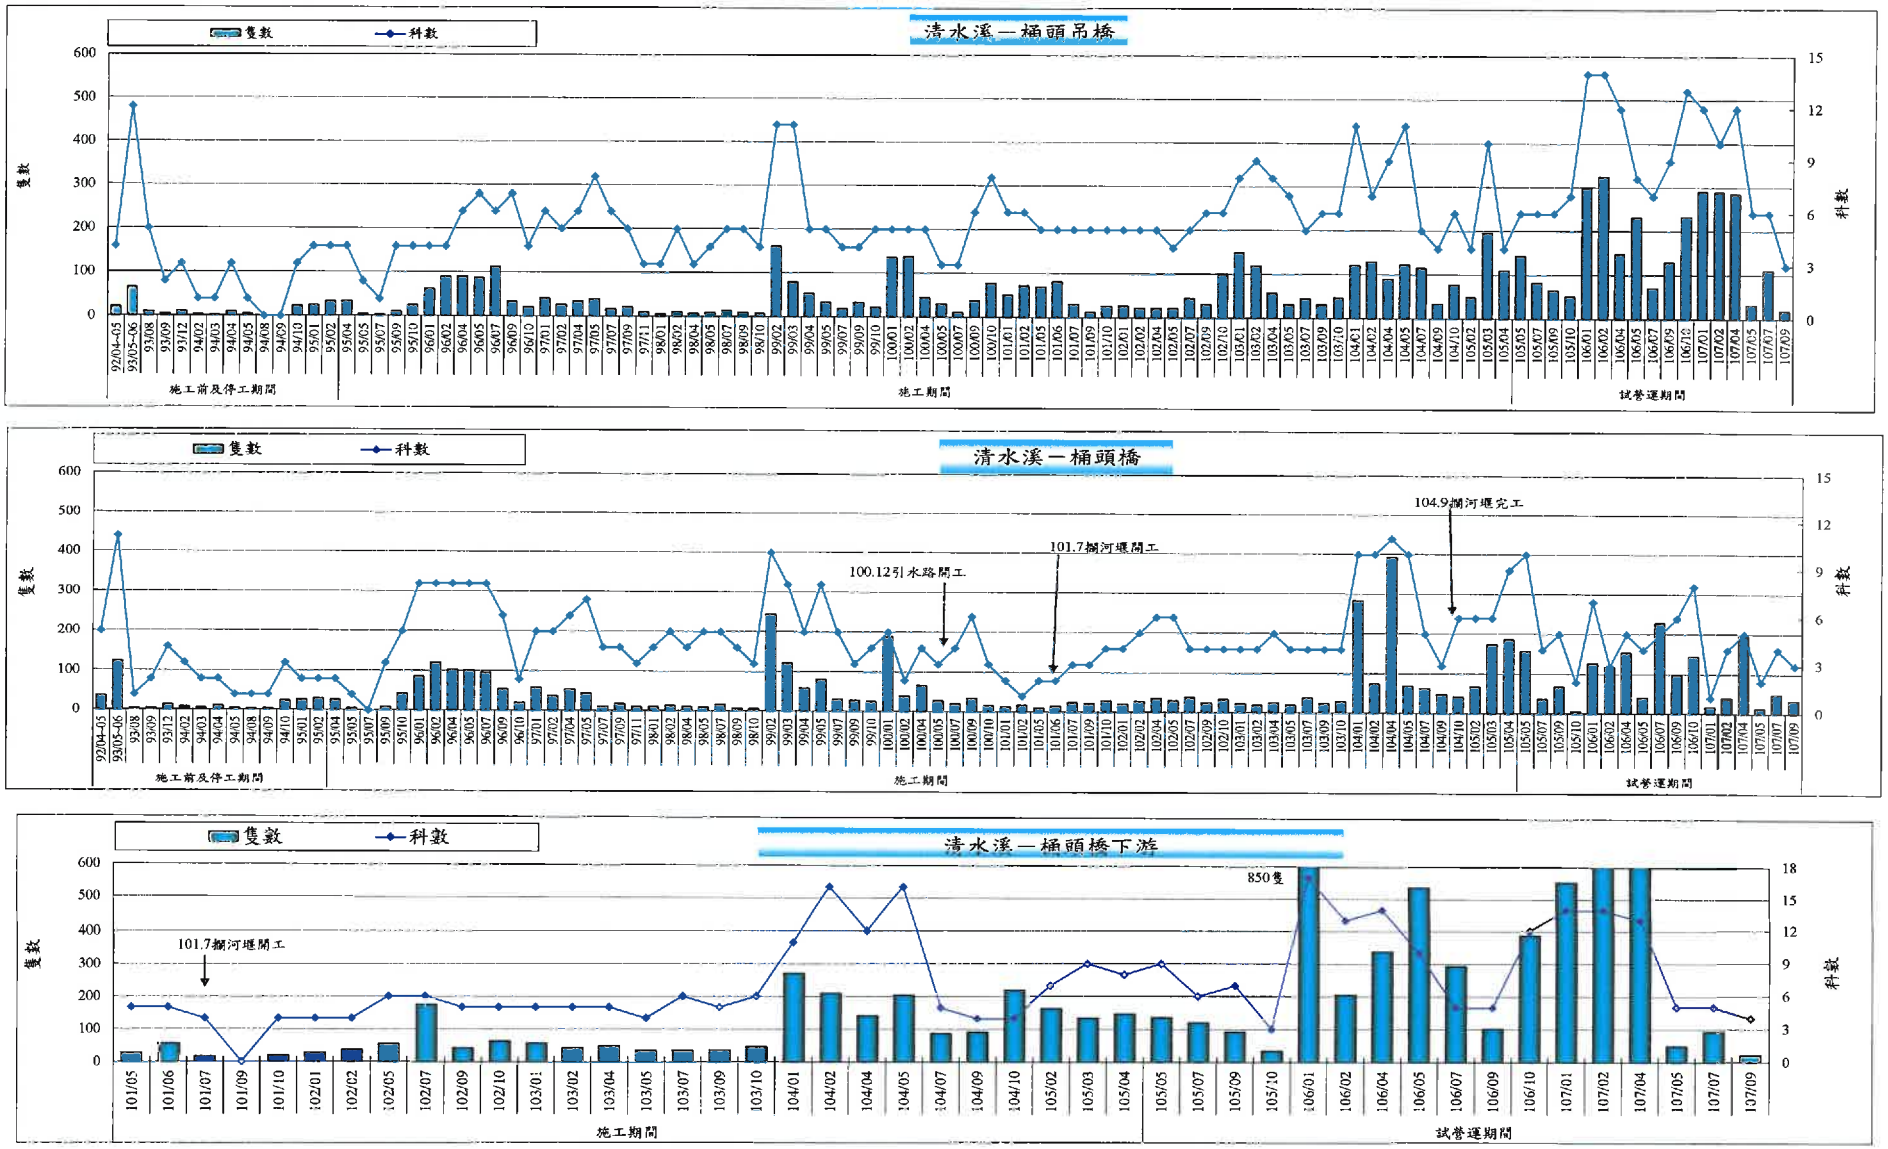

圖 2.5-3　歷次水生昆蟲監測結果比較

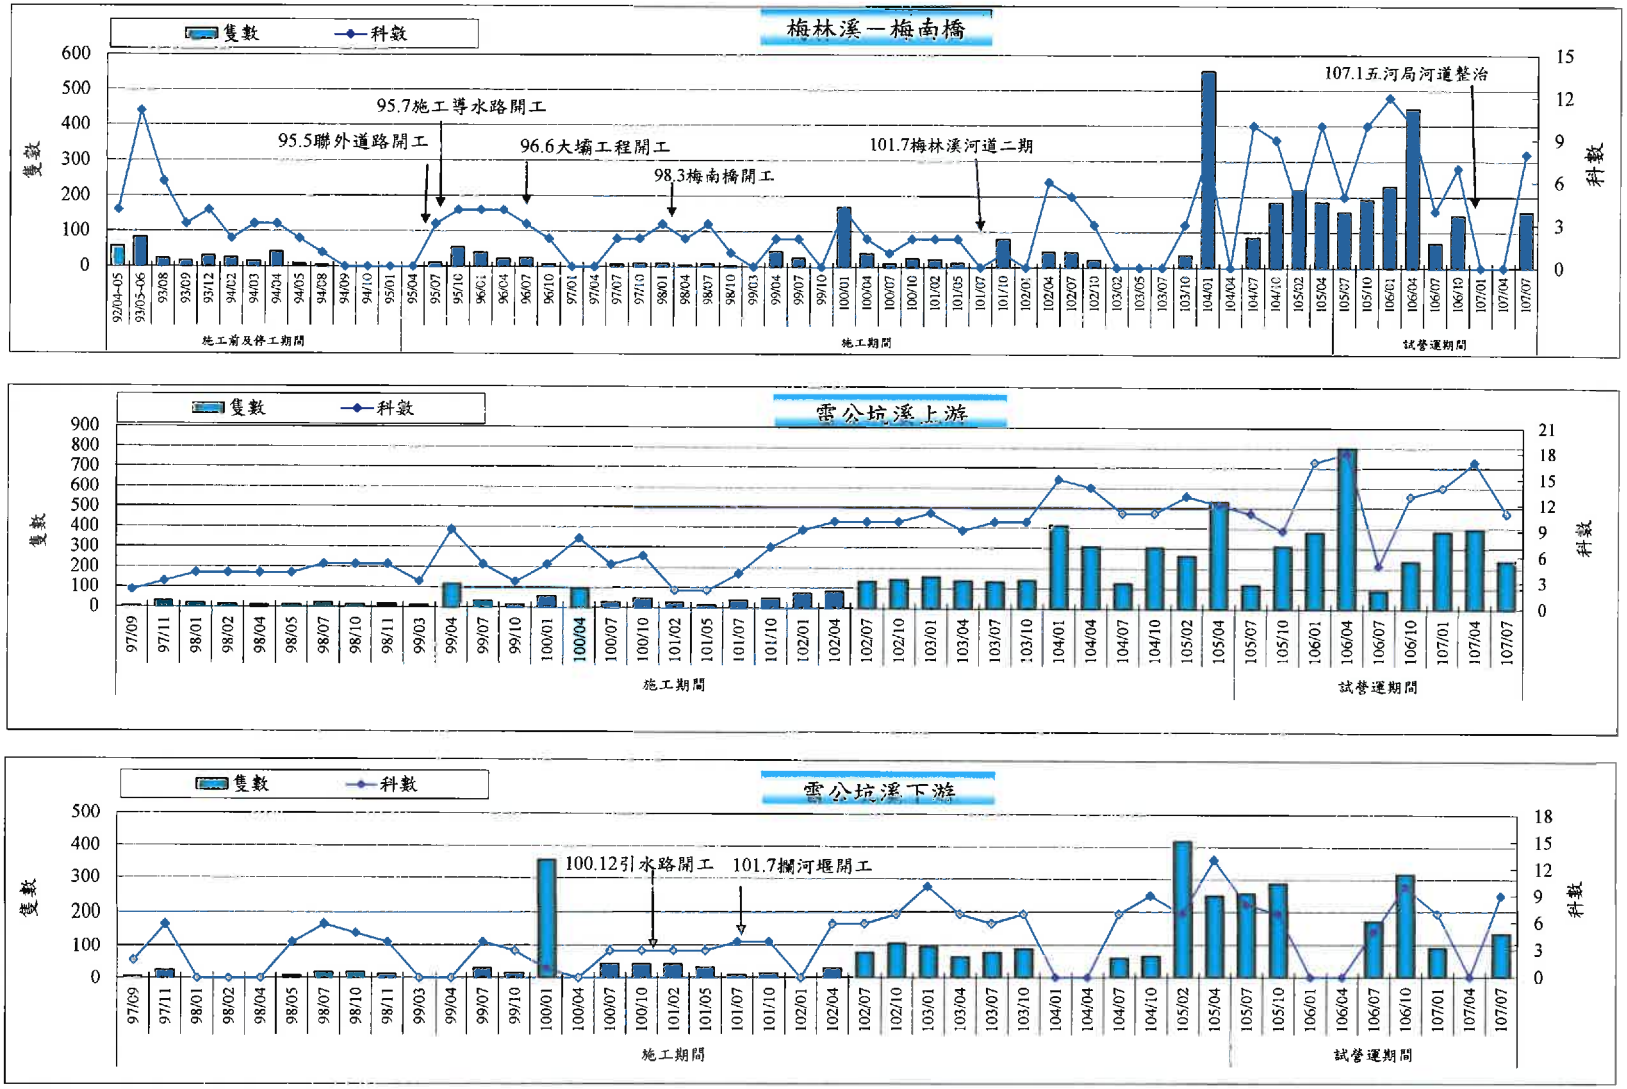

圖 2.5-3 歷次水生昆蟲監測結果比較(續)

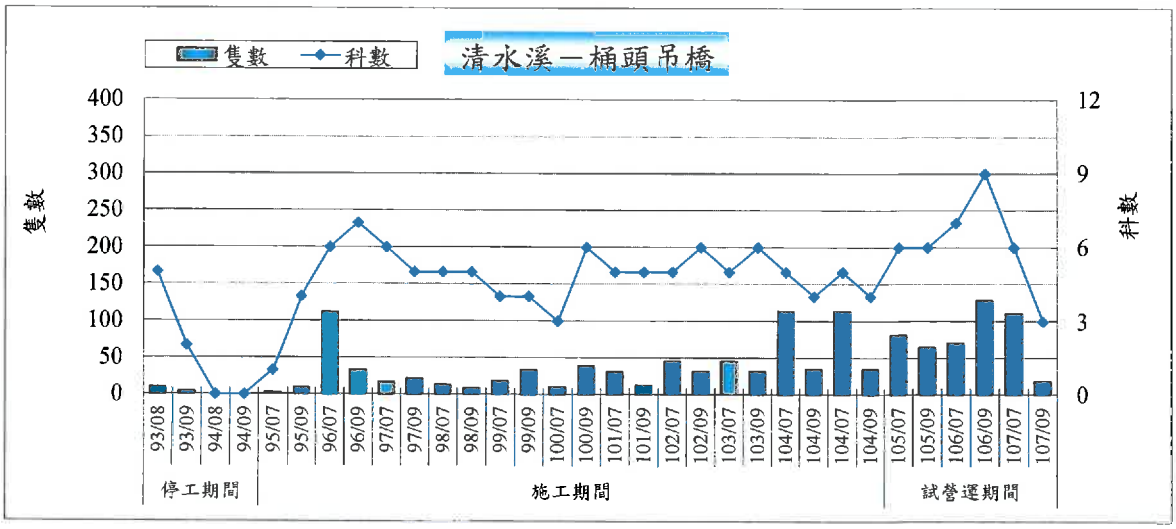

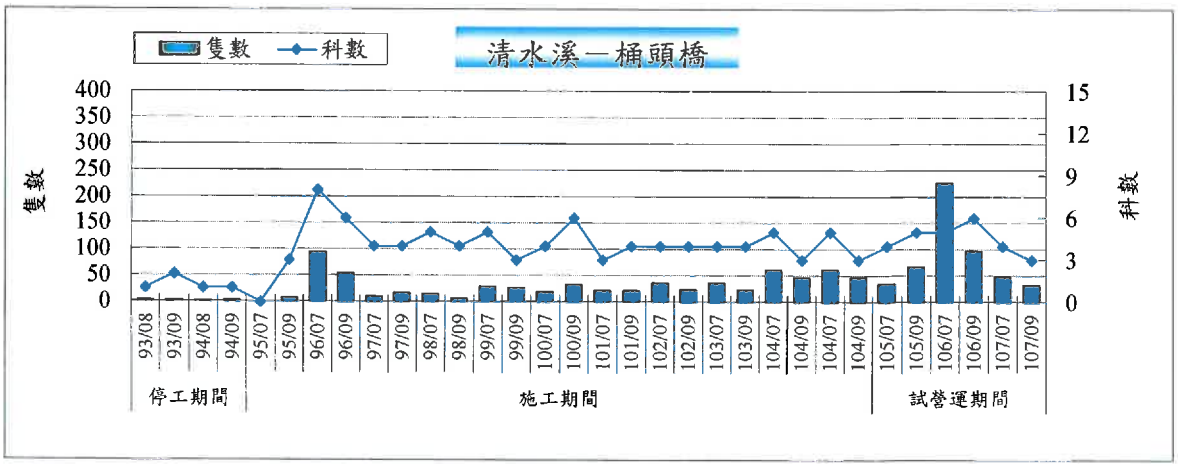

圖 2.5-4　歷次同季水生昆蟲監測結果比較

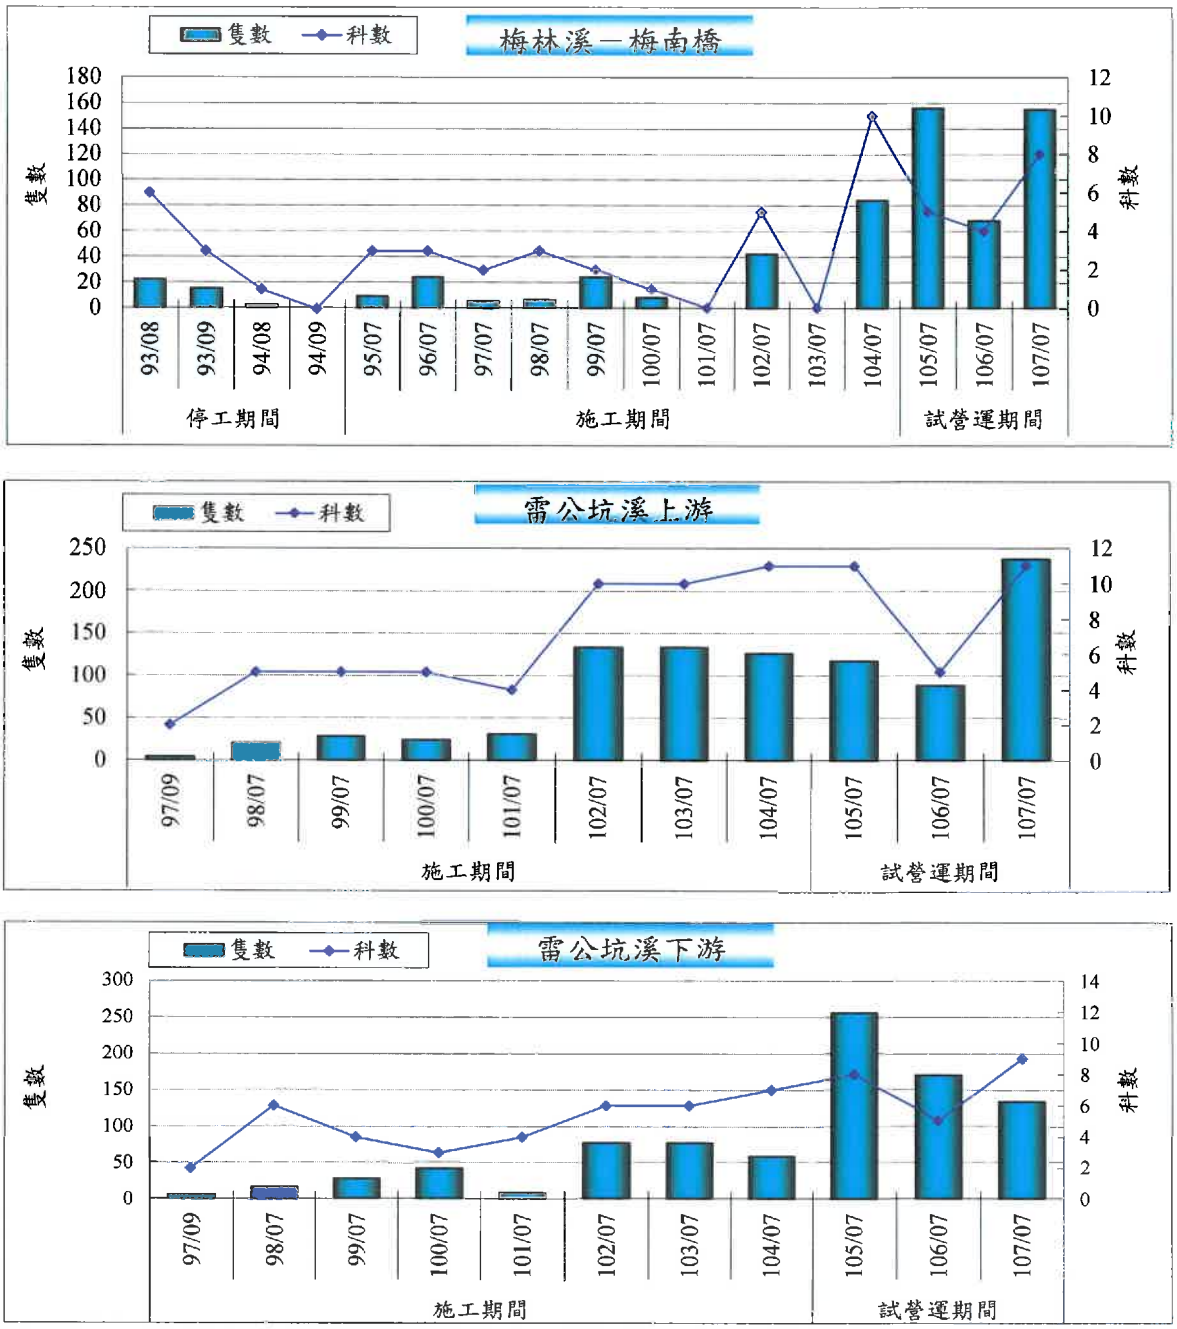

圖 2.5-4　歷次同季水生昆蟲監測結果比較(續)

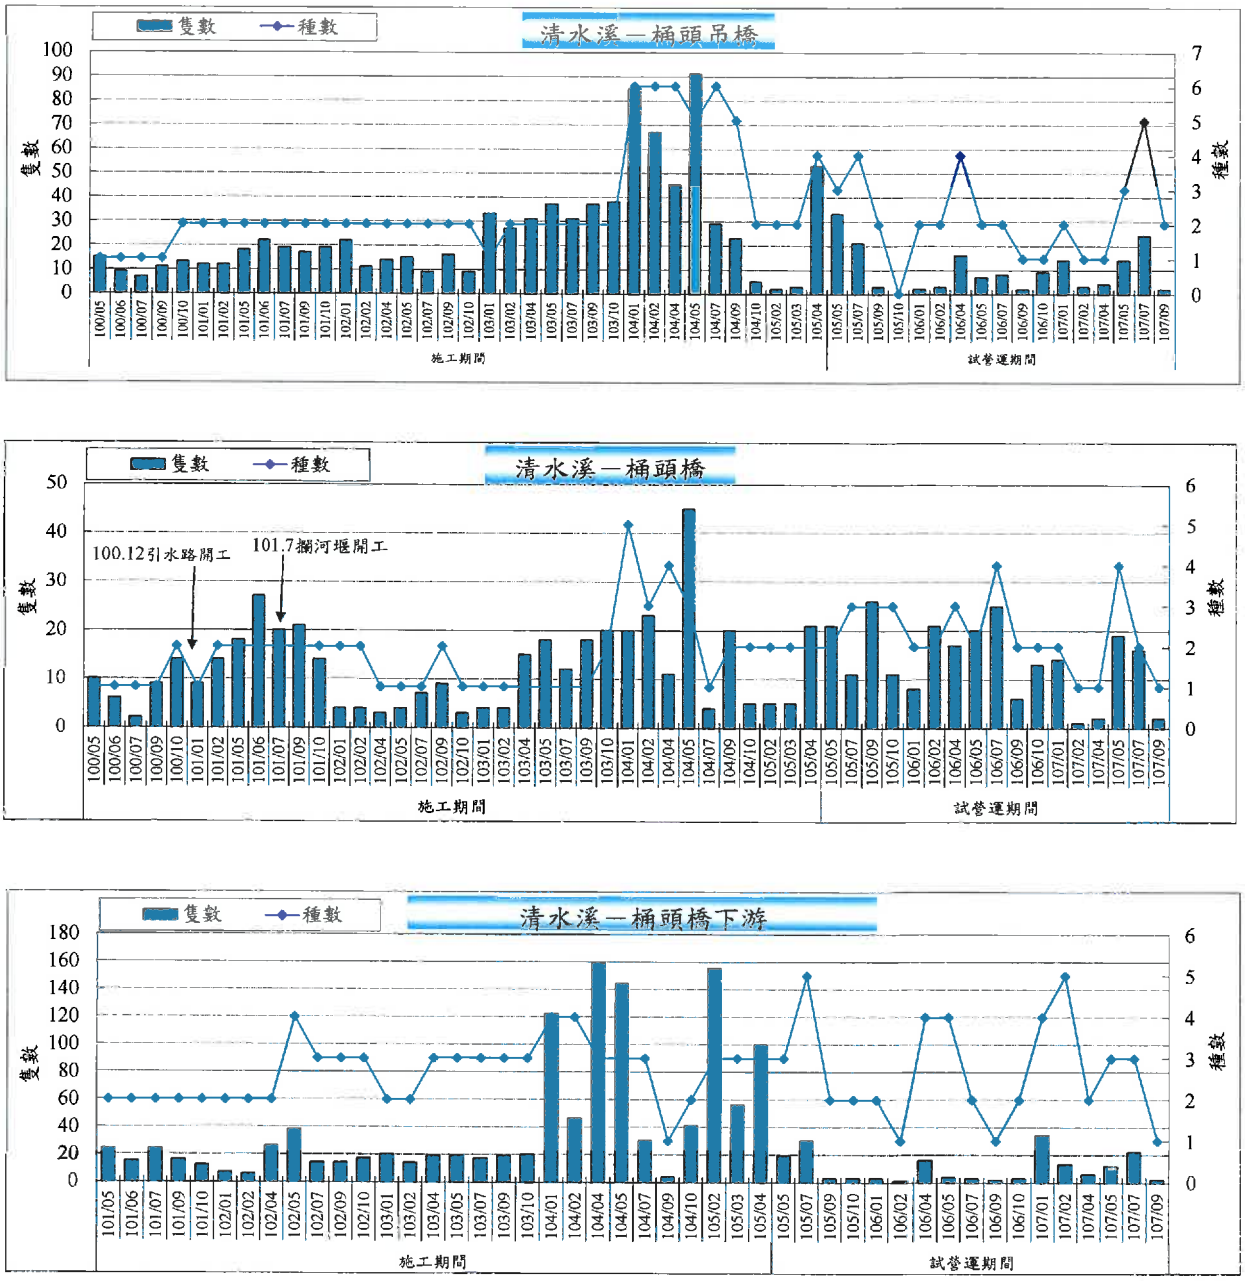

圖 2.5-5　歷次蝦蟹螺貝監測結果比較

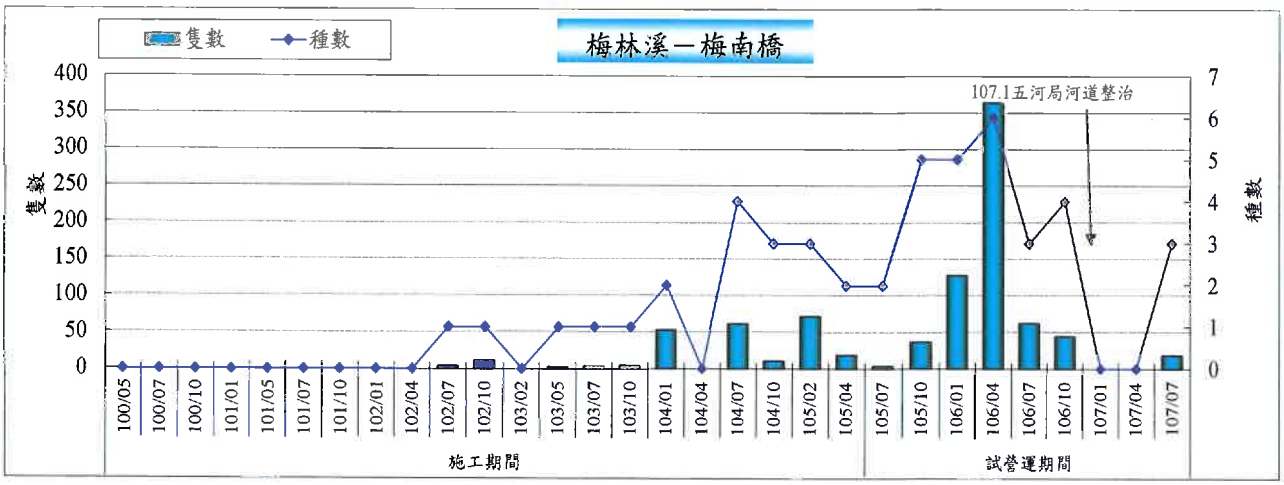

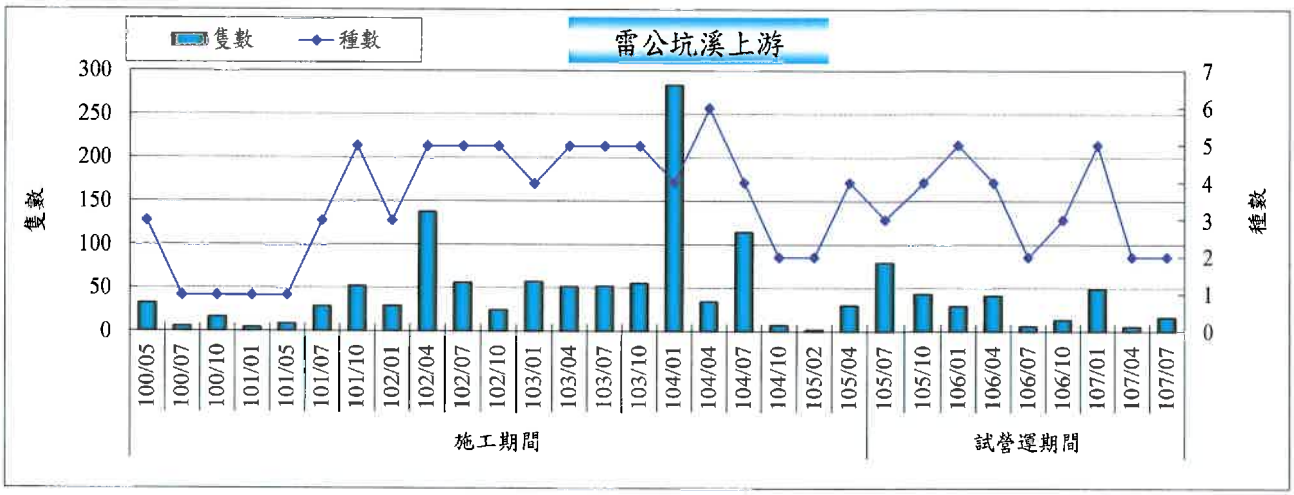

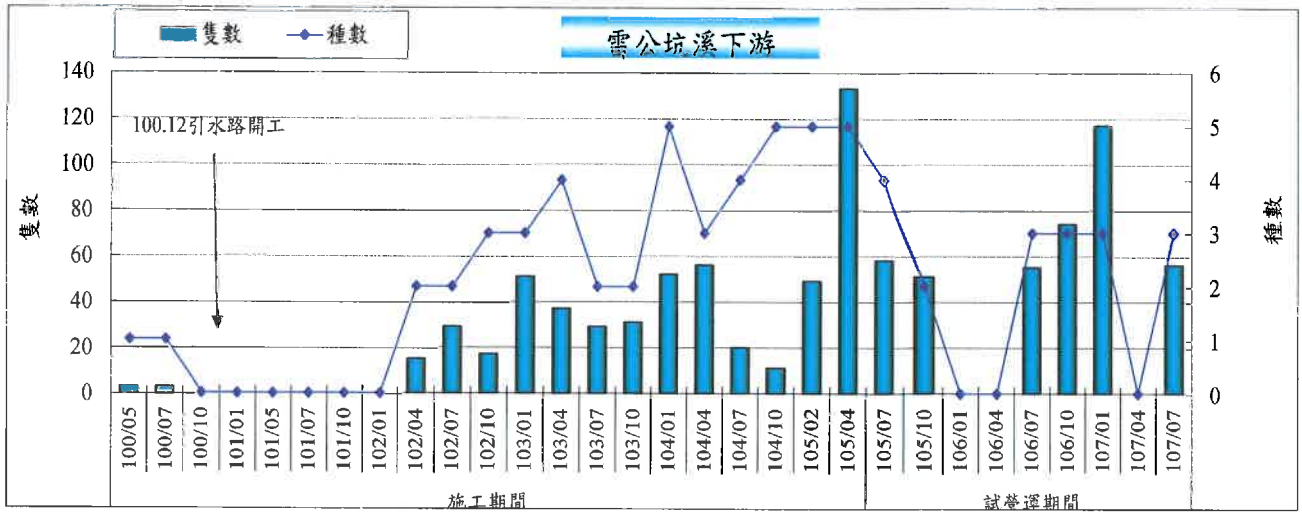

圖 2.5-5　歷次蝦蟹螺貝監測結果比較(續)

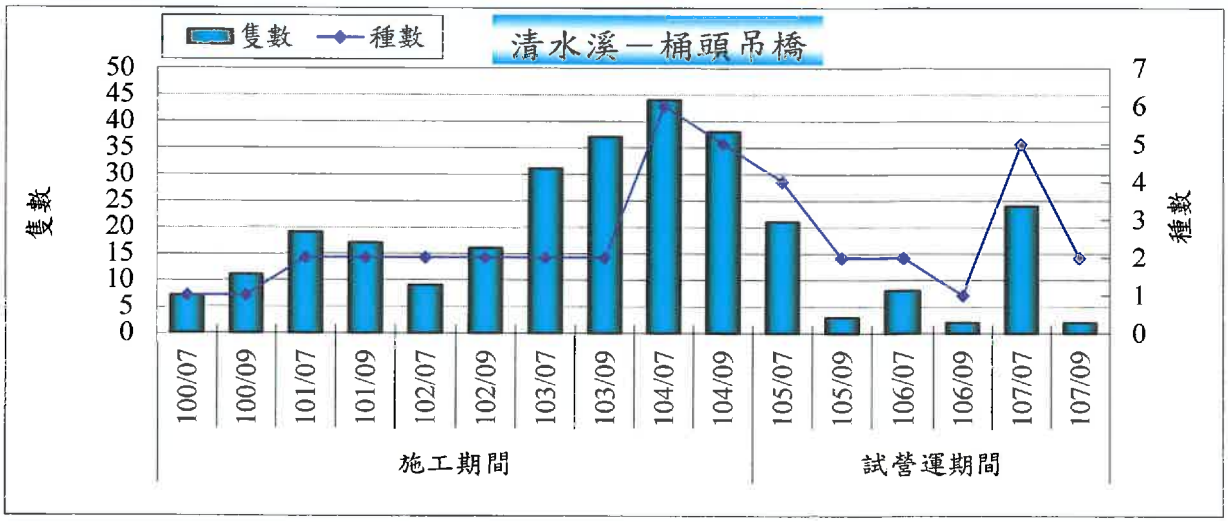

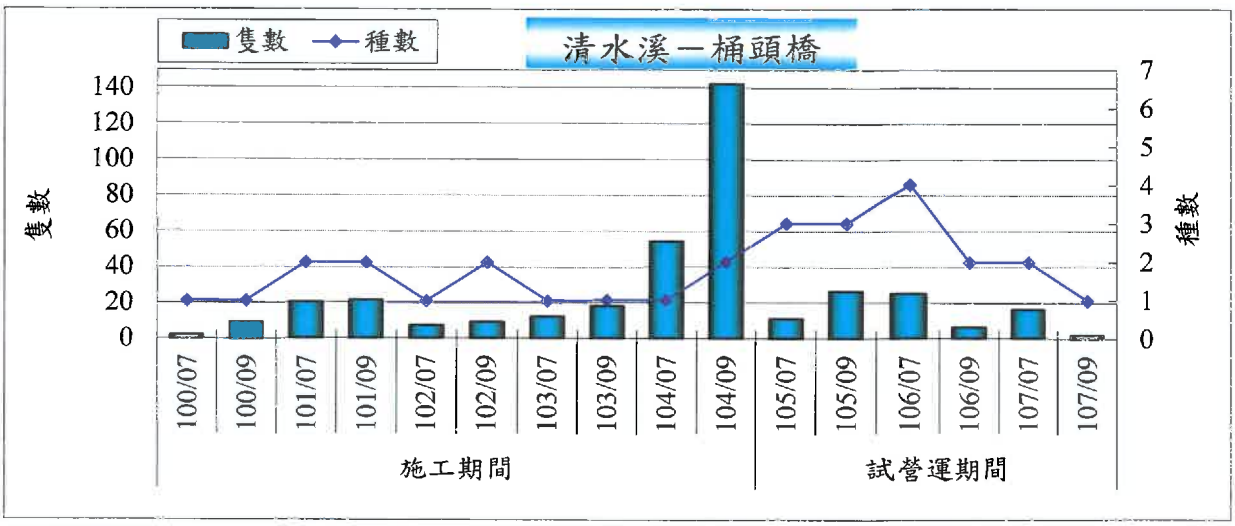

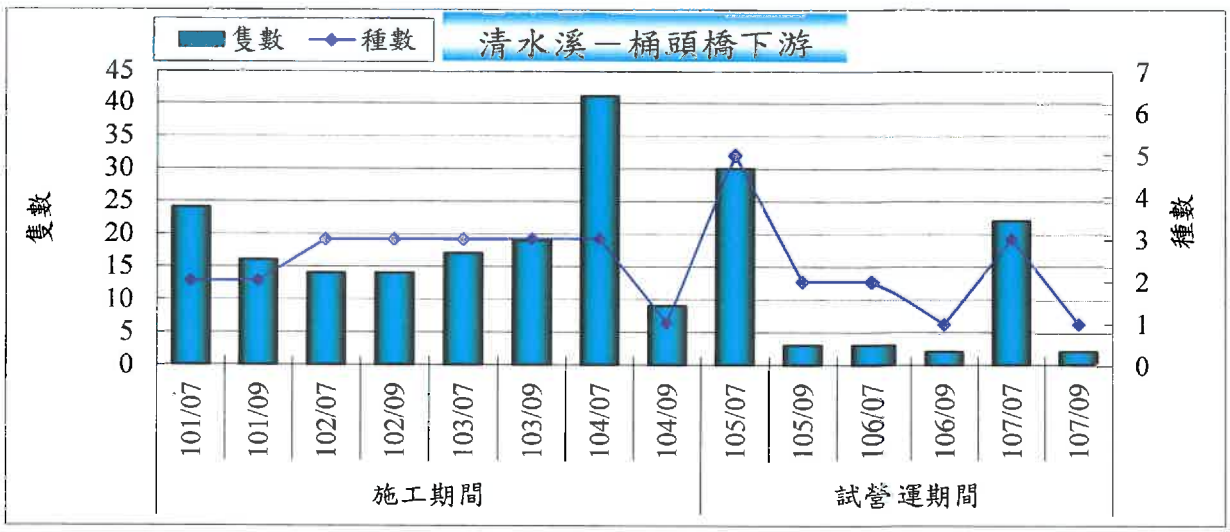

圖 2.5-6　歷次同季蝦蟹螺貝監測結果比較

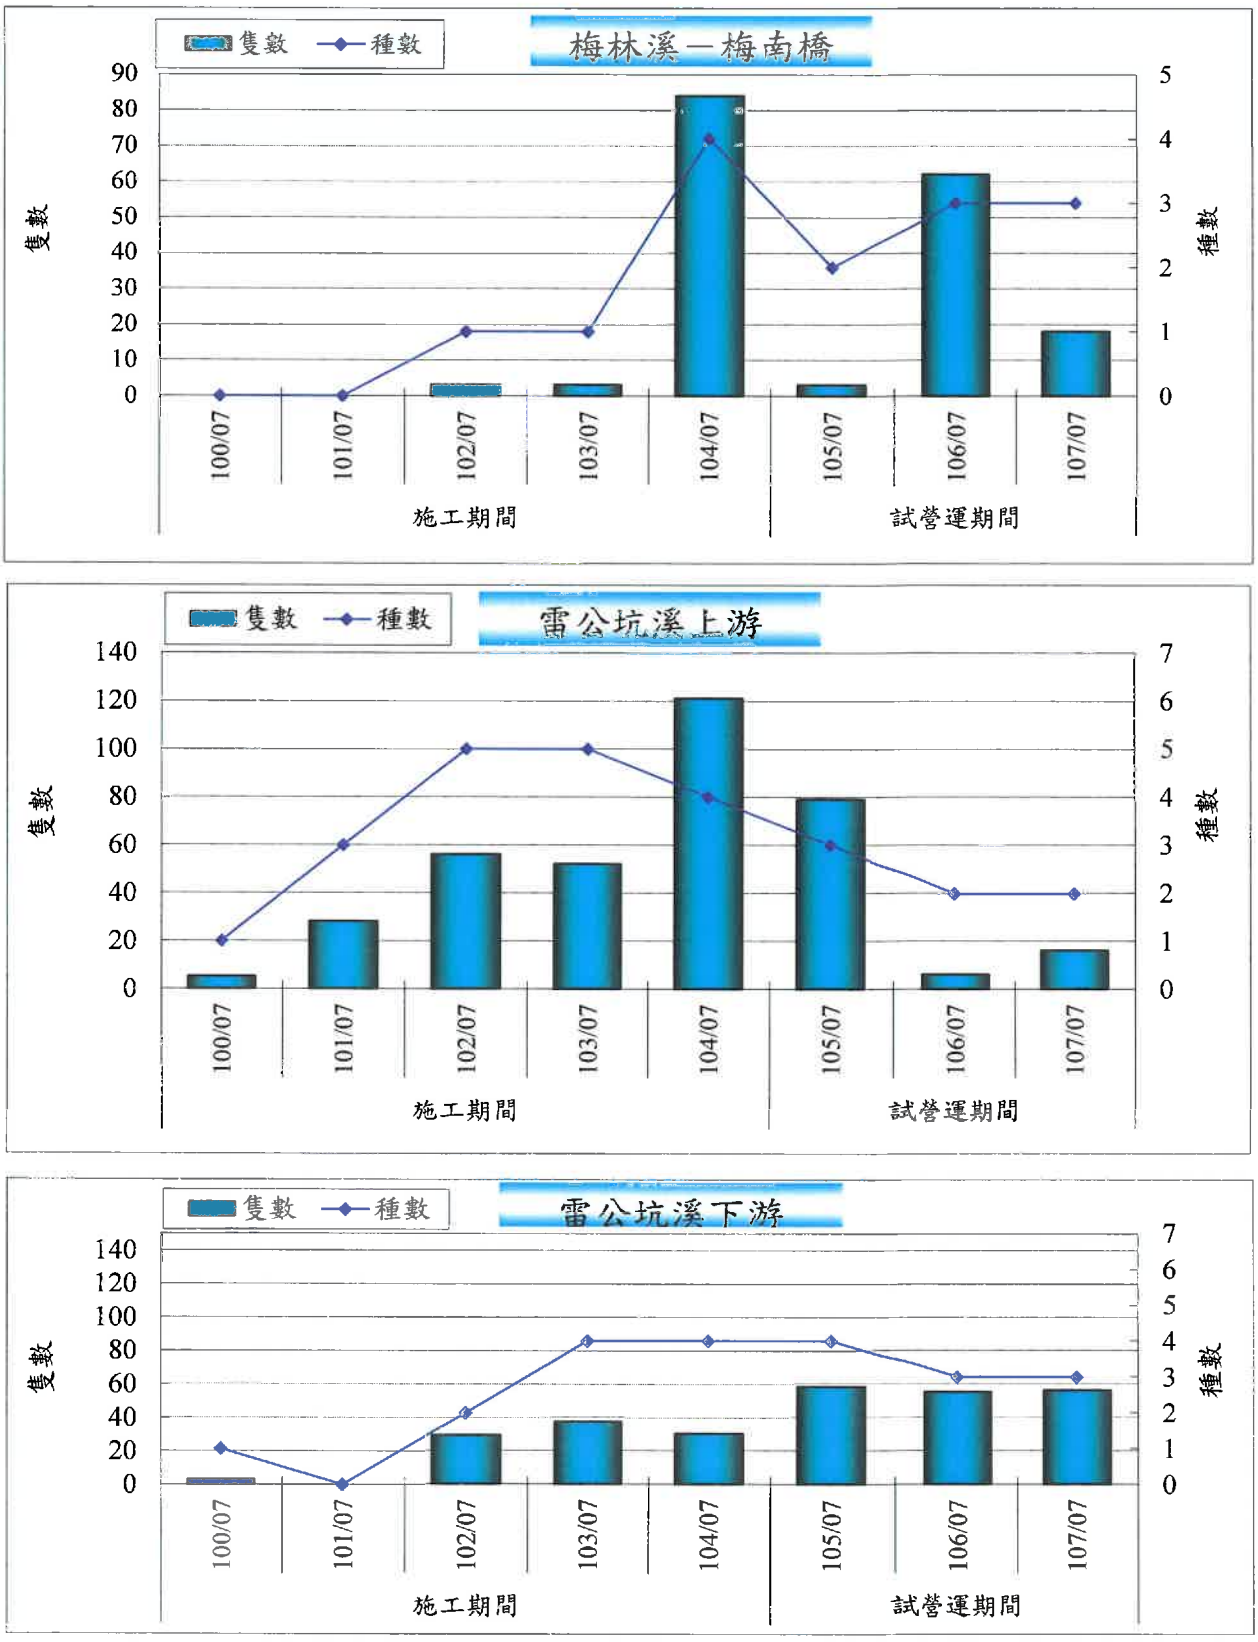

圖 2.5-6　歷次同季蝦蟹螺貝監測結果比較(續)

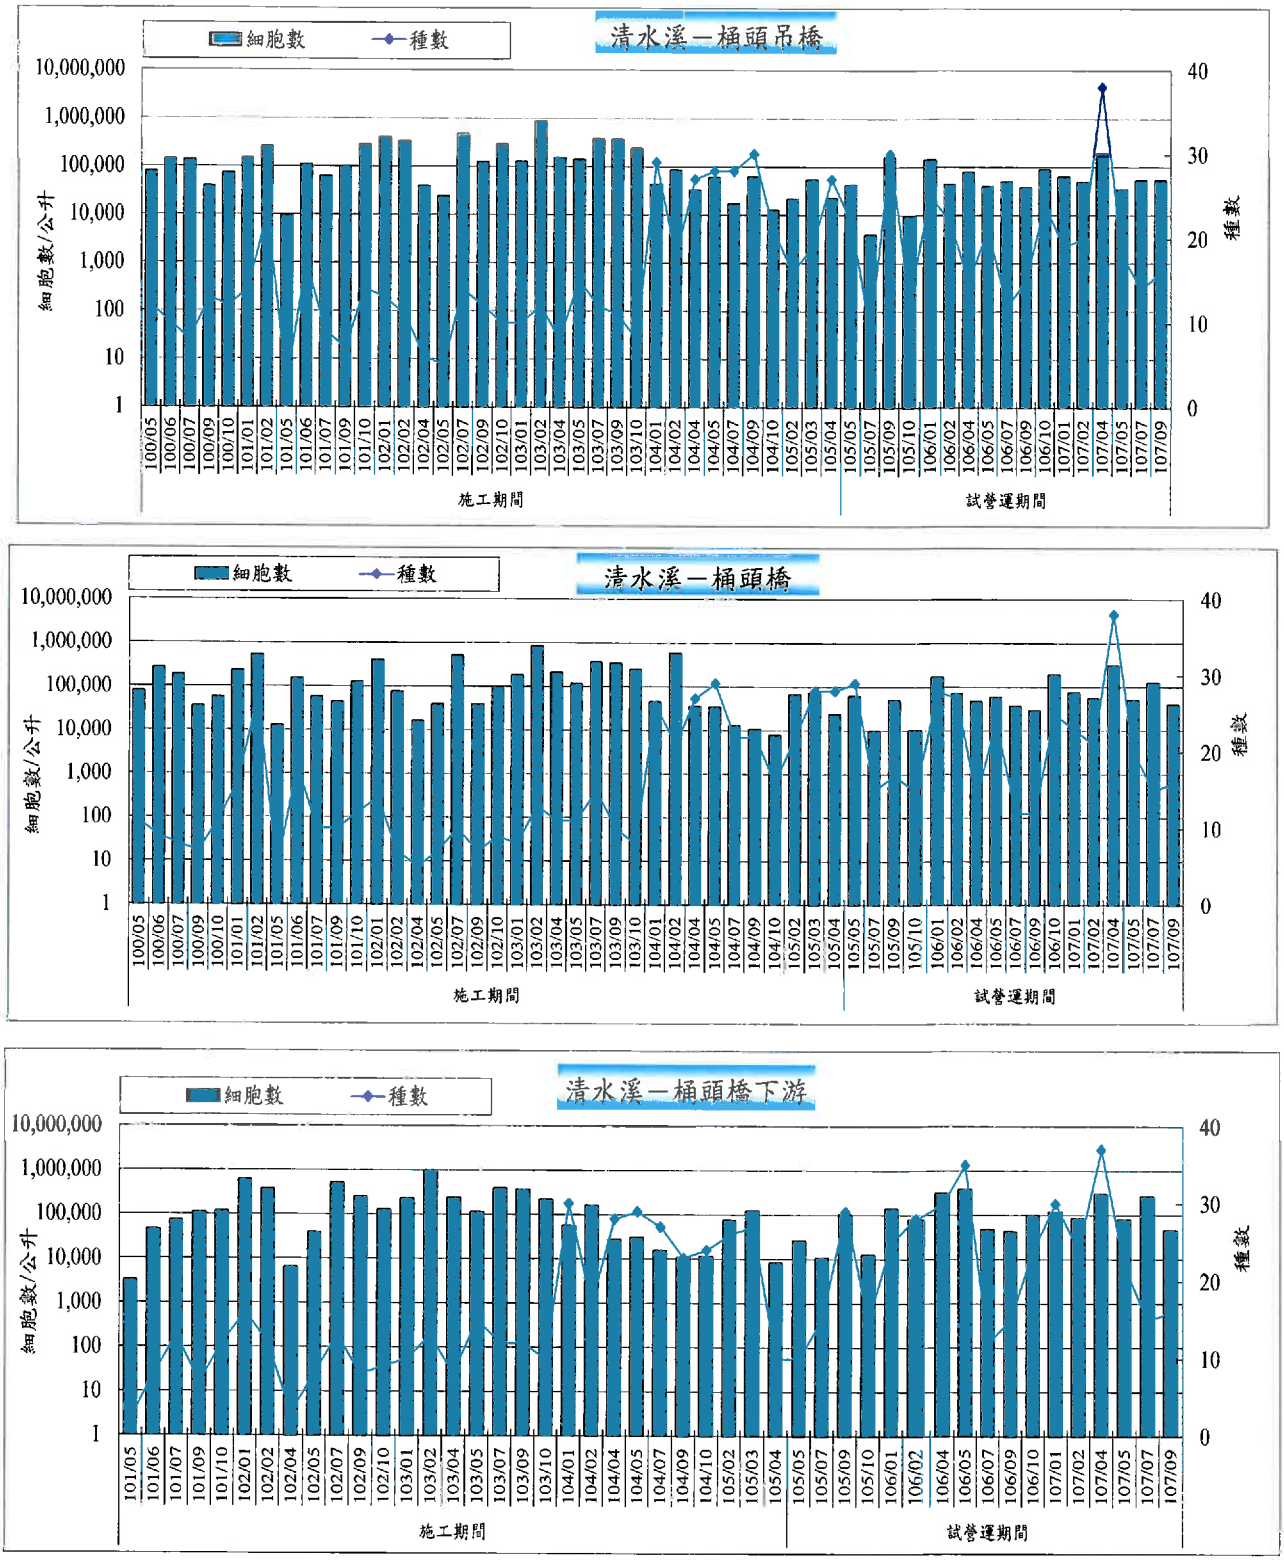

圖 2.5-7　歷次浮游植物監測結果比較

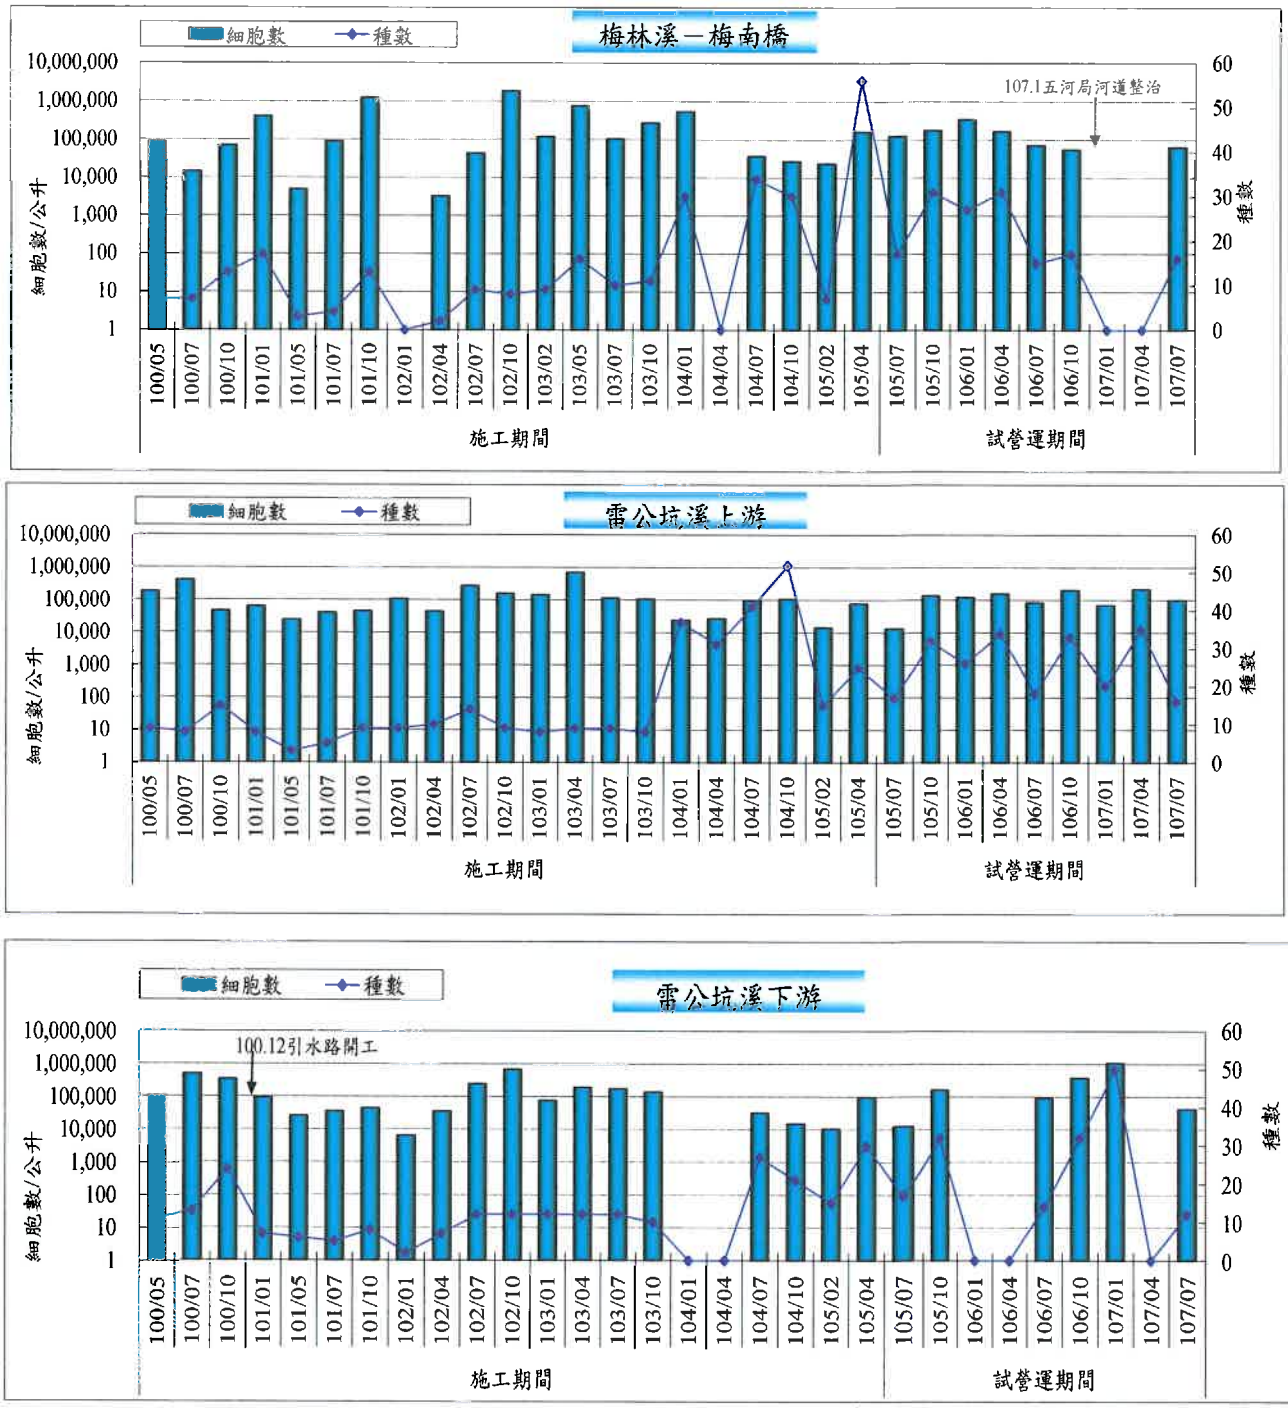

圖 2.5-7　歷次浮游植物監測結果比較(續)

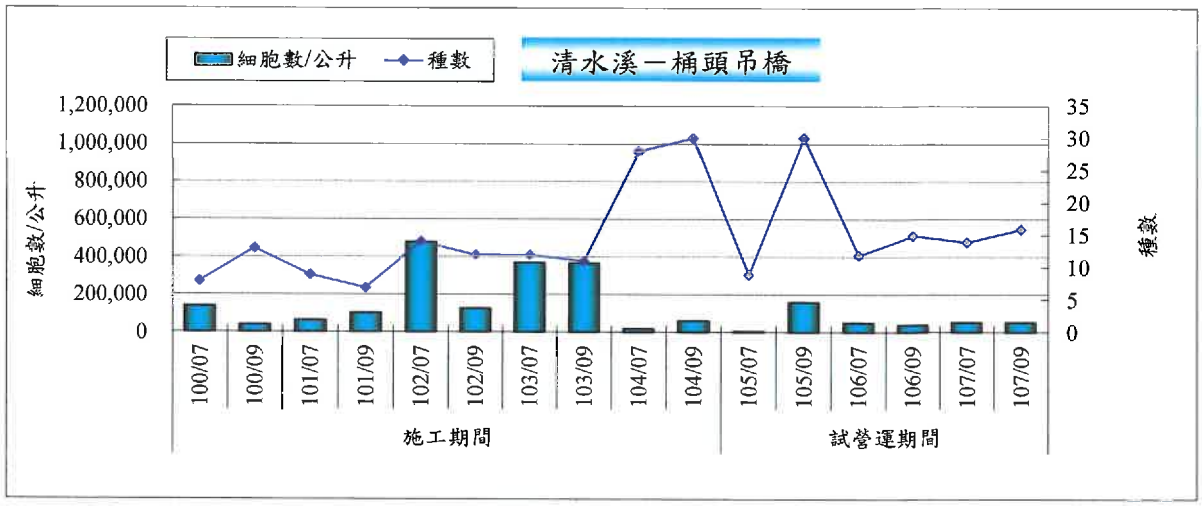

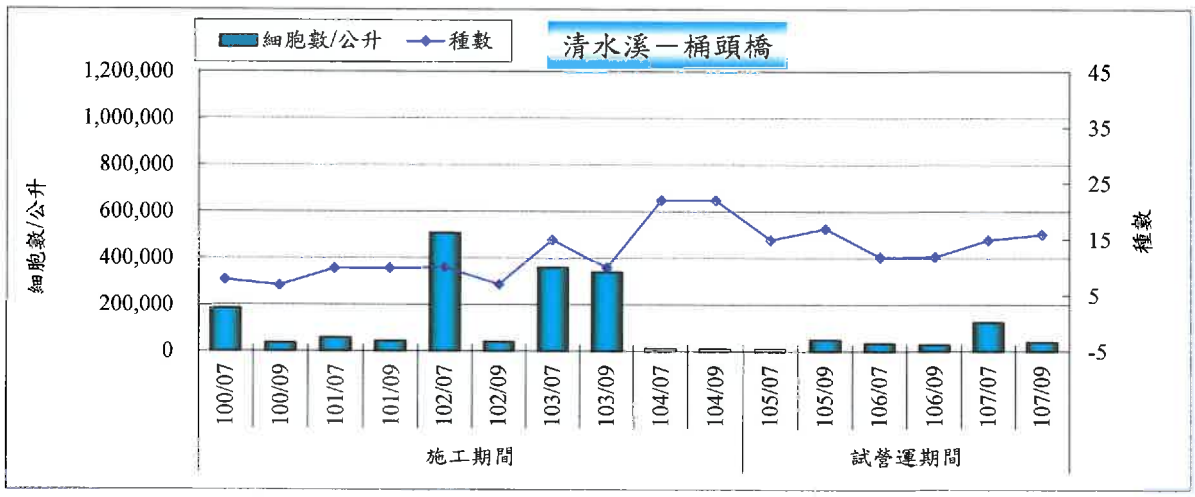

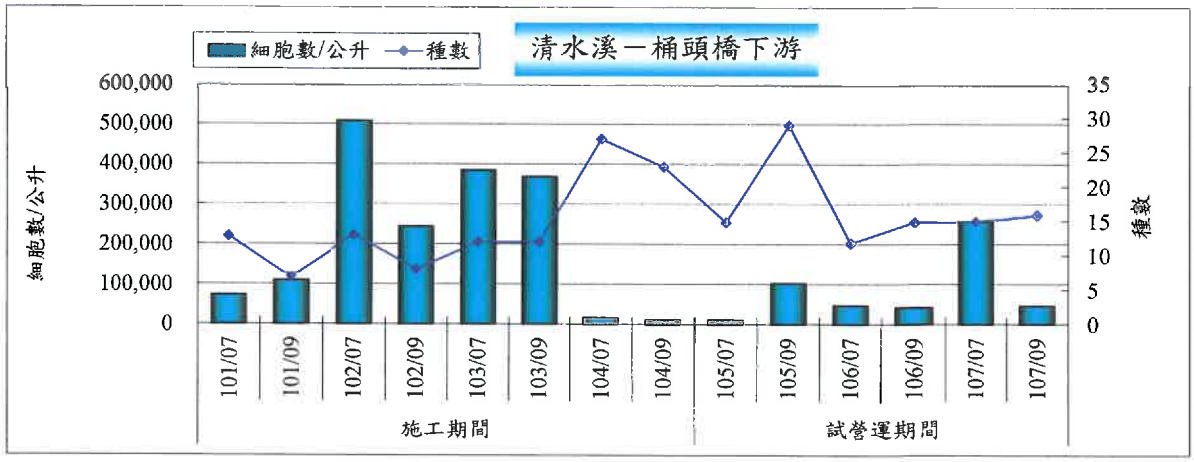

圖 2.5-8　歷次同季浮游植物監測結果比較

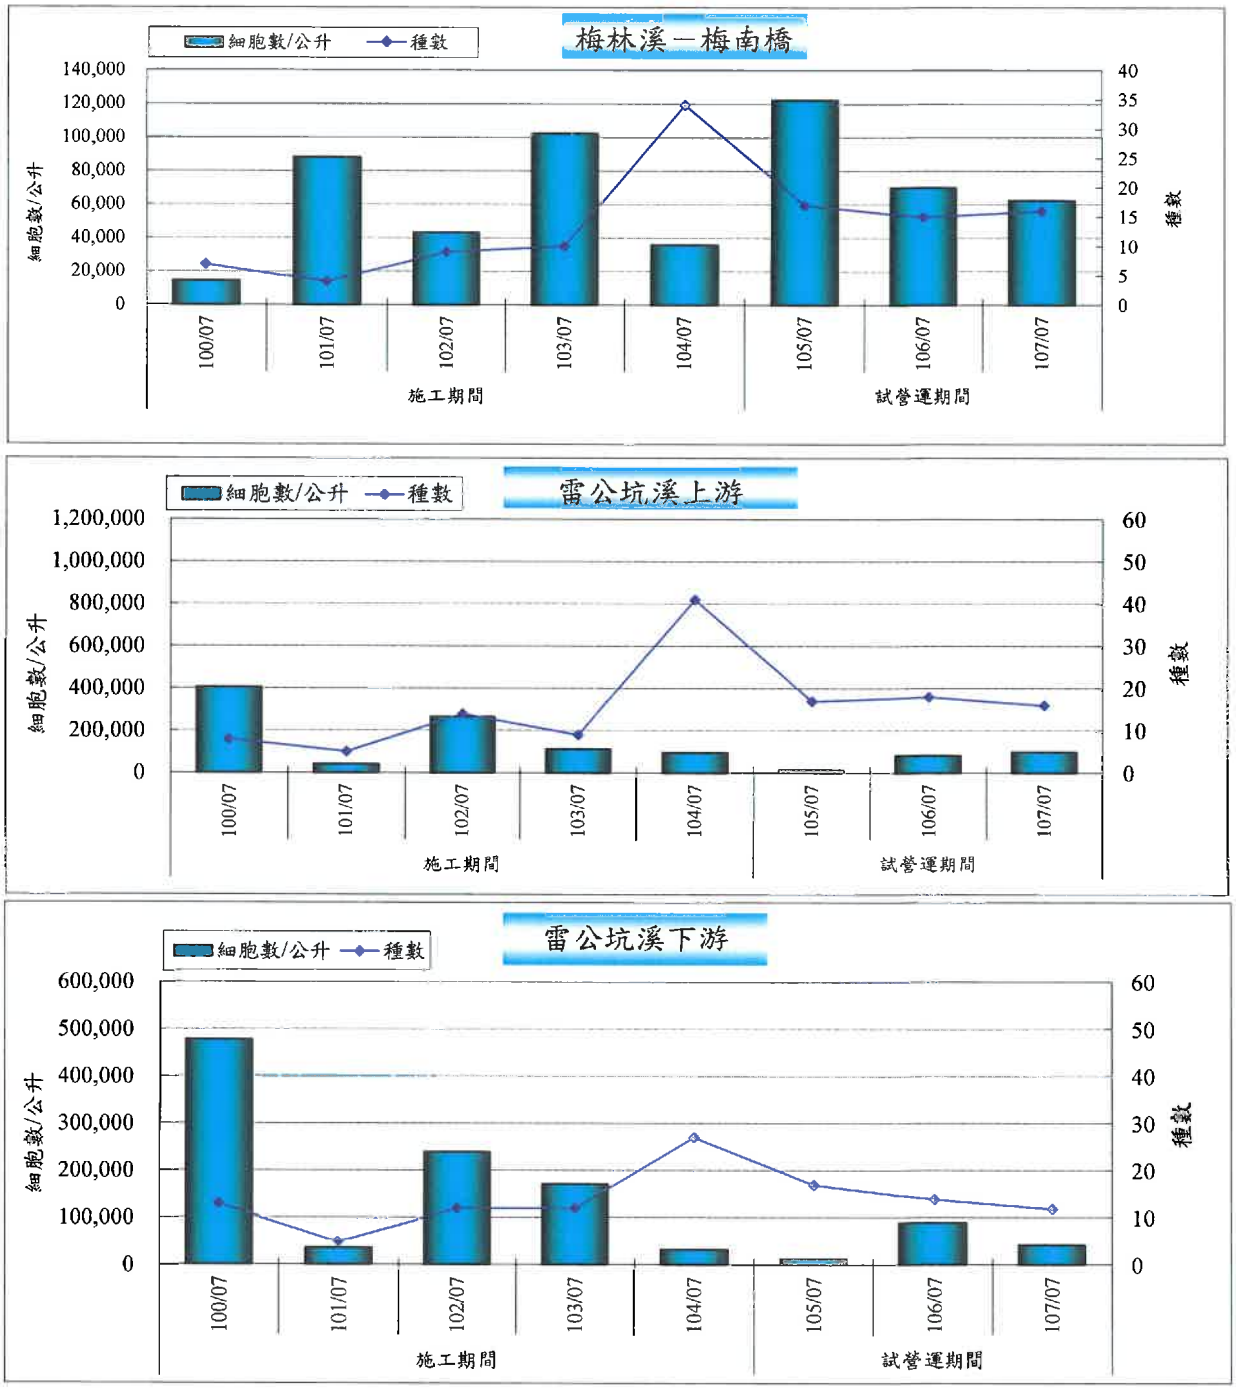

圖 2.5-8　歷次同季浮游植物監測結果比較(續)

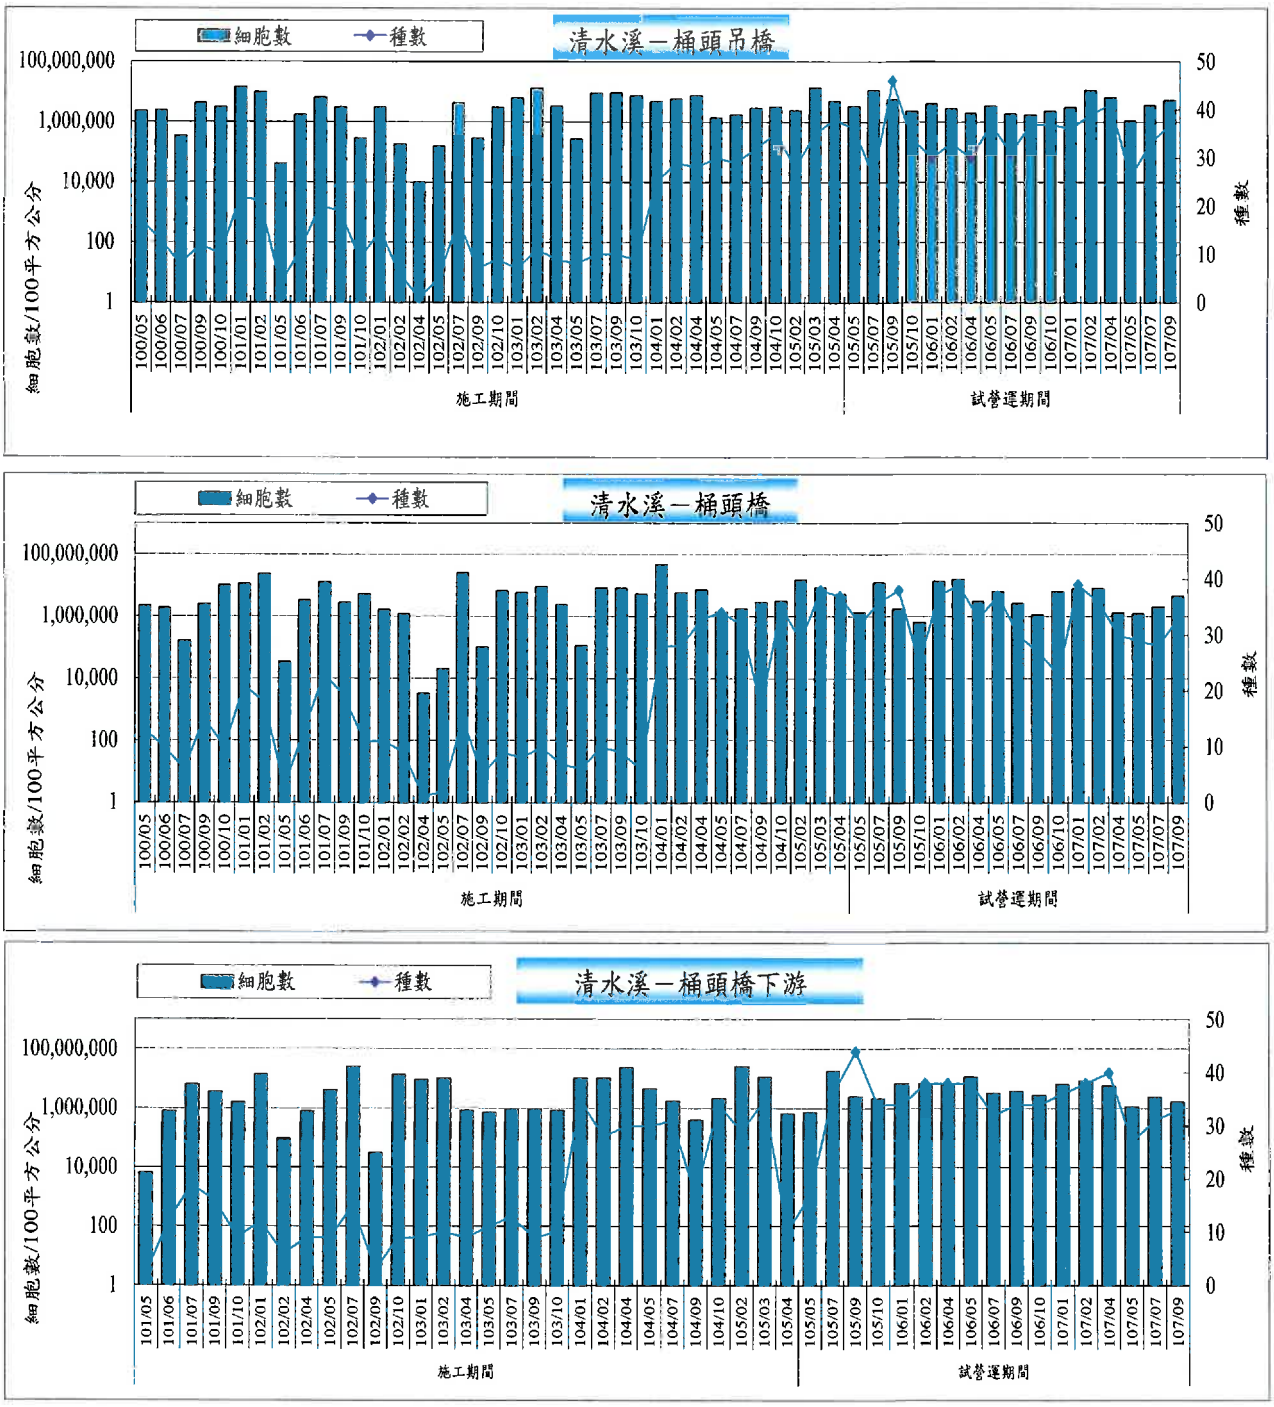

圖 2.5-9　歷次附著性藻類監測結果比較

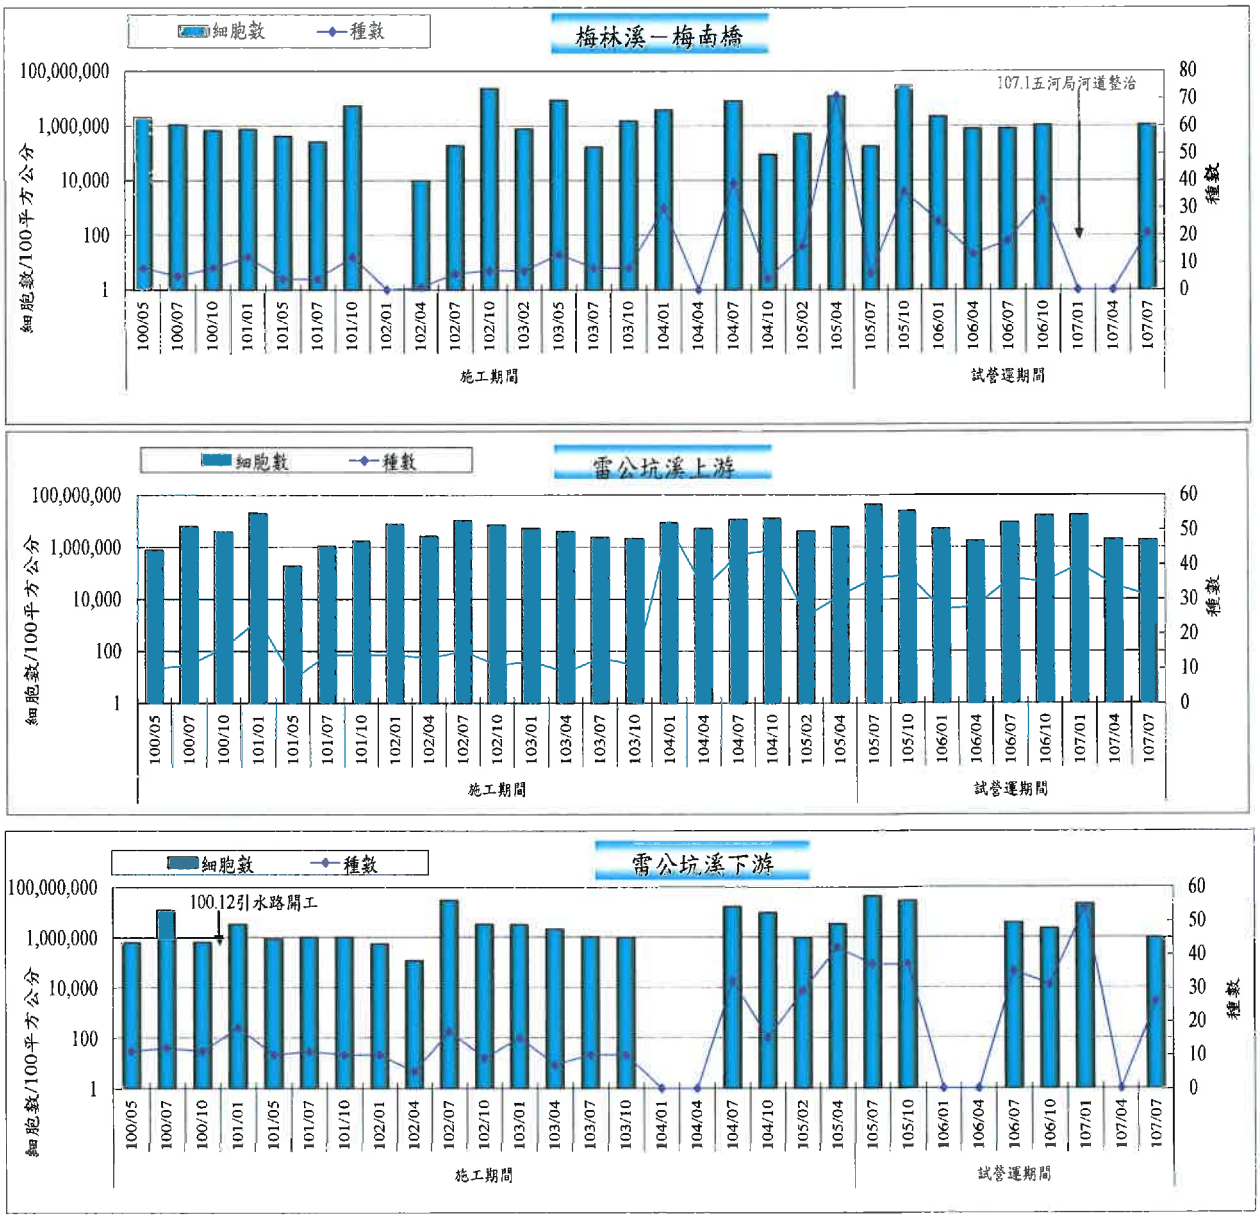

圖 2.5-9　歷次附著性藻類監測結果比較(續)

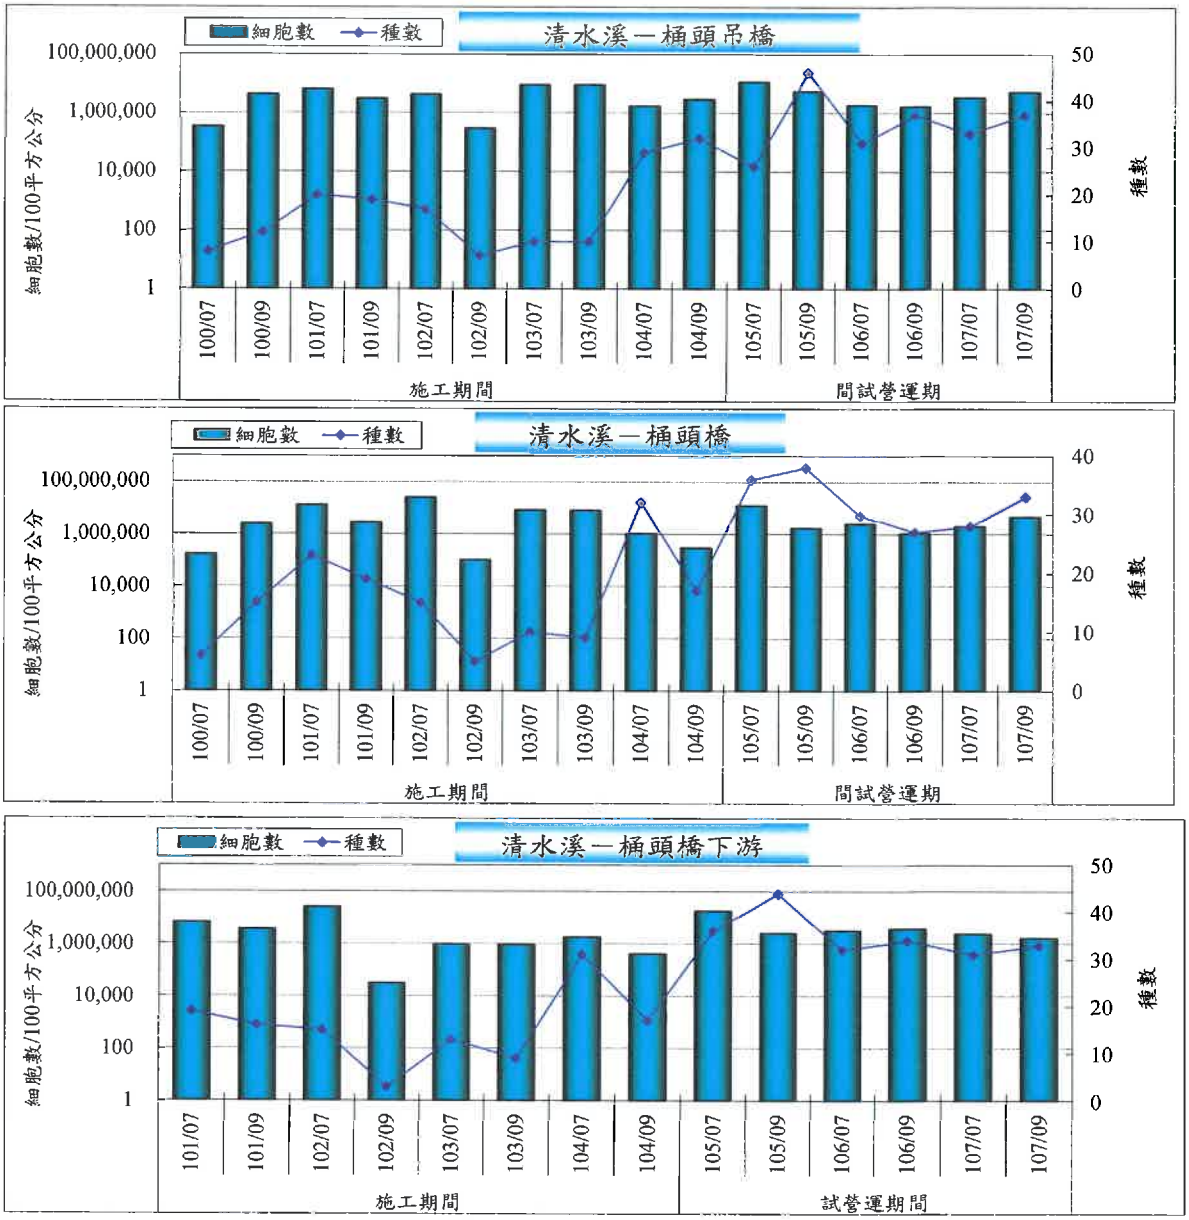

圖 2.5-10　歷次同季附著性藻類監測結果比較

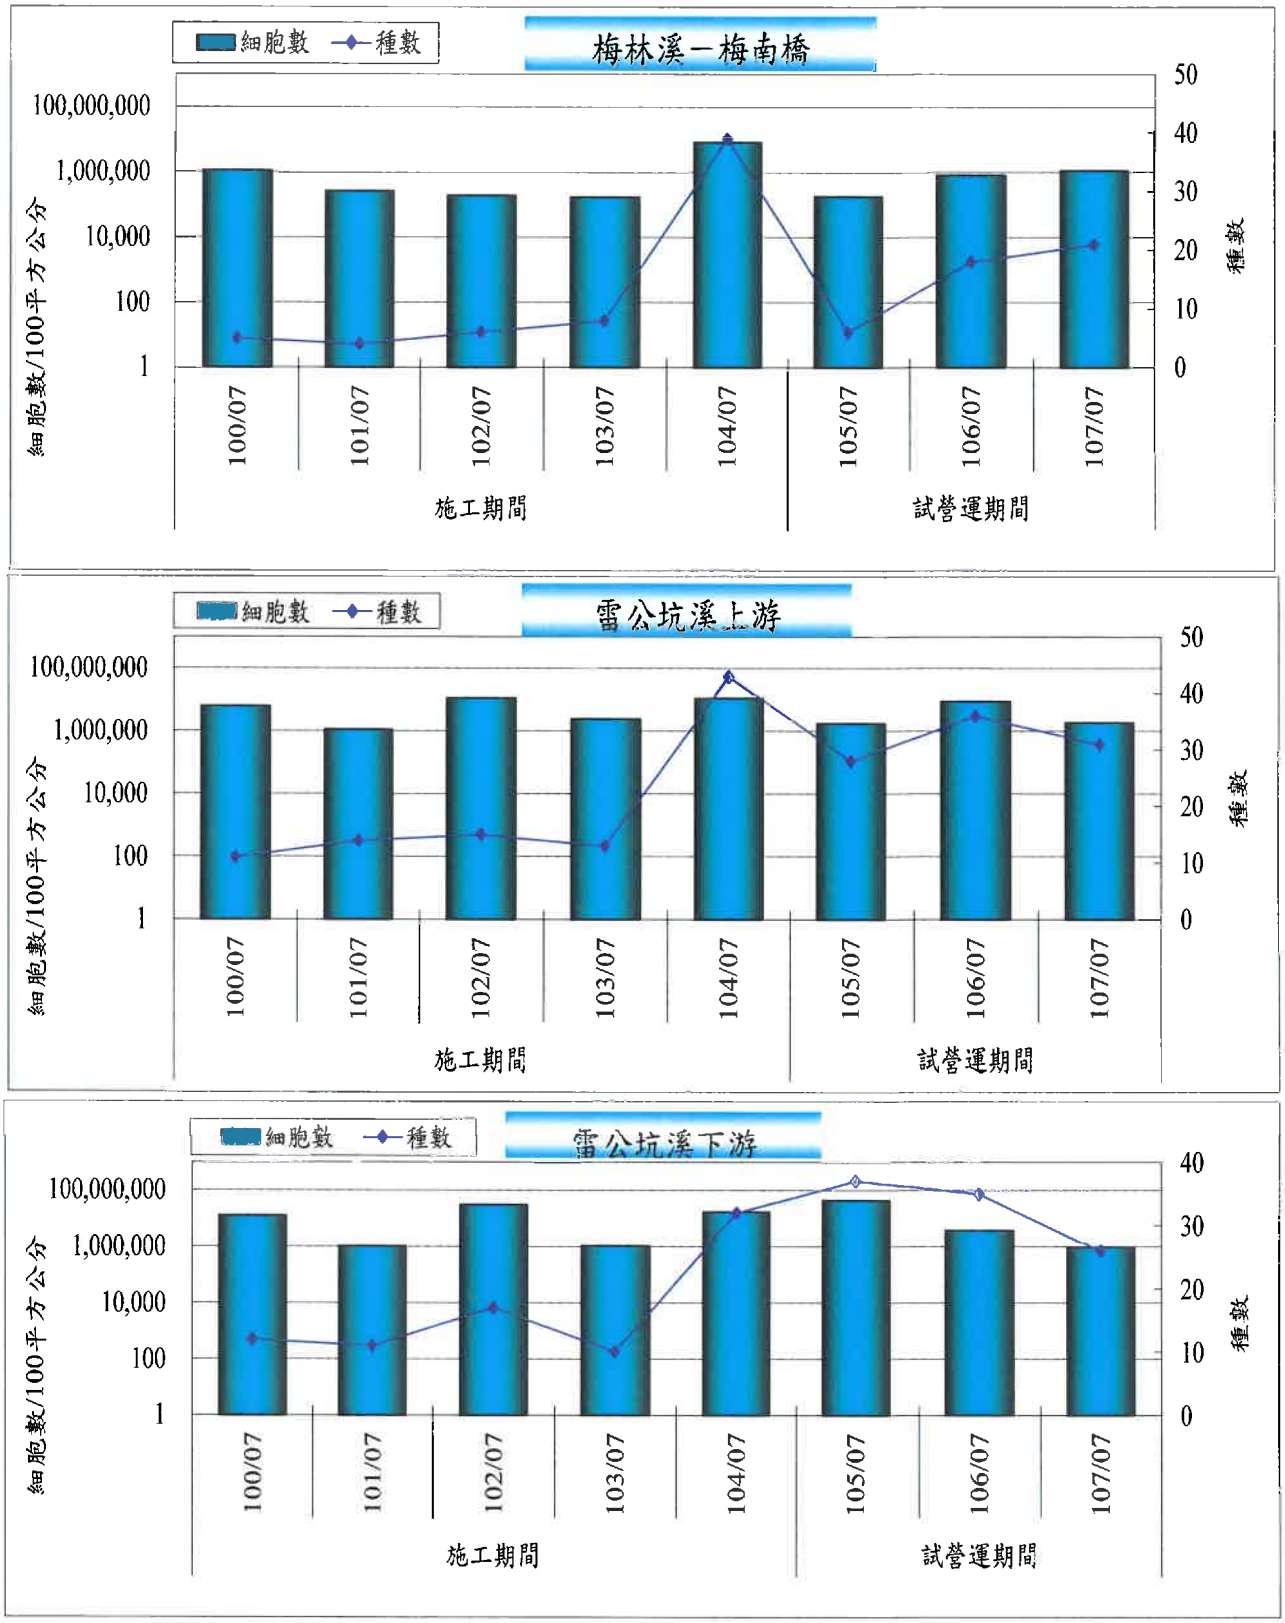

圖 2.5-10　歷次同季附著性藻類監測結果比較(續)

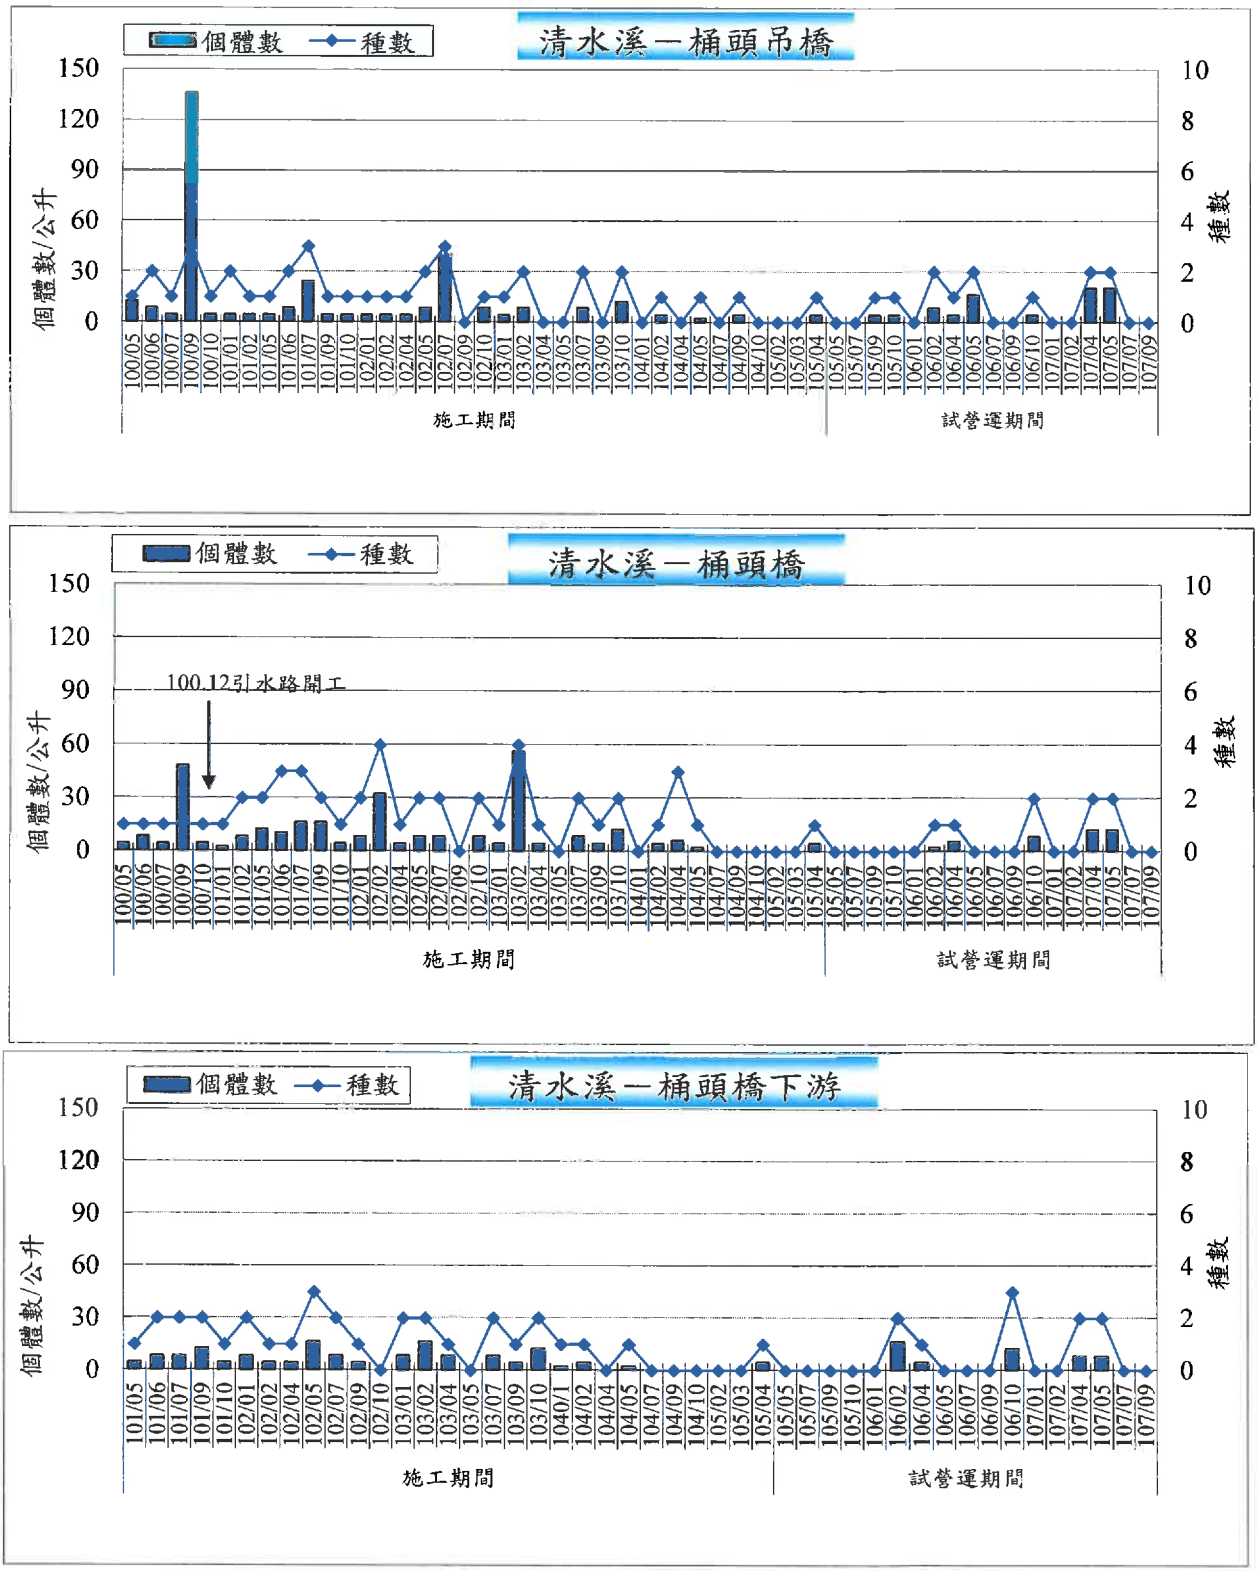

圖 2.5-11　歷次浮游動物監測結果比較

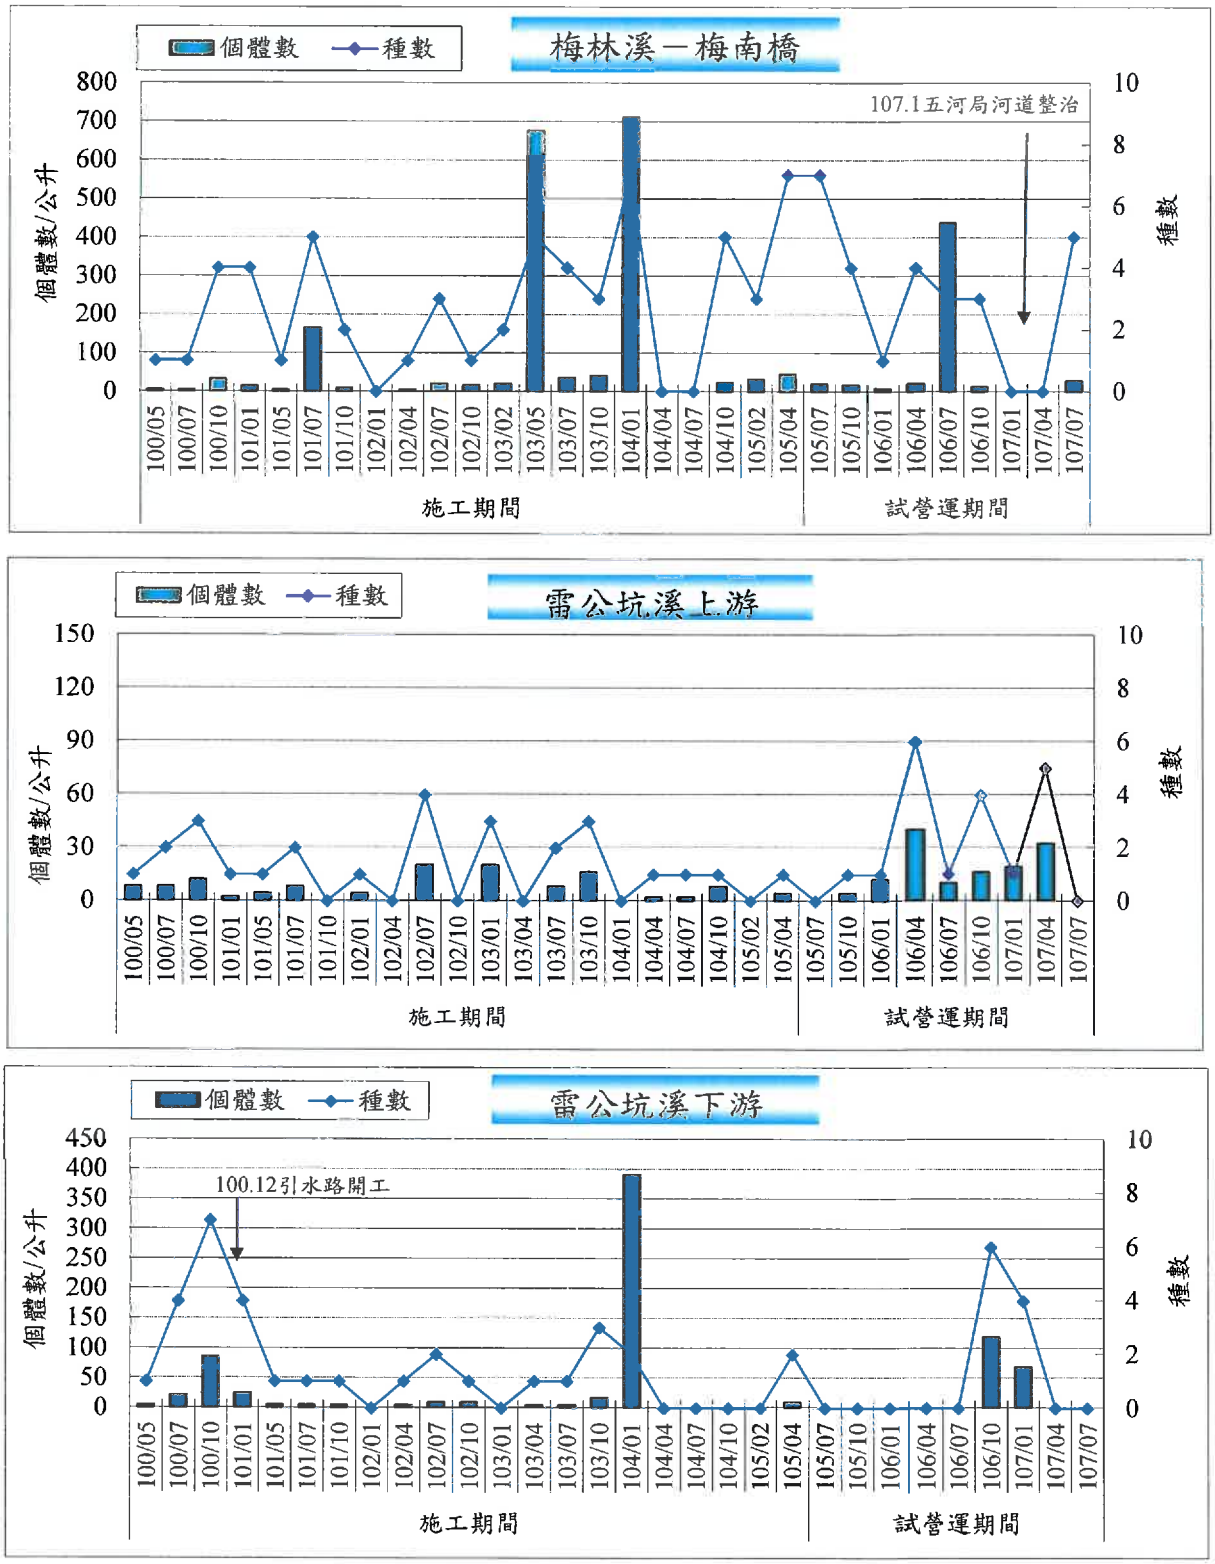

圖 2.5-11　歷次浮游動物監測結果比較(續)

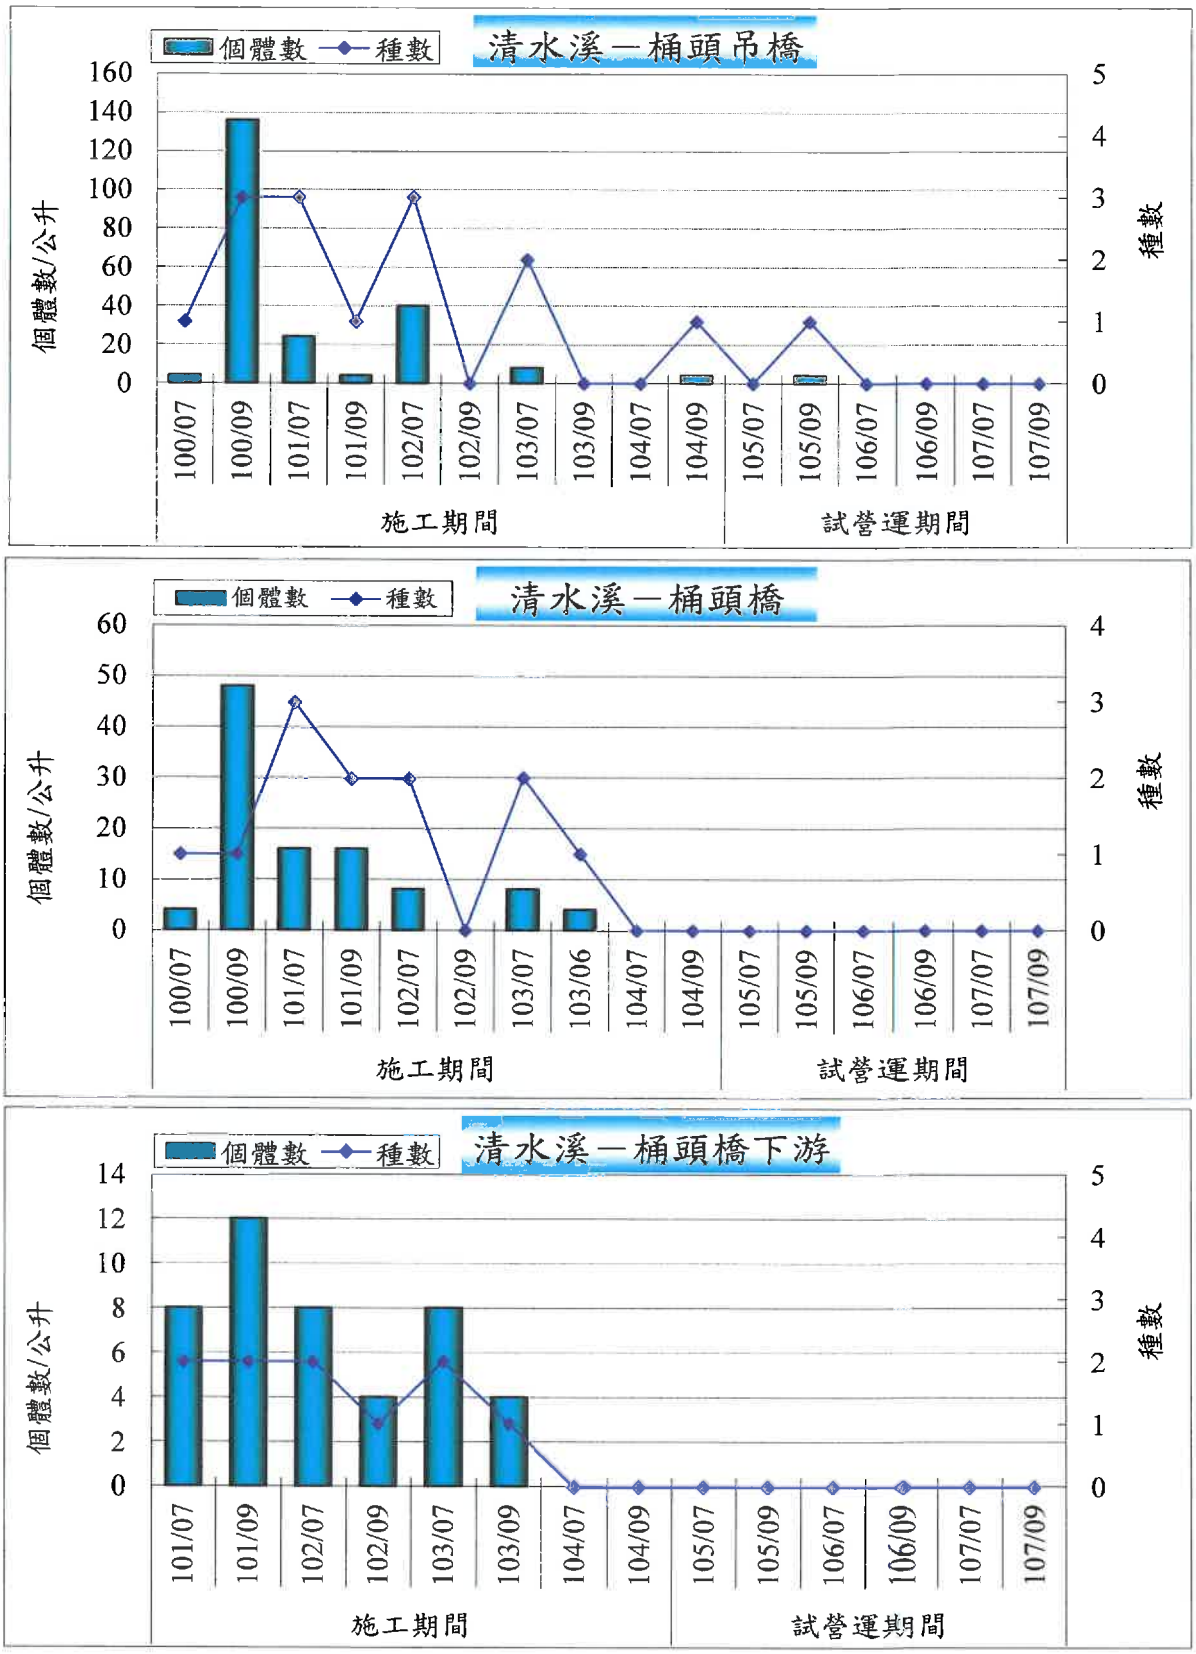

圖 2.5-12　歷次同季浮游動物監測結果比較

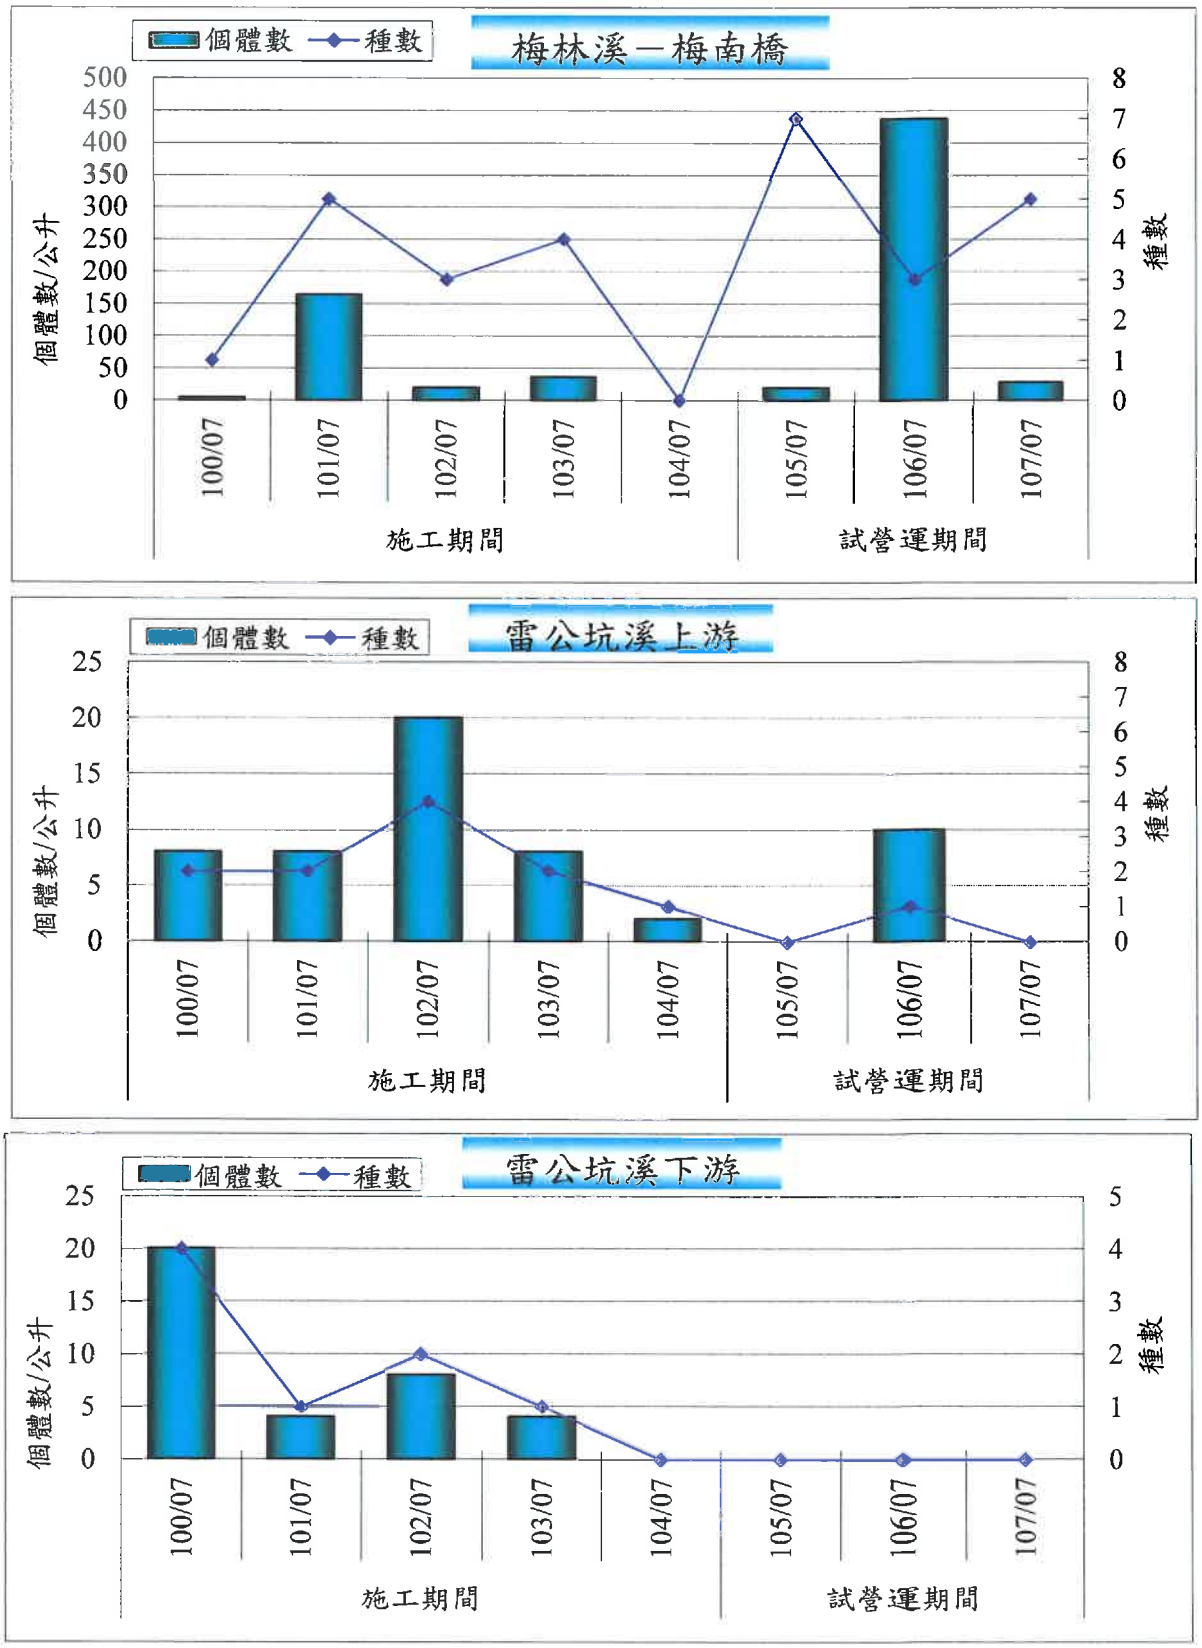

圖 2.5-12　歷次同季浮游動物監測結果比較(續)

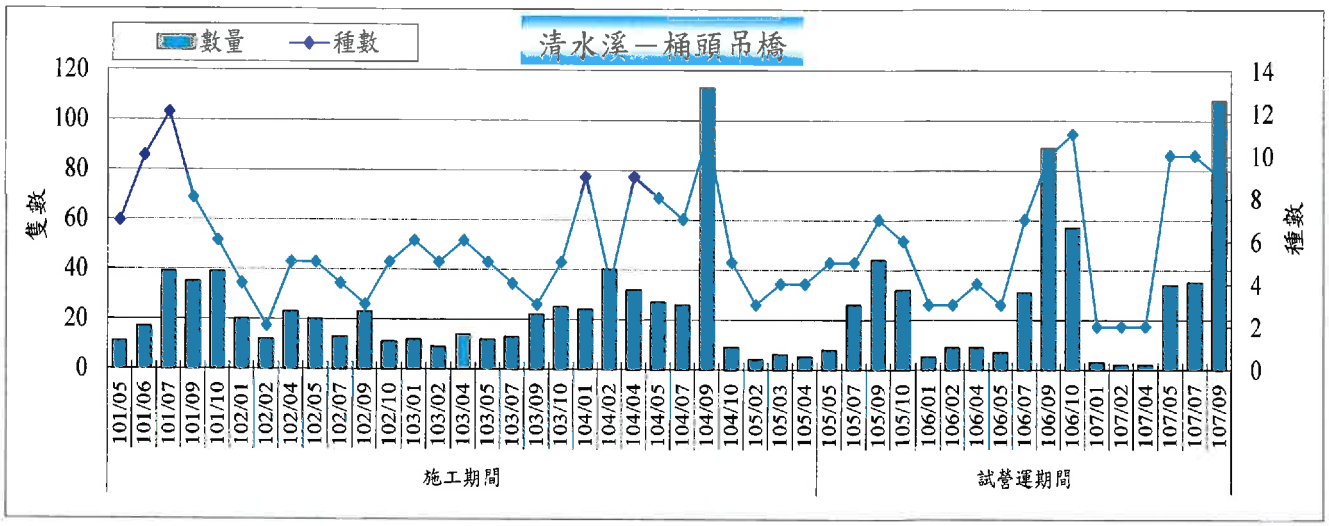

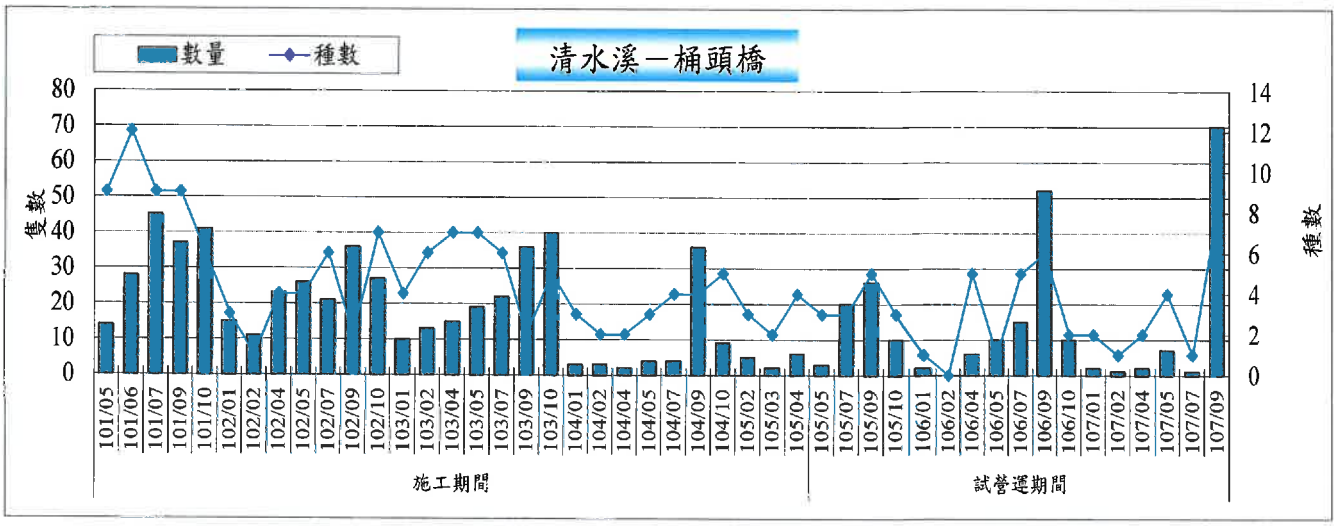

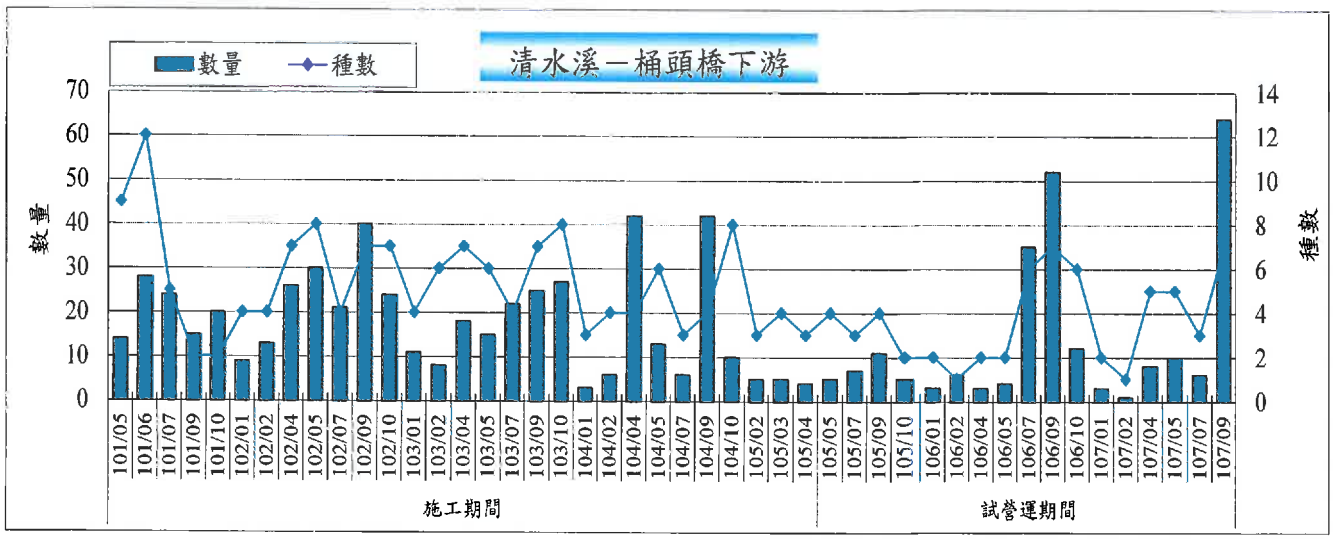

圖 2.5-13　歷次蜻蜓類監測結果比較

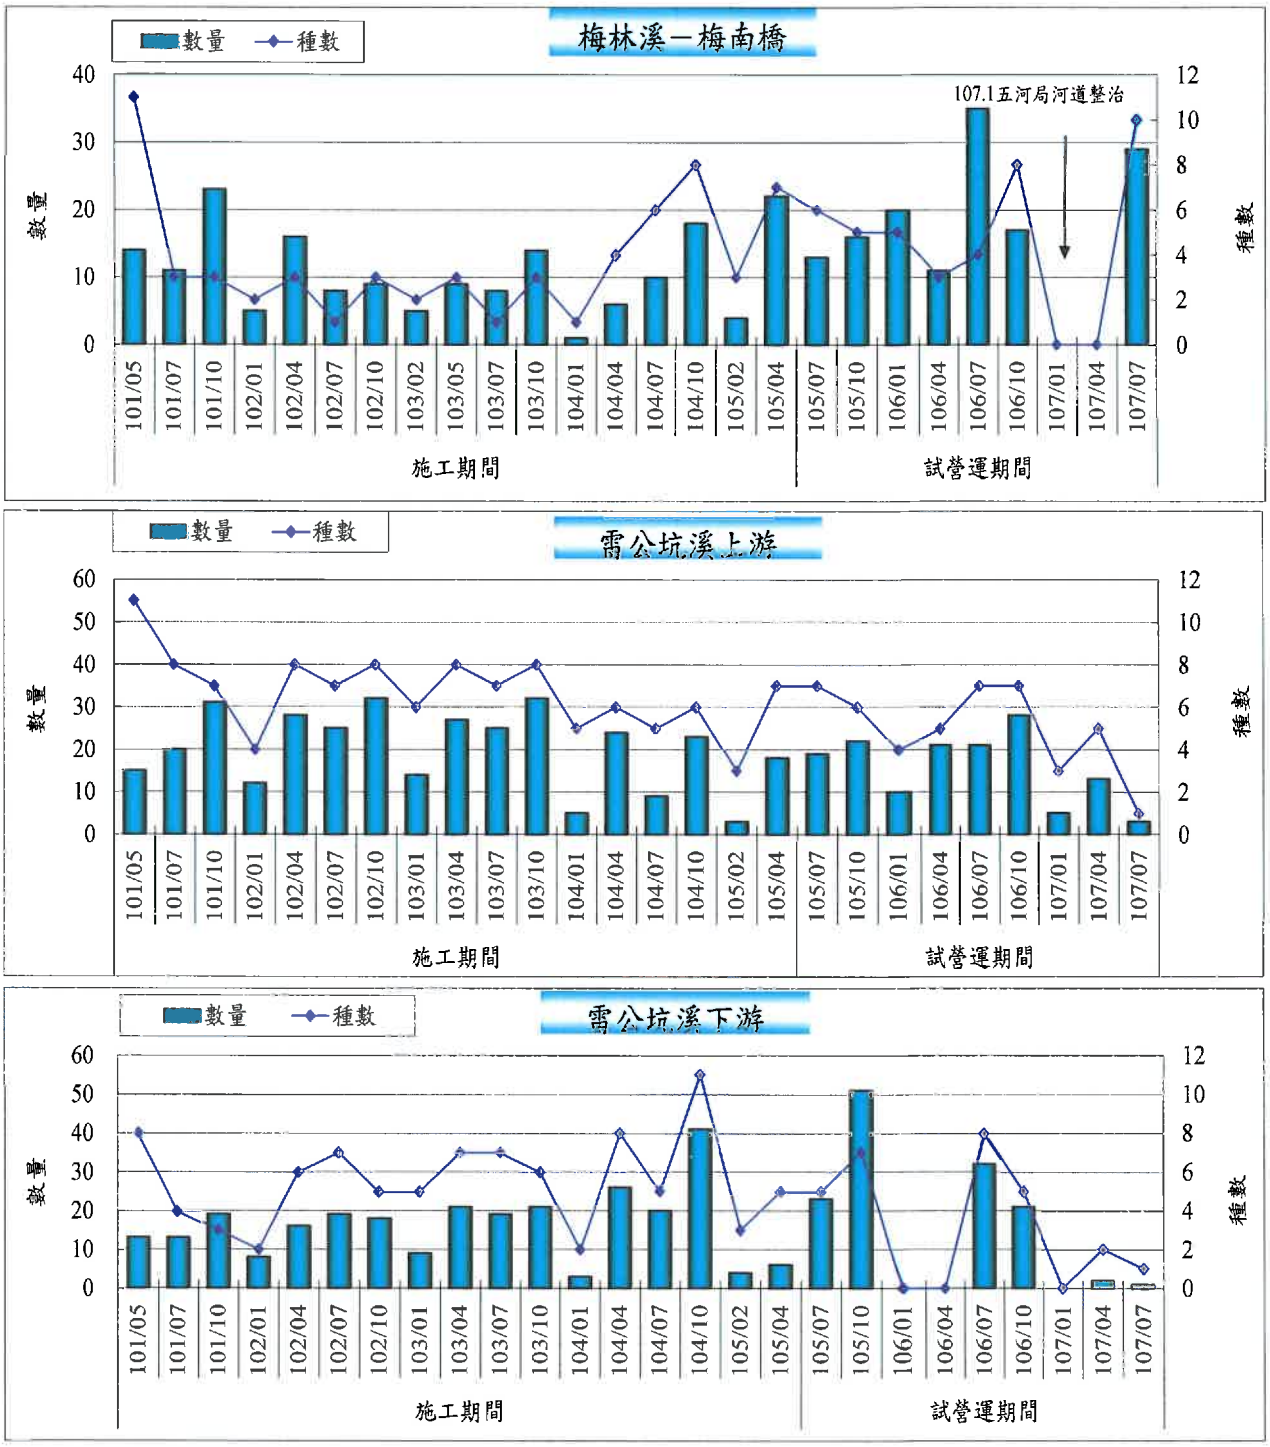

圖 2.5-13　歷次蜻蜓類監測結果比較(續)

圖 2.5-14　歷次同季蜻蜓類監測結果比較

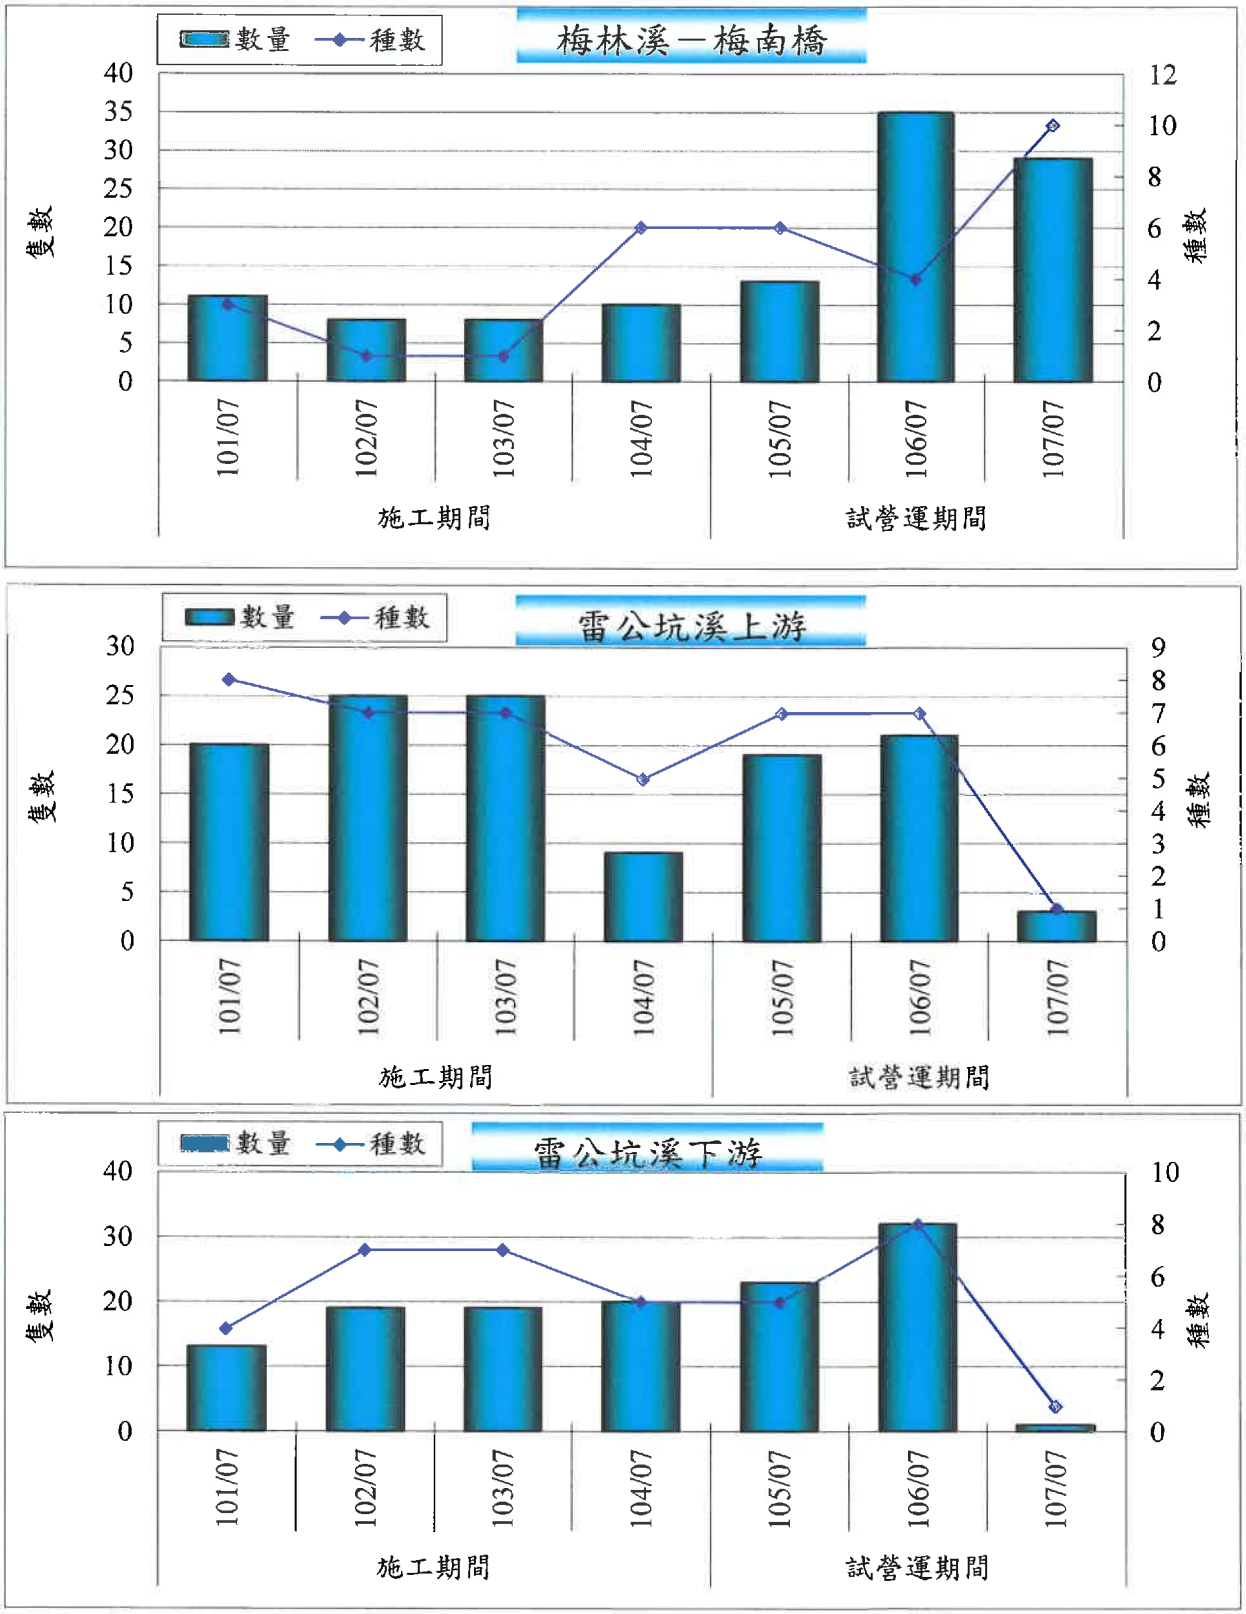

圖 2.5-14　歷次同季蜻蜓類監測結果比較(續)

圖 2.5-15　湖山水庫桶頭攔河堰魚道效益評估監測樣點測站

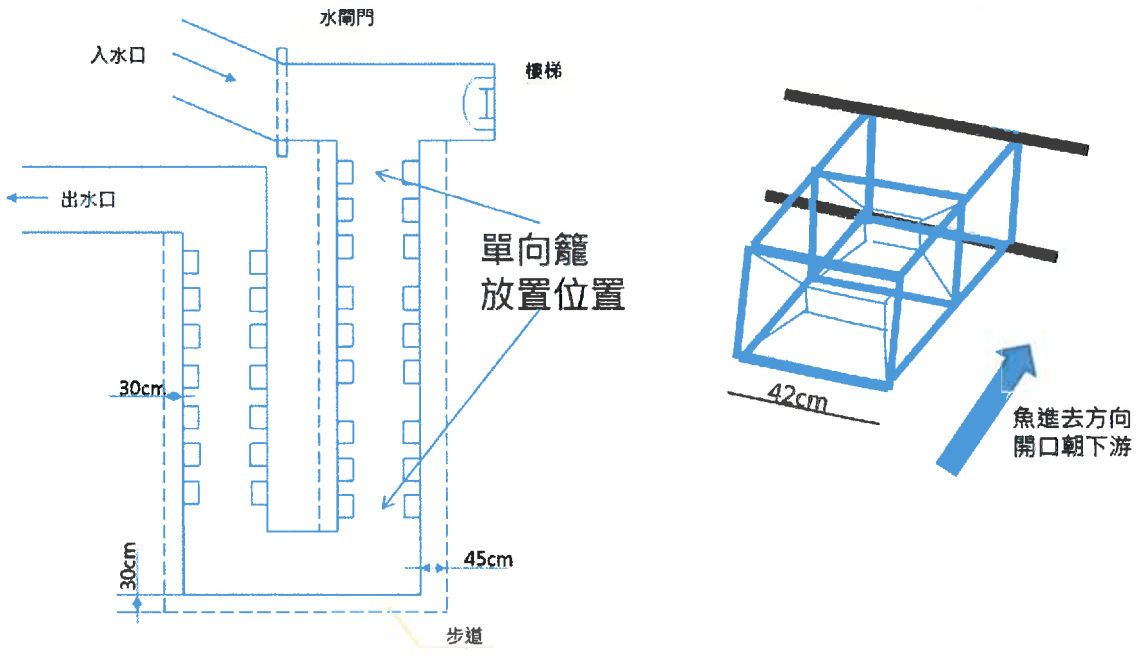

圖 2.5-16　桶頭攔河堰魚道監測單向籠放置位置及單向籠示意圖

桶頭攔河堰上游

桶頭攔河堰魚道

桶頭攔河堰下游

桶頭固床工上游

桶頭固床工魚道

桶頭固床工下游

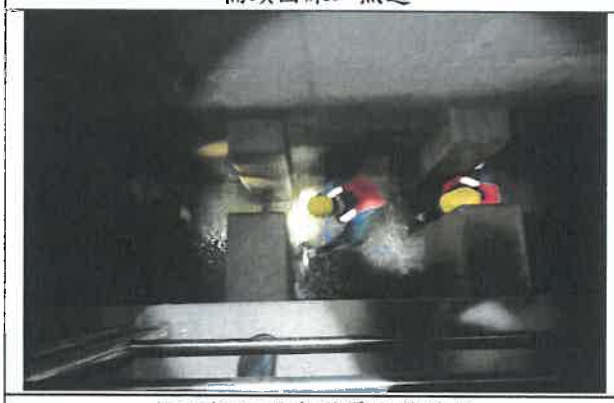

桶頭攔河堰魚道單向籠佈置

桶頭攔河堰魚道電氣採捕

圖 2.5-17　107 年 9 月魚道監測現況

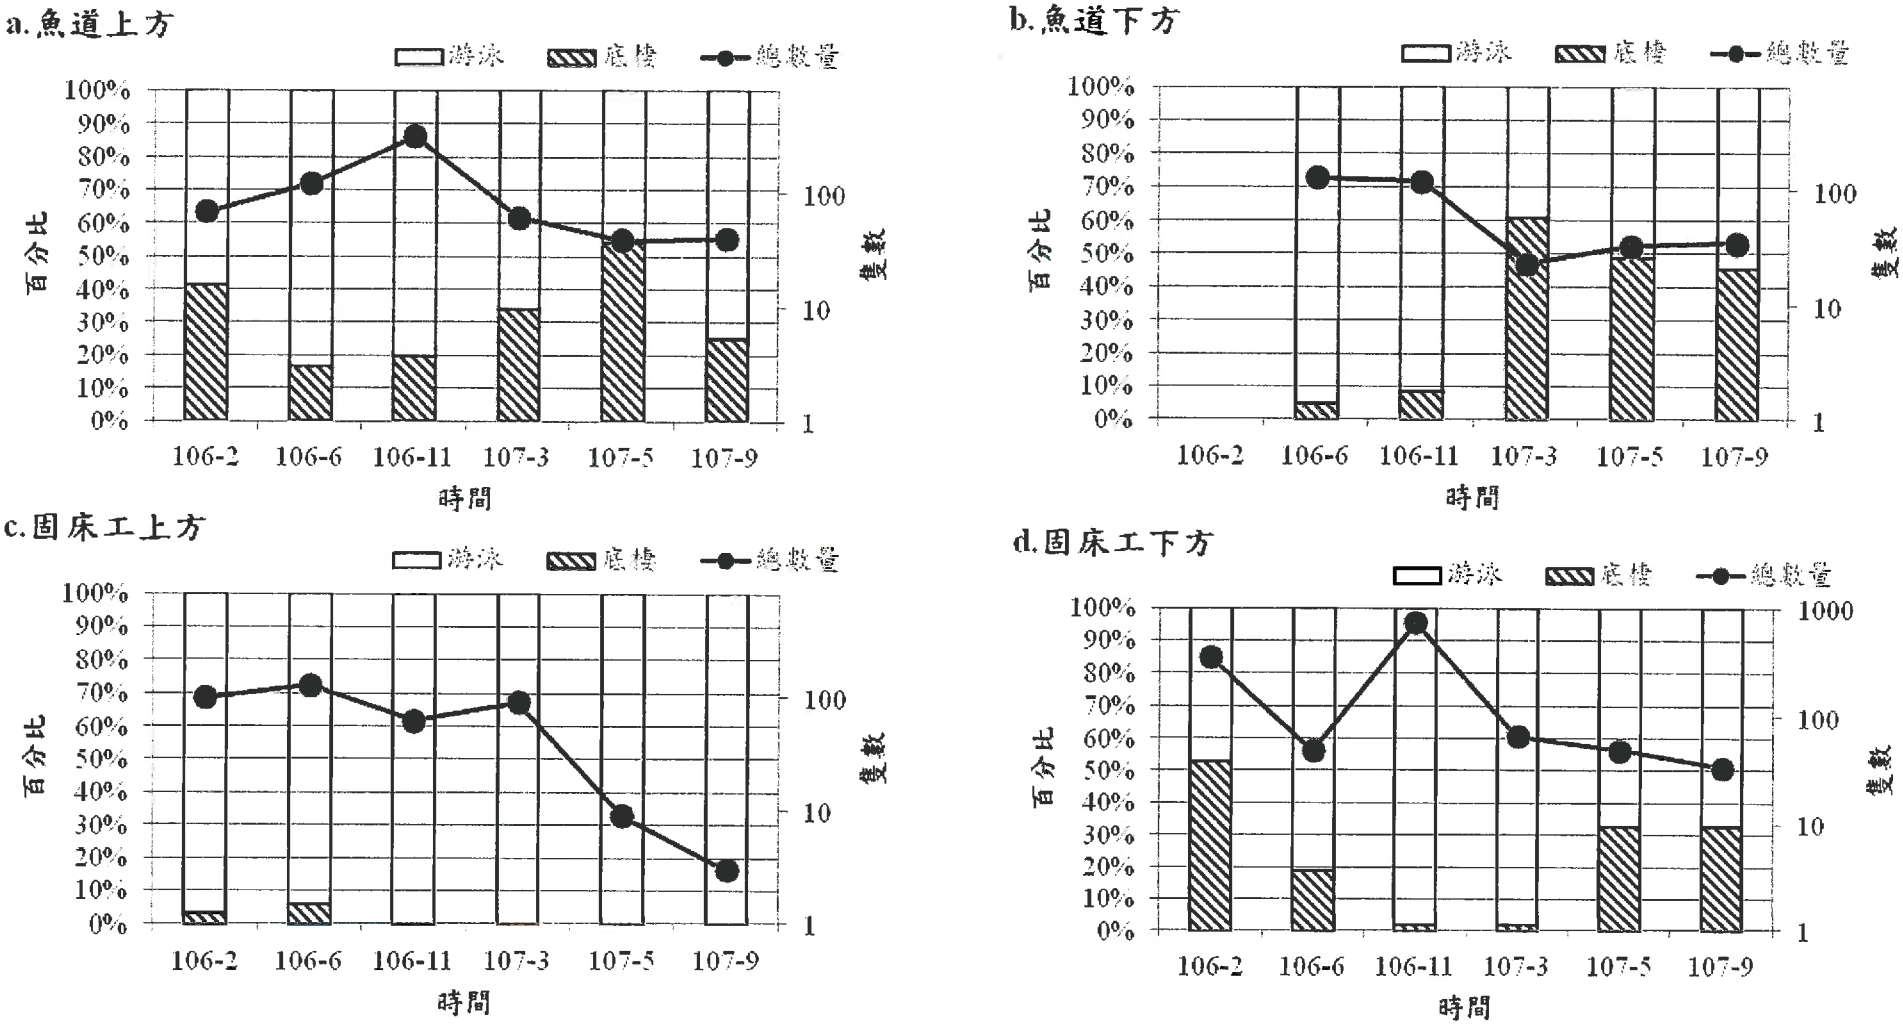

圖 2.5-18　歷次魚道上方、魚道下方、固床工上方及固床工下方各次監測游泳性魚類與底棲性魚類比例及魚類數量變化

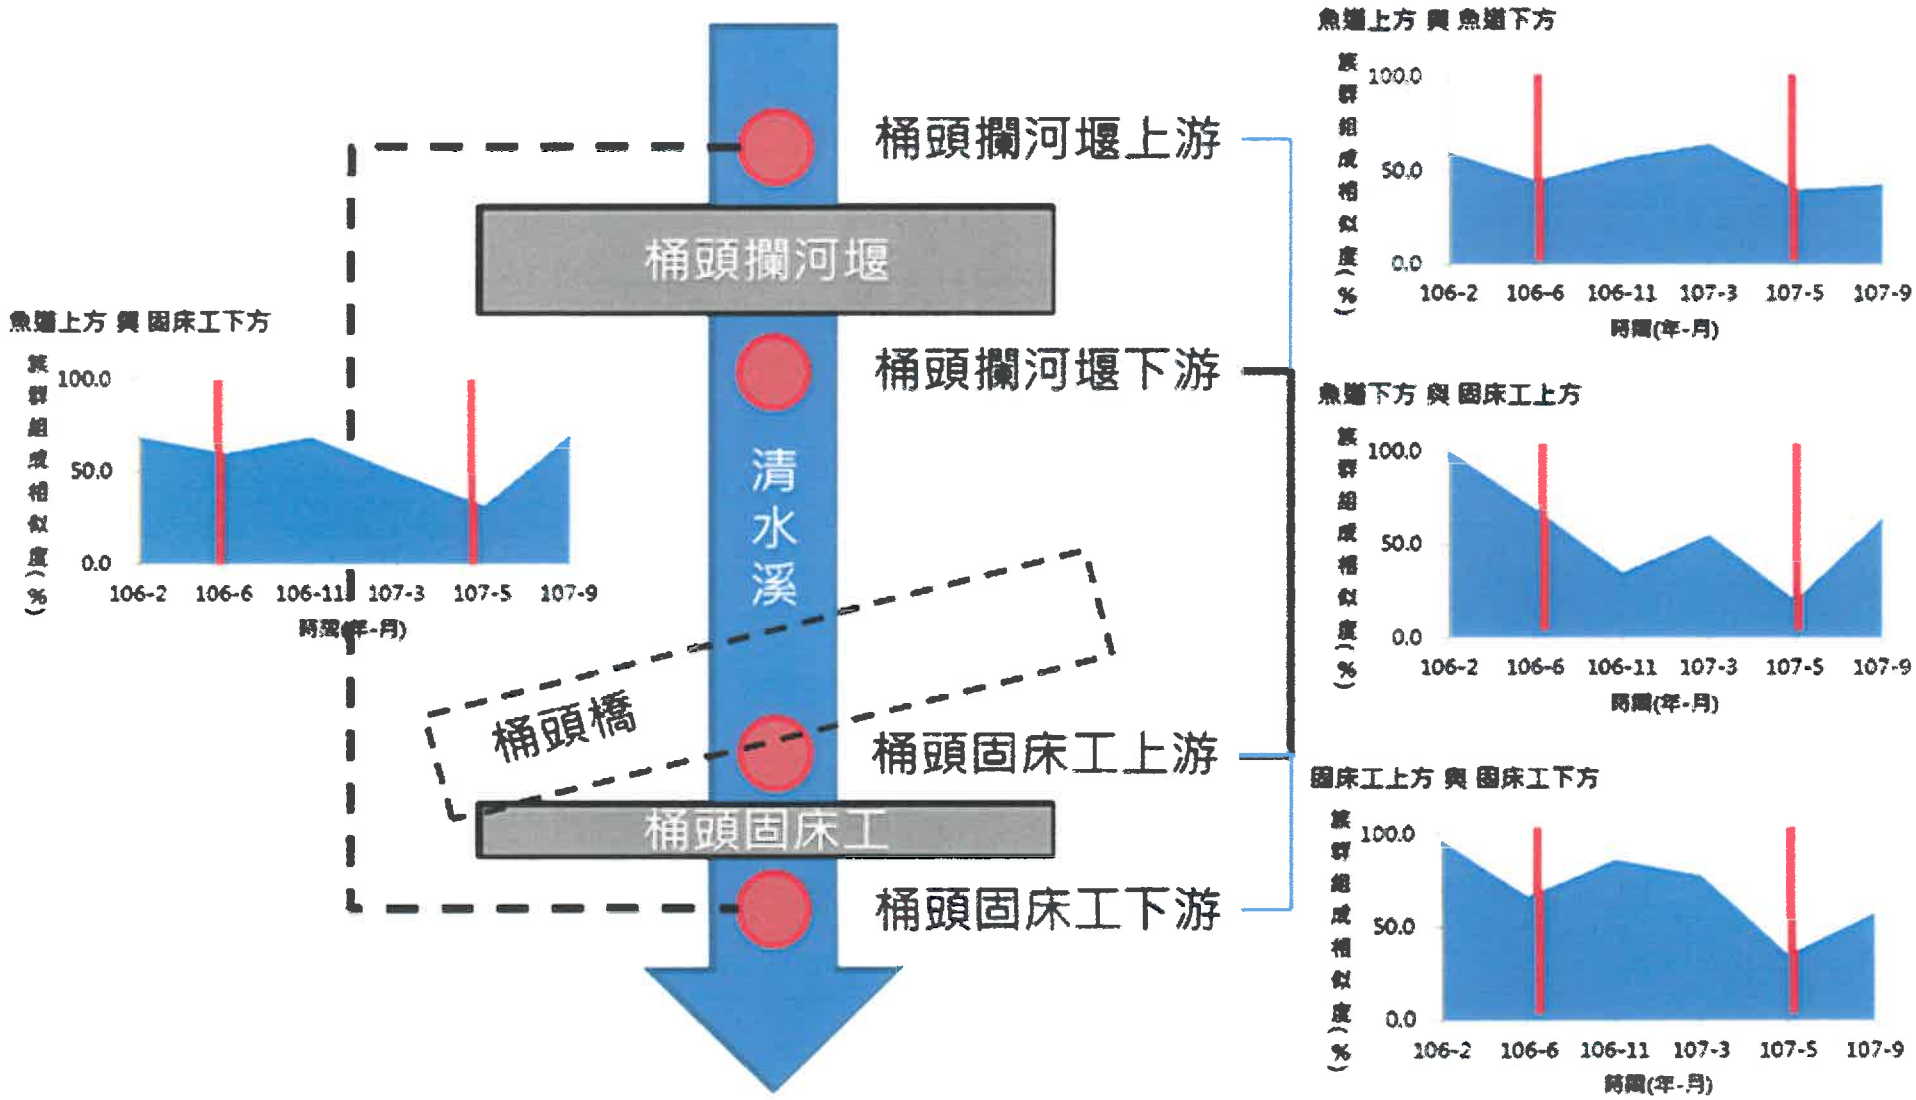

圖 2.5-19　歷次魚道各樣站之物種組成相似度變化(紅線為豪雨後調查)

2.6 陸域動物

本季監測於7月2日至6日及7月9日至13日進行監測，依據中央氣象局雲林氣象站資料，監測期間天氣多為午後陣雨，其中7月2日降雨量為155.5mm較多外，其餘監測期間雨量為0.0~16.5mm，對本計畫無重大影響。本季陸域動物保育類分布圖詳見圖2.6-1~圖2.6-2；本季陸域生態各物種名錄詳見附錄三，各物種歷次監測結果如附錄四及內文圖2.6-3～圖2.6-7、圖2.6-13～圖2.6-17、圖2.6-23～圖2.6-27所示；歷年同季監測結果比較如附錄四及內文圖2.6-8～圖2.6-12、圖2.6-18～圖2.6-22、圖2.6-28～圖2.6-32所示；相關監測結果分析說明如下：

2.6.1 水庫集水區

目前水庫集水區多數測站擾動已明顯減少，由於水庫集水區於試營運期間水庫內蓄水，促使道路無法通行，部分測線及測站無法抵達，爰須進行變更監測測線。

原本計畫區內共劃設A~G等7條監測測線，每條測線依其距離與可及性，另分別劃設2~11個測站。自97年度起因湖南壩及湖山壩陸續施工，原A、E全線以及F、G測線之部份測站已遷移至自然生態保留及復育區以及中坑溪上游，並分別增設M、N、O等測線。由於施工陸續展開，原本測線部份已遭工程干擾而無法繼續。本監測計畫參考過往監測測線及現場情況，監測測線為B、C、D、G、M、N、O等7條測線，共38個監測測站。

自105年7月起，因水庫內局部蓄水，測站無法抵達，須變換測站位置，因此在維持努力量相同、不變更測線及測站數量的前提下，儘量選擇環境相似，或是可較完整、通盤監測水庫集水區周邊之測站進行變更，其中，B測線及G測線部分測站挪移，C、D、O測線則變更位置，並改名為R、Q、P測線，測線數量及測站均與過往相同，仍為7條測線，共38個監測測站，變更前後位置見圖2.6-33。

本計畫陸域動物監測項目包括哺乳類、兩棲類、爬蟲類、鳥類及蝴蝶類，監測頻率為每季1次。配合湖山水庫工程計畫第四次環境影響差異分析報告之變更，自101年第2季起各項動物監測努力量則依據100年7月最新公告之動物生態評估技術規範，每次監測均進行三重複次數努力量，各項動物監測則以每三日為一次的重複量，共進行三次重複，以三次重複的各物種之最大值呈現。陸域動物監測時間如表2.6-1所示，鳥類為每日出後三小時及每次重複量的第1日晚上則進行夜間監測，地棲性哺乳類於第1天佈籠，之後每日早上巡視鼠籠，蝙蝠類則於夜間監測，兩棲類及爬蟲類為每日早上及每次重複量的第1日夜間進行監測，其中夜間監測由於本計畫監測站位較多，考量範圍及時間因素，故以兩組監測人員分別進行監測，蝴蝶類則於早上進行。

一、本季監測成果

(一)種屬組成及數量

1.鳥類

本季鳥類監測結果共記錄12目30科50種2,048隻次，鳥類組成以陸生性鳥種為主。由於監測範圍內包括山澗、溪流等棲地環境，因此亦可發現部分水鳥物種，如白鶺鴒(*Motacilla alba*)、小環頸鴴(*Charadrius dubius*)、小白鷺(*Egretta garzetta*)及小鸊鷉(*Tachybaptus ruficollis*)等。依據台灣野鳥圖鑑(王嘉雄等，1991)、台灣鳥類誌(行政院農業委員會林務局，2010)、台灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會，2017)，所記錄到的鳥種，除了白腰鵲鴝(*Copsychus malabaricus*)(外來種)及翠翼鳩(*Chalcophaps indica*)為不普遍種外，其餘鳥種均為臺灣西部低海拔山區普遍常見物種。

2.哺乳類

本季哺乳類監測結果共記錄到6目8科14種161隻次。其中，尖鼠科、鼠科均為現場捕捉紀錄；蝙蝠類為利用蝙蝠偵測器辨識而得；臺灣獼猴(*Macaca cyclopis*)及赤腹松鼠(*Callosciurus erythraeus thaiwanensis*)為目擊紀錄；臺灣鼴鼠(*Mogera insularis insularis*)為洞穴痕跡；臺灣野豬(*Sus scrofa taivanus*)為足跡及鳴叫紀錄；臺灣野兔(*Lepus sinensis formosus*)為排遺紀錄。依據2008台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄(邵廣昭等，2008)、台灣的蝙蝠(林良恭，2004)、台灣哺乳動物(祁偉廉，2008)，記錄到的物種中，除了臺灣野豬及長尾鼠耳蝠(*Myotis frater*)為不普遍種，絨山蝠(*Nyctalus plancyi velutinus*)為罕見種外，其餘皆為臺灣西部低海拔山區普遍常見物種。

3.兩棲類

本季兩棲類監測結果共記錄5科15種269隻次，主要出現於區內溪流、溝渠、積水容器與次生林底層。依據台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等，2002)、賞蛙圖鑑-台灣蛙類野外觀察指南(第二版)(楊懿如，2002)，除了黑蒙西氏小雨蛙(*Microhyla heymonsi*)及虎皮蛙(*Hoplobatrachus rugulosa*)為局部普遍種，其餘物種皆為臺灣西部常見物種。

4.爬蟲類

本季爬蟲類監測結果共記錄 5 科 12 種 121 隻次，多出現於次生林、林緣及草生灌叢等環境。依據台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等，2002)，所記錄物種除了臺灣草蜥((*Takydromus formosanus*)、古氏草蜥(*T. kuehnei kuehnei*)、蓬萊草蜥(*T. stejnegeri*)、印度蜓蜥(*Sphenomorphus indicus*)、臺灣滑蜥(*Scincella formosensis*)為局部普遍種外，其餘皆為臺灣西部平地至低海拔山區環境常見物種。

5.蝴蝶類

本季蝴蝶類監測結果共記錄 5 科 12 亞科 66 種 789 隻次，多出現於次生林、林緣及草生灌叢等環境。依據台灣蝶圖鑑第一、二、三卷(徐堉峰，2000、2002、2006)、台灣蝶類生態大圖鑑(濱野榮次，1987)，除臺灣鳳蝶(*Papilio thaiwanus*)為局部普遍種外，其餘蝶類皆為臺灣西部平地至低海拔山區環境常見物種。

(二)臺灣特有種及特有亞種

本季監測共記錄臺灣特有種 18 種：大彎嘴(*Megapomatorhinus erythrocnemis*)、小彎嘴(*Pomatorhinus musicus*)、繡眼畫眉(*Alcippe morrisonia*)、五色鳥(*Psilopogon nuchalis*)、臺灣竹雞(*Bambusicola sonorivox*)、長趾鼠耳蝠(*My. secundus*)、臺灣獼猴、梭德氏赤蛙(*Rana sauteri*)、面天樹蛙(*Kurixalus idiootocus*)、莫氏樹蛙(*Rhacophorus moltrechti*)、褐樹蛙(*Buergeria robusta*)、盤古蟾蜍(*Bufo bankorensis*)、臺灣草蜥、蓬萊草蜥、臺灣滑蜥、斯文豪氏攀蜥(*Japalura swinhonis*)、臺灣鳳蝶、寶島波眼蝶(*Ypthima formosana*)；臺灣特有亞種則計 24 種：南亞夜鷹(*Caprimulgus affinis*)、小雨燕(*Apus nipalensis*)、松雀鷹(*Accipiter virgatus*)、大冠鷲(*Spilornis cheela*)、紅嘴黑鵯(*Hypsipetes leucocephalus*)、白頭翁(*Pycnonotus sinensis*)、白環鸚嘴鵯(*Spizixos semitorques*)、山紅頭(*Cyanoderma ruficeps*)、粉紅鸚嘴(*Sinosuthora webbiana*)、黑枕藍鶲(*Hypothymis azurea*)、小卷尾(*Dicrurus aeneus*)、大卷尾(*D. macrocercus*)、樹鵲(*Dendrocitta formosae*)、斑紋鷦鶯(*Prinia criniger*)、褐頭鷦鶯(*Pr. inornata*)、頭烏線(*Schoeniparus brunneus*)、領角鴞(*Otus lettia*)、黃嘴角鴞(*O. spilocephalus*)、臺灣野兔、臺灣鼴鼠、臺灣野豬、堀川氏棕蝠(*Eptesicus serotinus horikawai*)、赤腹松鼠、長尾麝鳳蝶(*Byasa impediens febanus*)。

(三)保育類物種

本季監測共記錄 5 種珍貴稀有保育類(臺灣獼猴、松雀鷹、大冠鷲、領角鴞、黃嘴角鴞)。(保育等級依據行政院農業委員會中華民國 106 年 3 月 29 日農林務字第 1061700219 號公告)。

(四)優勢種群

1. B 測線

棲地以幽情谷前段為起點，至右側次生林坡地，全段以次生林棲地為主。洋燕(*Hirundo tahitica*)為本季 B 測線的優勢鳥類族群，佔 B 測線監測總隻次 14.63%；哺乳類數量都在 5 隻次以內，無明顯優勢種；兩棲類數量皆在 5 隻次以內，優勢種並不明顯；爬蟲類數量皆在 3 隻次以內，優勢種並不明顯；蝴蝶類以豆環蛺蝶(*Neptis hylas luculenta*)數量較多，佔 B 測線監測總隻次的 10.42%。

2. R 測線

棲地以茶園為主，本區域較少人為擾動，且茶園外圍仍屬次生林。本季優勢鳥種為繡眼畫眉，佔 R 測線監測總隻次的 22.81%；哺乳類數量以臺灣獼猴為優勢，佔 R 測線監測總隻次的 37.50%；兩棲類數量皆在 5 隻次以內，優勢種並不明顯；爬蟲類數量皆在 5 隻次以，優勢種並不明顯；蝴蝶類數量相當，優勢種並不明顯。

3. Q 測線

棲地位處壩體周邊的樹林及草生灌叢邊緣。鳥類優勢物種為麻雀(*Passer montanus*)，佔 Q 測線監測總隻次的 16.28%；哺乳類數量以臺灣獼猴為優勢，佔 Q 測線監測總隻次的 34.78%；兩棲類數量皆在 5 隻次以內，優勢種並不明顯；爬蟲類以蝎虎(*Hemidactylus frenatus*)數量較多，佔 Q 測線監測總隻次的 41.18%；蝴蝶類以黃蝶(*Eurema hecabe*)數量較多，佔 Q 測線監測總隻次的 12.00%。

4. G 測線

棲地以次生林鑲嵌竹林為主。本季鳥類優勢族群為赤腰燕(*H. striolata*)，佔 G 測線監測總隻次的 16.63%；哺乳類數量都在 5 隻次以內，沒有明顯優勢種；兩棲類以澤蛙(*Fejervarya kawamurai*)數量較多，佔 G 測線監測總隻次的 25.53%；爬蟲類以斯文豪氏攀蜥數量較多，佔 G 測線監測

總隻次的 35.71%；蝴蝶類以藍灰蝶(*Zizeeria maha okinawana*)數量較多，佔 G 測線監測總隻次的 16.56%。

5. M 測線

此測線位於自然生態保留及復育區內，主要棲地以次生林為主。本季優勢鳥類族群為繡眼畫眉，佔 M 測線監測總隻次的 23.38%；哺乳類數量以臺灣獼猴為優勢，佔 M 測線監測總隻次的 20.59%；兩棲類以澤蛙數量較多，佔 M 測線監測總隻次的 26.87%；爬蟲類數量皆在 5 隻次以內，優勢種並不明顯；蝶類以藍灰蝶數量較多，佔 M 測線監測總隻次的 12.00%。

6. N 測線

此測線亦包含自然生態保留及復育區，棲地以次生林地、竹林與草生地為主。本季優勢鳥類族群為麻雀，佔 N 測線監測總隻次的 19.33%；哺乳類數量都在 5 隻次以內，無明顯優勢種；兩棲類以日本樹蛙(*B. japonica*)較為優勢，佔 N 測線監測總隻次的 27.27%；爬蟲類數量皆在 5 隻次以內，優勢種並不明顯；蝶類以藍灰蝶、藍紋鋸眼蝶(*Elymnias hypermnestra hainana*)數量較多，兩者佔 N 測線監測總隻次的 23.02%。

7. P 測線

主要以次生林為主。本季優勢鳥類族群為洋燕，佔 P 測線監測總隻次的 19.32%；哺乳類數量都在 5 隻次以內，無明顯優勢種；兩棲類以日本樹蛙較為優勢，佔 P 測線監測總隻次的 30.30%；爬蟲類數量皆在 2 隻次以內且相近，無優勢種；蝴蝶類以遷粉蝶(*Catopsilia pomona*)數量較多，佔 P 測線監測總隻次的 14.29%。

整體而言，水庫集水區鳥類以赤腰燕較為優勢，數量約佔監測總隻次 11.47%。哺乳動物習性較為隱密，除少數物種外並不易於現場目擊觀察，以觀察、捕捉之結果看來，本區域優勢的翼手目為山家蝠(*Pipistrellus montanus*)，佔監測總隻次的 13.04%；樹棲性哺乳類優勢種為臺灣獼猴，佔監測總隻次的 21.12%；地棲性哺乳類優勢種為臭鼩(*Suncus murinus*)，佔監測總隻次的 6.83%。本季兩棲類物種以日本樹蛙為優勢種，佔監測總隻次的 19.70%；爬蟲類以蝎虎及斯文豪氏攀蜥為優勢種，兩者佔監測總隻次的 42.98%；優勢種蝴蝶類則為藍灰蝶，佔監測總隻次的 11.28%。

(五)鳥類之遷徙屬性

本季監測所記錄的50種鳥類中，其中包含1種冬候鳥(小環頸鴴)、4種夏候鳥(家燕(*H. rustica*)、鷹鵑(*Hierococcyx sparverioides*)、黃頭鷺(*Bubulcus ibis*)、小白鷺)以及3種外來種(白腰鵲鴝、白尾八哥(*Acridotheres javanicus*)、家八哥(*Acr. tristis*))。由監測紀錄可得知，本季監測範圍內之鳥類主要是以留鳥族群所組成(42種)。

(六)多樣性與均勻度估算

各測線之鳥類歧異度指數H'介於2.45~2.88，數值屬中等至中等偏高，顯示鳥種多樣性豐富。均勻度指數E介於0.76~0.88，數值屬偏高，顯示此地鳥類在不同物種間個體數分配大致為均勻。

各測線之哺乳類歧異度指數H'介於1.63~2.49，數值偏低至中等，顯示本區哺乳類物種豐富度尚可。均勻度指數E介於0.87~0.97，數值屬偏高，顯示在有限的物種數中個體數分配均勻。

各測線之兩棲類歧異度指數H'介於1.80~2.25，數值偏低至中等，顯示本區兩棲類物種豐富度尚可。均勻度指數E介於0.89~0.97，數值偏高，顯示在有限的物種數中個體數分配均勻。

各測線之爬蟲類歧異度指數介於1.56~2.14，數值屬偏低至中等，顯示本區爬蟲類物種豐富度尚可。各測線均勻度指數介於0.87~0.98，數值偏高，顯示在有限的物種數中個體數分配均勻。

各測線之蝴蝶類歧異度指數介於3.12~3.51，數值偏高，顯示本季各測線的蝴蝶物種豐富。各測線均勻度指數為0.88~0.94，數值偏高，顯示在有限的物種數中個體數分配相當均勻。

二、歷次監測結果

(一)鳥類

水庫集水區歷年鳥類監測結果，大部分鳥類均以春夏為繁殖生長季節，秋冬季則為冬候鳥造訪期間，因此種類上較春夏來得豐富；而4月、9月則為過境鳥暫時停留臺灣之時期，則有可能記錄部分稀有鳥種。比較歷季紀錄，本區共記錄鳥類種數介於29~61種之間，以105年第1季出現之種數

最多(61 種)；數量則介於 225~3,295 隻次之間，以 105 年第 1 季之數量最多(3,295 隻次)。除了 102 年第 4 季數量大幅減少外，自 100 年第 2 季後種數及數量有增加趨勢，常可發現優勢鳥群覓食及活動情形，推測除受大環境氣候變化影響外，亦可能因植被變化影響，鳥類遷移至水庫集水區周圍(測站附近)林相較好之棲地環境。過往保育類物種記錄 20 種，包括魚鷹(*Pandion haliaetus*)、朱鸝(*Oriolus traillii*)、藍腹鷴(*Lophura swinhoii*)、東方蜂鷹(*Pernis ptilorhynchus*)、大冠鷲、赤腹鷹(*Acc. soloensis*)、鳳頭蒼鷹(*Acc. trivirgatus*)、松雀鷹、灰面鵟鷹(*Butastur indicus*)、林鵰(*Ictinaetus malayensis*)、褐鷹鴞(*Ninox japonica*)、領角鴞、黃嘴角鴞、八色鳥(*Pitta nympha*)、臺灣藍鵲(*Urocissa caerulea*)、鉛色水鶇(*Rhyacornis fuliginosus*)、白尾鴝(*Cinclidium leucurum*)、臺灣山鷓鴣(*Arborophila crudigularis*)、燕鴴(*Glareola maldivarum*)及紅尾伯勞(*Lanius cristatus*)。

水庫集水區歷年同季鳥類監測結果，種數以 106 年第 3 季最多(55 種)；數量以 107 年第 3 季最多(2,048 隻次)。整體來看，物種數及數量有逐漸增加趨勢。檢視資料，於近幾年種數及數量均較 99 年度前增加，可能與水庫集水區近幾年擾動減少，環境較穩定，較適宜鳥類活動。另外，本季以赤腰燕為主要優勢物種，不排除因氣溫高且近期降雨及濕度較高，於 N 及 G 樣線有較多小型昆蟲集中，使赤腰燕及洋燕數量均增加。

過去環評監測範圍為湖山水庫計畫區、湖南水庫計畫區與桶頭攔河堰等 3 處，監測時間為 82 年 7 月至 84 年 1 月，期間每個計畫區各執行 6 季監測，結果共記錄 58 種鳥類。截至目前監測結果，將歷季各階段與環評期間進行比對，所監測之種數起伏變化多受自然因素(如季節及氣溫變動)及施工期間之人為(如工程施作造成棲地減少、行車頻繁及噪音)影響。

(二)哺乳類

水庫集水區歷年哺乳類種類及數量主要受季節影響，大部分哺乳類於春夏季為繁殖生長季節，所記錄物種較多，秋冬季氣溫較低則轉為蟄伏甚至冬眠，所記錄物種較少。比較歷季監測紀錄，共記錄哺乳類種數介於 2~16 種之間，以 102 年第 2 季出現之種數最多(16 種)；數量則介於 10~173 隻次之間，以 106 年第 3 季之數量最多(173 隻次)。施工前(92 年第 2 季)及停工期間(93 年第 2 季至 95 年第 1 季)監測結果，優勢種以東亞家蝠(*Pip. abramus*)、臺灣彌猴為主；施工期間

(95 年第 2 季開始)優勢種則多以臺灣獼猴、赤腹松鼠為主，小型囓齒目物種記錄情形較過去減少。部分物種於 97 年~98 年可能受工程干擾，造成族群數量有減少或往外遷移；相較於 97 年~98 年監測結果，99 年哺乳類種數略微增加，但數量仍較少，主要因受工程行為而有所影響。自 100 年開始哺乳類種數及數量則有增加趨勢，主要係因於 100 年度採用最新蝙蝠偵測器(Anabat SD1 系統)，故可偵測到較多蝙蝠種類及數量。保育類物種共記錄 4 種，分別為臺灣獼猴、白鼻心(*Paguma larvata taivana*)、山羌(*Muntiacus reevesi*)及食蟹獴(*Herpestes urva formosanus*)。

水庫集水區歷年同季哺乳類監測結果，水庫哺乳類種類於 100 年第 3 季及 107 年第 3 季時種數最多，物種數量皆達 14 種；數量以 106 年第 3 季最多，達 173 隻次)。檢視資料，哺乳類種數及數量於 100 年開始有增加趨勢，可發現蝙蝠類數量增加較明顯。本季氣候大致穩定，且多數工程亦已完成，種類及數量均在歷年同季波動範圍內。

與環評期間比對水庫集水區環評期間各季記錄物種數介於 8 種~9 種之間；施工前及停工期間種數介於 8 種~13 種之間；施工期間介於 2 種~16 種之間；施工兼營運期間則介於 11~14 種。由結果得知，96 年第 3 季前種數較環評期間多，而 96 年 6 月大壩工程開工後，水庫集水區哺乳類種數大幅減少，最低甚至只有 2 種。主要因翼手目(如東亞家蝠、摺翅蝠(*Miniopterus schreibersii*)等)及小型囓齒目與食蟲目(如小黃腹鼠(*Rattus losea*)、溝鼠(*R. norvegicus*)、臭鼩等)物種數量減少。自 100 年起哺乳類種數及數量又開始增加。

(三)兩棲類

水庫集水區歷年兩棲類監測結果，除少數種類如盤古蟾蜍、莫氏樹蛙、梭德氏赤蛙等會利用冬季進行繁殖之外，大部分兩棲類均以春夏季為繁殖生長季節；兩棲類為外溫動物，受外界溫度影響甚鉅，秋冬季氣溫較低，活動也會減少。比較本季及歷季紀錄，出現兩棲類之種數介於 2~16 種之間，以 104 年第 4 季出現之種數最多(16 種)；數量則介於 29~1,475 隻次之間，以 100 年第 4 季之數量最多(1,475 隻次)，主要是該季監測期間恰逢梭德氏赤蛙大量發生聚集繁殖，故記錄數量暴增。整體而言，92 年~99 年歷季種數及數量隨季節有所變化，如春夏季溫度高，記錄之物種數及數量較豐富；100 年後種數與數量逐漸穩定，波動變化較少。各季優勢種仍有部分差異，主要記錄較多之物種包括盤古蟾蜍、小雨蛙(*Mi. fissipes*)、拉都希氏赤蛙(*Hylarana*

latouchii)、澤蛙、梭德氏赤蛙、日本樹蛙與面天樹蛙等。97年第3季後就沒有保育類的紀錄，主要因98年3月保育類名錄變更，本區目前所記錄之保育蛙類皆從名錄中除名，修正為一般物種。

水庫集水區歷年同季兩棲類監測結果，物種數以106、107年第3季最多(15種)；數量以94年第3季最多(478隻)。兩棲類種數與數量自101年起明顯增加，隨後保持平穩，由比較結果可知，歷年同季種數及數量大致穩定，無明顯差異。

過去環評監測範圍為湖山水庫計畫區、湖南水庫計畫區與桶頭攔河堰等3處，監測時間為82年7月至84年1月，共記錄9種兩棲類。監測自92年開始累計共記錄20種兩棲類，佔臺灣蛙類的2/3，歷季種數則介於4～15種，且自100年第1季開始漸趨平穩。歷季各階段與環評期間比對結果，所監測之種數起伏變化多受自然因素(如季節變動)及施工期間之人為(如工程施作造成棲地減少、行車頻繁)影響。

(四)爬蟲類

大部分爬蟲類均以春夏季為繁殖生長季節；另爬蟲類為外溫動物，受外界溫度影響甚鉅，秋冬季氣溫較低，活動力較為減少。比較水庫集水區本季及歷季紀錄，共記錄爬蟲類種數介於1種~20種之間，以95年第3季出現之種數最多(20種)；數量則介於1~153隻次之間，以94年第3季之數量最多(153隻次)。97年~98年種類及數量略微降低，除主要受氣候影響(如颱風)外，部分測站因工程進行而往高處遷移，導致較常出沒活動於河床溪谷的物種觀察記錄數量減少。自100年開始，種數略微增加，隨後保持平穩。數量上則是自102年第3季明顯增加，尤其以蝎虎類變化較多，可能是源於施工後人為擾動環境面積加大，使得適應人為環境的蝎虎開始進駐。歷季監測主要優勢種多為印度蜓蜥、蝎虎類、斯文豪氏攀蜥；保育類物種記錄7種，包括梭德氏草蜥(*T. sauteri*)、龜殼花(*Trimeresurus mucrosquamatus*)、雨傘節(*Bungarus multicinctus*)、環紋赤蛇(*Hemibugnarus macclellandi*)、斯文豪氏游蛇(*Rhabdophis swinhonis*)、錦蛇(*Elaphe taeniura*)及食蛇龜(*Cistoclemmys flavomarginata*)。

水庫集水區歷年同季爬蟲類監測結果，種數以95年第3季最多(20種)；數量亦以95年第3季最多(153隻次)。整體而言，爬蟲類種數沒有太大變化，數量於102年明顯增加後保持平穩。

過去環評監測範圍為湖山水庫計畫區、湖南水庫計畫區與桶頭攔河堰等 3 處，監測時間為 82 年 7 月至 84 年 1 月，共記錄 6 種爬蟲類。監測迄今除了 98 年第 1 季 5 種外，其餘各季種數大多在 6 種以上，皆較環評期間的種數豐富。

(五)蝴蝶類

水庫集水區監測結果，種數介於 44~73 種，以 100 年第 4 季最多(73 種)；數量則介於 338~1,181 隻次，以 101 年第 3 季較多(1,181 隻次)。整體而言，蝴蝶類種數尚屬穩定，而隻數自 102 年第 4 季開始有逐漸減少的趨勢，103 年第 3 季隻數雖有回升，但仍然偏低，可能與 103 年部份測線(如 G3~G6)開始施工，造成植被遭剷除、揚塵，讓蝴蝶類食物來源減少。105 年第 2 季起種數恢復情況良好，數量雖有持續回升，但仍不及 102 年第 4 季之前之數量。主要優勢種多為白粉蝶(*Pieris rapae crucivora*)、緣點白粉蝶(*Pei. canidia*)、藍灰蝶、黃蝶、遷粉蝶。歷季保育類物種僅記錄 1 種，為曙鳳蝶(*Atrophaneura horishana*)。

水庫集水區歷年同季蝴蝶類監測結果，種數以 102 年第 3 季種數最多(68 種)；數量以 101 年第 3 季(1,181 隻次)最多，本季種類及數量均尚在歷年同季波動範圍內，無明顯差異。

2.6.2 引水工程區

因應湖山水庫工程計畫第三次環境影響差異分析報告之變更，故自 100 年第 2 季起新增引水工程沿線之生態環境監測計畫，陸域生態監測範圍為引水工程基地及其周圍外推 500 公尺，以及引水隧道上方兩側 200 公尺範圍內，共計 10 個測站。本計畫陸域動物監測項目包括哺乳類、兩棲類、爬蟲類、鳥類及蝴蝶類，監測頻率為每季 1 次。配合湖山水庫工程計畫第四次環境影響差異分析報告之變更，自 101 年第 2 季起各項動物監測努力量則依據 100 年 7 月最新公告之動物生態評估技術規範，每次監測均進行三重複次數努力量，各項動物監測則以每三日為一次的重複量，共進行三次重複，以三次重複的各物種之最大值呈現。陸域動物監測時間如表 2.6-2 所示，鳥類為每日出後三小時及每次重複量的第 1 日晚上則進行夜間監測，地棲性哺乳類於第 1 天佈籠，之後每日早上巡視鼠籠，蝙蝠類則於夜間監測，兩棲類及爬蟲類為每日早上及每次重複量的第 1 日夜間進行監測，其中夜間監測由於本計畫監測站位較多，考量範圍及時間因素，故以兩組監測人員分別進行監測，蝴蝶類則於早上進行。另外，本計畫執行 107 年第 1 季監測時，發現引水工程區施作「湖山水庫南勢溪上游防淤設施工程」，施工範圍自引水隧道出水口至引水道測站 2 間，其工程影響造成邊坡落差約 1~2m，且河床因施工而整平。直至本季(107 年第三季)，該區仍為裸地狀況。有關引水工程區監測結果說明如下：

一、本季監測成果

(一)種屬組成及數量

1.鳥類

本季鳥類監測結果共記錄 10 目 27 科 47 種 704 隻次，鳥類組成以陸生性鳥種為主。由於監測範圍內包括山澗、溪流等水域環境，因此亦可發現水鳥，共記錄白鷺鷥、小白鷺等。依據台灣野鳥圖鑑(王嘉雄等，1991)、台灣鳥類誌(行政院農業委員會林務局，2010)、台灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會，2017)，除了翠翼鳩為不普遍種外，其餘均為臺灣西部平地至低海拔山區普遍常見物種。

2.哺乳類

本季哺乳類監測結果共記錄到 5 目 7 科 12 種 74 隻次。所記錄的物種中，蝙蝠類均為超音波偵測紀錄；尖鼠科與鼠科為鼠籠捕捉紀錄；臺灣獼猴與赤腹松鼠為目擊紀錄；臺灣鼴鼠為洞穴痕跡；臺灣野兔為排遺紀錄。依據 2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄(邵廣昭等，2008)、台灣的蝙蝠(林良恭，2004)、台灣哺乳動物(祁偉廉，2008)，所紀錄的物種除絨山蝠為稀有有種，其餘皆為臺灣西部平地至低海拔山區普遍常見物種。

3.兩棲類

本季兩棲類監測結果共記錄 5 科 10 種 83 隻次，主要出現於溪流環境、次生林底層、溝渠以及積水容器。依據台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等，2002)、賞蛙圖鑑-台灣蛙類野外觀察指南(第二版)(楊懿如，2002)，除了黑蒙西氏小雨蛙為局部分佈種外，其餘物種皆為臺灣西部常見物種。

4.爬蟲類

本季爬蟲類監測結果共記錄 5 科 13 種 116 隻次，主要出現在小徑草叢邊緣、次生林底層以及林緣。依據台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等，2002)，所記錄的物種除了臺灣草蜥、古氏草蜥、印度蜓蜥、臺灣滑蜥及花浪蛇(*Amphiesma stolatum*)為局部普遍種外，其餘皆為臺灣西部平地至低海拔山區環境常見物種。

5.蝴蝶類

本季蝴蝶類監測結果共記錄 5 科 12 亞科 58 種 282 隻次，主要出現在溪流、草生灌叢、竹林邊緣、次生林以及林緣地帶。

依據台灣蝶圖鑑第一、二、三卷(徐堉峰，2000、2002、2006)、台灣蝶類生態大圖鑑(濱野榮次，1987)，所記錄的物種皆為臺灣西部平地至低海拔山區環境常見物種。

(二)臺灣特有種及特有亞種

本季監測共記錄臺灣特有種 15 種(繡眼畫眉、大彎嘴、小彎嘴、五色鳥、臺灣竹雞、長趾鼠耳蝠、臺灣獼猴、面天樹蛙、莫氏樹蛙、褐樹蛙、盤古蟾蜍、臺灣草蜥、臺灣滑蜥、斯文豪氏攀蜥、長尾麝鳳蝶)，以及 21 種臺灣特有亞種(南亞夜鷹、小雨燕、大冠鷲、鳳頭蒼鷹、黑枕藍鶲、大卷尾、小卷尾、褐頭鷦鶯、頭烏線、山紅頭、樹鵲、白頭翁、白環鸚嘴鵯、紅嘴黑鵯、黃嘴角鴞、領角鴞、金背鳩(*Streptopelia orientalis*)、臺灣野兔、赤腹松鼠、堀川氏棕蝠、臺灣鼴鼠)。

(三)保育類物種

本季監測共記錄 5 種珍貴稀有保育類(臺灣獼猴、大冠鷲、鳳頭蒼鷹、黃嘴角鴞、領角鴞)。(保育等級依據行政院農業委員會中華民國 106 年 3 月 29 日農林務字第 1061700219 號公告)。

(四)優勢種群

本季鳥類監測以小雨燕為優勢鳥種，數量佔總監測隻次的 14.63%；哺乳類因行蹤隱蔽而不易觀察，若以觀察與捕捉紀錄來看，翼手目以東亞家蝠隻次較多，數量佔總監測隻次的 27.03%，地棲型物種則數量相近，沒有明顯優勢種，樹棲型物種則以臺灣獼猴為主，數量佔總監測隻次的 20.27%；小雨蛙、澤蛙及日本樹蛙為本季較優勢的兩棲類，數量佔總監測隻次的 54.31%；爬蟲類以蝎虎為優勢種，數量佔總監測隻次的 25.30%；藍灰蝶為蝴蝶類中數量較為優勢的物種，數量佔總監測隻次的 15.60%。

(五)鳥類之遷徙屬性

本季監測所記錄之 47 種鳥類中，包含夏候鳥 4 種(家燕、北方中杜鵑(*Cuculus optatus*)、小白鷺、黃頭鷺)，以及外來種 5 種(白尾八哥、家八哥、橙頰梅花雀(*Estrilda melpoda*)、白腰鵲鴝、野鴿(*Columba livia*))。由監測紀錄可得知，本區監測範圍內之鳥類主要是以留鳥族群所組成(38 種)。

(六)多樣性與均勻度估算

本季鳥類歧異度指數 H′=3.21，數值偏高，顯示鳥種多樣性相當豐富。均勻度指數 E=0.83，數值屬偏高，顯示此地鳥類物種數分配尚屬均勻。

本季哺乳類歧異度指數 H′=2.06，數值中等，顯示哺乳類多樣性尚屬豐富。由於哺乳類行跡隱蔽，較不易發現，因此有多樣性常偏低。均勻度指數 E= 0.83，數值偏高，顯示在有限的物種數中個體數分配均勻。

本季兩棲類歧異度指數 H′=2.24，數值中等，顯示本區兩棲類尚為豐富。均勻度指數 E=0.87，數值偏高，顯示在有限的物種數中個體數分配均勻。

本季爬蟲類歧異度指數 H′=2.04，數值中等，顯示本區爬蟲類多樣性尚屬豐富。均勻度指數 E=0.89，數值偏高，顯示在有限的物種數中個體數分配均勻。

本季蝴蝶類歧異度指數 H′=3.56，數值偏高，顯示本區蝴蝶類多樣性偏高，物種甚為豐富。均勻度指數 E=0.88，數值偏高，顯示此地蝴蝶類在不同物種間個體數分配尚屬均勻。

二、歷次監測結果

(一)鳥類

歷季鳥類監測種數介於 39~63 種，以 105 年第 1 季最多(63 種)；數量則介於 449~1,229 隻次，以 105 年第 4 季最多(1,229 隻次)。歷季優勢種以白頭翁、繡眼畫眉、麻雀與小雨燕為主。保育類物種共記錄到 18 種，包括鳳頭蒼鷹、松雀鷹、大冠鷲、林鵰、燕鴴、臺灣山鷸鴴、藍腹鷴、領角鴞、黃嘴角鴞、八色鳥、紅尾伯勞、臺灣畫眉(*Garrulax taewanus*)、白尾鴝、鉛色水鶇、灰面鵟鷹、朱鸝、東方蜂鷹及臺灣藍鵲。

歷年同季監測結果，種數以 100 年第 3 季最多(56 種)；數量以 101 年第 3 季最多(996 隻次)。本季數量尚在歷年同季波動範圍內，後續將持續監測。

(二)哺乳類

歷季哺乳類監測結果，種類及數量主要受季節影響，大部分哺乳類於春夏季為繁殖生長季節，所記錄物種較多，秋冬季氣溫較低則轉為蟄伏甚至冬眠，所記錄物種較少。比較本季及歷季監測記錄，種數介於 10~16 種，以 100 年第 2 季

及第 3 季最多(16 種)；數量則介於 38~105 隻次，以 100 年第 3 季最多(105 隻次)。整體而言，哺乳類種數自 100 年第 2 季起有略微減少的趨勢，主要是地棲性物種如鼠科、蝙蝠科等記錄頻率漸少，推測是過往隨引水工程區工程的影響，使得動物遷移至其他干擾較輕的地區。歷季優勢種多以翼手目動物為主，如摺翅蝠、東亞家蝠、長趾鼠耳蝠等。保育類物種共記錄到 4 種，分別為山羌、臺灣獼猴、食蟹獴與白鼻心，屬於次生林及溪流環境常見哺乳類。

歷年同季監測結果，種數以 100 年第 3 季最多(16 種)；數量亦以 100 年第 3 季最多(105 隻次)。本季的物種數及數量均於歷季波動範圍內，目前工程均已施工完畢，但物種及數量尚未回復，另外，107 年第 1 季監測時於引水工程區測站 1、2 有記錄明顯的人為整地，造成動物稍遠離，將持續監測。

(三)兩棲類

歷季兩棲類監測結果，種數介於 10~14 種，以 100 年第 4 季、105 年第 2 季及 106 年第 2 季較多(14 種)；數量則介於 65~295 隻次，以 100 年第 4 季較多(295 隻次)。整體而言，種數大致保持平穩，數量自 102 年第 4 季開始有減少趨勢。推測自從幽情谷於 103 年第 1 季開始剷除植被，溪澗因工程便道而受移動、污染，以致許多兩棲類棲地受干擾。

歷年同季種數以 103、104、106、107 年第 3 季最多(13 種)；數量以 100 年第 3 季最多(287 隻次)，歷年同季數量有逐漸下降趨勢，除番婆夾坑溪於過往曾有較大變動，且並無明顯恢復外，近期可能因 107 年第 1 季於引水工程區測站 1、2 有明顯的人為整地，本區域測站多屬水量不穩區域，尤其番婆夾坑溪除豐水期有少量水流外，其餘季次多為乾涸，因土石不穩常有波動造成兩棲類較不適應，應與環境擾動後，適宜的棲地仍少有關。

(四)爬蟲類

歷季爬蟲類監測結果，種數介於 7~14 種，以 100 年第 3 季較多(14 種)；數量則介於 33~121 隻次，以 100 年第 3 季較多(121 隻次)。整體而言，引水工程區種數有減少趨勢，可能與長期施工及施工面積增大關，本季工程已完工，種數有逐漸回升之趨勢；隻次則隨季節有所波動，通常春夏季較多。歷季優勢種以蝎虎為主。保育類物種共記錄 3 種，分別為龜殼花、錦蛇和雨傘節。

歷年同季監測結果，種數以100年第3季(14種)最多；數量亦以100年第3季最多(121隻次)，歷年同季數量略有下降，可能因107年第1季監測時於引水工程區測站1、2有記錄明顯的人為整地，測站3土石不穩常有波動造成爬蟲類較不適應，推估應與環境擾動後，造成適宜的棲地減少有關。

(五)蝴蝶類

歷季蝴蝶類監測結果，種數介於36~61種，以106年第3季最多(61種)；數量則介於169~556隻次，以100年第3季最多(556隻次)。整體而言，蝴蝶類種數尚屬穩定，而數量逐漸下降，推測可能與引水工程區工程範圍日益擴大，裸地比例增加，使得蝴蝶類的蜜源及食草來源減少，工程雖已完工，但目前尚未回復。歷季優勢種以白粉、緣點白粉蝶、遷粉蝶、豆環蛺蝶、藍灰蝶為主。保育類物種無記錄。

歷年同季監測結果，種數以106年第3季最多(61種)，數量以100年第3季最多(556隻次)。歷年同季數量有逐漸下降趨勢，本季物種數與數量均於歷季波動範圍內，但物種數與數量中等偏低，可能因107年第1季監測時於引水工程區測站1、2的人為整地尚未恢復有關，另外，引水工程區測站3則因土石較不穩常有變動，河床上植物生長不良，造成蝴蝶類較少接近活動。

2.6.3 自然生態保留及復育區

本季陸域生物各物種名錄詳見附錄三，而各物種歷次監測結果比較如附錄四及內文圖2.6-23～圖2.6-27所示；歷年同季監測結果比較如附錄四及內文圖2.6-28～圖2.6-32所示；相關監測結果比對分析說明如下：

一、本季監測成果

(一)種屬組成及數量

1.鳥類

本季於自然生態保留及復育區共記錄鳥類11目28科44種934隻次，其中小環頸鴴及小白鷺屬水鳥。所紀錄的物種除白腰鵲鴝(外來種)、翠翼鳩為不普遍物種外，其餘均為臺灣西部平地至低海拔山區普遍常見物種。

2.哺乳類

本季於自然生態保留及復育區共記錄哺乳類 6 目 8 科 14 種 62 隻次。所記錄之物種除了臺灣野豬、長尾鼠耳蝠較不普遍，絨山蝠為罕見種外，其餘為臺灣西部平地至山區常見普遍物種。

3.兩棲類

本季於自然生態保留及復育區共記錄兩棲類 5 科 12 種 122 隻次。除了黑蒙西氏小雨蛙為局部分布種外，其餘物種皆為臺灣西部常見物種。

4.爬蟲類

本季於自然生態保留及復育區共記錄爬蟲類 5 科 11 種 37 隻次。除了蓬萊草蜥、臺灣草蜥、古氏草蜥、印度蜓蜥為局部普遍種外，其餘皆為臺灣西部平地至山地普遍常見物種。

5.蝴蝶類

本季於自然生態保留及復育區共記錄蝴蝶類 5 科 12 亞科 60 種 326 隻次，除臺灣鳳蝶為局部普遍種外，其餘蝶類皆為臺灣西部平地至低海拔山區環境常見物種。

(二)臺灣特有種及特有亞種

本季監測於自然生態保留及復育區共記錄 16 種特有種(長趾鼠耳蝠、臺灣獼猴、大彎嘴、小彎嘴、繡眼畫眉、五色鳥、臺灣竹雞、梭德氏赤蛙、面天樹蛙、褐樹蛙、盤古蟾蜍、蓬萊草蜥、臺灣草蜥、斯文豪氏攀蜥、臺灣鳳蝶、寶島波眼蝶)，以及 23 種特有亞種(南亞夜鷹、小雨燕、大冠鷲、紅嘴黑鵯、白頭翁、白環鸚嘴鵯、山紅頭、粉紅鸚嘴、黑枕藍鶲、小卷尾、大卷尾、樹鵲、斑紋鷦鶯、褐頭鷦鶯、頭烏線、領角鴞、黃嘴角鴞、臺灣野兔、臺灣鼷鼠、臺灣野豬、堀川氏棕蝠、赤腹松鼠、長尾麝鳳蝶)。

(三)保育類物種

本季監測共記錄 4 種珍貴稀有保育類(臺灣獼猴、大冠鷲、領角鴞、黃嘴角鴞)。(保育等級依據行政院農業委員會中華民國 106 年 3 月 29 日農林務字第 1061700219 號公告)。

(四)優勢種群

本季監測於自然生態保留及復育區記錄物種中，鳥類以赤腰燕最優勢，佔自然生態保留及復育區鳥類記錄總隻次的13.60%；哺乳類因行蹤隱蔽而不易觀察，若以觀察與捕捉紀錄來看，翼手目以山家蝠較為優勢，佔本季監測總隻次的12.90%。樹棲性哺乳類以臺灣獼猴最為優勢，佔本季監測總隻次的19.35%。地棲性哺乳動物數量均小於5隻次，無明顯優勢種；兩棲類以日本樹蛙較為優勢，佔本季監測總隻次的21.31%；爬蟲類以斯文豪氏攀蜥較為優勢，佔本季監測總隻次的21.62%；蝴蝶類以藍灰蝶較多，佔監測總隻次的11.96%。

(五)鳥類之遷徙屬性

本季監測所記錄的44種鳥類中，其中包含1種冬候鳥(小環頸鴴)、3種夏候鳥(家燕、鷹鴴、小白鷺)、3種外來種(白腰鵲鴝、白尾八哥、家八哥)。由監測紀錄可得知，本區監測範圍內之鳥類主要是以留鳥族群(37種)所組成。

二、歷次監測結果

(一)鳥類

歷季鳥類種數介於22~56種之間，以104年第2季出現之種數最多(56種)；數量則介於119~1,156隻次之間，以105年第1季之數量最多(1,156隻次)。整體而言，鳥類種數有緩慢增加之趨勢；隻次自100年第2季開始增加，隨後除了102年第4季可能受到102年8月27~29日的康芮颱風及9月19~22日的天兔颱風來襲，以及104年第3季可能受到104年8月6~9的蘇德勒颱風及104年8月20~23的天鵝颱風影響，使得食物來源無法馬上回復，造成鳥類族群往其他地區遊蕩遷移，使數量相對較少，其餘季次大致保持平穩。整體以留鳥居多，歷季優勢物種多為白頭翁、繡眼畫眉。保育類物種共記錄12種，包括東方蜂鷹、大冠鷲、藍腹鷴、赤腹鷹、松雀鷹、鳳頭蒼鷹、領角鴞、黃嘴角鴞、八色鳥、白尾鴝、朱鸝及紅尾伯勞。

歷年同季監測結果，種數以106年第3季最多(47種)；隻次以107年第3季最多(934隻次)。整體來看，物種數及數量有逐漸增加趨勢，應與環境較穩定，較適宜鳥類活動有關。另外，本季以赤腰燕為主要優勢物種，不排除因氣溫高且近期降雨及濕度較高，於N樣線有較多小型昆蟲集中，使赤腰燕及洋燕數量均增加。

(二)哺乳類

歷季哺乳類監測紀錄，種數介於 2~14 種，以 107 年第 2、3 季最多(14 種)；數量則介於 7~62 隻次，以 107 年第 3 季最多(62 隻次)。哺乳類種數及數量於 100 年開始有增加趨勢，主要係因本團隊於 100 年度採用最新蝙蝠偵測器(Anabat SD1 系統)，故可偵測到較多蝙蝠種類及數量。歷季優勢物種多以臺灣獼猴為主。保育類物種共記錄 3 種，分別為臺灣獼猴、白鼻心及食蟹獴。

歷年同季監測結果，種數以 107 年第 3 季最多(14 種)；數量以 107 年第 3 季最多(62 隻次)。本季物種數及數量為歷年同季最高，紀錄較多隱蔽性較高之物種(臺灣野豬、長尾鼠耳蝠、絨山蝠)及臺灣獼猴數量較多所致。

(三)兩棲類

歷季兩棲類之種數介於 4~14 種之間，以 104 年第 4 季及 106 年第 3 季出現之種數最多(14 種)；數量則介於 18~199 隻次之間，以 101 年第 3 季之數量最多(199 隻次)。整體而言，歷季種數自 99 年第 1 季開始有逐漸增加趨勢。數量自 99~101 年主要受季節影響，如春夏季溫度高，記錄之物種數較多；自 102 年開始，兩棲類數量波動小，但仍以春、夏季數量較多。各季優勢種仍有部分差異，主要記錄較多之物種包括黑眶蟾蜍、小雨蛙、拉都希氏赤蛙、日本樹蛙等。保育類自 97 年第 3 季後就無記錄，主要因 98 年 3 月保育類名錄變更，本區目前所記錄之保育蛙類皆從名錄中除名，修正為一般物種。

歷年同季監測結果，物種數以 106 年第 3 季最高(14 種)；數量以 101 年第 3 季最多(199 隻次)。本季物種數及數量均在歷年同季波動範圍內，差異不大。

(四)爬蟲類

歷季爬蟲類種數介於 5~12 種之間，以 106 年第 2 季出現之種數最多(12 種)；數量則介於 8~74 隻次之間，以 102 年第 3 季之數量最多(74 隻次)。整體而言，種數並沒有明顯變化；而 99 年第 1 季~102 年第 2 季數量多落於 20~30 隻次之間，102 年第 3 季開始增加，隨後保持平穩。主要優勢種多為壁虎科、斯文豪氏攀蜥、印度蜓蜥。保育類物種共記錄 4 種，包括梭德氏草蜥、龜殼花、雨傘節及食蛇龜。

歷年同季監測結果，物種數以 107 年第 3 季最多(11 種)；數量以 102 年第 3 季最多(74 隻次)。本季物種數為歷年同季最高，檢視資料發現本季記錄較多正蜥科物種及蛇類。

(五)蝴蝶類

歷季蝴蝶類種數介於 30~66 種之間，以 106 年第 3 季出現之種數最多(66 種)；數量則介於 145~458 隻次之間，以 102 年第 3 季之數量最多(458 隻次)。整體而言，蝴蝶類的物種數及數量尚屬穩定，波動變化以春、夏季較高。主要優勢種多為白粉蝶、緣點白粉蝶、藍灰蝶、黃蝶、遷粉蝶。歷季保育類物種僅記錄 1 種，為曙鳳蝶。

歷年同季監測結果，種數以 106 年第 3 季最多(66 種)；數量以 102 年第 3 季最多(458 隻次)。本季物種數及數量均在歷年同季波動範圍內，差異不大。

表 2.6-1　本季水庫集水區陸域動物監測時間一覽表

時段	第一天 7/2			第二天 7/3			第三天 7/4			第四天 7/5			第五天 7/6		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1.陸域生物	(1)水庫集水區														
動物樣線 B	鳥、蝶、兩、爬	哺	蝙、鳥、兩、爬		哺					鳥、蝶、兩、爬	哺	蝙、鳥、兩、爬		哺	
動物樣線 R	鳥、蝶、兩、爬	哺	蝙、鳥、兩、爬		哺					鳥、蝶、兩、爬	哺	蝙、鳥、兩、爬		哺	
動物樣線 Q				鳥、蝶、兩、爬	哺	蝙、鳥、兩、爬		哺					鳥、蝶、兩、爬		蝙、鳥、兩、爬
動物樣線 G				鳥、蝶、兩、爬	哺	蝙、鳥、兩、爬		哺					鳥、蝶、兩、爬		蝙、鳥、兩、爬
動物樣線 M				鳥、蝶、兩、爬	哺	蝙、鳥、兩、爬		哺					鳥、蝶、兩、爬		蝙、鳥、兩、爬
動物樣線 N		哺				蝙、鳥、兩、爬	鳥、蝶、兩、爬	哺			哺			哺	蝙、鳥、兩、爬
動物樣線 P		哺	蝙、鳥、兩、爬				鳥、蝶、兩、爬	哺			哺	蝙、鳥、兩、爬		哺	

時段	第六天 7/9			第七天 7/10			第八天 7/11			第九天 7/12			第十天 7/13		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1.陸域生物	(1)水庫集水區														
動物樣線 B				鳥、蝶、兩、爬	哺	蝙、鳥、兩、爬		哺							
動物樣線 R				鳥、蝶、兩、爬	哺	蝙、鳥、兩、爬		哺							
動物樣線 Q		哺			哺		鳥、蝶、兩、爬		蝙、鳥、兩、爬		哺			哺	
動物樣線 G		哺			哺		鳥、蝶、兩、爬		蝙、鳥、兩、爬		哺			哺	
動物樣線 M		哺			哺		鳥、蝶、兩、爬		蝙、鳥、兩、爬		哺			哺	
動物樣線 N	鳥、蝶、兩、爬							哺	蝙、鳥、兩、爬	鳥、蝶、兩、爬				哺	
動物樣線 P	鳥、蝶、兩、爬					蝙、鳥、兩、爬		哺		鳥、蝶、兩、爬				哺	

表 2.6-2　本季引水道區陸域動物監測時間一覽表

時段	第一天 7/2			第二天 7/3			第三天 7/4			第四天 7/5			第五天 7/6		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
	(2)引水道區														
動物樣站 1~5	鳥、蝶、兩、爬	哺	蝙、鳥、兩、爬		哺		鳥、蝶、兩、爬	哺	蝙、鳥、兩、爬		哺		鳥、蝶、兩、爬		蝙、鳥、兩、爬
動物樣站 6~10		哺		鳥、蝶、兩、爬	哺	蝙、鳥、兩、爬		哺		鳥、蝶、兩、爬	哺	蝙、鳥、兩、爬			
	第六天 7/9			第七天			第八天			第九天			第十天		
動物樣站 1~5															
動物樣站 6~10	鳥、蝶、兩、爬		蝙、鳥、兩、爬												

註 1.A：日出後 3 小時內(夏 6~9 時，冬 7~10 時)；B：13~16 時(此時段主要進行哺乳類佈籠及巡籠行程)；C：日落後(夏 19~21 時，冬 18~20 時)，且安排兩組人力同時進行監測。

註 2.第二天之後行程，除了持續巡籠(哺乳類)為主要監測項目外，配合其他類別之監測進行補充。

表 2.6-3　水庫集水區陸域動物測線及測站變更位置後之分析比較表

測線(變更前)	變更說明	周邊環境差異		物種差異(優勢物種)	
		變更前	變更後	變更前	變更後
B	測站 B1、B2 位置挪動	林緣及草生地過渡帶	樹林環境	洋燕、白頭翁、紅嘴黑鵯、綠繡眼、台灣野兔	繡眼畫眉、洋燕、白頭翁、紅嘴黑鵯、台灣野兔、台灣獼猴
R(C)	2 處測站均變更	無人擾動的樹林	少人擾動的樹林間的農用小徑	紅嘴黑鵯、繡眼畫眉	紅嘴黑鵯、繡眼畫眉、洋燕
Q(D)	測站位置全部變更	幽情谷的溪谷	大壩邊的樹林環境	白頭翁、洋燕、麻雀、台灣野豬、台灣鼴鼠	白頭翁、洋燕、麻雀、赤腰燕、台灣野豬
G	3 個測站挪動位移 50~100 公尺	人為擾動的草生灌叢	維修道路，上坡處為樹林，下坡處為草生灌叢	繡眼畫眉、褐頭鷦鶯、白頭翁	繡眼畫眉、白頭翁、綠繡眼、台灣獼猴
M	無變更	無變更	無變更	-	-
N	無變更	無變更	無變更	-	-
P(O)	2 處測站均變更	溪谷及其旁的林緣	溪谷旁均為樹林	綠繡眼、褐頭鷦鶯、白頭翁	繡眼畫眉、綠繡眼

註：因 105 年 5 月湖山水庫進入試營運期間蓄水，過往監測測站及路線均受蓄水影響，無法抵達或已沒入水中，故 105 年 7 月起進行調整。

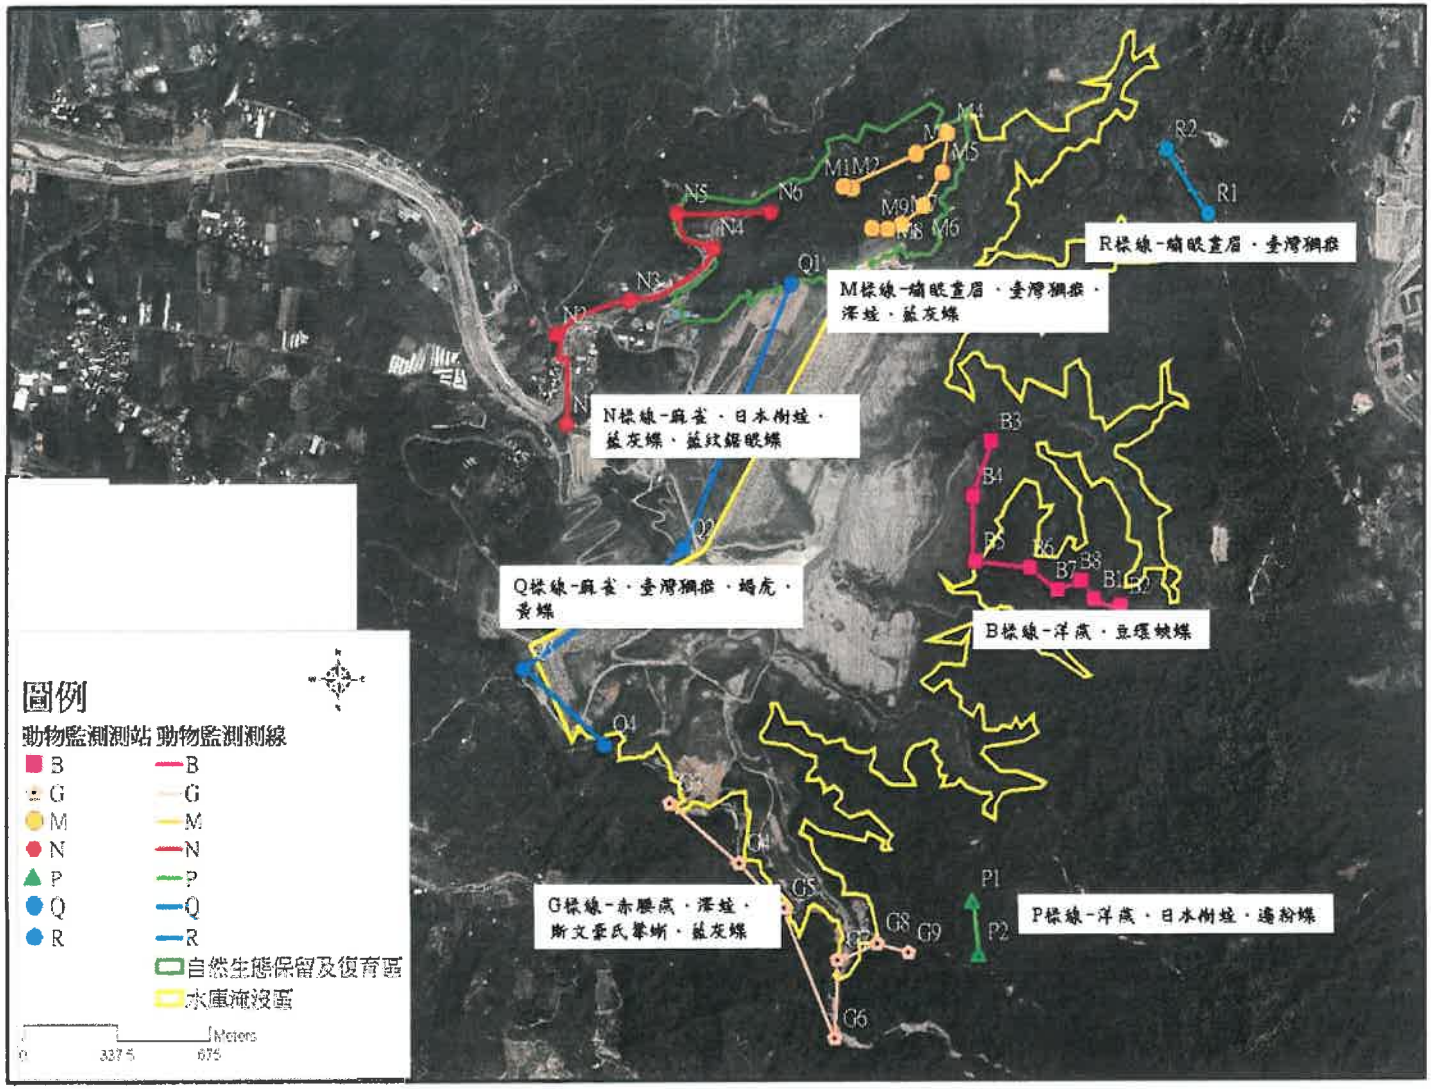

圖 2.6-1　水庫集水區優勢物種圖

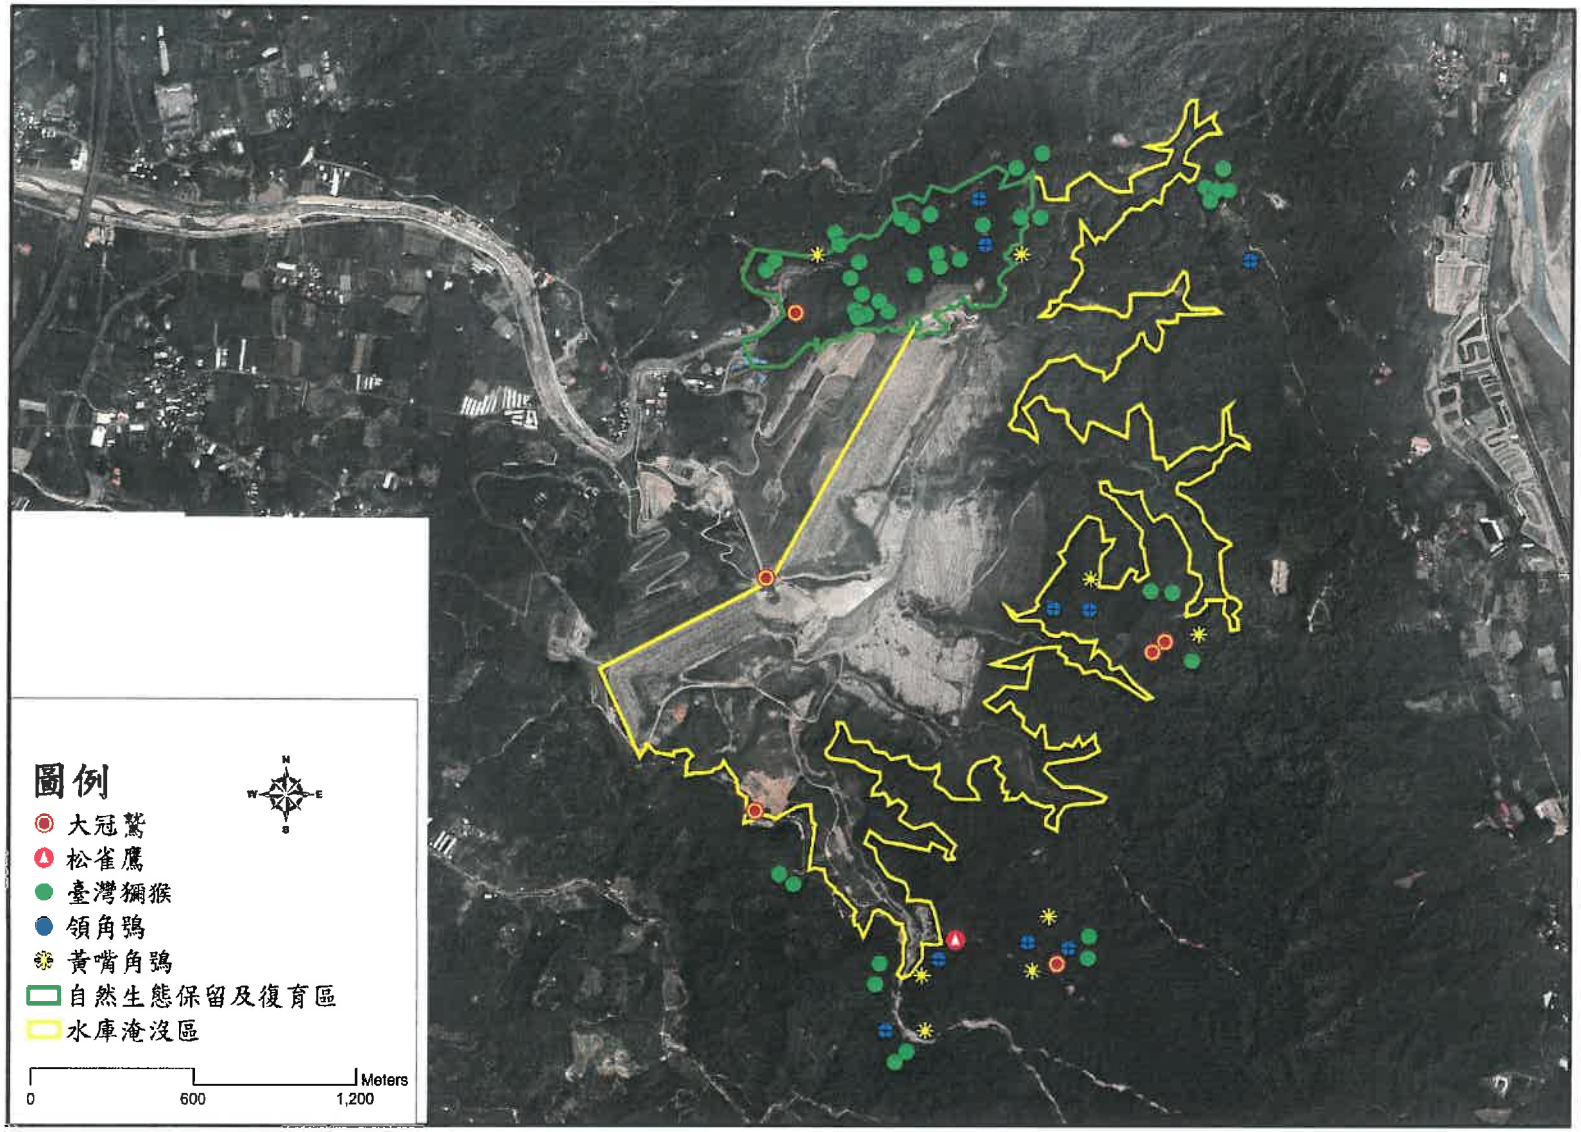

圖 2.6-2　水庫集水區與自然生態保留及復育區陸域動物保育類分布圖

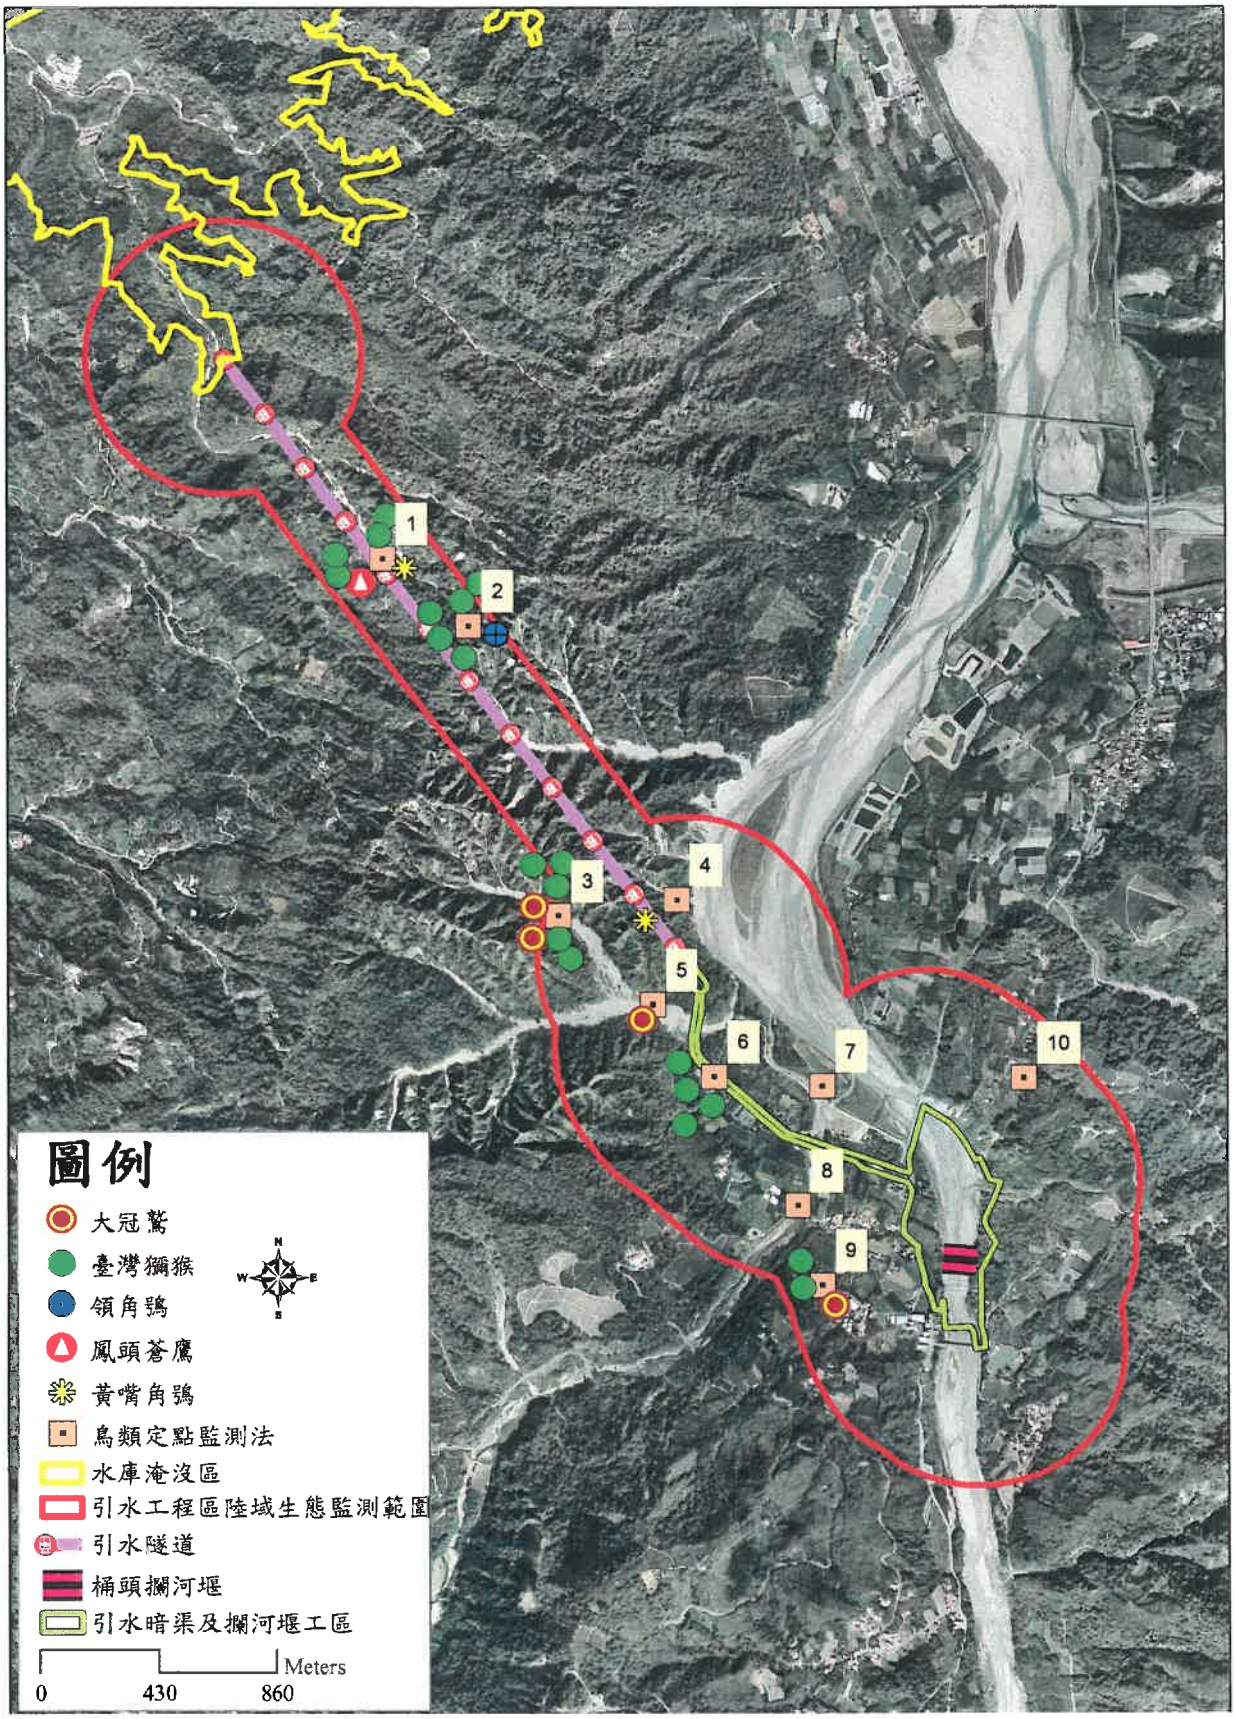

圖 2.6-3　引水工程區陸域動物保育類分布圖

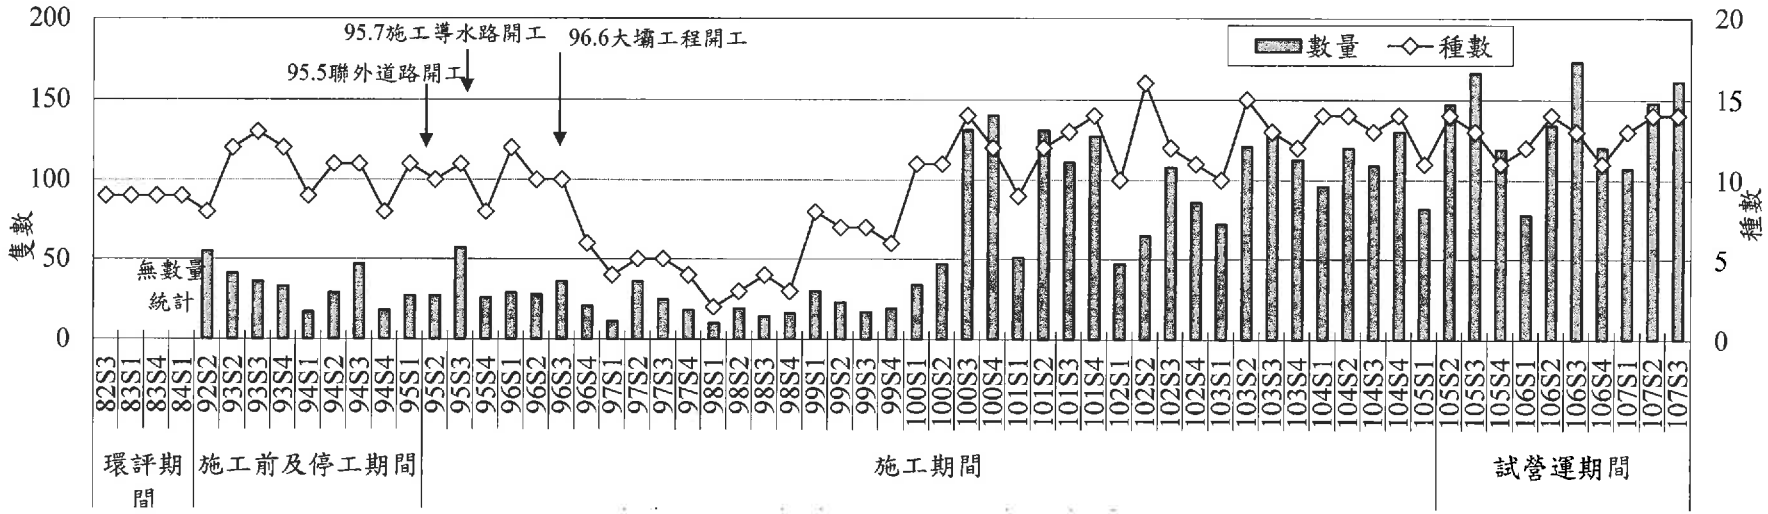

圖 2.6-4　水庫集水區歷年哺乳類監測種數及數量比較分析圖

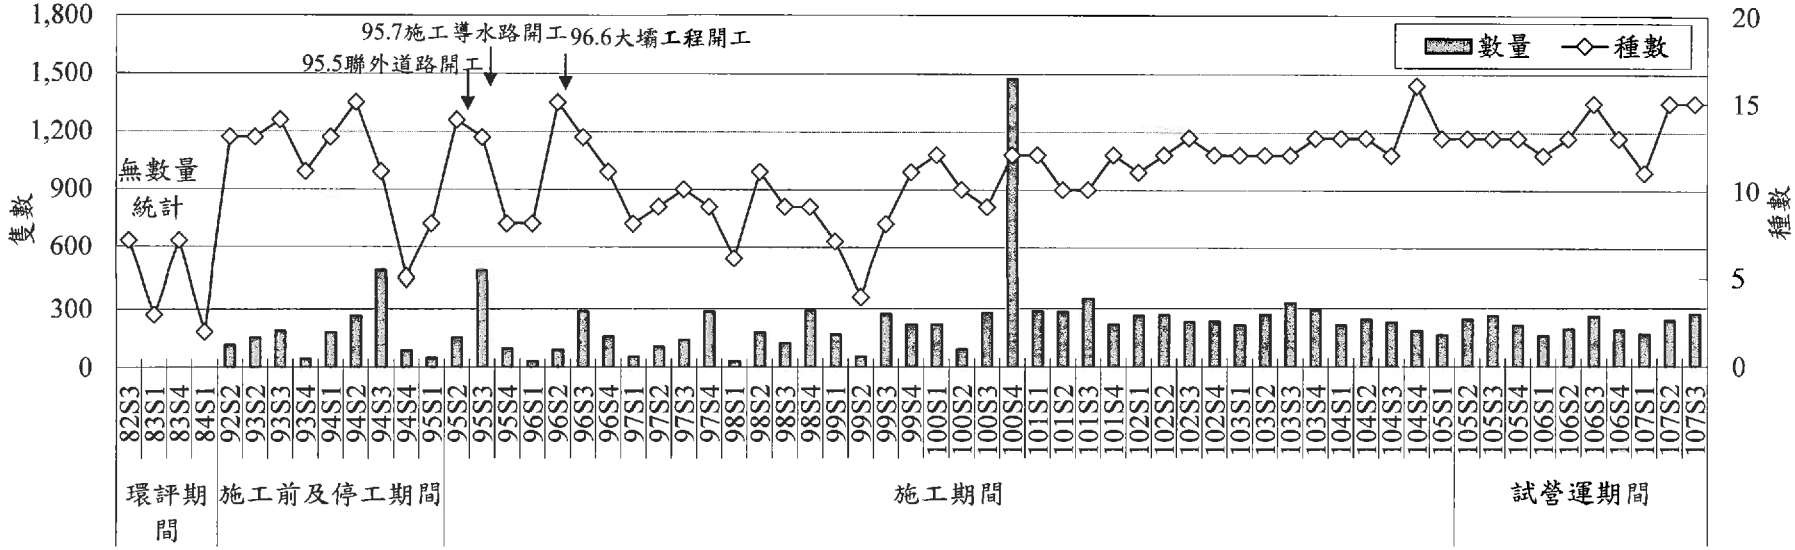

圖 2.6-5　水庫集水區歷年兩棲類監測種數及數量比較分析圖

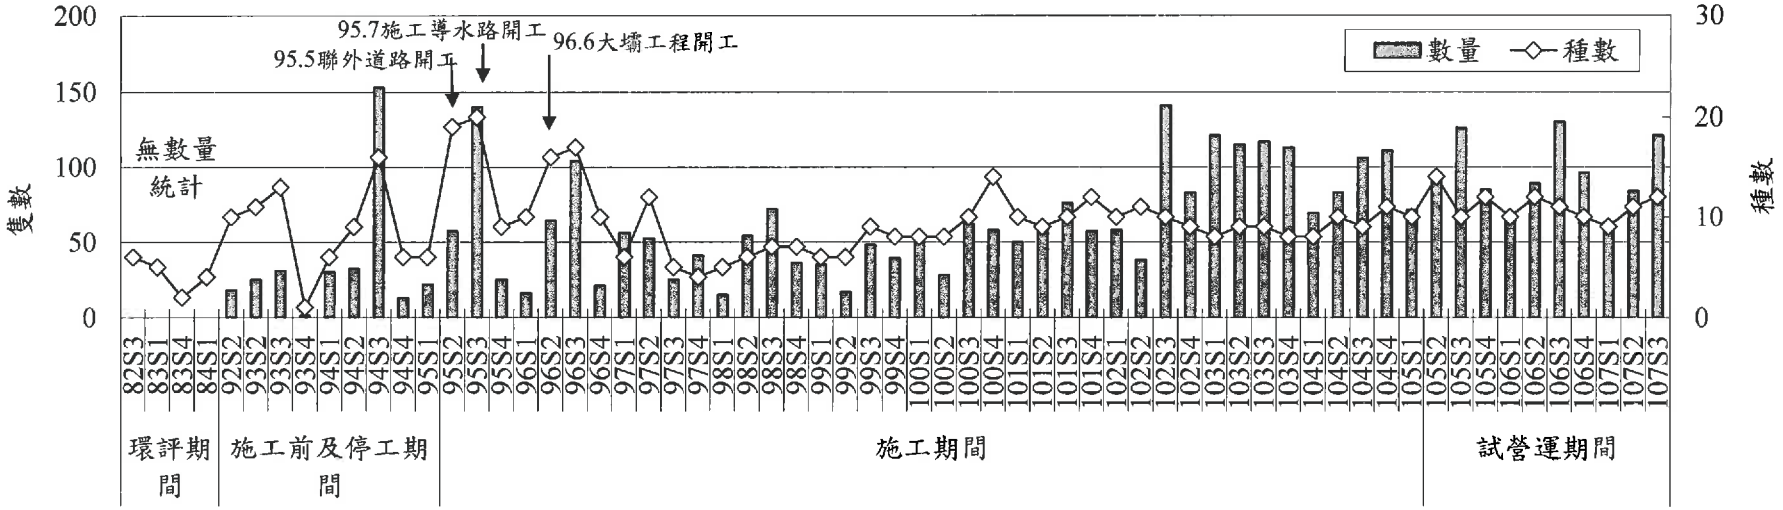

圖 2.6-6　水庫集水區歷年爬蟲類監測種數及數量比較分析圖

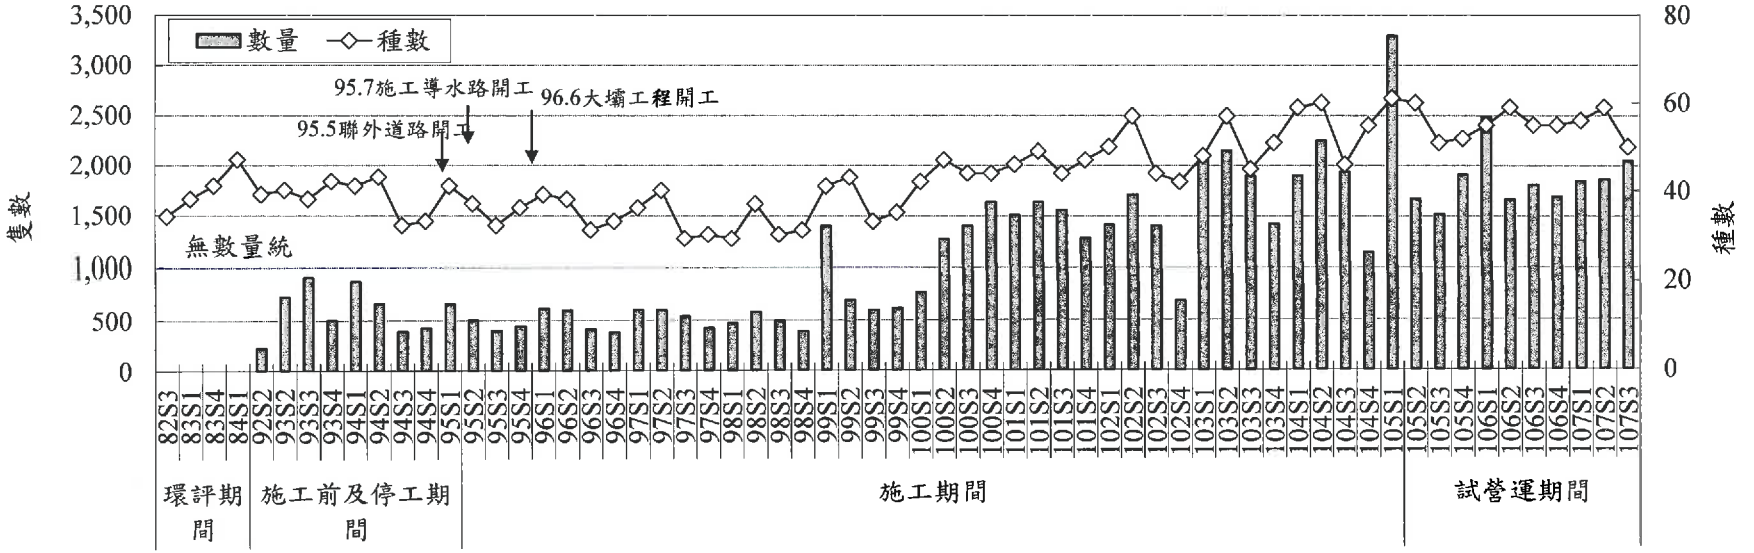

圖 2.6-7　水庫集水區歷年鳥類監測種數及數量比較分析圖

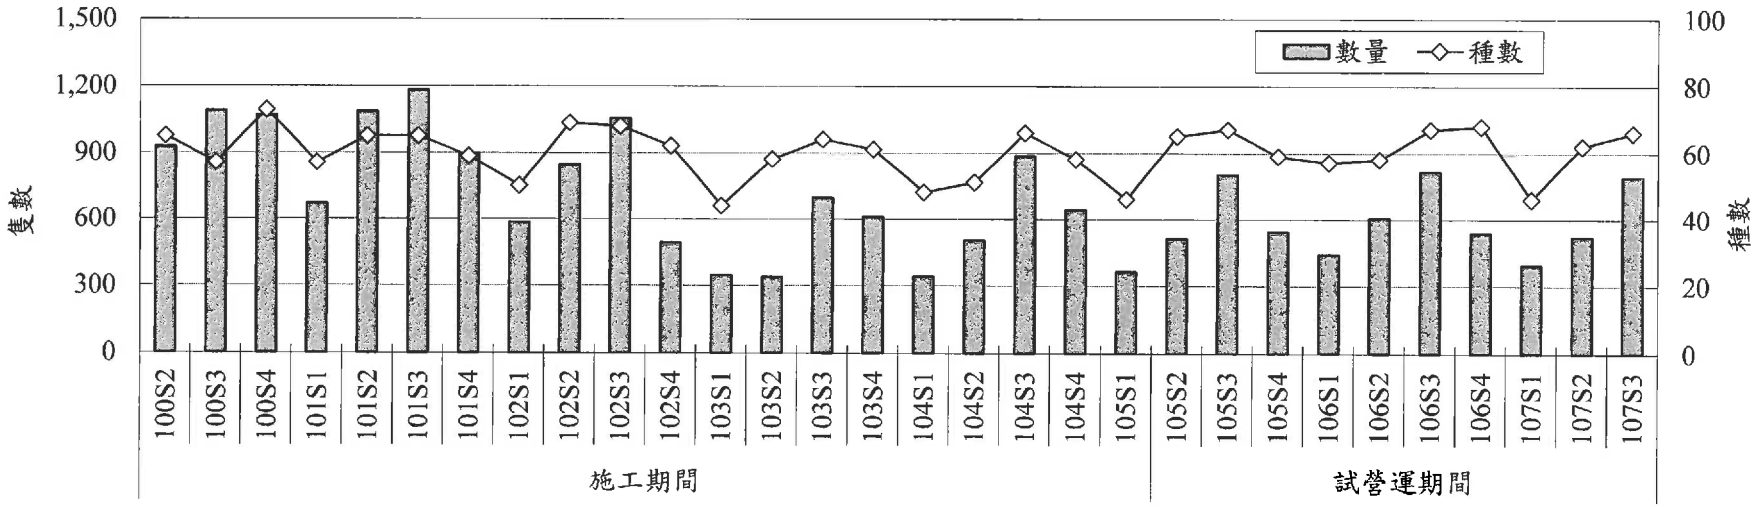

圖 2.6-8　水庫集水區歷年蝴蝶類監測種數及數量比較分析圖

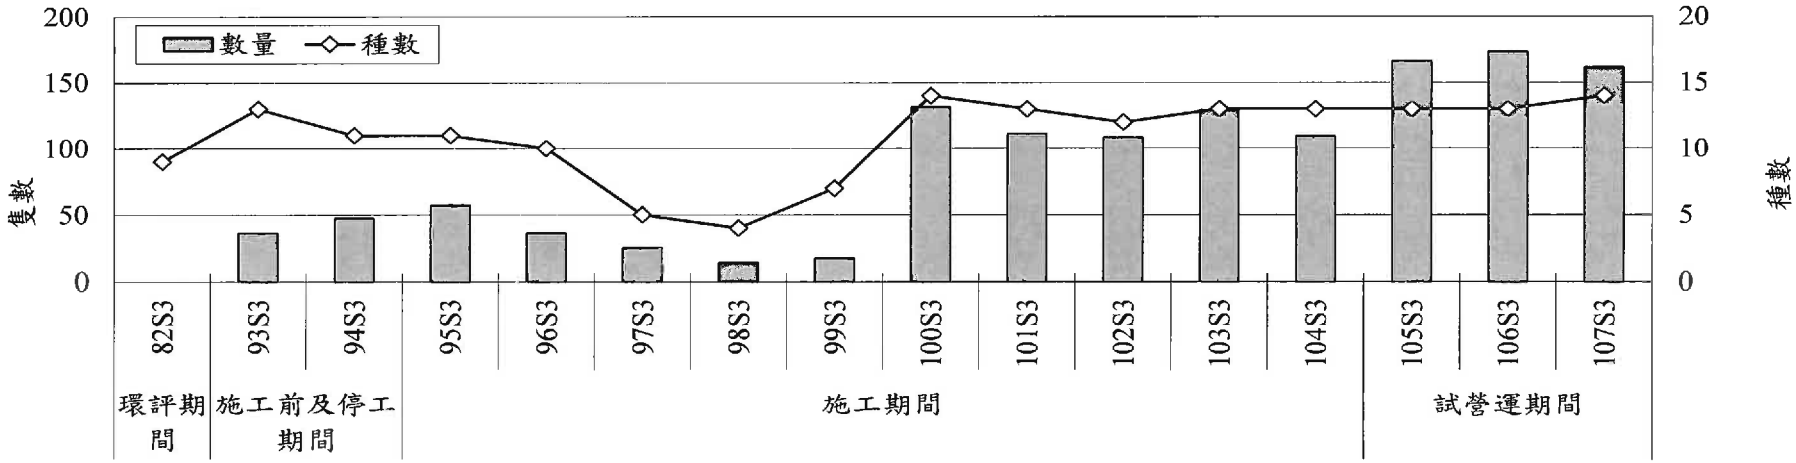

圖 2.6-9　水庫集水區歷年同季哺乳類監測種數及數量比較分析圖

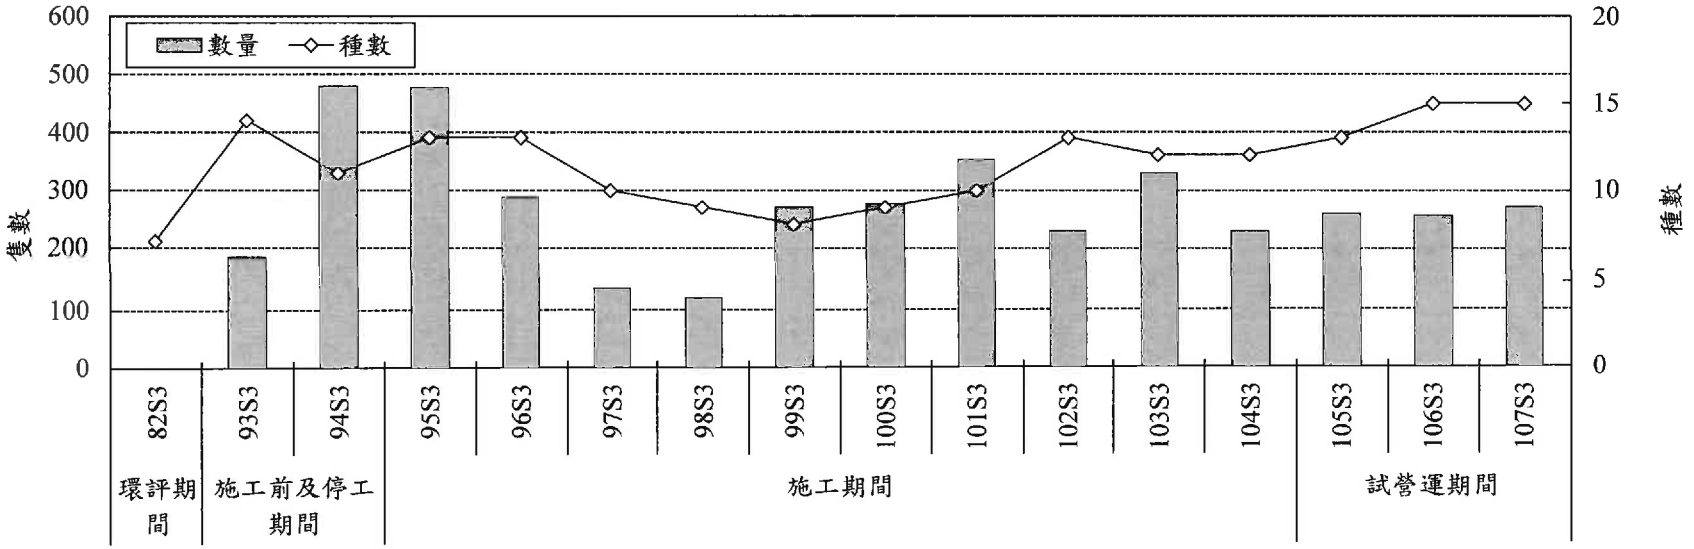

圖 2.6-10　水庫集水區歷年同季兩棲類監測種數及數量比較分析圖

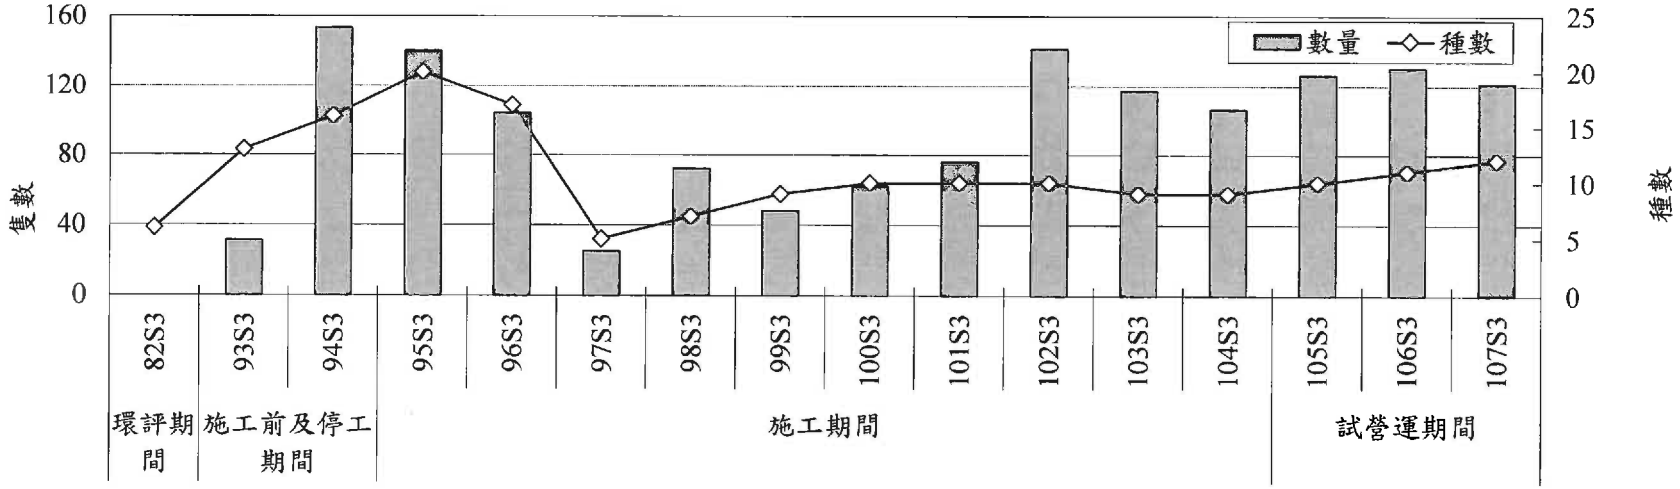

圖 2.6-11　水庫集水區歷年同季爬蟲類監測種數及數量比較分析圖

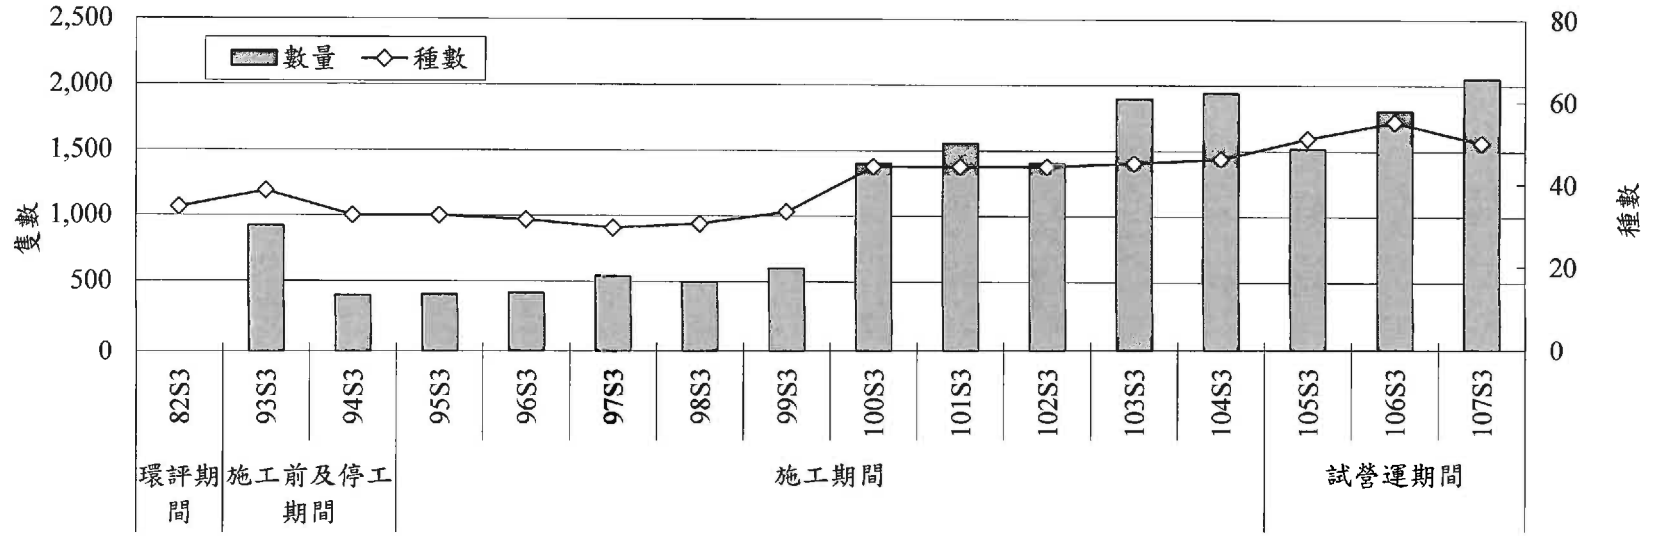

圖 2.6-12　水庫集水區歷年同季鳥類監測種數及數量比較分析圖

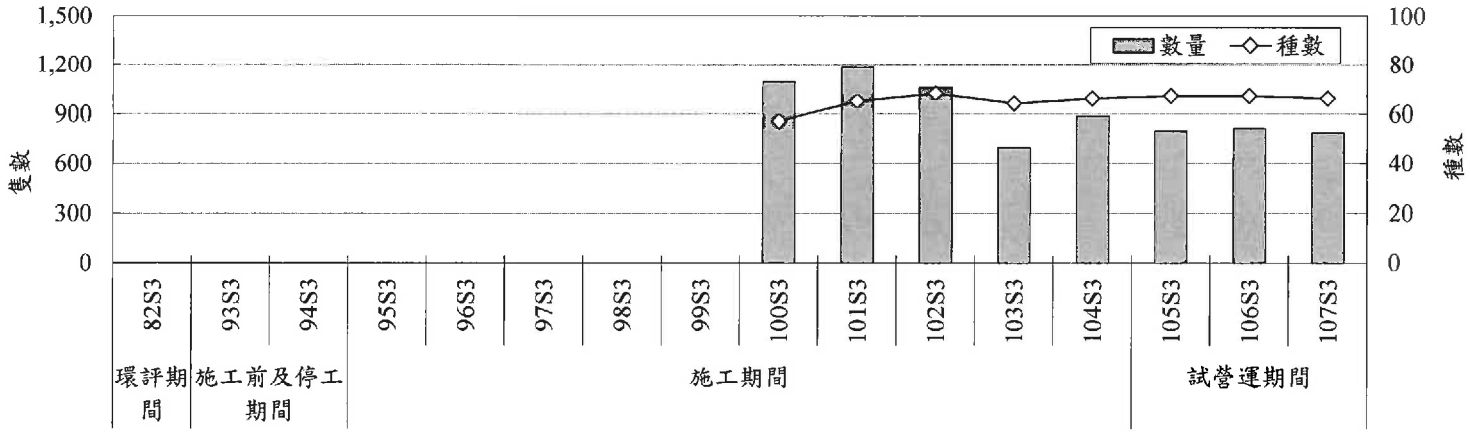

圖 2.6-13　水庫集水區歷年同季蝴蝶類監測種數及數量比較分析圖

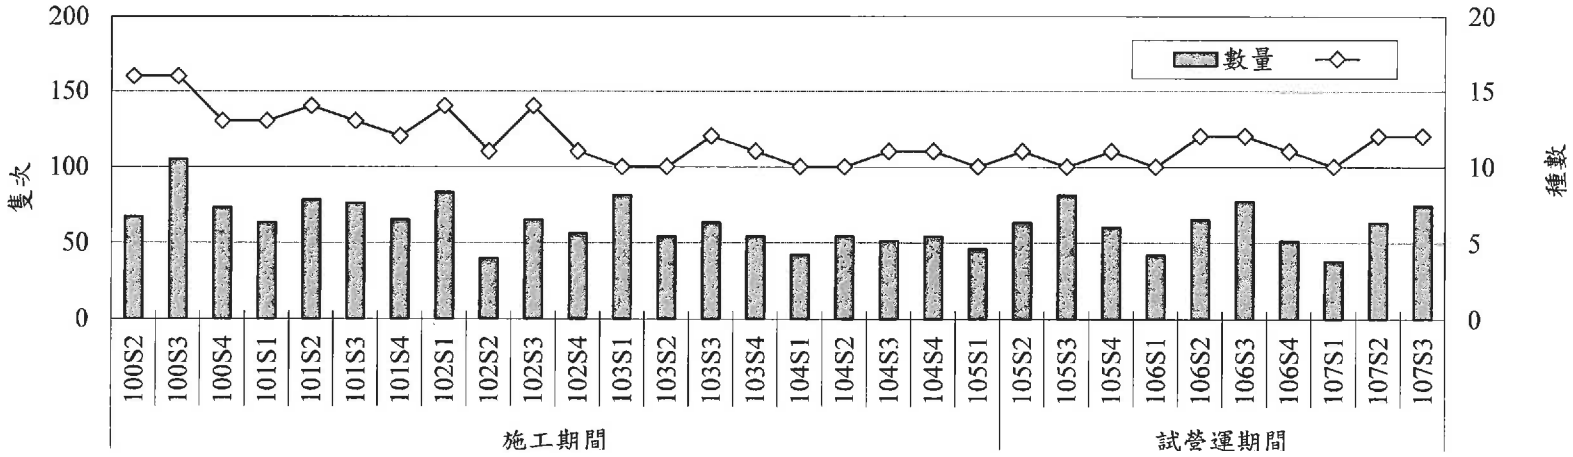

圖 2.6-14　引水工程區歷年哺乳類監測種數及數量比較分析圖

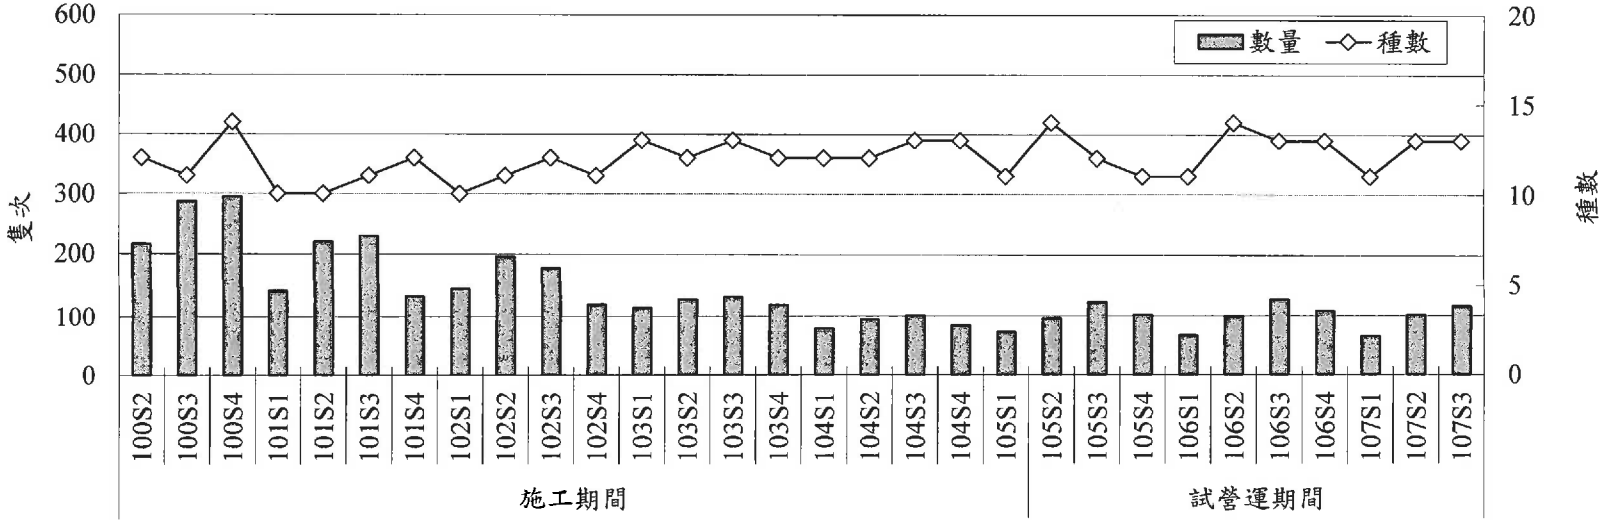

圖 2.6-15　引水工程區歷年兩棲類監測種數及數量比較分析圖

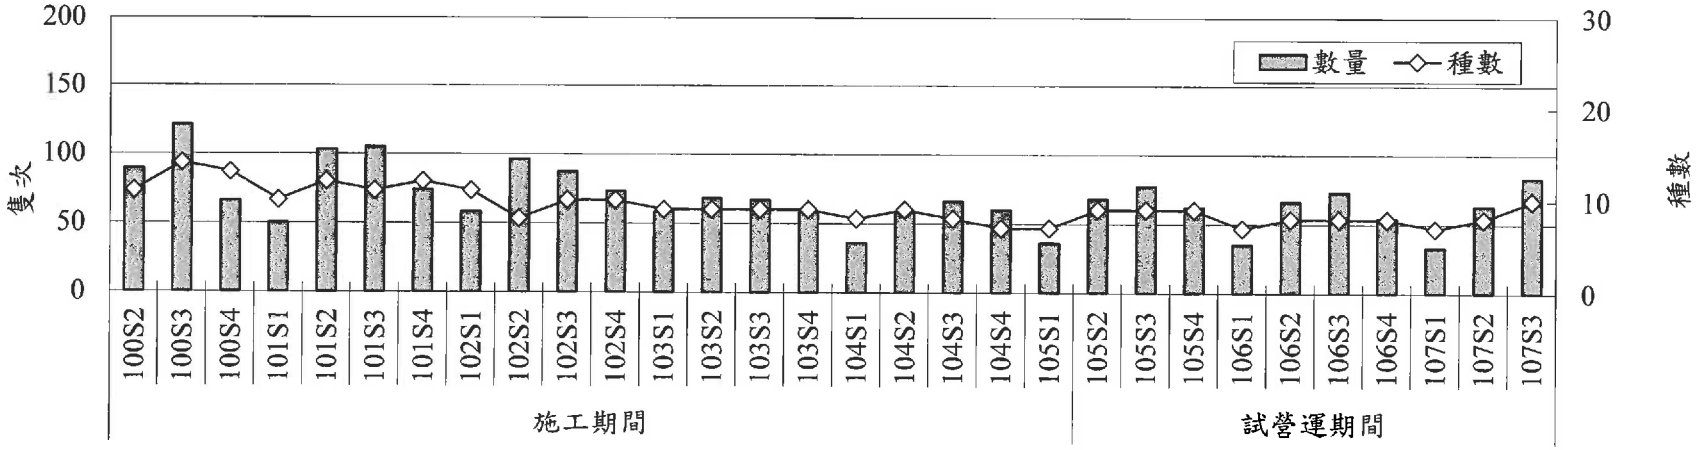

圖 2.6-16　水工程區歷年爬蟲類監測種數及數量比較分析圖

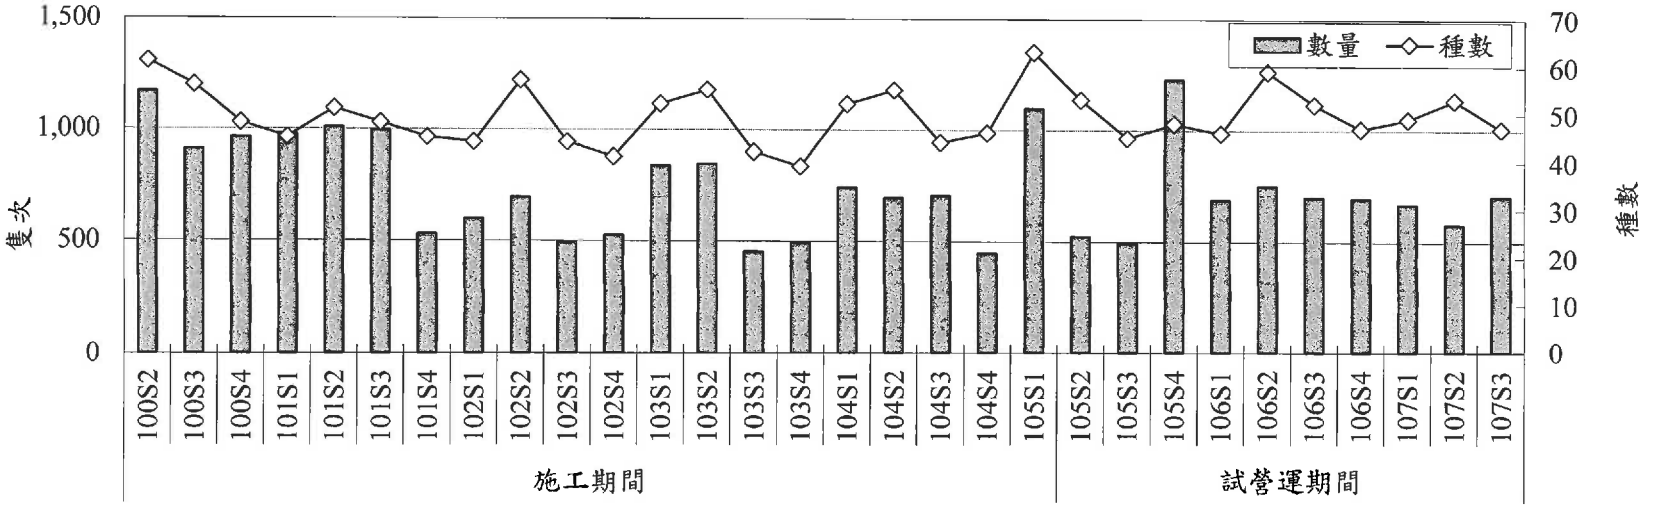

圖 2.6-17　引水工程區歷年鳥類監測種數及數量比較分析圖

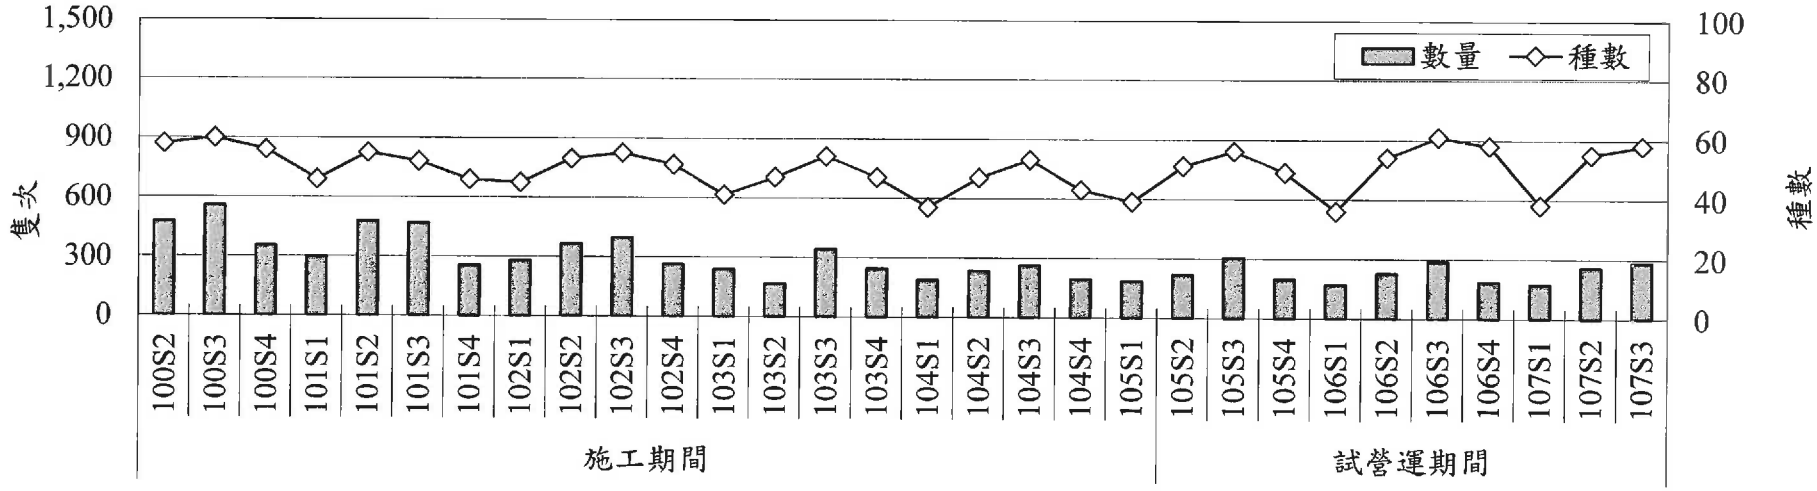

圖 2.6-18　引水工程區歷年蝴蝶類監測種數及數量比較分析圖

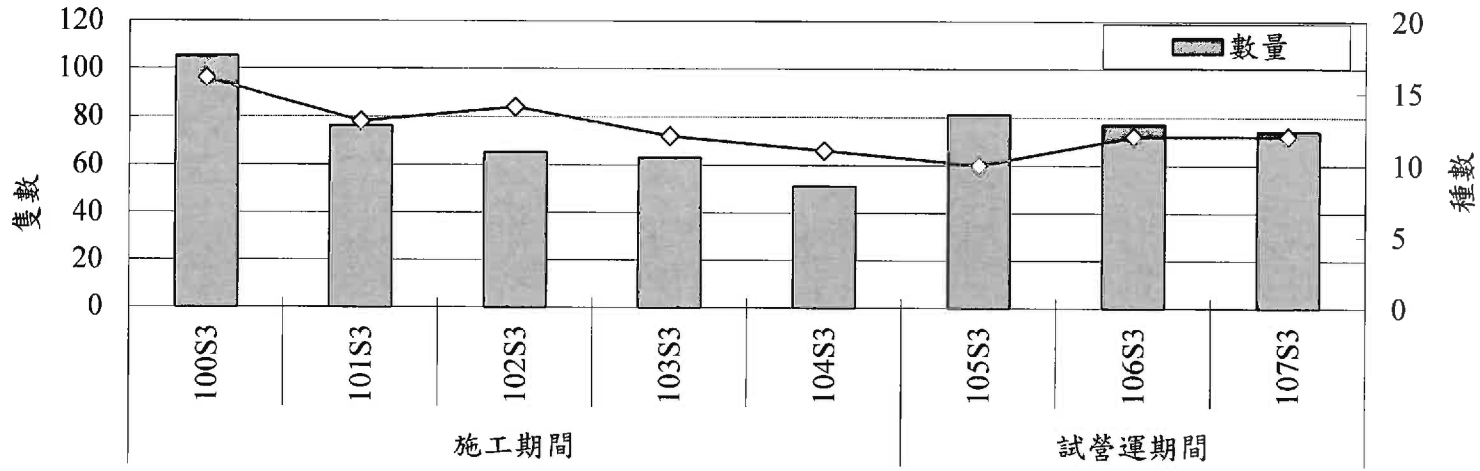

圖 2.6-19　引水工程區歷年同季哺乳類監測種數及數量比較分析

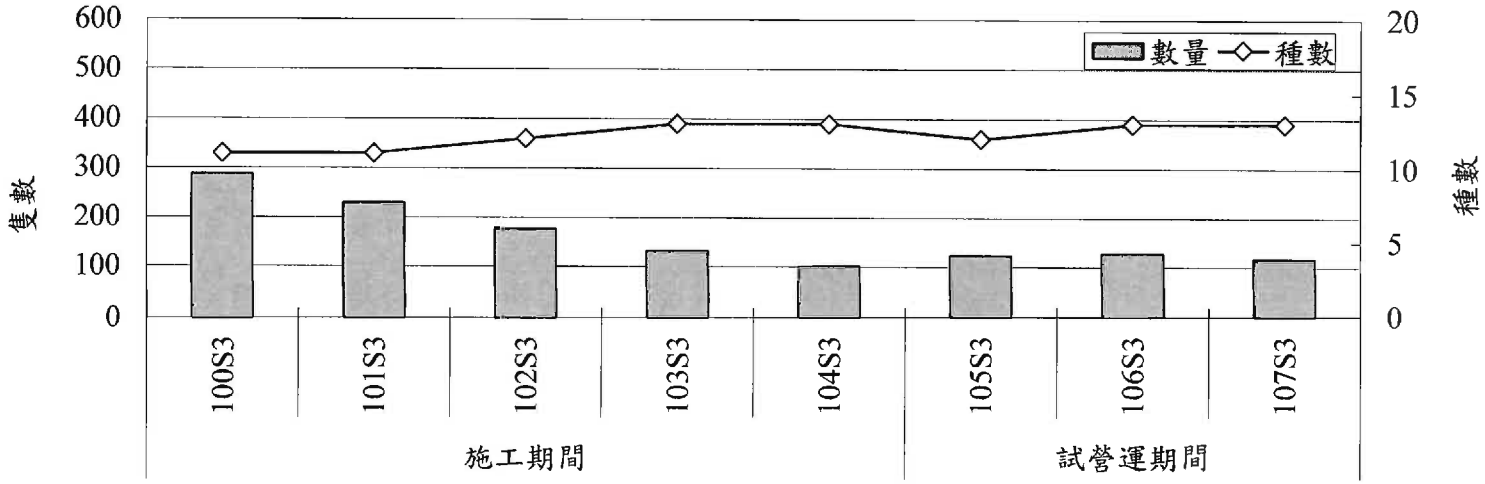

圖 2.6-20　引水工程區歷年同季兩棲類監測種數及數量比較分析

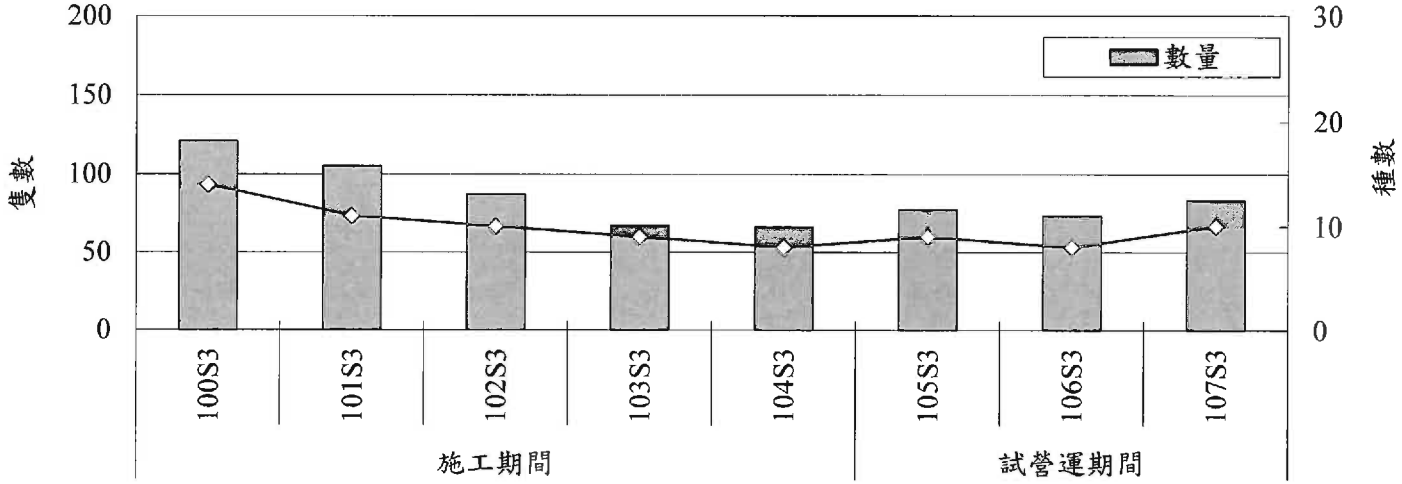

圖 2.6-21　引水工程區歷年同季爬蟲類監測種數及數量比較分析

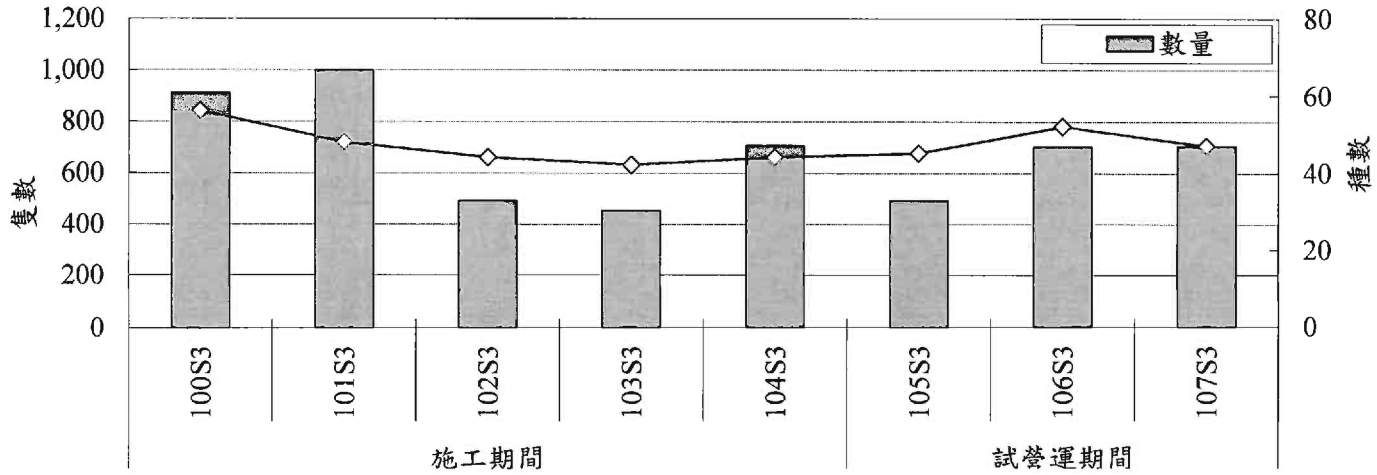

圖 2.6-22　引水工程區歷年同季鳥類監測種數及數量比較分析圖

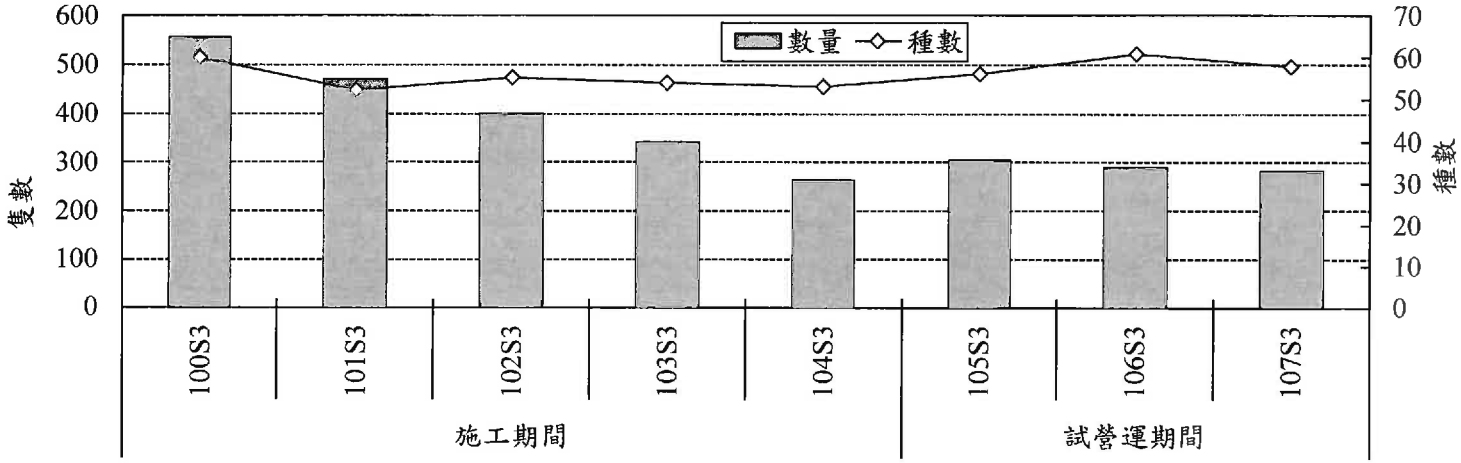

圖 2.6-23　引水工程區歷年同季蝴蝶監測種數及數量比較分析圖

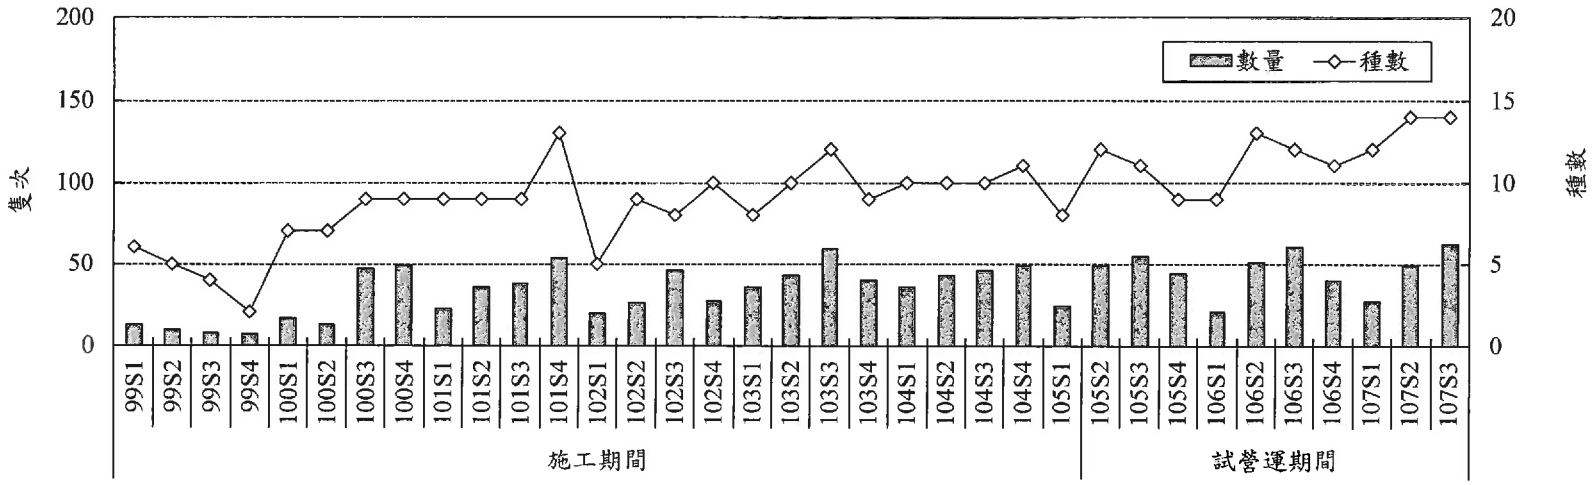

圖 2.6-24　自然生態保留及復育區歷年哺乳類監測種數及數量比較分析

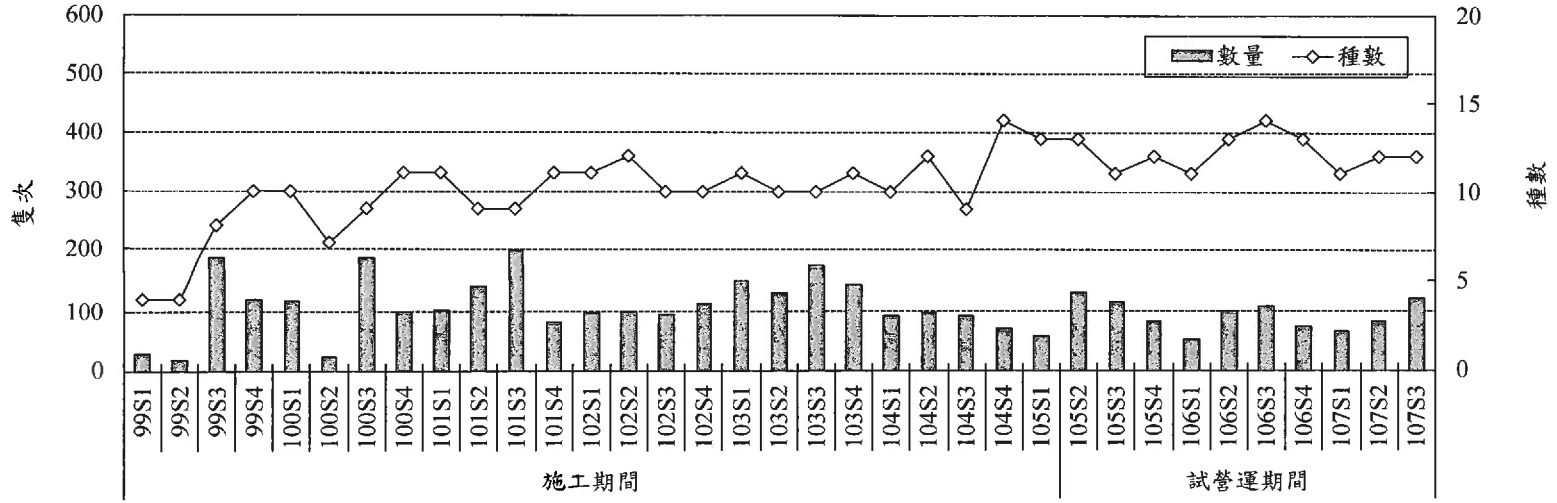

圖 2.6-25 自然生態保留及復育區歷年兩棲類監測種數及數量比較分析

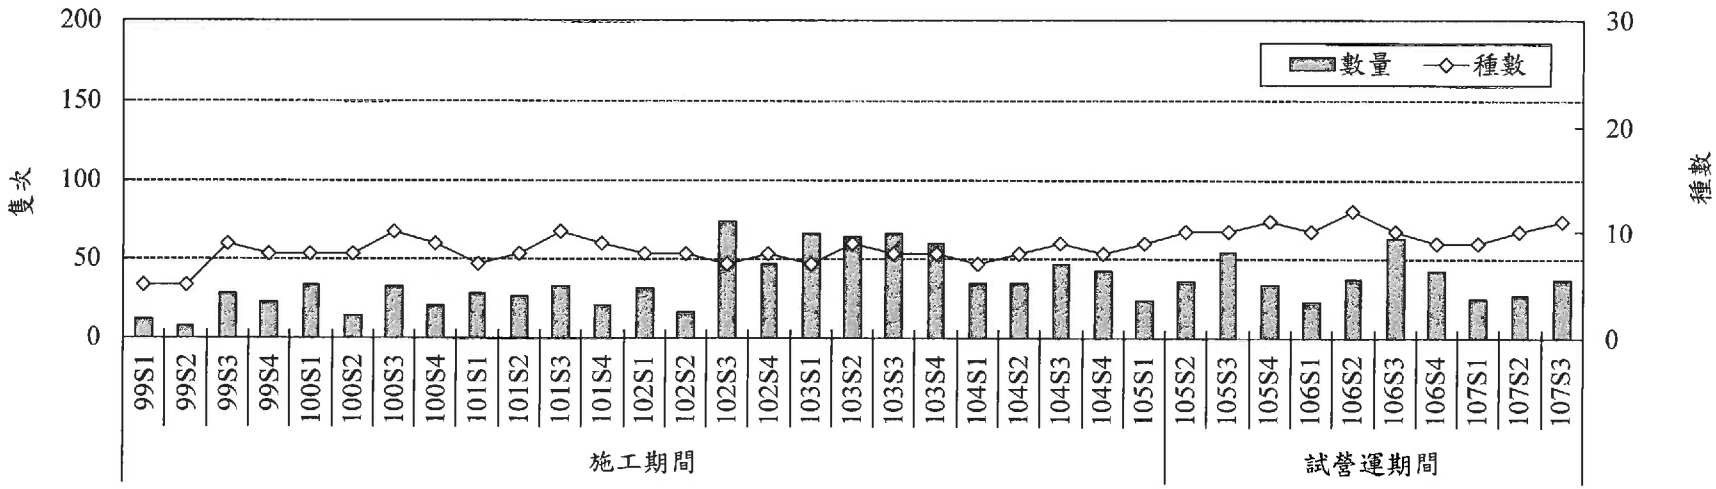

圖 2.6-26　自然生態保留及復育區歷年爬蟲類監測種數及數量比較分析

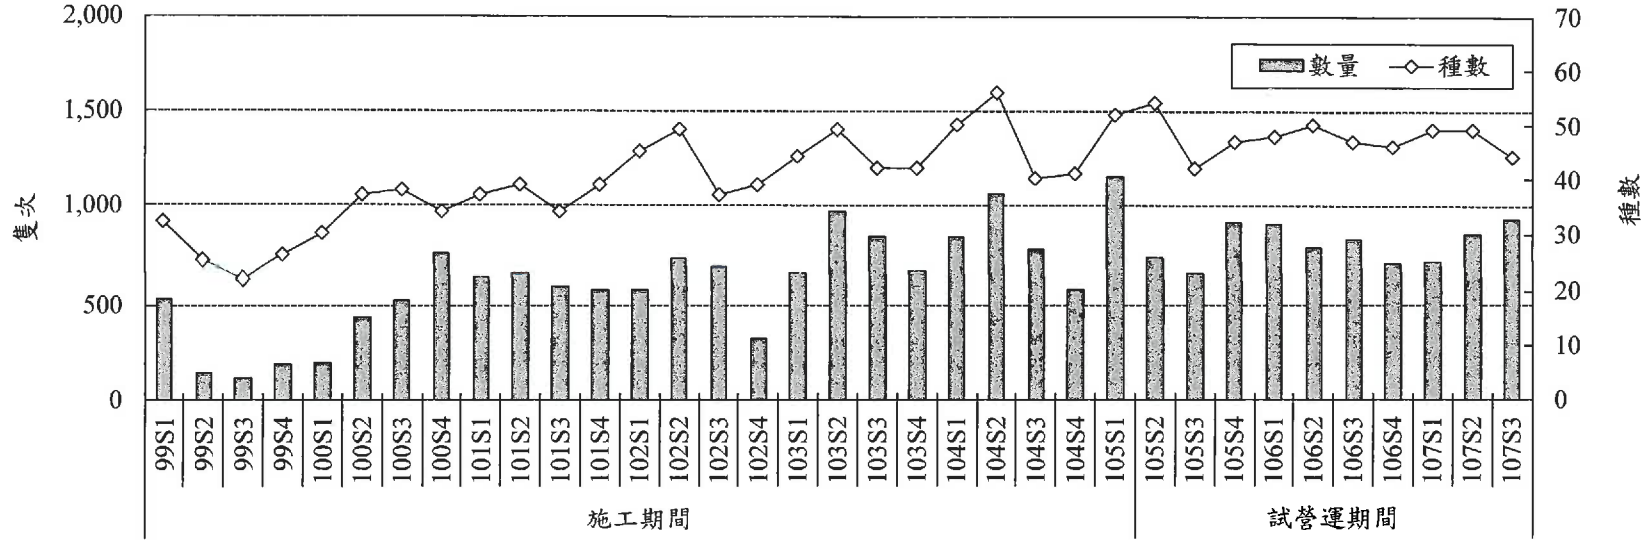

圖 2.6-27　自然生態保留及復育區歷年鳥類監測種數及數量比較分析圖

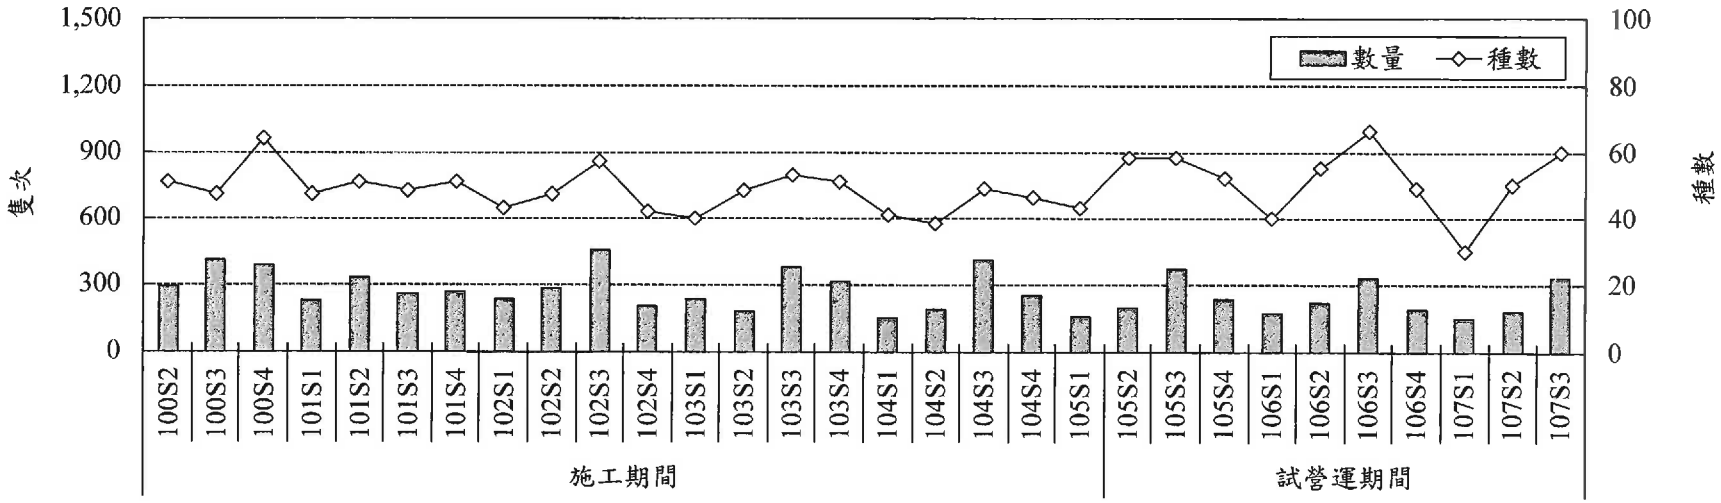

圖 2.6-28　自然生態保留及復育區歷年蝴蝶監測種數及數量比較分析圖

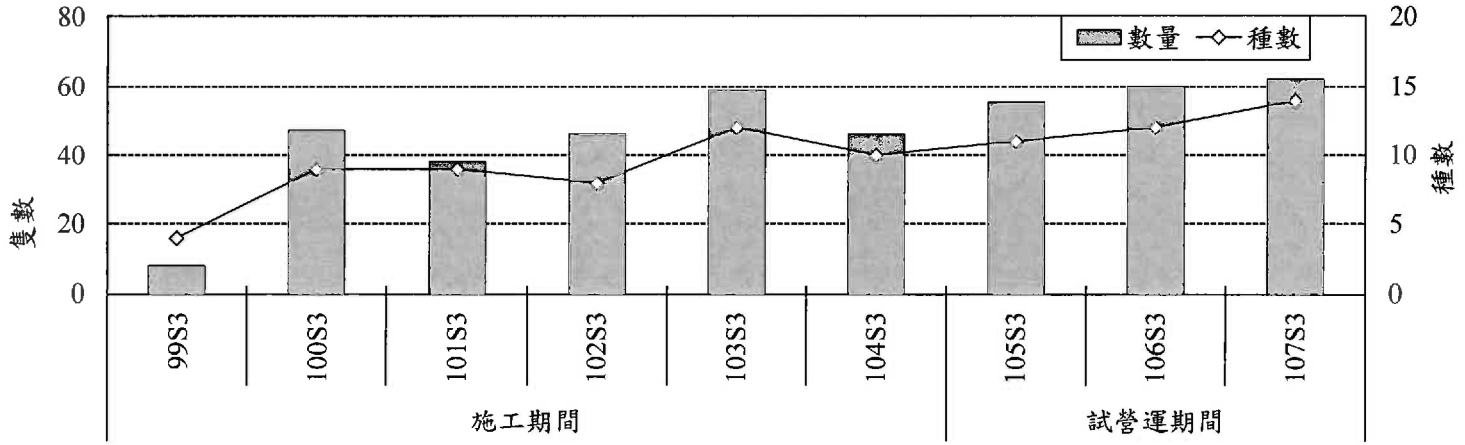

圖 2.6-29　自然生態保留及復育區歷年同季哺乳類監測種數及數量比較分析

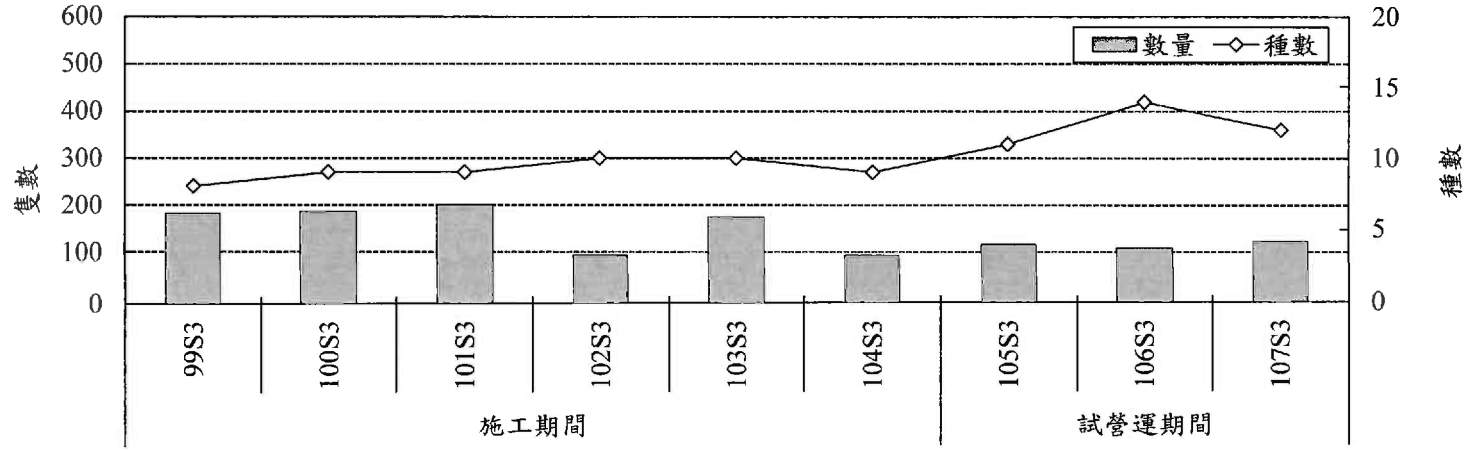

圖 2.6-30　自然生態保留及復育區歷年同季兩棲類監測種數及數量比較分析

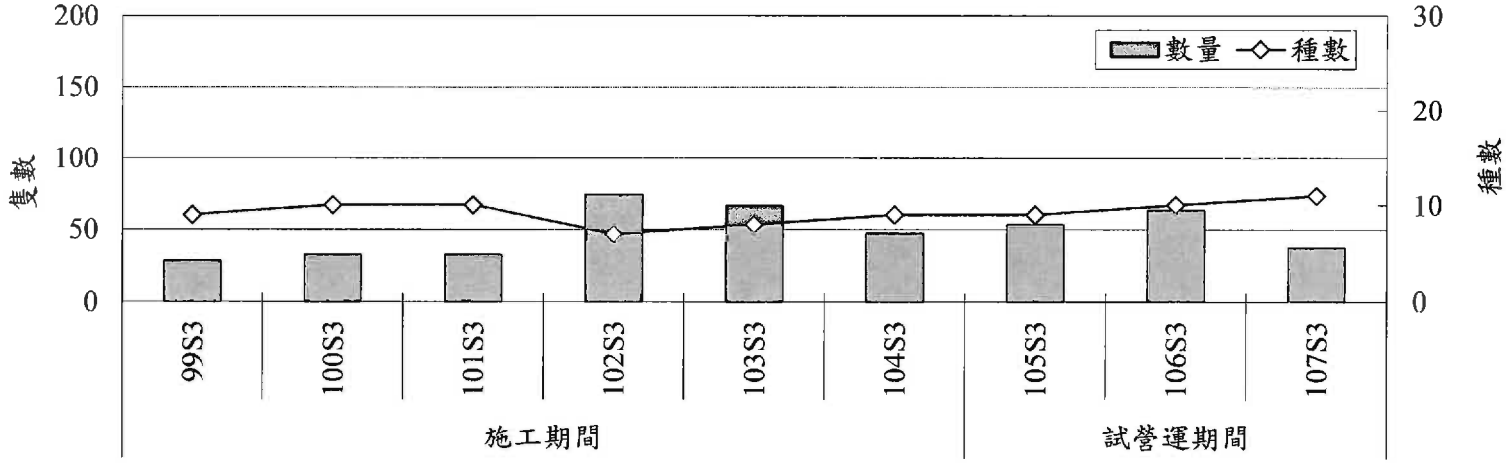

圖 2.6-31　自然生態保留及復育區歷年同季爬蟲類監測種數及數量比較分析

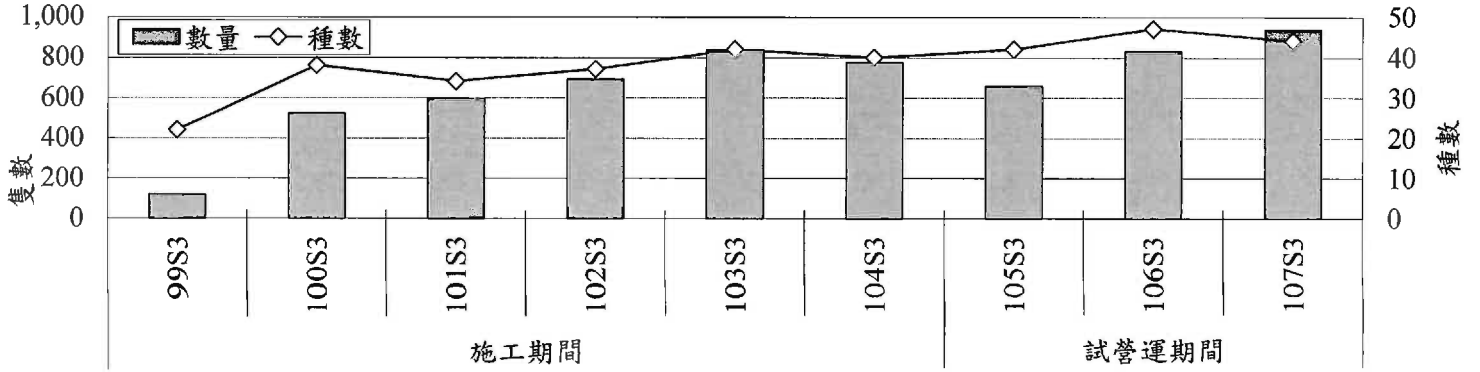

圖 2.6-32　自然生態保留及復育區歷年同季鳥類監測種數及數量比較分析圖

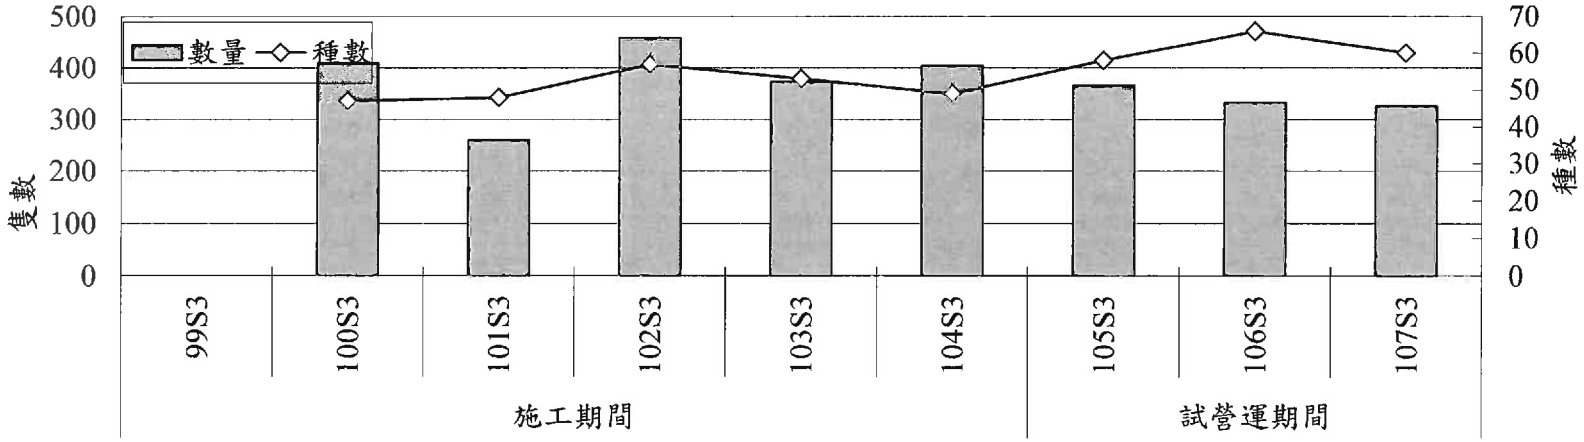

圖 2.6-33　自然生態保留及復育區歷年同季蝴蝶類監測種數及數量比較分析圖

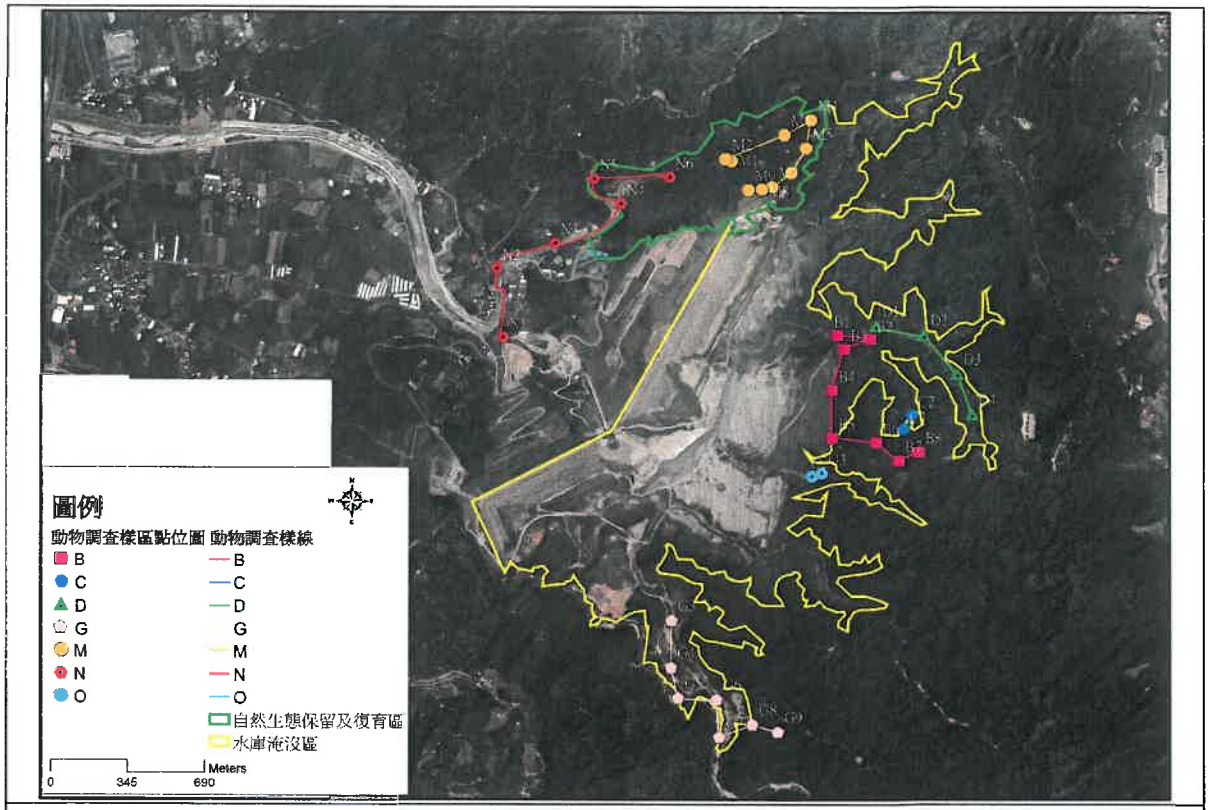

原陸域動物樣線

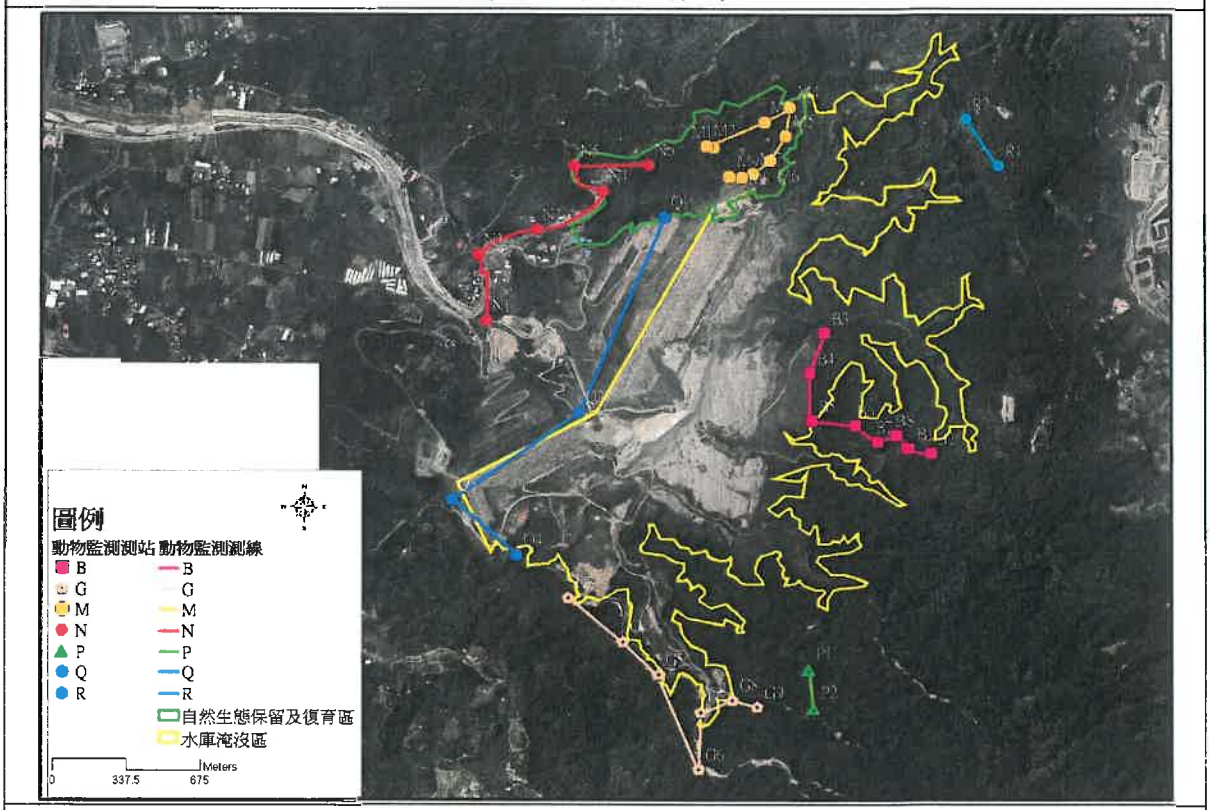

調整後陸域動物樣線 B、C、D、G、O

圖 2.6-34　湖山水庫水位升高後陸域生物測站變更(105 年 7 月後)

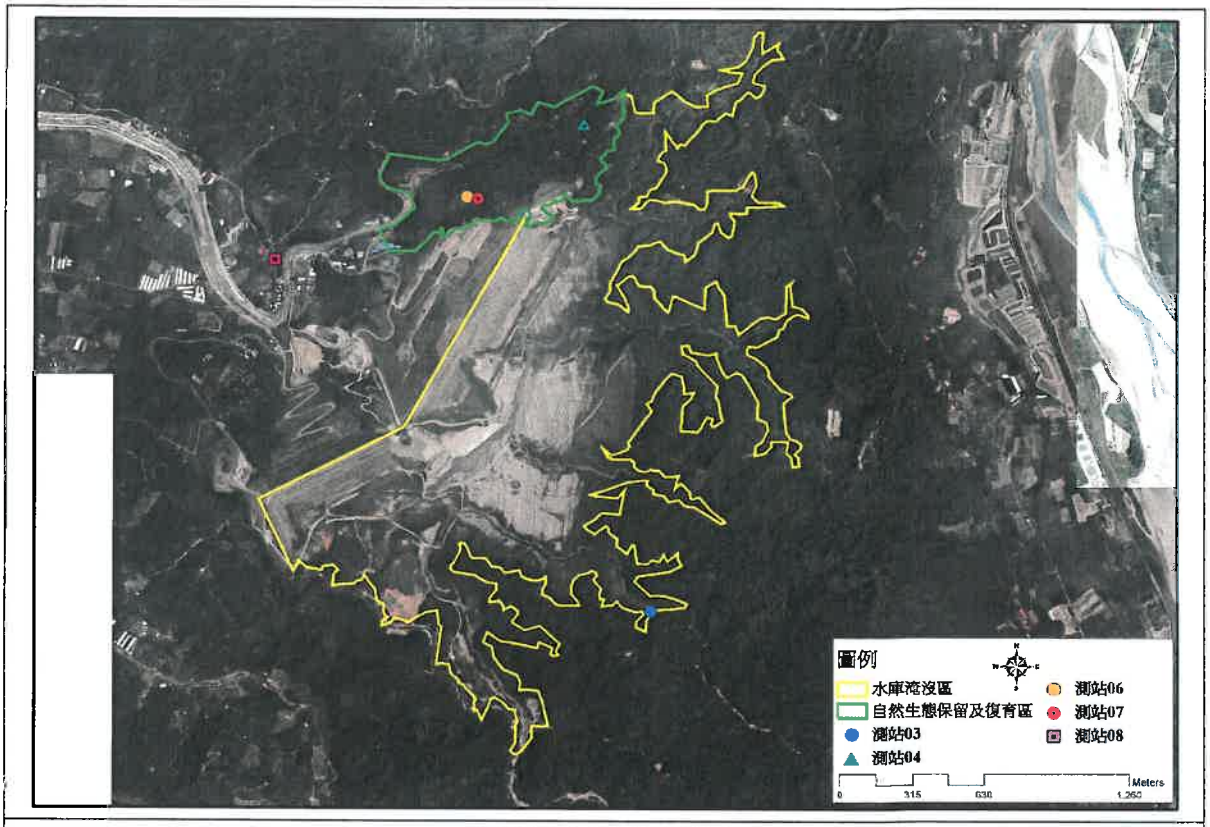

原陸域植物測站

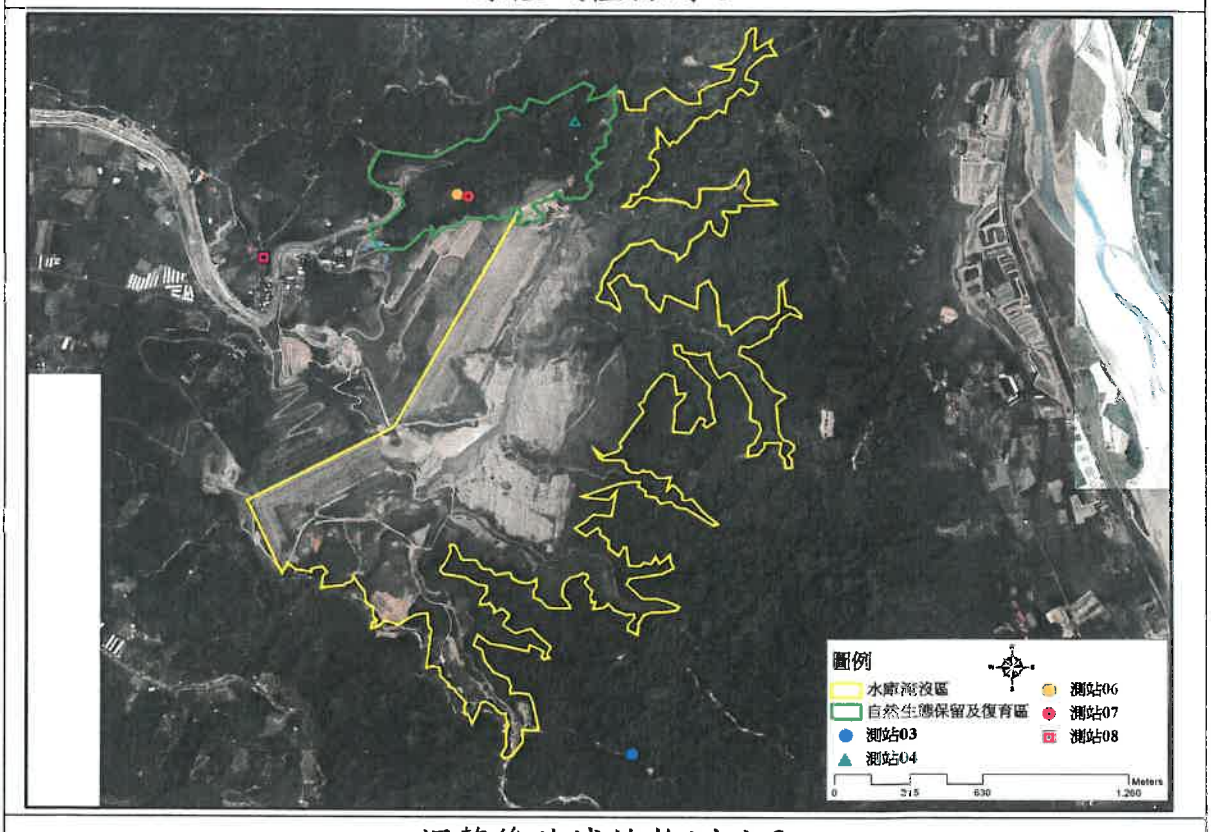

調整後陸域植物測站 3

圖 2.6-34　湖山水庫水位升高後陸域生物測站變更(105 年 7 月後)(續 1)

樣線/測站	蓄水後影響	建議	變更後續影響的課題
B	B1、B2 將因蓄水淹沒，其他測站仍可抵達，但路程需增加約 40 分鐘	將 B1、B2 往 B8 方向延伸	B1、B2 目前位於幽情谷入口處，環境屬凹谷，樹 林較少，變更後將以樹林為主，且後續比對將略有差異(灌叢生物減少，樹林物種略增)
C	仍可監測但可能淹沒，路程需增加約 40 分鐘	改設置為庫區東北邊的 R 樣線	棲地環境類似
D	全部淹沒，無法監測	改設置於大壩沿線至觀景台周邊上 Q 樣線	設於大壩上，因一側為水域一側為草地，可觀看鳥類變化，其他生物亦可觀察，但可能數量較少。
G	G3、G4、G6 可能受蓄水淹沒	將 G3、G4、G6 往庫區遷建道路挪動	G3、G4 因過往擾動，閒置後周邊環境以草生灌叢為主，如挪動後環境及物種將有局部變更，且後續比對將略有差異(灌叢生物減少，耐擾動物種或水鳥增加)
O	全部淹沒，無法監測	改設於 G9 周邊農用道路的 P 樣線	1.O 樣線現況為溪谷環境，周邊以草生灌叢為主 2.改設於 G9 周邊的農用道路，環境較不受干擾，但環境差異較大，以樹林為主
M	不受影響	—	—
N	不受影響	—	—
植物測站	測站 3 將被淹沒	改設於 G9 周邊的農用道路周邊	距離不遠，物種及數量略有差異，但差異不大

圖 2.6-34　湖山水庫水位升高後陸域生物測站變更(105 年 7 月後)(續 2)

2.7 陸域植物

2.7.1 水庫集水區

本計畫區植被大致為次生林、竹林或果園，目前多處經人為開發，屬人為擾動較頻繁區域，易受人為活動所干擾，因此自然度均偏低，無法顯現植群之穩定結構與形相。為瞭解監測範圍內植群之可能變化與當地稀有鳥種八色鳥之棲地，測站之選擇以人為擾動較少自然度較高區域為主。由於施工陸續展開，99 年第 1 季監測期間發現，原本測站 2、測站 5 及測站 9 已遭工程干擾而無法繼續監測，103 年第 1 季監測發現測站 1、10、11 及 12 因大壩工程已進入施工末期，為確保水庫未來蓄水後之水質，位於淹沒區範圍內之地表須進行必要之地表清除，因此無法繼續監測，故本計畫延續先前植物測站 3、4、6、7 及 8，共 5 個測站進行監測。105 年第 4 季將測站植物測站 4、6 及 7 劃入自然生態保留與復育區討論，故本計畫延續先前植物測站 3 及 8，共 2 個測站進行監測，監測結果如以下說明。

一、植被概況

本區域大致以次生林、廢棄果園、檳榔園、竹林及草生地等為主，目前庫區範圍內因已進入試營運期，水庫已開始蓄水，而各植被環境現況說明如下：

(一)次生林

此類植被為本區域自然度最高環境，主要分布於坡地人為擾動較少區域，林內少有大徑木，多為中小徑木，經長期自然演替已有大量物種進駐，如咬人狗(*Dendrocnide meyeniana*)、澀葉榕(*Ficus irisana*)、大冇榕(*Ficus septica*)、豬母乳(*Ficus fistulosa*)、九節木(*Psychotria rubra*)、鵝掌柴(Schefflera *octophylla*)、山香圓(*Turpinia formosana*)及火筒樹(*Leea guineensis*)等，與低海拔之榕楠原始林相似，其物種以桑科榕屬為主，如未受人為擾動將可演替為榕楠林。

(二)廢棄果園

此類植被在監測範圍內佔有相當大面積，主要以果樹－龍眼樹(*Dimocarpus longan*)為主，因長期未整理而有大量物種進駐，而進駐物種與次生林相似，如咬人狗、澀葉榕、大冇榕、豬母乳、九節木、鵝掌柴及山香圓，其下層植被目前仍以陽性物種為主，如馬纓丹(*Lantana camara*)、海金沙(*Lygodium japonicum*)、三角葉西番蓮(*Passiflora suberosa*)、銳葉牽牛(*Ipomoea indica*)及小葉桑(*Morus australis*)等。

(三)竹林

多以小區塊鑲嵌於各林區內，物種以麻竹(*Dendrocalamus latiflorus*)為主，竹林下物種較少且多生長不良，以陽性物種或灌木為主。

(四)草生地

多位於擾動頻繁區域，如開發擾動較少之間隙或新崩塌地，其物種以禾本科及陽性先驅物種為主，並有少量灌木鑲嵌其中。

(五)裸地

由於本區域內曾有大面積開發，但隨工程的進展及閒置，有大面積的裸地漸由草生灌叢取代，因此裸地面積逐漸縮小。

(六)水庫水域

目前水庫已進入試營運階段，水庫已開始蓄水，然而因未達滿水位，周邊仍有大面積草生灌叢生長。

二、植物物種組成

本季監測共記錄植物 111 科 352 屬 472 種，依植物型態區分，共包括 95 種喬木，72 種灌木，66 種藤本，239 種草本，以草本植物為主(50.6%)；依植物屬性區分，共包括 32 種特有種(包含 8 種特有變種和 1 種特有品型)，342 種其他原生種，67 種歸化種，31 種栽培種，以其他原生物種最多(72.5%)，植物歸隸屬性統計及植物名錄則詳見附錄三。

歷年監測結果科數介於 103~116 科間，以 100 年第 4 季到 101 年第 2 季及 102 年 4 季最高，種數則介於 426~510 種間，以 102 年第 3 季最高，大致而言，物種數變化不大，且主要以陽性物種為優勢，過去因工程導致裸地面積增加，使陽性物種進駐機率增加，但隨工程穩定，各物種演替及增長，物種數漸回復穩定。

三、臺灣特有種

本季監測共記錄 32 種特有種(其中包含 8 種特有變種和 1 種特有品型)，分別為樟葉槭(*Acer albopurpurascens*)、青楓(*Acer serrulatum*)、布朗藤(*Heterostemma browni*)、岩生秋海棠(*Begonia ravenii*)、黃肉樹(*Litsea hypophaea*)、香楠(*Machilus zuihoensis*)、疏花魚藤(*Derris laxiflora*)、山芙蓉(*Hibiscus taiwanensis*)、土防己(*Cyclea gracillima*)、桶鉤藤(*Rhamnus formosana*)、薄葉玉心花

(*Tarenna gracilipes*)、臺灣欒樹(*Koelreuteria henryi*)、山香圓、烏皮九芎(*Styrax formosana*)、石朴(*Celtis formosana*)、圓果冷水麻(*Pilea rotundinucula*)、翼莖粉藤(*Cissus pteroclada*)、三葉崖爬藤(*Tetrastigma formosanum*)、臺灣青芋(*Colocasia formosana*)、臺灣油點草(*Tricyrtis formosana*)、桂竹(*Phyllostachys makinoi*)、臺灣矢竹(*Pseudosasa usawai*)及三奈(*Zingiber kawagoii*)；8 種特有變種，分別為田代氏澤蘭(*Eupatorium clematideum* var. *clematideum*)、三斗石櫟(*Lithocarpus hancei* var. *ternaticupula*)、大葉楠(*Machilus japonica* var. *kusanoi*)、圓葉布勒德藤(*Bredia hirsuta* var. *rotundifolia*)、玉山紫金牛(*Ardisia cornudentata* subsp. *morrisonensis* var. *morrisonensis*)、臺灣何首烏(*Polygonum multiflorum* var. *hypoleucum*)、山油點草(*Tricyrtis formosana* var. *stolonifera*)、臺灣芭蕉(*Musa basjoo* var. *formosana*)；1 種特有品型，為山枇杷(*Eriobotrya deflexa* forma *deflexa*)。

四、稀特有植物

稀特有植物中記錄環保署「植物生態評估技術規範」所公告環評等級為 3 之臺灣地區稀特有植物圓葉布勒德藤 1 種，圓葉布勒德藤主要零星分布於幽情谷一帶，因前期的施工階段水庫挖掘工程造成族群減少，於現階段進入試營運期後擾動減少，爰本季監測留存族群數量維持穩定。

五、植物測站監測分析

水庫集水區原有 5 處測站(測站 3、4、6、7 及 8)，其中 3 處測站(測站 4、6 及 7)位於自然生態保留及復育區內，因報告內文將自然生態保留及復育區以獨立章節方式呈現，因此，測站 4、測站 6 及測站 7 將改於自然生態保留及復育區一節中說明，本節僅分析測站 3 及測站 8。

(一)組成分析

1.測站 3

本測站原位於南勢坑溪支流崙尾坑溪，海拔高度約 196 公尺，因試營運期後水庫開始蓄水造成道路無法通行，於 105 年第 3 季更換監測位置。新測站位於舊測站東南側約 400 公尺處，植被類型均屬人為擾動後自然演替而成，但由於本區域人為擾動較少，因此物種及植株數量均多。整體而言，因為氣溫高且水分充足，植被上層以龍眼樹最為優勢，其他尚有三斗石櫟、大香葉樹(*Lindera megaphylla*)、白匏子(*Mallotus paniculatus*)和石苓舅(*Glycosmis citrifolia*)等，徑級多為中小徑木；下層植被由於林下較潮濕，因此有明顯優

勢物種。地被層物種依覆蓋度由高至低排列分別為冷清草(*Elatostema lineolatum* var. *majus*)、細葉複葉耳蕨(*Archniodes aristata*)、拎樹藤(*Epipremnum pinnatum*)、柚葉藤(*Pothos chinensis*)、龍船花(*Clerodendrum kaempferi*)、山棕(*Arenga engleri*)和穿鞘花(*Amischotolype hispida*)等物種，其餘物種覆蓋度均未達 5%。本季氣溫及降雨量較上季增加，因此地被總覆蓋度較上季增加，而優勢種原本即生長較強勢且佔有較多面積，因此本季覆蓋度變動不大，僅次優勢種的龍船花及穿鞘花等物種覆蓋度有所增減。

2.測站 8

本測站位於基地外邊緣且鄰近道路，海拔高度約 130 公尺，本區屬廢棄果園。然而，於 104 第 2 季發現，測站因周邊私人用地開路，造成測站內約 40%受影響，其中地被影響較大，而木本層僅有部分小苗受影響。測站內上層植被以血桐(*Macaranga tanarius*)和龍眼樹最為優勢；下層植被以龍眼樹小苗為主要優勢種，其餘尚有姑婆芋(*Alocasia odora*)、大黍(*Panicum maximum*)和三葉崖爬藤等植物，其餘物種覆蓋度均未達 5%，測站內龍眼樹幼苗大量拓殖，成為地被的主要優勢種，測站內曾進行人工綠美化工程，並栽植山黃梔(*Gardenia jasminoides*)稚樹若干株，過程清除部分地被，本季恢復良好，優勢種組成與上季相似，由於氣溫與降雨量較上季增加，因此地被覆蓋度明顯增加。

(二)歧異度分析

1.木本歧異度

各測站歧異度指數(H')介於 1.20～1.72，最優勢度指數(N_2)介於 2.65～4.90，均勻度指數(E_S)介於 0.72～0.85；大致而言，物種越豐富或越少單一優勢種情況發生，則其均勻度越高，如測站 3 均勻度屬良好的情況，反之則單一優勢種越是明顯，如測站 8 以血桐為優勢，因此均勻度屬均等級別。整體而言，測站內物種組成與株數與上季並無太大變化，因此歧異度及均勻度並無太大差異。

2.草本歧異度

各測站歧異度指數(H') 介於 1.90～2.16，最優勢度指數(N_2)介於 4.12～4.66，均勻度指數(E_S)介於 0.48～0.55；本季各測站物種尚稱豐富，但均勻度介於均等至中等的情況。整體而言，草本植物之均勻度皆較木本植物低，主要原因是林下環境受樹冠遮蔽影響，物種大多為耐蔭物種，而樹冠孔隙

下方則會出現少量陽性物種，故造成組成較不平均的情況。測站 8 因上層喬木於 104 年第 2 季受到人為干擾，光線充足之下許多草本植物快速生長茂盛，而 106 年第 1 季因種植綠美化植栽導致地被清除，目前恢復良好。本季氣溫及降雨量上升，因此整體覆蓋度較上季增加。測站 3 於 105 年第 3 季受水庫集水區開始試營運期間蓄水影響無法監測，因而另設置新測站造成資料有不連續性。

2.7.2 引水工程區

因應湖山水庫工程計畫第三次環境影響差異分析報告之變更，故自 100 年第 2 季起新增引水工程區沿線之生態環境監測計畫，陸域生態監測範圍為引水工程基地及其周圍外推 500 公尺，以及引水隧道上方兩側 200 公尺範圍內。本計畫區植被大致為次生林、竹林、果園、草生灌叢、農耕地、河川、裸地及人工建物等，目前多處經人為開發，屬人為擾動較頻繁區域，易受人為活動所干擾，因此自然度均偏低，無法顯現植群之穩定結構與形相。為瞭解監測範圍內植群之可能變化，測站之選擇以人為擾動較少自然度較高區域為主，共 4 個測站進行監測，如圖 2.7-2 所示，監測結果如以下說明。

一、植被概況

本區域大致以次生林、廢棄果園、檳榔園、竹林及草生地等為主，目前基地範圍內均已完工，而各植被環境現況說明如下：

(一)次生林

此類型植被為本區自然度最高的植被類型，目前植被大致呈現演替初期至演替中期階段，部份區域則因地形陡峭不易抵達，且擾動少而有較好之林相。經監測發現，本區次生林先前曾有居民種植及採收竹子，故林內有大量竹叢鑲嵌其中或成片生長，但部分演替較好的區域，林相已漸回復至低地樟楠林之結構。目前林中之自然演替仍不斷進行，林相結構尚稱良好，且自然更新亦佳，上層木本物種主要以土肉桂(*Cinnamomum osmophloeum*)、臺灣雅楠(*Phoebe formosana*)、澀葉樟、大冇樟、山黃麻(*Trema orientalis*)、大葉楠及山香圓等物種組成，下層地被植物則有小花蔓澤蘭(*Mikania micrantha*)、毛蓮菜(*Elephantopus mollis*)、青苧麻(*Boehmeria nivea* var. *tenacissima*)、臺灣澤蘭(*Eupatorium cannabinum* subsp. *asiaticum*)、大冇樟、穿鞘花、斜方複葉耳蕨(*Arachniodes rhomboides* var. *rhomboides*)、姑婆芋、冷清草、克氏鱗蓋蕨(*Microlepia krameri*)及觀音座蓮(*Angiopteris lygodiifolia*)等物種，依其演替狀況略有差異，如未受人為擾動將可演替為樟楠林。

(二)竹林

包含天然分布之竹林與人為栽植的物種。大致以桂竹、麻竹及綠竹(*Bambusa oldhamii*)為主，其中以桂竹分布最廣，全區均有分布，除成片生長，亦可發現成叢的竹林散在次生林中。因竹林有排他作用，其他物種較難於空隙中生長，僅偶可見大頭艾納香(*Blumea riparia* var. *megacephala*)、倒地蜈蚣(*Torenia concolor*)、生根卷柏(*Selaginella doederleinii*)等草本夾雜其間；人為栽植之竹林皆位於平地或低海拔區域，主要為綠竹及桂竹，其用途為食用或工藝用，人為除草及維護動作頻繁，地被植物相亦較單純。

(三)果園

零星分布於各區，種植物種包含檳榔(*Areca catechu*)、香蕉(*Musa sapientum*)、番石榴(*Psidium guajava*)、柚(*Citrus grandis*)等果樹。底層人為除草頻繁，其下物種及族群量深受人為活動影響，僅見大花咸豐草(*Bidens pilosa* var. *radiata*)、菁芳草(*Drymaria diandra*)、昭和草(*Crassocephalum crepidioides*)、克非亞草(*Cuphea cartagenesis*)等先驅草本分布其間。

(四)草生灌叢

主要分布於河床地或溪流沿岸區域及山坡崩塌地上，由自然力或人為干擾所造成，生長之植被以五節芒(*Miscanthus floridulus*)、白茅(*Imperata cylindrica* var. *major*)、象草(*Pennisetum purpureum*)、棕葉狗尾草(*Setaria palmifolia*)等禾本科植物或大花咸豐草、葛藤(*Pueraria lobata* ssp. *thomsonii*)、火炭母草(*Polygonum chinense*)及紫花藿香薊(*Ageratum houstonianum*)等陽性草本，並隨演替時程，陸續有喬木小苗進駐如血桐、構樹(*Broussonetia papyrifera*)及山黃麻等苗木。

(五)農耕地

零星分布於各區，面積並不大，以種植茶(*Camellia sinensis*)、稻(*Oryza sativa*)及蔬菜等作物為主，由於人為擾動頻繁，僅餘田埂有大花咸豐草、菁芳草、昭和草、紫花藿香薊及克非亞草等先驅草本分布其間。

(六)河川

主要為清水溪及其支流，經監測範圍的東南側區域。河床

屬於天然沖刷而成，水流通過處無植被分布，僅於部分沙洲及河岸兩側有少量濱水植物，可見者有木賊(*Equisetum ramosissimum* subsp. *ramosissimum*)、蘆竹(*Arundo donax*)、甜根子草(*Saccharum spontaneum*)、鴨跖草(*Commelina communis*)、短葉水蜈蚣(*Kyllinga brevifolia*)等，生長位置受溪水沖蝕影響，不定時會變化。

(七)裸地

區域中以礫石環境組成，以山谷崩塌地為主，其表面幾乎無植物生長，僅少量陽性草本植物散生其中。

(八)人工建物

包含了房舍、道路、空地及停車場等，是自然度最低之區域。本區表面幾乎無植物生長，僅少量先驅性草本植物散生其中，所見皆為人為栽植的行道樹或園藝物種，常見者為馬拉巴栗(*Pachira macrocarpa*)、金露花(*Duranta repens*)、大葉桃花心木(*Swietenia macrophylla*)、絲瓜(*Luffa cylindrica*)等。

二、植物物種組成

本季監測共記錄植物 107 科 336 屬 458 種，依植物型態區分，共包括 96 種喬木，72 種灌木，65 種藤本，225 種草本，以草本植物為主(49.1%)；依植物屬性區分，共包括 32 種特有種(包含 8 種特有變種和 1 種特有品型)，329 種其他原生種，64 種歸化種，33 種栽培種，以其他原生物種最多(71.8%)，植物歸隸屬性統計及植物名錄則詳見附錄三。

歷年監測結果科數介於 99~108 科間，以 106 年第 1 季至 107 年第 2 季最高，種數則介於 387~458 種間，以 107 年第 3 季(本季)最高。因山谷崩塌造成裸地的變化以及人為農業活動，造成外來物種的進駐，大致而言，物種數變化不大，目前物種仍緩慢增加中，待環境穩定後，物種數應可逐漸穩定，本季因氣溫及降雨量增加，大部分植物呈現展葉物候。

三、臺灣特有種

本季監測共記錄 32 種特有種(其中包含 8 種特有變種和 1 種特有品型)，分別為樟葉槭、青楓、岩生秋海棠、土肉桂、黃肉樹、香楠、疏花魚藤、山芙蓉、土防己、桶鉤藤、薄葉玉心花、臺灣欒樹、小花鼠刺(*Itea parviflora*)、山香圓、烏皮九芎、石朴、圓果冷水麻、翼莖粉藤、三葉崖爬藤、臺灣青芋、桂竹、臺灣矢竹及三奈；7 種特有變種，分別為田代氏澤蘭、大葉楠、圓葉布勒德藤、玉山

紫金牛、臺灣何首烏、細葉麥門冬(*Liriope minor* var. *angustissima*)、山油點草、臺灣芭蕉；1種特有品型，為山枇杷。

四、稀特有植物

稀特有植物中記錄環保署「植物生態評估技術規範」所公告環評等級為3之臺灣地區稀特有植物圓葉布勒德藤1種，圓葉布勒德藤主要記錄於引水工程區隧道上方稜線區域，以及河床開挖工程區之邊坡草叢中。

五、植物測站監測分析

(一)組成分析

1.測站 1

本測站原為環差監測中之測站 3，位於引水工程區上方旱溪東側坡地上，海拔高度約 381 公尺，坡度約有 45 度，曾經因為坍塌造成裸露地，但已生長大量植被，故恢復情形良好，106 年第 3 季約有 20%面積受土石沖刷造成裸露，本季可見裸露地區逐漸恢復植被，但地表土壤仍顯鬆動。歷季監測可見邊緣區域有許多大香葉樹幼苗，本季幾乎不存，可能與樹冠更加茂密有關。因當地樹冠仍茂密加上落葉與卵石組成之基質較不穩定且乾燥，覆蓋度並不高。測站木本植物依百分比重要值由高至低排列分別為長梗紫麻(*Oreocnide pedunculata*)、大香葉樹、臺灣雅楠、鵝掌柴、咬人狗、白匏子、大冇榕和澀葉榕，林下依覆蓋度由高至低排列分別為粗毛鱗蓋蕨(*Microlepia strigosa*)、臺灣蘆竹(*Arundo formosana*)、大線蕨(*Colysis pothifolia*)、姑婆芋、細葉複葉耳蕨、柚葉藤、長梗紫麻和風藤(*Piper kadsura*)等，其餘物種覆蓋度皆未達 5%。

2.測站 2

本測站原為環差監測中之測站 2，位於引水工程區上方旱溪西側坡地上，目前木本植物依百分比重要值由高至低排列分別為大冇榕、豬母乳、土肉桂、大香葉樹、鵝掌柴、羅氏鹽膚木(*Rhus javanica* var. *roxburghiana*)和刺楤(*Aralia decaisneana*)，地被植物以大花咸豐草、香澤蘭(*Chromolaena odorata*)、海州常山(*Clerodendrum trichotomum*)、熱帶鱗蓋蕨(*Microlepia speluncae*)、密花苧麻(*Boehmeria densiflora*)和水雞油等覆蓋度較高，其餘物種均未達 5%，先前崩塌處已不明顯且有完整植被覆蓋，本季氣溫及降雨量皆增加，因此整體覆蓋度明顯較上季增加，其中，次優勢物種海州常

山、密花苧麻、青苧麻等組成稍有變化，將持續監測觀察其更新情形。

3.測站 3

本測站原為環差監測中之測站 4，位於引水工程區上方旱溪卵石流西側坡地，測站 2 之南側，測站位於溪床上，常受到不定期的洪泛影響，而本季監測時發現測站內僅以羅氏鹽膚木、密花苧麻和血桐等小喬木至灌木為主，林冠呈現不連續狀態，地被植被因無喬木阻擋陽光而有較高覆蓋度，多以五節芒、密花苧麻、香澤蘭和甜根子草為主，其餘物種覆蓋度均未達 5%。本季因氣溫及降雨量增加，導致地被總覆蓋度明顯較上季增加，由於本測站優勢種多為耐乾旱物種，因此氣溫成為主要影響因子。

4.測站 4

本測站原為環差監測中之測站 5，位於清水溪支流上游，為最東側的測站，海拔高度約 266 公尺，測站位於檳榔園周圍，為檳榔園間殘留並作為界線的次生林，因此本測站坡度約 45 度，測站內潮濕且氣候適宜植物生長。由於 104 年第 4 季監測發現測站檳榔園遭到大幅度人為干擾，周圍除檳榔、破布子(*Cordia dichotoma*)等經濟樹種以外之樹木皆遭伐除，測站內除檳榔外僅存一株小菲律賓榕(*Ficus ampelas*)未被伐除，地被植物基本上並非清除對象，但仍因為伐木過程受到大幅破壞，並有施灑除草劑的痕跡，部分種類消失，地表覆滿樹木斷枝殘葉，影響地被生長。本季監測發現裸露地區恢復情形良好，測站內許多木本植物的小苗因無喬木層阻礙而生長良好，如鵝掌柴、小葉桑和構樹等，且部分地被層的木本植物開始晉級生長，即胸高直徑超過 1 公分；覆蓋度依序為觀音座蓮、棕葉狗尾草、金午時花(*Sida rhombifolia*)、家山藥(*Dioscorea batatas*)、銳葉牽牛和絹毛鳶尾(*Costus speciosus*)等，其餘物種覆蓋度均低於 5%，由於測站曾受人為干擾嚴重，導致光度增加，使土壤種子庫打破休眠，地被層物種數大增，但優勢種組成變化不大，本季氣溫及降雨量皆增加，造成整體覆蓋度明顯較上季增加。

(二)歧異度分析

1.木本歧異度

各測站歧異度指數(H')介於 0.99～2.01，最優勢度指數(N_2)介於 2.51～7.04，均勻度指數(E_S)介於 0.57～0.93；測站 1 因 106 年第 3 季曾崩塌導致植相些許改變，本季逐漸恢復，

但優勢種組成略有差異；而測站 2 位於易崩塌之地形，本季監測植物生長良好，自然演替持續進行中，但容易回復至演替初期之環境；測站 3 木本植物與高大草本植物競爭，導致生長較緩慢；測站 4 於 105 年第 4 季因農業活動造成植相改變，本季木本植物的小苗間競爭現象較明顯，物種變化仍持續進行中，除測站 4 屬於人為干擾外，其餘測站皆屬自然變化。物種自然競爭當中雖有少數較優勢物種，但各物種間相對優勢度並無太大差距，測站 1 的均勻度屬於均等，其餘各測站的均勻度均屬於良好狀態。

2.草本歧異度

各測站歧異度指數(H')介於 1.68～2.66，最優勢度指數(N_2)介於 3.31～9.82，均勻度指數(E_S)介於 0.51～0.70；各測站物種介於 17~32 種，物種尚稱豐富，本區各測站受干擾較頻繁，因此均勻度偏低，因干擾類型不同導致測站物種組成有所差異。測站 1、2 曾受崩塌影響導致覆蓋度降低，本季測站 2 漸有回復跡象，優勢物種組成已逐漸穩定，僅零星物種增減，但測站 1 於 106 年第 3 季有自然崩塌現象，導致演替遲遲受阻，本季覆蓋度逐漸恢復；測站 4 曾受人為干擾嚴重，導致均勻度較低，本季地被植物因競爭導致物種數減少，覆蓋度較低的物種相繼消失，而優勢種仍以先驅植物為主，本季因屬於植物生長季，競爭現象較明顯，因此各測站皆屬於均等狀態。

2.7.3 自然生態保留及復育區

本區植被大致為次生林、竹林、果園及咖啡園，目前部份區域經人為開發，人為擾動較頻繁，因此自然度局部偏低，植群結構較不穩定。各物種名錄詳見附錄三，監測結果如以下說明。

一、植物物種組成

1. 本季監測成果

本季監測共記錄植物 102 科 322 屬 407 種，依植物型態區分，共包括 91 種喬木，58 種灌木，62 種藤本，196 種草本，以草本植物為主(48.2%)；依植物屬性區分，共包括 28 種特有種(包含 7 種特有變種和 1 種特有品型)，288 種其他原生種，60 種歸化種，31 種栽培種，以其他原生物種最多(70.8%)，植物歸隸屬性統計及植物名錄則詳見附錄三。

2. 歷次監測成果

歷年監測未單獨統計自然生態保留及復育區植物種數，僅於 103 年第 3 季後開始針對性統計，歷年監測結果科數介於 97~104 科間，以 106 年第 4 季和 107 年第 1 季最高，種數則介於 382~407 種間，以 107 年第 3 季最高。整體而言，本區域無明顯擾動，物種變化小，物種變化主要受季節變化影響。另本季於步道兩旁種植綠美化植栽，因此物種數略為增加。

二、臺灣特有種

本季監測共記錄 28 種特有種(其中包含 7 種特有變種和 1 種特有品型)，分別為樟葉槭、青楓、臺灣羅漢果(*Siraitia taiwaniana*)、黃肉樹、香楠、疏花魚藤、山芙蓉、土防己、薄葉玉心花、臺灣欒樹、小花鼠刺、山香圓、烏皮九芎、石朴、圓果冷水麻、翼莖粉藤、臺灣油點草、桂竹、臺灣矢竹及三奈；7 種特有變種，分別為大葉楠、圓葉布勒德藤、玉山紫金牛、臺灣何首烏、細葉麥門冬、山油點草、臺灣芭蕉；1 種特有品型，為山枇杷。

三、稀特有植物

稀特有植物中記錄環保署「植物生態評估技術規範」所公告環評等級為 1 之臺灣地區稀特有植物臺灣羅漢果及等級為 3 之臺灣地區稀特有植物圓葉布勒德藤，主要分布於自然生態保留及復育區的聯外道路邊。另歷季曾有紀錄環評等級為 1 之臺灣地區稀特有植物臺灣萍蓬草(*Nuphar shimadai*)，屬於植物保存區水池中人為栽培植株，自 107 年第 1 季起水池曾長期乾旱，本季監測雖已恢復水量但不見存活植株。

四、植物測站監測分析

(一)組成分析

1.測站 4

本測站為原測站 4 於 105 年第 2 季受步道興建與地下水觀測井施工破壞後所選定的新測站，同樣位於開發基地北側之自然生態保留及復育區，海拔高度約 250 公尺，屬次生林地；上層植被以豬母乳及大冇榕為主，其餘尚有菲律賓榕、水冬瓜(*Saurauia tristyla* var. *oldhamii*)、龍眼樹及大葉楠，但數量較少；下層植被以觀音座蓮為主，其次為山棕、麻竹、姑婆芋、柚葉藤、拎樹藤、野小毛蕨(*Cyclosorus dentata*)和小杜若(*Pollia minor*)等，其餘物種覆蓋度皆未達 5%，本季測

站內主要優勢物種並無明顯變化，僅零星物種增減，上季因鄰近道路進行疏通作業，干擾測站邊緣植株生長，本季恢復狀況良好，因此總覆蓋度較上季增加，測站中心的植株雖無明顯變化，但仍需注意邊際效應造成的影響。

2.測站 6

本測站為原測站 6 於 106 年第 1 季受步道施工破壞後所選定的新測站，同樣位於湖山主壩北側，海拔高度約 208 公尺，本區域屬廢棄果園，因此可於區內發現大量果樹，然而，久未整理致使部分木本植物進駐，如龍眼樹、山柚(*Champereia manillana*)、大香葉樹和朴樹(*Celtis sinensis*)等，但以過去留存的果樹－龍眼樹優勢度最高，具較大胸徑，其餘均為中小徑木，其中以山柚數量最多；下層植被以大線蕨和龍眼樹小苗為優勢，其次為柚葉藤、雙面刺、山棕、海金沙、樹杞(*Ardisia sieboldii*)和三角葉西番蓮為主，其餘物種皆零星生長於測站中，且覆蓋度均未達 5%。本季優勢物種組成並無明顯變化，後續仍持續監測。

3.測站 7

本測站位於湖山主壩北側，海拔高度約 236 公尺，本區位於竹林周圍，故林下竹葉落葉層較厚，林內多屬小徑木，其中以香楠最為優勢，其次為鵝掌柴及九節木，其餘尚有龍眼樹、黃肉樹、臺灣雅楠、杜英(*Elaeocarpus sylvestris*)、山刈葉(*Melicope semecarpifolia*)和無患子(*Sapindus mukorossii*)等，但株數不多；下層植被以柚葉藤為優勢，其餘尚有龍眼樹、九節木、山棕、海金沙和三角葉西番蓮等，其餘物種覆蓋度皆未達 5%。因測站外緣步道綠美化工程已完成，人為干擾減少，加上本季氣溫及降雨量增加，因此地被總覆蓋度明顯增加，地被優勢物種組成與上季相似，僅有零星物種增減。

(二)歧異度分析

1.木本歧異度

各測站歧異度指數(H')介於 1.09～1.96，最優勢度指數(N_2)介於 2.60～6.08，均勻度指數(E_S)介於 0.71～0.83；大致而言，物種越豐富或越少單一優勢種情況發生，則其均勻度越高，各測站均勻度皆屬良好的情況，反之單一優勢種越是明顯；整體而言，測站 4 上季受人為干擾，導致上木層株數略微減少，雖然對優勢種組成並無明顯影響，本季恢復狀況良好，而測站 7 曾受綠美化工程影響導致組成稍有變化，本

季因工程已完成，測站較無明顯變化，但測站 4 和 7 皆有人為干擾的記錄，將特別注意影響狀況。

2.草本歧異度

各測站歧異度指數(H')介於 2.21～2.60，最優勢度指數(N_2)介於 6.06～9.30，均勻度指數(E_S)介於 0.62～0.73；各測站物種數介於 18～26 種，尚稱豐富，本季均勻度皆屬均等級別。整體而言，草本植物之均勻度均較木本植物低，造成此一情況之主因為林下受樹冠遮蔽影響，林下物種集中於耐蔭物種，故出現組成較不平均的情況。原測站 4 於 105 年第 2 季受步道興建與地下水觀測井施工破壞影響，原測站 6 於 106 年第 1 季受綠美化工程破壞，因樣區替換，造成資料有較大差異。而測站 7 雖曾受綠美化工程干擾造成物種組成變化，目前地被恢復狀態良好；測站 4 於 107 年第 2 季受道路疏通工程影響，邊緣部分喬木和地被遭清除，本季恢復狀況良好，各樣區狀況將持續密切關注。

表 2.7-1　本季環境監測計畫生態監測行程表-陸域植物

時段	第一天 7/11	第二天 7/12	第三天 7/13	第四天 7/14
水庫集水區	測站及物種監測			
引水路沿線			測站及物種監測	測站及物種監測
自然生態保留及復育區		測站及物種監測		

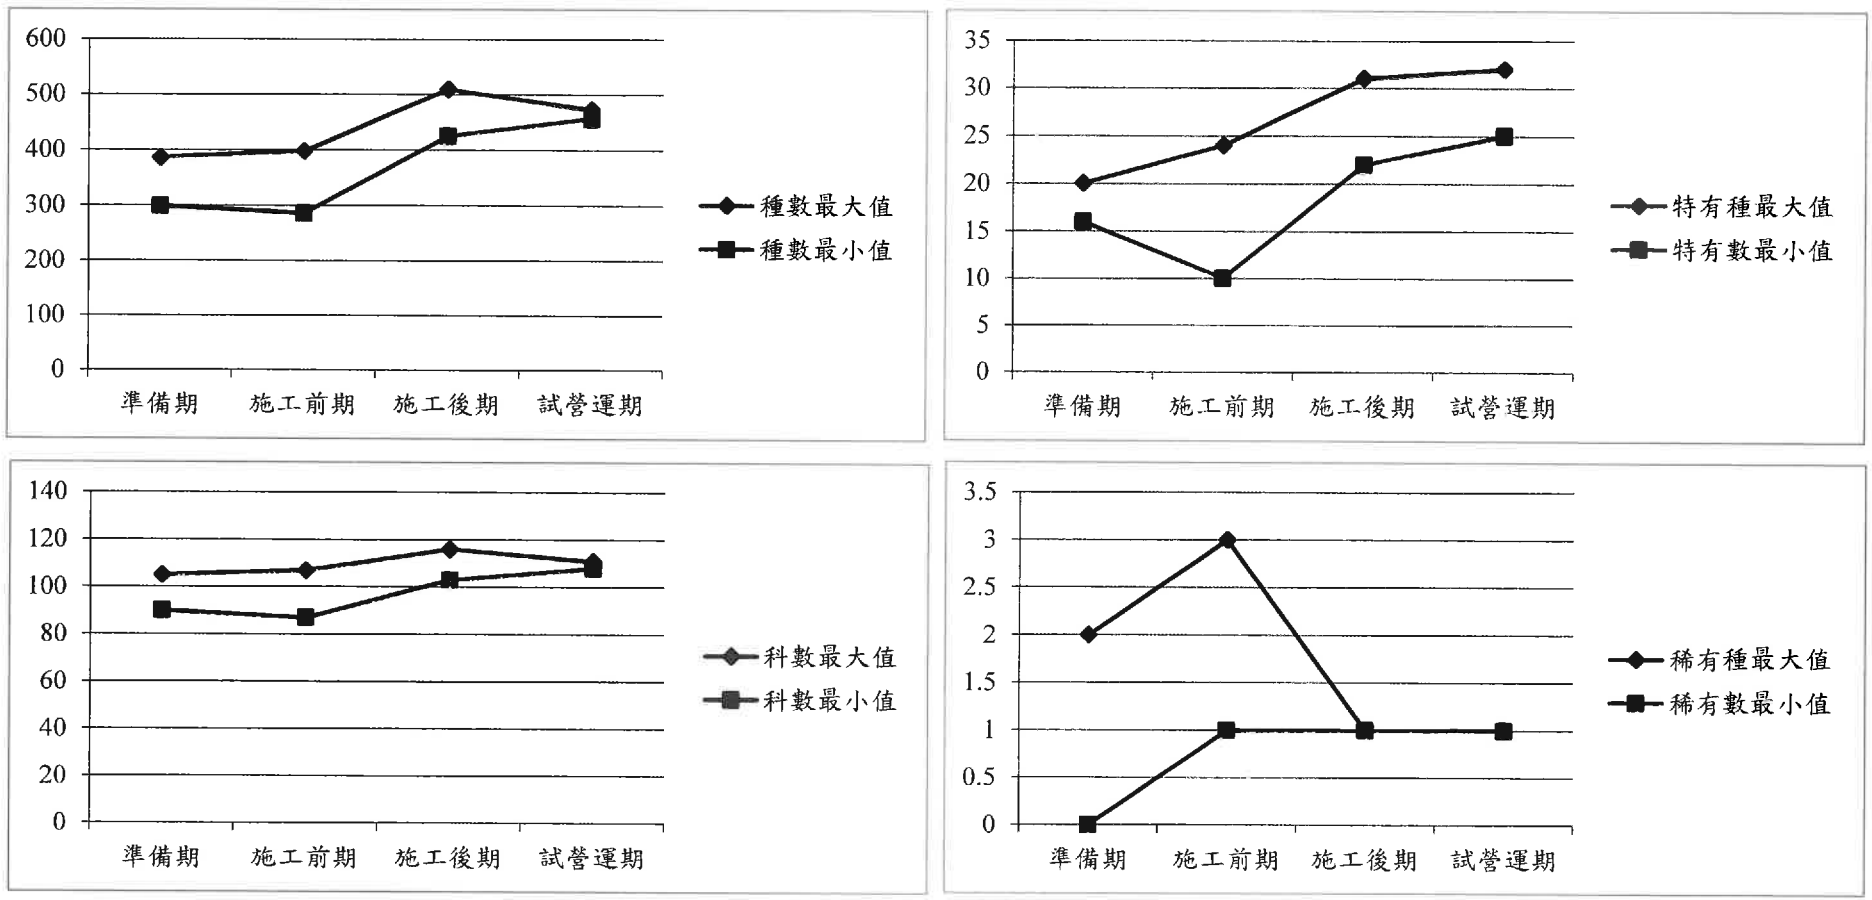

圖 2.7-1　歷期水庫集水區植物監測結果比較分析圖

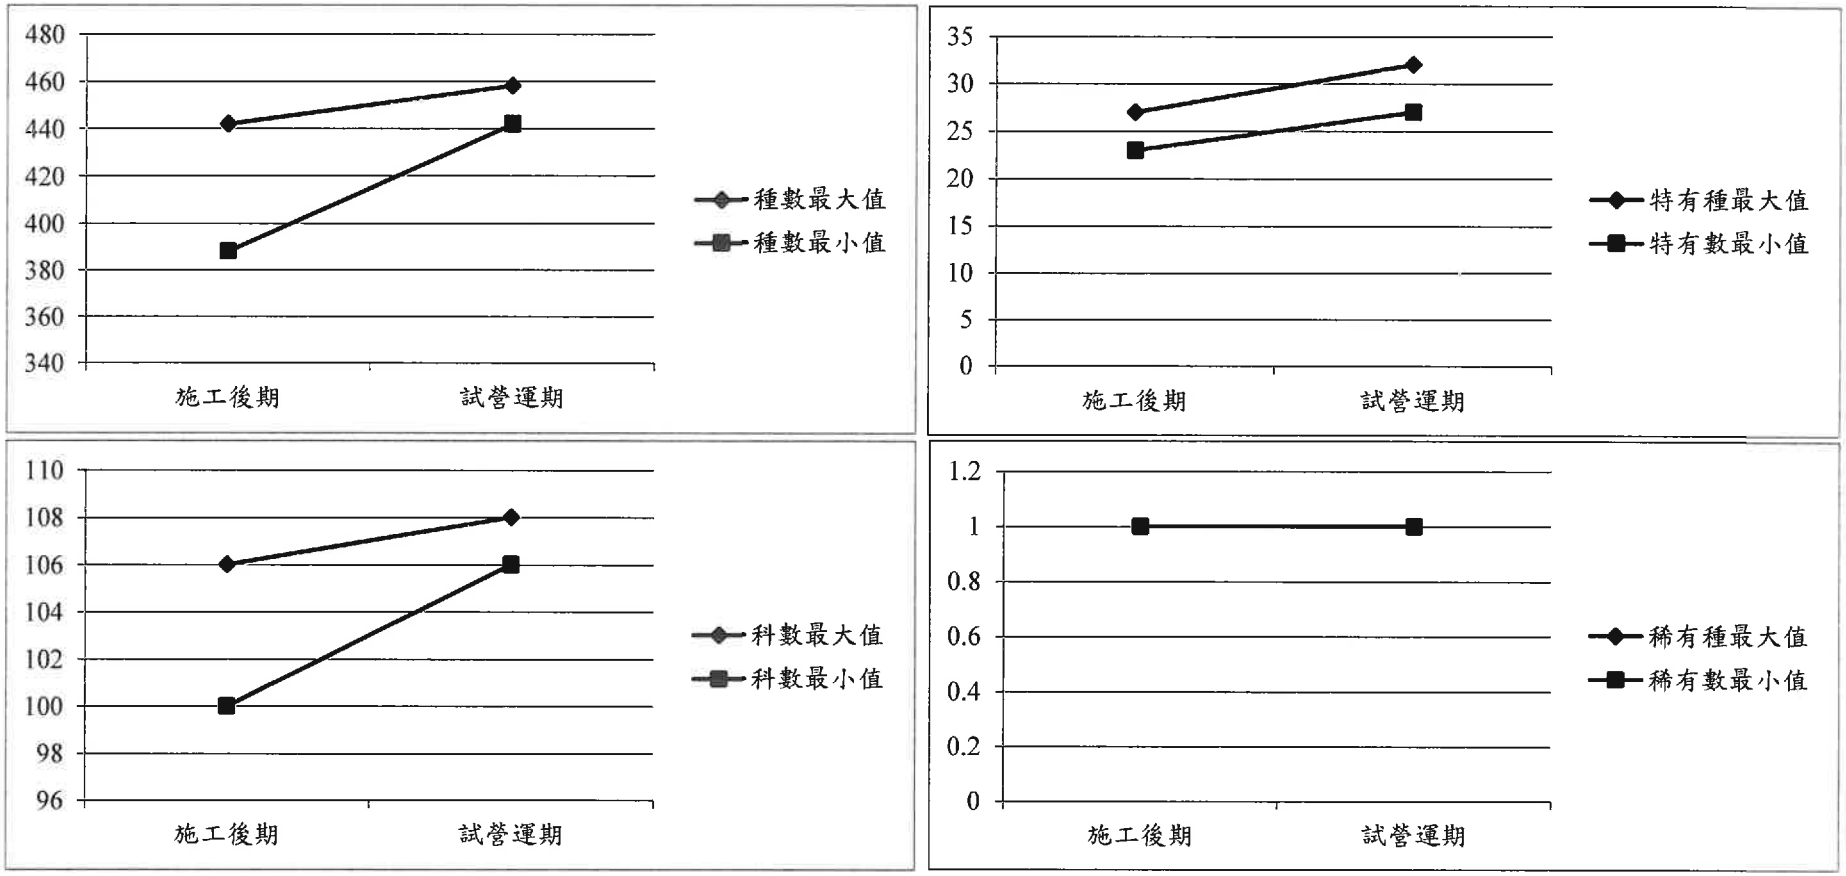

圖 2.7-2　歷期引水工程區植物監測結果比較分析圖

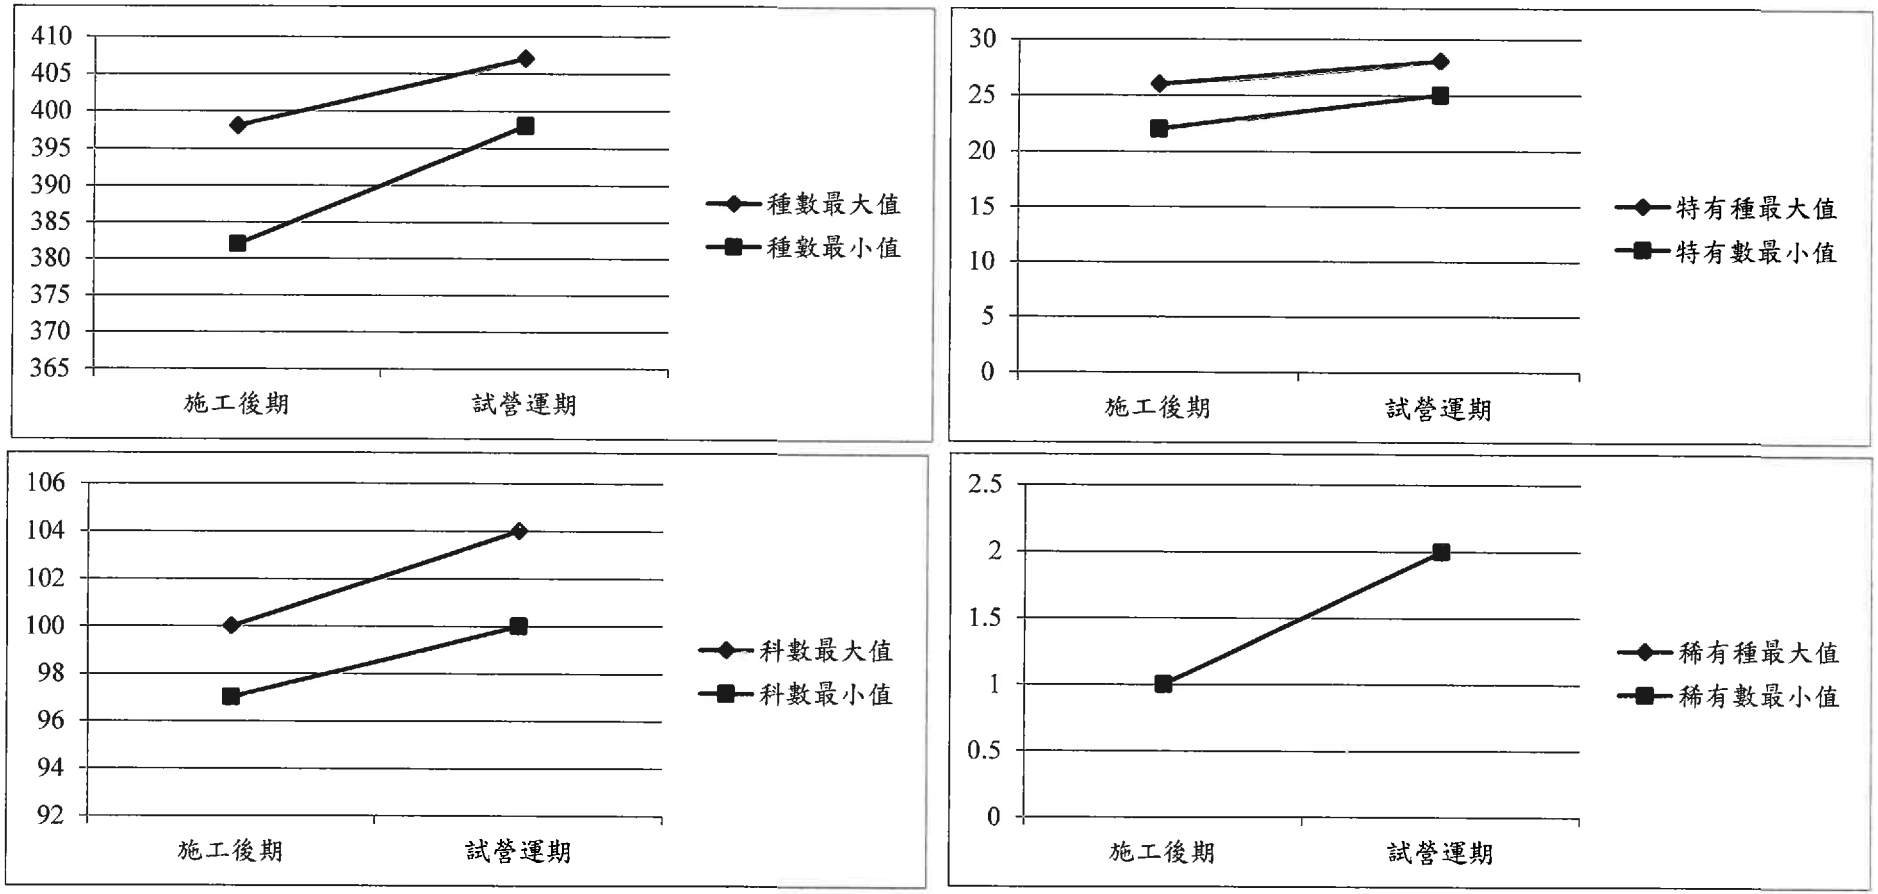

圖 2.7-3　歷期自然生態保留及復育區植物監測結果比較分析圖

第三章　檢討與建議

第三章 檢討與建議

3.1 監測結果檢討與因應對策

3.1.1 空氣品質

歷年空品數據如圖 2.1-3~圖 2.1-17，依歷年趨勢圖可觀察出，本計畫之空氣品質監測結果於施工前(92 年 4 月~95 年第 1 季)、施工期間(95 年第 2 季~105 年第 1 季)及試營運期間(105 年第 2 季~107 年第 3 季)皆差異不大。

歷年監測數據除 $PM_{2.5}$、PM_{10} 及 O_3 因背景環境影響而曾略微超標，其餘測值較無特殊異常狀況發生，均可符合空氣品質標準。$PM_{2.5}$ 之監測係從 102 年第 4 季起配合環評承諾開始執行，至本季止共計執行 20 季次，過往曾於 104 年第 4 季時有記錄到高值發生(梅林國小測站，82 $\mu g/m^3$)，分析高值發生原因，主要係因該次監測執行時適逢冷氣團夾帶大量污染物南下影響，致使當日之測值有明顯偏高狀況發生。另就 $PM_{2.5}$ 及 PM_{10} 之歷年監測結果與空氣品質標準進行比對，目前已監測之成果偶有超標狀況發生，比對鄰近環保署斗六及竹山空品站之測值亦有相同之趨勢，及查詢環保署之空氣品質指標，均顯示臺灣西半部之指標污染物均為細懸浮微粒，因此本季測值偏高之情形，應受大環境影響。而臭氧係屬二次污染物，其濃度較易於日照強、擴散條件差之環境明顯升高，且就本計畫區之開發特性而言亦較不易產生臭氧污染(包含其前趨物質)，此測項偶有超標係受環境背景影響。

3.1.2 噪音振動

歷年監測結果差異不大，惟自 102 年 8 月配合噪音管制標準加嚴後，部分測站夜間測值有超出管制標準狀況。

歷年噪音於棋山國小、桶頭國小、梅林國小及瑞竹國小偶有超標狀況，經比對監測逐時數據、現場監測紀錄表及確認品保品管後得知各測站於日間時段易因民眾及學生活動而導致噪音偶有超標狀況；而晚間及夜間時段之測值偏高係受自然背景音源所影響。此外，歷年噪音於引水隧道入口及引水隧道出口處亦偶有超標狀況，由過往之現場紀錄表及錄音檔，測值偏高係受蟲鳴及水流聲影響，致使部分測站測值偶有超過音量標準。

歷年測站之日間及夜間 L_{v10} 振動位準，均符合日本振動規制法施行規則之參考基準，亦低於人體感受閾值 55 dB，無特殊異常。

3.1.3 營建噪音振動

歷次營建噪音振動之監測結果有部分均能音量超出噪音管制標準，惟均屬偶發事件，後續經追蹤改善後，已均可符合相關標準規範，

另自 104 年大壩工程完工後，已較少超標情形。

3.1.4 水質水量

本季河川水質有懸浮固體、總磷及生化需氧量測項超標情形。

針對本季南勢坑溪上游兩站(引水隧道出口上、下游)與清水溪流域各測站懸浮固體均有超標情況，其中清水溪流域於草嶺地區上游之 3 測站，歷年超標比例介於 32.0~48.0%之間，草嶺地區下游至桶頭地區 3 測站之歷年超標比例則介於 64.0~80.0%之間，顯示後者流域之懸浮固體易有超標情況發生。清水溪流域超標主要因採樣前幾日午後有降雨情形，且由於清水溪流域地質脆弱，導致受雨水沖刷易使水體懸浮固體測值升高；另引水隧道出口上游水質受降雨影響，懸浮固體亦有升高情況發生，而下游測站水質除持續受上游水質影響外，因該河道亦承接引水道之水源，於採樣期間引水道之上游 (桶頭地區)同時有降雨情形，因此引水道水流量明顯偏高(115.2~2,022.6 m^3/min)，因此受水流持續沖刷及上游水質影響，導致測值有超標情況發生。歷次數據顯示，懸浮固體於降雨後常有異常偏高之情形發生，且由本團隊不定期踏勘與空拍結果可知，本測站上游存有一崩塌面(位於乾坑溪上，如圖 3.1-1 所示)，明顯可看到大面積之裸露面，因此當有降雨情形發生，將易受雨水沖刷滑落而使水質懸浮固體濃度偏高。

圖 3.1-1 本計畫水質測站上游空拍探勘結果

針對總磷測值常有不符合乙類水體水質標準之情形，分析主要污染來源係為鄰近農田使用之肥料，且降雨後易受雨水沖刷導致磷分溶

入水體而被測得。本計畫部份水質測站位於清水溪上游河段，根據本團隊 106 年現勘空拍結果(如圖 3.1-2)可發現，其上游污染源主要可分為點源(聚落生活污水)及非點源(農業行為如果園及茶園)，其中非點源部分，因農業行為多會使用農藥殺蟲劑或使用肥料等，其成份多含有機磷及磷酸鹽等，且分析歷年總磷監測結果(如圖 3.1-3 所示)，歷年高值多發生於降雨過後、梅雨及豐水期間，雨水沖刷使的非點源污染進入清水溪，導致總磷測值易有超標情形發生。

另本季南勢坑溪上游(引水隧道出口下游)之 9 月生化需氧量(2.9mg/L)略有超過乙類水體水質標準(2.0mg/L)，檢視歷次監測結果，雖曾有超過法規情況發生，惟近期測值均能符合法規標準，推測本次應屬偶發事件，後續將會持續觀察測值變動情形。

圖 3.1-2 本計畫水質測站上游土地利用現況

3.1.5 交通量

本計畫交通量歷年監測顯示於雲 214 鄉道之路段服務水準，及台 3 省道-149 縣道路口之平均延滯服務水準較差外，其餘各路段及路口交通量皆屬良好至尚可等級，比對歷年交通服務水準與湖山工程之工進狀況如下：

1. 引水路及攔河堰工程分別於 100 年 12 月及 101 年 7 月陸續開工，經比對 149 縣道之交通量服務水準，顯示該工程施工期間並未對鄰近交通造成明顯影響。

2. 材料運輸道路(現已更名為水庫路)封閉施工期間，鄰近道路未測得明顯之交通增量，亦未有明顯之服務水準變化。105 年第 2 季道路開放後，道路服務水準均為 A~B 級。

3. 大壩工程對交通量之影響以當地社區之主要幹道(雲 214 鄉道測站)為例，由歷年監測成果顯示雲 214 鄉道之交通流量自 99 年起有波動較大之狀況，分析可能原因包含：本計畫施工狀況調整(如大壩工程之土方由區內平衡改為價購 1,152,500 方內運)、材料運輸道路開通及當地民眾用路習慣改變，均可能造成交通流量轉移之情形，惟近年之交通量及服務水準均已趨於穩定。

3.1.6 水域生物

一、魚類

(一)河川水域生物

清水溪三處測站中，桶頭吊橋測站種數多能維持在 5~8 種之間，但受上游崩塌地的輸沙影響，使得水體常有混濁現象，且底質易受到泥沙覆蓋的情形仍在，長期而言，對於魚類的生存產生較負面的影響。歷年監測結果在 98 年以後，底棲性的臺灣間爬岩鰍與埔里中華爬岩鰍的數量皆減少的現象，逐漸改游泳性的臺灣石魚賓與粗首馬口鱲及同樣為底棲性的明潭吻鰕虎為主要物種。桶頭橋測站因固床工完成後，使得水流速到此測站後明顯減緩並形成深潭的棲地類型。因此，泥沙會在此處累積並覆蓋棲地的現象非常明顯，導致此測站的魚類種數與數量較為偏少，故 105 年後已鮮少監測到臺灣間爬岩鰍與埔里中華爬岩鰍。桶頭橋下游測站魚類種數與數量相較於另外兩處測站(桶頭吊橋測站與桶頭橋測站)豐富，亦為保育類埔里中華爬岩鰍數量較多的測站。魚類的種數與數量的變動，主要來自於自然因素所造成的棲地環境的變動。本季因為受到 8 月 23~25 日大雨的影響，使得桶頭橋測站與桶頭橋下游測站 9 月監測到魚類的種數及數量都減少。

梅南橋測站雨季與非雨季間的水量變化大，種數與數量的變動較大，93 年第 3 季至 103 年第 4 季之間，數量大多呈現偏少的狀態，惟 105 年第 2 季湖山水庫進入試營運期間後，使得本測站在非雨季時仍保持在有水流的狀態，使得魚類的種數與數量開始有明顯上升的趨勢。本季五河局的工程已經結束並恢復為有水的的狀態，但是因為棲地形態已出現明顯的改變，水體呈現非常混濁的狀態，故本季魚類的種數與數量都較以往減少。

雷公坑溪上游測站因棲地環境穩定，故歷年監測結果於 100 年以後大多能維持在 5 種以上，101 年以後數量則有逐漸增加的趨勢。雷公坑溪下游測站在工程結束後已少有人為擾動的影響，使得棲地環境逐漸穩定，但是因為水流量變動大，所以種數與數

量常有較大的變動。本季雷公坑溪上游測站棲地呈現穩定的狀態，主要是受水域面積增加且流速較快的影響，故魚類的數量較為減少。雷公坑溪下游測站本季因為已經恢復為有水的狀態，故監測到的魚類種數與數量尚屬豐富。

(二)水庫水域生物

水庫區內兩處測站歷年監測結果，魚類無太大差異。本季因為水位上升蓄水量明顯增加，使得水域面積明顯增加，所監測到的魚類數量略微減少。湖山(第二)取出水工附近測站監測到的魚類首次以原生種(粗首馬口鱲)為優勢種。引水隧道出口附近測站的種數與數量雖然較為偏多，但仍在歷年的變化內，魚類也同樣以底棲性的臺灣特有種魚類(明潭吻鰕虎與短吻紅斑吻鰕虎)為主。

二、水生昆蟲

(一)河川水域生物

清水溪的桶頭吊橋測站與桶頭橋下游測站，歷年水生昆蟲都是以耐污性低的種類為主，科數與數量在 103 年以前以「工程擾動」與「自然因素(梅雨、颱風或強降雨)」為主要的擾動因子，104 年以後，隨著桶頭攔河堰大多數工程完工，在擾動逐漸減少之下，自然因素(梅雨、颱風或強降雨)則成為影響水生昆蟲群聚的主要因子。104 年以後水生昆蟲的科數與數量也相對於 103 年以前增加，尤其在非雨季時，科數與數量都更為豐富。桶頭橋測站因為河道在此處轉為開闊再加上桶頭固床工的攔阻，泥沙覆蓋與堆積的情況明顯且持續增加，使得水生昆蟲以較能適應水體混濁與泥沙的物種為主。本季三處測站因為受到降雨的影響，使得水流域面積與水流量都明顯增加，所以科數或數量較為減少。

梅林溪梅南橋測站在 94 年第 1 季至 103 年第 4 季之間，受到水庫工程及河道整治影響，科數與數量都較為減少，但是在 105 年第 2 季水庫進入試營運期間後，梅林溪在非雨季時仍保持有穩定的水流量，使得棲地明顯較為穩定，所以水生昆蟲的科數與數量呈現逐漸增加的趨勢。本季五河局河道景觀工程已完工，目前該測站已恢復為有水的狀態，由於棲地環境已經出現非常大的變動，科數與數量雖大致穩定，但群聚組成已有明顯的轉變。

雷公坑溪上游測站因為棲地環境相對穩定，人為擾動少，且水流量都較為穩定，所以水生昆蟲的科數與數量都較其他測站豐富。從歷年的資料可知，101 年第 4 季以後，科數與數量皆呈現逐漸增加的趨勢，僅 106 年第 3 季因為受到大水影響，棲地產生明顯的變動，使得科數出現明顯的減少。雷公坑溪下游測站，因為水流量變化較大，再加上 103 年以前有明顯的工程擾動，使得科數與數量明顯較少，但是在 104 年工成逐漸完工以後，環境已

逐漸穩定，水生昆蟲的科數也趨於穩定的變動，但是數量因為受到水流量的影響，仍有較大的變動，科數與數量在第 3~4 季水流量較多的期間較為豐富。本季雷公坑溪上游測站水生昆蟲的科數與數量呈現穩定的狀態，而雷公坑溪下游測站也因為恢復為有水流的狀態，所以監測到的水生昆蟲的科數與數量同樣尚屬豐富。

(二)水庫水域生物

水庫區內的湖南(第一)取出水工附近測站與湖山(第二)取出水工附近，其測站環境屬於靜水域，棲地類型為大型石塊與人造的水泥構造物，而且因為蓄水的關係，水位的變動仍大，所以水生昆蟲的科數與數量相對較少。引水隧道出口附近測站的科數雖然相對較為穩定，但是數量上受到引水與否而有較大的變動。於豐水期因水體較為混濁，所以優勢種以適應混濁水體的四節蜉蝣科為主，而枯水期濁度較低時則有扁蜉科成為優勢種的情形。本季水庫區湖南(第一)取出水工附近測站水生昆蟲的科數與數量大致維持穩定的狀態，而湖山(第二)取出水工附近測站的科數雖然大致穩定，但是數量卻較為減少，引水隧道出口附近測站大致都維持穩定。

三、蝦蟹螺貝類

(一)河川水域生物

清水溪三處測站歷年種數與數量變化明顯受到攔河堰工程(102 年)及水流量大且混濁的影響，但是在 103 年第 1 季以後因為工程多數已完工，故數量逐漸增加。另外，桶頭吊橋測站與桶頭橋下游測站的數量在 104 年時達到高峰後，在 105 年第 3 季後數量則有較為減少的現象，主要是受到梅雨與颱風(莫蘭蒂、梅姬)所帶來的大水，導致棲地有大幅度的變動與水體較為混濁所致，但是在 106 年以後較為恢復。本季清水溪三處測站 7 月的種數與數量都屬穩定，但是 9 月時都因水流明顯較大，使得種數與數量都較為減少。

梅林溪梅南橋測站歷年因水流量在雨季與非雨季時變化較大，再加上梅林溪河道整治工程的影響，因此在 103 年以前蝦蟹螺貝類的種數與數量非常稀少，直到 104 年第 3 季以後蝦蟹螺貝類的種數與數量才較為穩定，自 105 年第 2 季湖山水庫開始試營運後，本測站保持在全年皆有水流的狀態，也使得蝦蟹螺貝類的數量較為增加且大致都能維持在 3 種以上。本季雖然恢復為有水的狀態，但是因為棲地型態已經出現非常大的變化，所以種數與數量雖然仍屬穩定，但是優勢種由原先的蝦蟹類轉變為螺貝類，後續將持續監測以了解後續蝦蟹螺貝類種數與數量的變化。

雷公坑溪上游測站因為水流量與環境狀態都較為穩定，因此歷年監測結果的種數與數量都呈現穩定的狀態，僅 100 年第 3 季

至 101 年第 2 季的種數較少，而 106 年第 3 季也因為受到大水影響，種數與數量較為減少。雷公坑溪下游測站在 102 年以前因受到引水路工程的影響，使得種數與數量都較為非常稀少，但是在 104 年引水路工程逐漸完工後，種數與數量都以有明顯的增加，而本測站在有水流的狀態下，數量都已較為豐富。目前兩處測站大多能維持在 3~4 種以上。本季雷公坑溪上游測站本季監測期間棲地大致都呈現穩定的狀態，所以種數與數量都維持穩定的狀態。雷公坑溪下游測站本季河道已呈現有穩定水流的狀態，所以蝦蟹螺貝類的種數與數量大致呈現穩定的現象。

(二)水庫水域生物

水庫區內的湖南(第一)出水工附近測站與湖山(第二)取出水工附近測站的種數在歷次監測中大致穩定維持在 3~5 種與 2~4 種之間，但是數量的變動較大。引水隧道出口附近測站歷次監測的種數大致在 3~4 種之間。本季湖南(第一)出水工附近測站種數較歷次監測偏少，但是數量大致維持穩定，湖山(第二)取出水工附近測站種數與歷次監測結果相比大致穩定，但是數量則較為偏少。引水隧道出口附近測站，本季的種數與歷次監測相比則略微減少，而數量則是歷次監測以來最少的一季。

四、浮游植物

(一)河川水域生物

清水溪三處測站歷年的種數在 103 年以前因為攔河堰工程的影響，浮游植物的種數都較為少，而施工挖掘等過程也使地表的營養鹽也進入水體中提供浮游植物利用，使得浮游植物的數量容易有較大的變動。而 104 年以後攔河堰工程大致結束，浮游植物種數與數量主要受到自然因子(如氣候、雨量與日照時間等)的影響，種數也較 103 年以前增加，而數量的變動也較為穩定。本季三處測站 7 月監測結果與歷次監測相比呈現穩定的狀態，但是 9 月因為水流量與水流速都明顯增加，所以種數或數量都略微減少。

梅南橋測站歷年由於水流量容易受到降雨的影響，因此浮游植物的種數在 103 年以前較為偏少，104 年以後種數較 103 年以前增加，數量在 104 年以後的變動也較為穩定。本季梅南橋測站的工程已經結束並恢復為有水的狀態，監測到的種數與數量大致呈現穩定的狀態。

雷公坑溪上游測站的棲地自監測以來環境大都呈現穩定的狀態，目前大致都能維持在 30 種以上；雷公坑溪下游測站在 104 年第 3 季以後棲地也逐漸穩定下來，在有水流的情形下，種數已逐漸增加，目前大致能維持在 20 種以上。雷公坑溪兩處測站的種數與數量主要受到環境因子的影響。本季雷公坑溪上游測站棲地環境呈現穩定的狀態，水體也維持清澈，但是水流速因為雨季的

關係明顯較快，所以浮游植物的種數與數量與歷年監測結果相比都有略微減少的狀態。雷公坑溪下游測站本季恢復為有水的狀態，但是監測到的浮游植物與 104 年以後的監測結果相比，種數雖然較為減少，但是數量則維持穩定的狀態，與歷年監測結果相比也都還呈現穩定的狀態。

(二)水庫水域生物

水庫區內的湖南(第一)取出水工附近測站與湖山(第二)取出水工附近測站的浮游植物歷次監測結果在種數上大致維持在 15~20 種之間，僅部分季次較少。此兩處測站在 105 年第 2 季時數量都明顯較其他季次高出許多，主要原因在於蓄水初期地表的營養鹽進入水體當中，當時又正值水溫與氣溫轉為溫暖的季節，才使得浮游植物的數量明顯增加。本季水庫區內兩處測站的種數都是自歷次監測以來，數量最多的一季。藻類優養指數(ATSI)計算分別呈現中養與優養的狀態。引水隧道出口附近測站的浮游植物的種數在 105 年第 4 季以後大致呈現穩定的狀態。本季的種數與數量與歷次監測結果相比也呈現穩定的狀態，但未有優勢種。

五、附著性藻類

(一)河川水域生物

清水溪三處測站歷年附著性藻類的種數在 102 年至 103 年受到桶頭攔河堰與桶頭固床工工程的人為擾動與上游崩塌地的輸砂作用導致底質受到泥沙覆蓋，種數明顯較少且變動較大，而 104 年工程大致完工後，種數的變動較趨於穩定，而目前清水溪三處測站的附著性藻類大致都能維持在 25~30 種以上。本季清水溪三處測站監測到的種數與數量與歷年監測結果相比大致維持穩定，主要在於岸邊的緩流區仍有大量附著性藻類大量生長，所以監測到的種數與數量仍屬穩定。藻屬指數(GI)與腐水度指數(SI)的計算結果則是介於輕度至中度污染水質。由歷年監測的結果來看，清水溪也大致處於輕度至中度污染水質。

梅林溪梅南橋測站在 102 年以前因為工程擾動使得附著性藻類的種數明顯溪少，104 年以後種數與數量在水流量穩定的狀態下，已逐漸增加，但是變動的幅度較大，自 105 年第 2 季湖山水庫開始試營運後，因全年保持有常流水的狀態，種數逐漸趨於穩定。本季監測時，五河局河道景觀工程已完工，由前期(107 年第 1 季及第 2 季)無水狀態的環境，現已恢復為有水的狀態，種數與數量也大致維持穩定的狀態，將持續監測種數與數量的變化，以了解附著性藻類的種數與數量恢復穩定的情形。

雷公坑溪上游測站因為環境穩定所以歷年的種數較為穩定，在 104 年以後，僅部分季次的數量有較大的變動；雷公坑溪下游測站在 104 年以後引水路工程完工，環境趨於穩定後，種數也呈

現增加的狀態，目前兩處測站的種數大致都能維持在 30 種以上。本季雷公坑溪上游測站的種數與數量呈現穩定的狀態。藻屬指數(GI)與腐水度指數(SI)的計算呈現輕度污染的狀態，優勢種為低耐污性鼓藻，顯示水質為輕度至中度污染的狀態。雷公坑溪下游測站本季恢復為有水的狀態，所以附著性藻類的種數與數量與與歷次監測結果相比也呈現穩定的狀態。GI 的計算呈現中度污染的狀態，亦無明顯的優勢種。

(二)水庫水域生物

目前水庫區內的湖南(第一)取出水工附近測站與湖山(第二)取出水工附近測站在 105 年的監測皆未監測到附著性藻類，直到 106 年第 3 季以後，附著性藻類的種數與數量才較為穩定，但是仍有部分季次有較大的變動。湖南(第一)取出水工附近測站與湖山(第二)取出水工附近測站本季監測到的種數與歷年監測結果相比大致維持穩定的狀態，但是數量雖然也在歷年的變動之內，但是明顯較為偏多。引水隧道出口附近測站雖然大多可以監測到附著性藻類，但是因為取水與否的影響，水流量的變動非常大，監測到的附著性藻類種數與數量常有較大的變動。本季引水隧道出口附近測站的附著性藻類的種數與數量跟歷年監測結果相比維持穩定的狀態。此外，三處測站藻屬指數(GI)與腐水度指數(SI)的計算結果呈現都介於輕度至中度污染之間。

六、浮游動物

(一)河川水域生物

清水溪三處測站屬於流水域型態的測站，浮游動物不易留在該水域中，所以歷年由於因水流量較大且流數也較快，再加上水體有時經常較為混濁。因此清水溪三處測站的浮游動物大多呈現稀少的狀態。本季清水溪三處測站本季皆未監測到浮游動物，主要原因乃是清水溪原本的浮游動物數量就屬稀少，再加上本季水流量大且流速快，故未採集到浮游動物。

梅林溪梅南橋測站由歷年的監測資料來看，本測站因為水流量變動較大且水流流速屬於稍快的狀態，所以浮游動物的種數與數量變動較大，但相較為其他測站仍屬於較為豐富的測站。於 105 年第 2 季湖山水庫開始進入試營運期間後，本測站全年保持有常流水的狀態，使得種數與數量的變動較為穩定。本季監測到的浮游動物也屬稀少，與之前的監測結果相比大致維持穩定的狀態。

雷公坑溪的浮游動物在歷年監測結果中，兩處測站的種數與數量也大都呈現稀少的狀態，僅少部分季測量較多，無法看出明顯的變化趨勢。雷公坑溪上游測站在 105 年第 4 季至今每季皆有監測到浮游動物，但是雷公坑溪下游測站同樣只有少部分季次監測到浮游動物。本季兩處測站皆未監測到浮游動物，原因應是浮

游動物數量原本就屬稀少，且本季監測正值雨季時間，水域面積增加且流速較快，因此未監測到浮游動物。

(二)水庫水域生物

水庫區內湖南(第一)取出水工附近測站與湖山(第二)取出水工附近測站因為棲地環境屬於湖泊型的靜水域，所以浮游動物的變動情形也較為相似。歷年監測以來，浮游動物的種數與數量相較於溪流型(清水溪、梅林溪、雷公坑溪)的棲地明顯較為豐富，僅少部分季次的數量較少。本季水庫區內兩處測站浮游動物的種數與數量則較為偏少，都在歷年的變化之內。位在南勢坑溪的引水隧道出口測站屬於溪流型水域且水流量變化大，所以浮游動物的種數與數量大多呈現稀少的狀態。本季引水隧道出口測站則未監測到浮游動物，應是受到於本測站的水流速明顯較快，而且容易受到引水時水流量大且流速湍急的影響所致。

七、蜻蜓類

(一)河川水域生物

清水溪三處測站從歷年監測結果在5月至10月之間的數量較為豐富，歷年蜻蜓的種數在1~12種之間，主要都在3~8種之間變動，優勢種以薄翅蜻蜓最為常見。本季清水溪三處測站在7月的數量較為稀少，但是在9月監測到大量成群聚集的薄翅蜻蜓，本季三處測站間測結果，數量為歷年監測以來最多的一次。

梅林溪梅南橋測站歷年由於水量變化大，因此歷年來種數與數量的變動較大，種數在1~12種之間，主要都在3~6種之間變動，但是在105年第2季湖山水庫啟用後，在非雨季也保持有較穩定的水流量，所以蜻蜓的種數與數量有逐漸豐富的現象。優勢種以薄翅蜻蜓與樂仙蜻蜓最為常見。本季因為五河局河道景觀工程已完工，棲地恢復為有水的狀態，蜻蜓的種數與數量也尚屬穩定。

雷公坑溪兩處測站歷年的種數大致在5~11種之間，也是臺灣特有種較為豐富的測站，種數與數量也較鄰近的清水溪三處測站豐富。由於蜻蜓為環境是否穩定的指標之一，雷公坑溪上游測站除了106第3季曾因大水造成棲地明顯的變動外，棲地一直呈現較為穩定的狀態，所以種數與數量較為穩定，僅在105年第1季因為寒害使得數量較為減少。雷公坑溪下游測站在104年的引水路完工後環境也趨於穩定，蜻蜓的數量在有水流的狀態下，也能維持在豐富的狀態。本季雷公坑溪兩處測站排除未監測到蜻蜓的季次，本季兩處測站所監測到的種數與數量都是歷次監測以來最少的一季。雷公坑溪上游測站應是自然的波動，雷公坑溪下游測站因為河床已經乾涸許久，本季雖恢復為有水的狀態，但是蜻蜓的種數與數量仍屬稀少。

(二)水庫水域生物

目前歷次監測中，因為水庫區內的湖南(第一)取出水工附近測站與湖山(第二)取出水工附近測站，因為水位變化仍然較大，而且缺乏可做成蟲產卵與幼蟲生長的棲地環境，所以種數與數量都較為偏少。而本季水庫區內兩處測站種數與數量跟歷次監測比對大致同樣呈現較為稀少但是穩定的狀態。而引水隧道出口附近測站因為棲地的自然度較高，所以蜻蜓的種數與數量相對較為穩定。本季監測到的種數與數量也大致維持穩定的狀態。

八、魚道效益評估

本季監測重點整理，(1)本季監測桶頭攔河堰魚道中的單向籠未捕獲到任何生物，但以電氣法則監測到何氏棘魚、臺灣白甲魚、臺灣石魚賓、臺灣間爬岩鰍與埔里中華爬岩鰍，固床工魚道捕獲埔里中華爬岩鰍；(2)臺灣白甲魚為棲地環境未受阻隔之重要指標物種，本季桶頭攔河堰魚道中仍持續有監測到；(3)固床工魚道因適逢雨季，水流量大且快，故測定流速均大於 2m/s，均大於一般魚類可以利用的流速，故監測到的魚類稀少；(4)固床工上方棲地已呈現游泳性魚類適合生存的環境，固床工下方棲地呈現不穩定的狀況；(5)本季四處測站物種相似度均低於 50%，應為近期降雨量較大所造成的現象；(6)何氏棘魚外來種對水生生物族群問題應持續觀察。

3.1.7 陸域生物

一、哺乳類

水庫集水區物種及數量的波動大致隨工程進展變化，但自 100 年度起使用蝙蝠偵測器，監測種類及數量明顯增加，另外，過往於幽情谷可發現臺灣野豬、食蟹獴等中小哺乳動物活動的活動足跡，但隨本案試營運及蓄水，監測路線變更，後續的中小型哺乳動物發現的痕跡將可能減少。本季哺乳類物種數及數量均在歷季波動範圍內，無明顯差異。進入試營運期間後，擾動已減少，可於水庫周邊多種植原生植物，以增加生物棲地及食物來源。

引水工程區哺乳動物雖隨工程變化波動，但種類及數量尚稱穩定，但於清水溪一側，因番婆夾坑溪環境特性造成局部山坳裸露，其河床兩側的山壁落差高，且因土石不穩，常有滑動，可能不利植物生長及生物通行，可選擇數處有崩塌的邊坡，進行打樁、固坡，並進行栽植及維護，以增加生物活動通道。目前現地已多處進行補植復舊，環境應可逐漸改善，後續應持續監測。

自然生態保留及復育區歷季數量雖有波動，但其物種數及種類大致穩定，將再持續進行監測。

二、兩棲類

水庫集水區物種及數量的波動大致隨工程進展變化，歷次波動大致屬穩定，無明顯差異，除 100 年第 4 季洽逢梭德氏赤蛙大量發生聚集繁殖，造成數量暴增，其餘則屬穩定。本區蓄水後，梭德氏赤蛙棲息的溪流環境將減少或往上游移動，其數量或活動空間將可能變動，故應注意溪流上游的保護，以維持其棲息空間。

引水工程區歷季優勢種優勢物種大致相當，種數及數量除 101~104 年因施工逐漸下降外，其餘無太大波動。本區域測站多屬水量不穩區域，尤其番婆夾坑溪除豐水期有少量水流外，其餘季次多為乾涸，且土石不穩常有波動，可於番婆夾坑溪周邊多種植植物，或於其下游規劃截水池，增加保水時間。

自然生態保留及復育區歷季數量雖有波動，但其物種數及種類大致穩定，將再持續進行監測。

三、爬蟲類

水庫集水區物種及數量的波動大致隨工程進展變化，歷次波動大致屬穩定，無明顯差異，主要為季節性變化。大致而言，除試營運及蓄水處較不適宜爬蟲類活動，其餘區域有較多植被可供爬蟲類棲息。進入試營運期間後，擾動已減少，可於水庫周邊多種植原生植物，以增加生物棲地及食物來源。

引水工程區於施工期間種數及數量均有下降趨勢，雖已有進行綠化工作且已有植物自然進駐，但因時間尚短，目前數量尚未恢復，可堆置石組或是利用枯倒木，營造適宜爬蟲類活動的空間。

自然生態保留及復育區歷季數量雖有波動，但其物種數及種類大致穩定，將再持續進行監測。

四、鳥類

水庫集水區於施工初期因環境變化較大，物種及數量明顯較少，隨工程影響範圍固定，數量逐漸回升，並於 105 年度因多數工程已結束，其物種及數量為歷年最高，大體上鳥類變化隨季節及施工影響狀況而波動。過往保育類物種記錄 20 種，包括魚鷹、朱鸝、藍腹鷴、東方蜂鷹、大冠鷲、赤腹鷹、鳳頭蒼鷹、松雀鷹、灰面鵟鷹、林鵰、褐鷹鴞、領角鴞、黃嘴角鴞、八色鳥、臺灣藍鵲、鉛色水鶇、白尾鴝、臺灣山鷓鴣、燕鴴及紅尾伯勞。大致而言，多數保育物種仍可發現，但八色鳥數量近年偏低，臺灣藍鵲、鉛色水鶇、臺灣山鷓鴣、燕鴴，於近幾年並未發現，可能與棲地形態變化有關，仍須再持續注意。進入試營運期間後，擾動已減少，可於水庫周邊多種植原生植物，以增加生物棲地及食物來源。

引水工程區於施工期間種數及數量均有下降趨勢，但隨施工後其及進入試營運期間，環境逐漸穩定，數量有逐漸回復趨勢，將再持續關注。

自然生態保留及復育區過往雖未進行施工，但因緊鄰水庫集水區，因此過往數量仍有局部隨季節變化及工程進度略有波動，但整體而言仍屬穩定，建議於可於規劃的步道兩側、坡面等開闊或大面積芒草區，種植具鳥餌、誘蝶、食草等功能的原生灌木或喬木，以提供生物利用。

五、蝴蝶類

水庫集水區監測結果，種數及數量僅有小幅度波動且以季節性變化為主。整體而言，蝴蝶類種數尚屬穩定，而隻數自 102 年第 4 季開始有逐漸減少的趨勢，而 103 年第 3 季隻數雖有回升，但仍然偏低，可能與 103 年部份測線(如 G3~G6)開始施工，造成植被遭剷除、揚塵，讓蝴蝶類食物來源減少。105 年第 2 季起種數恢復情況良好，數量雖有持續回升，但仍不及 102 年第 4 季之前之數量。進入試營運期間後，擾動已減少，可於水庫周邊多種植原生植物，以增加生物棲地及食物來源。

引水工程區種數及數量僅有小幅度波動且以季節性變化為主。整體而言，蝴蝶類種數尚屬穩定，而數量逐漸下降，推測可能因監測時於引水工程區測站 1、2 有記錄明顯的人為整地，而引水工程區測站 3 則因土石較不穩常有變動，河床上植物生長不良，造成蝴蝶類較少靠近。

自然生態保留及復育區歷季數量雖有波動，但其物種數及種類大致穩定，將再持續進行監測。

3.1.8 陸域植物

由歷季監測結果可知，其物種數為歷季累加資料，僅記錄曾出現或現有物種，較無法觀測出季節變化所造成之影響；歷季所增加之物種多為原生種並有部分的歸化種及栽培種。

引水工程區因夏季豪雨造成土石崩落，部分植被破碎化，產生明顯的裸露地，107 年第 1 季監測時發現裸露地區有大量的小花蔓澤蘭覆蓋，但本季監測發現覆蓋度相對降低，由於小花蔓澤蘭主要繁殖季為 10 月至翌年 2 月，本季監測時非其繁殖季，因此覆蓋度較低，但小花蔓澤蘭拓殖能力強且喜好陽光，可在光度較強的裸露地迅速蔓延，因此後續變化仍需密切關注。

3.1.9 因應對策與建議

一、水質水量

本案於進入試營運期間進行蓄水作業，建議應定期於低水位期間清除邊坡草生地植被，以避免遭淹沒後帶入大量有機質，影響蓄水水質。

二、水域生物

(一)本季梅南橋測站五河局河道景觀工程已完工，現已恢復為有水流的狀態，惟棲地已明顯的改變，水域面積雖增加，但由原本的流水域轉變為靜水域，且水體也呈現混濁的狀態，導致監測到的魚類種數與數量都明顯減少。梅南橋測站在本測站的上下游河道均設立數條橫斷河道之水泥構造物(固床工)，造成下游水量偏少，推測非雨季時，下游可能出現斷流的情形。主要原因為五河局工程，使得原先具有高低落差複雜的棲地已被整平成開闊的平面，造成原先是河道有寬有窄的複雜流水與型態，轉變為水體幾乎呈現靜止的狀態，目前水體只能以溢流的方式越過固床工。本測站曾監測到一次但僅 1 隻次的洄游性的魚類(花鰻鱺)，但是該人工構造物並未設置魚道或提供縱向移動的相關設施，對於魚類的縱性移動是否產生影響仍無法確定。由於完工後目前僅有一季的監測資料，對於上述可能發生的情形仍需有其他季次的監測資料才能確定。因此，建議持續監測水生生物後續種數與數量的變化，以確認該人工構造物是否產生影響。另外，本測站在非雨季時因為降雨量不足，以致水流量明顯減少，使得水質會出現略微轉差的現象，除了設法減少外源性污水流入本區外，可於非雨季(11 月至隔年 5 月)時，建請湖山水庫管理中心協調相關單位增加放水量，以提高梅林溪下游的生態基流量，增加水體的流動性，避免水體靜止且營養鹽濃度升高，促使有機物質累積，導致水質變差或優養化的現象。

(二)水庫區方面，本季湖南(第一)取出水工附近測站與湖山(第二)取出水工附近測站分別呈現「中養」與「優養」。觀察水體狀態，發現透明度仍偏高且水色呈現藍灰色，因此，建議多加留意該處水質變化，尚不需要引進魚類來降低水質優養化的問題。此外，由於水庫區內的水源將引自清水溪，所以清水溪的水質變化也同樣需要持續進行監測，並進行水源與水質的管控。

(三)水庫區內監測到魚類歷季以來仍是以外來種魚類為主，其中也包含掠食性的線鱧，但目前仍只有監測到零星個體，未見大型的成體或大量聚集的魚苗。將持續監測以了解數量變化情形，詳述如下：

1.對於水庫區數量過多或對於原生種產生生存上威脅的外來種之種數與數量應進行長期的監測，並提出外來種問題及相關建議，供管理部門參考。

2.除了長期的監測及民眾的環境教育外，可委由當地的環保或社區團體或其他專責單位進行定期的捕抓以抑制外來種數量的方式降低其威脅。由於湖山水庫仍屬管制區域，若要委由當地環保或社區團體或其他專責單位進行，應取得管理單位同意後方可進行。程建中等於 100 年也曾以延繩釣的方式在龍鑾潭捕抓線鱧，墾丁國家公園於 104 年曾與社區合作，試辦以人工放置籠具與垂釣的移除方式在龍鑾潭移除外來種。黃大駿等於 106 年與 107 年亦於龍鑾潭利用路亞(擬餌)釣法、延繩釣法與籠具(蝦籠、長沉籠)等方式進行線鱧與其他外來種的移除。上述方法除了可委由學術或專業團體進行之外，也可於適當的教學後，委由當地的環保或社區團體進行長期移除，以抑制外來種的數量，減少外來種對原生種的影響。相關操作方法與時機及頻率包括：

(1)個體數抑制

A.一般漁法：定置網用於沿岸附近誘導目標魚種進入網內來進行捕獲；手拋網及刺網都具有網目選擇性，可選擇不同網目捕捉不同體型之目標魚種。手拋網之機動性較高，於大部分地方均可以操作，但對於水草茂盛及障礙物多之水域較難施行，且此方法較具技巧性，需熟稔技術俾提高漁獲效率；刺網為帶狀之漁具，利用阻斷魚群游動路徑來進行捕捉，但使用時須事先申請許可。

B.誘餌漁法：該法亦稱為路亞釣法，以模擬魚類、蝦及昆蟲等生物，引誘魚類攻擊魚餌的釣法。該方法機動性高，可在發現魚蹤後再加以引誘，並可根據目標魚種及大小的不同更換不同的誘餌以降低誤捕的機率。同時也可以減少使用傳統活體魚餌因脫鉤而進入水庫當中，形成新的外來種。黃大駿等於龍鑾潭移除的結果也發現路亞釣法對於線鱧的誘捕具有一定的效果，尼羅口孵非季則以長沉籠的效果較佳。

C.延繩釣法：該法主要用於海洋漁業，但是加以改良後則可用於湖泊水庫。使用方式同樣是在主繩上綁上若干數量的副繩，每一條副繩則綁有一只魚鉤，每一個魚鉤皆有魚餌，放置於水深

較深的水域至少一天一夜誘捕掠食性魚類。

(2)時機及頻率

線鱧的繁殖期主要出現在夏季的 4~9 月可於該期間以網具捕撈幼體與成魚(梁與謝，2012)。吳郭魚於水溫 20 度以上開始繁殖，而 25-32 度為最適宜水溫，因此同樣可於 4~9 月進行捕撈(行政院農委會吳郭魚主題館)。而黃大駿等人在龍鑾潭的移除結果發現在 4 月與 5 月線鱧正要進入繁殖期且雨季來臨前，以路亞釣法對於線鱧的誘捕具有一定的效果，尼羅口孵非鯽則以長沉籠的效果較佳。

依據目前監測資料來看，外來種數量不多，且湖山水庫水域面廣大且深，因此可先嘗試前述方式，建議移除頻率可兩個月進行一次，移除期間則密集的以上述方法操作 3-5 天捕抓線鱧，雖無法完全移除線鱧，但至少抑制其數量，往後則可再視外來種數量調整移除時間與頻率。

目前水庫區的監測資料僅有沿岸三處，因此建議仍應先持續監測外來種的族群數量，並增加監測測站，以了解外來種於何時與何處測站較多，以便未來進行移除作業時，能結合相關資料以達到抑制或移除的目標。

(3)來源釐清

引水隧道出口位於南勢坑溪，陳榮宗於 2007 年至 2008 年在南勢坑溪的調查並無外來種存在，而集水區其他溪流(崙尾坑溪與土地公坑溪)亦無外來種的調查紀錄。但是該次調查的測站位在距離本測站下游約 600 公尺處，而兩處測站之間尚有落差超過 2 公尺以上的壩體。因此若在引水隧道測站上游的南勢坑溪監測到外來種魚類則可判斷庫區內的部分外來種魚類，可能是順著水流進入到庫區，若是引水隧道測站上游的南勢坑溪未監測到外來種魚類，則可判斷庫區內的外來種魚類原先即已存在於庫區內。因此建議由監測團隊於南勢坑溪，即引水隧道測站上游進行 1~2 次的補充監測，以確認庫區內的外來種是由南勢坑溪進入庫區，或是庫區內原先即有尼羅口非非鯽或線鱧等外來魚種。此外，後續也應有長期監測累積資料以供往後分析魚類群聚的變化。

(四)本季桶頭攔河堰魚道的監測中，仍持續監測到臺灣白甲魚，但是單向籠則未監測到魚類或蝦蟹類。固床工魚道也僅以電魚法監測到 1 隻次的埔里中華爬岩鰍，由於固床工本季水流量較上一季明顯增加，使得流速均超過 2m/s，已大於一般魚類可以利用的流速，為本次監測值得注意地方。若清水溪環境中無太大的變動(如颱風或梅雨等帶來的大水)，四處測站的物種組成相似度應維持在 50%以上，顯示具有魚道的桶頭攔河堰並無太大的縱向性阻隔。因此，颱風或強降雨過後，大多數的水生生物

因順著大水往下游棲地移動，部分區域洄游的種類是否可以利用魚道快速使各棲地的族群恢復，為後續觀察的重點。

三、陸域生物

本計畫湖山水庫處於試營運及蓄水期間，造成爬蟲類棲息空間減少及改變，且蓄水初期，爬蟲類將向水庫蓄水區外移動，現階段水庫蓄升速度慢，且已暫時穩定水位，可明顯減少爬蟲類傷亡，未來進入營運階段或水位有明顯變化，仍應減緩水位變化速度，以增加生物適應或移動時間。

有關引水工程區，針對生態保育措施部份可規劃持續設置生態池或水盆，提供兩棲類繁殖及利用；目前雖已完工，但生物族群量尚未完全恢復，建議可多種植植物增加生物食物來源及躲藏棲地，並堆置石組或是利用枯倒木，營造適宜爬蟲類活動的空間；鳥類方面建議以具生態功能及多樣化的植栽進行復育或營造，以提供生物覓食及棲息空間。

自然生態保留及復育區近期的綠美化工程於本區進行施工，可能會對生物造成影響，後續應加強注意，並多種植原生植物，以提供生物利用。並建議在各區應可多種植蝴蝶喜好的蜜源植物及食草植物如黃荊、方骨消、杜虹花、龍船花...等，以吸引蝴蝶利用及繁殖。此外，由於環境的變化，未來植被復育除利用原生種外，本區域開闊的環境及過往大量人車進出，可能會有較多的外來物種進駐及擴散，應加強控管，以避免影響擴大。

小花蔓澤蘭屬陽性物種且拓殖力強，喜好於陽光充足的區域，各文獻均指出小花蔓澤蘭並無法完全移除，僅能長期抑制，降低拓植力。本案過往施工的引水道工程周邊及水庫集水區周邊開闊處，因棲地已多處呈現開闊，易造成小花蔓澤蘭大量繁殖，且於春夏季氣溫高且降雨量豐富的季節，常為其快速增生的時機，建議可參考特生中心資料(http://conservation.forest.gov.tw/aspropaganda)，於其開花結果前進行人工移除。建議在每年 8 月及 10 月各進行 1 次刈草、切蔓和拔蔓，刈草和切蔓高度為 50 公分左右，地表蔓藤儘量拔除，並清離林地或集中加以覆蓋、遮蔭以防再次萌蘖。拔蔓時宜連根拔起，儘量將蔓藤清除乾淨，若只是將藤蔓拉斷散落現場，以小花蔓澤蘭旺盛的繁殖能力很可能重新生根，難以發揮防治成效。依據現場調查及小花蔓澤蘭習性，歷季調查小花蔓澤蘭分佈區域多位處林緣，且有短草叢區域(約 1 公尺左右)，此環境可提供小花蔓澤蘭攀爬環境、日照充足(芒草區因生長較高，小花蔓澤蘭生長初期並不佔優勢)，且人為擾動相對較少，其他區域雖亦有分佈，但較少大面積生長；因此，本案小花蔓澤蘭生長較旺盛的區域，大致位於引水工程區的番婆夾坑溪、水庫集水區的維修道路旁(樹林旁)等區域，另外，小花蔓澤蘭種子多，常以土壤種子庫方式存在，如以人力清除後，需持續關注，以免因裸露，種子快速萌發。

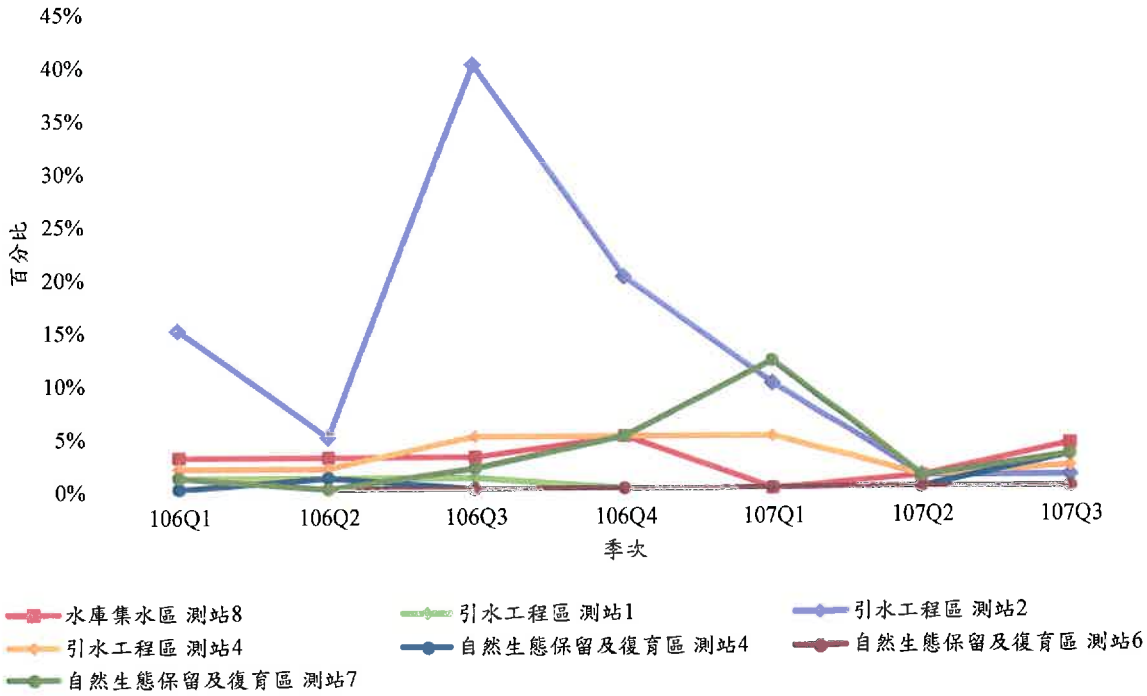

圖 3.1-3　歷年小花蔓澤蘭覆蓋度變化

3.2 監測結果異常現象因應對策

一、上季異常環境監測結果與因應對策(參見表 3.2-1)

二、本季異常環境監測結果與因應對策(參見表 3.2-2)

表 3.2-1　上季監測之異常狀況及處理情形

異常狀況	因應對策	執行成效
一、環境噪音 本季噪音於引水隧道入口(桶頭端)、引水隧道出口(庫區端)、桶頭國小、梅林國小及瑞竹國小有超標狀況，其餘測值均能符合相關之音量標準。	・根據現場紀錄顯示，引水隧道出口(庫區端)之現場環境噪音源主要為水流聲。 ・引水隧道入口(桶頭端)、桶頭國小及瑞竹國小之現場環境噪音源於夜間主要為蟲鳴鳥叫聲。 ・梅林國小於日間時段之均能音量有超標狀況，經現場監測錄音資料分析，主要噪音源為學校學童活動之聲音，判斷此乃造成監測值超標之原因。	部分測站日間測值受居民及國小校內活動而有超標之情形；部分晚間及夜間測值因受蟲鳴聲等自然背景音影響而有超標狀況發生。
二、河川水質 河川水質於清水溪流域 4 月及 6 月、梅林流域 6 月皆有部份測站懸浮固體及總磷測項超標。	針對懸浮固體超標部份，清水溪流域超標推測主要因採樣前幾日有降雨情形，且由於清水溪流域地質脆弱，導致受雨水沖刷易使水體懸浮固體測值升高；另 6 月引水隧道出口上游水質受降雨影響，懸浮固體略有升高，下游水質因承接引水道(水流速快及沖刷，流量量測為 144 m^3/min)且受上游影響，因此導致測值有超標情況發生，另梅林溪壩下游持續受上游水質影響，導致測值亦有偏高情形。歷次數據顯示，降雨後常有異常偏高之情形。 針對總磷測值常有不符合乙類水體水質標準之情形，分析主要污染來源係為鄰近農田使用之肥料，且降雨後易受雨水沖刷導致磷分溶入水體而被測得。	河川水質於梅林溪及清水溪流域皆有部分測站懸浮固體及總磷測項超標。

表 3.2-2　本季監測之異常狀況及處理情形

異常狀況	原因分析與因應對策或後續追蹤
一、空氣品質 本季監測結果除7月桶頭國小、8月北勢坑溪民宅之O_3 8小時有超標之情形，其餘均符合空氣品質標準。	・桶頭國小及北勢坑溪民宅之O_3 8小時超標情形，比對鄰近同時段之環保署斗六空品站(60ppb 及58ppb)與竹山空品站(65ppb 及 62ppb)均有超標或偏高，顯示臭氧濃度偏高與大環境之影響有關。
二、環境噪音 本季噪音於引水隧道入口(桶頭端)、引水隧道出口(庫區端)、玉當山及瑞竹國小有超標狀況，其餘測值均能符合相關之音量標準。	・根據現場紀錄顯示，引水隧道出口(庫區端)之現場環境噪音源主要為水流聲。 ・引水隧道入口(桶頭端)及瑞竹國小之現場環境之夜間噪音源主要為蟲鳴聲。 ・玉當山於日間時段之均能音量有超標狀況，經現場監測錄音資料分析，主要噪音源為鄰近居民之廟會活動，晚間及夜間則主要為蟲鳴之聲音，判斷此乃造成監測值超標之原因。
三、地面水質 本季除桶頭攔河堰上游(桶頭吊橋)之大腸桿菌群略有高於飲用水水源水質標準外，其餘測站測值均能符合保護人體健康基準及飲用水水源水質標準。	由於桶頭吊橋測站屬本計畫之上游水質背景測站，且河道兩旁仍有民宅，因此可能會受到生活污水排入之影響。另比對環保署水質測站(桶頭攔河堰)測值，其近期測值介於<10~2.7x10^4CFU/100mL，亦有部分測值超過法規標準，顯示上游水質有受沿線居民活動影響之虞。
四、河川水質 河川水質於梅林溪流域及清水溪流域皆有懸浮固體及總磷測項超標；另梅林溪9月份有測站生化需氧量有超標情況發生。	針對本季梅林溪流域之南勢坑溪上游兩站(引水隧道出口上、下游)與清水溪流域各測站懸浮固體均有超標情況，清水溪流域超標主要因採樣前幾日午後有降雨情形，且由於清水溪流域地質脆弱，導致受雨水沖刷易使水體懸浮固體測值升高；另引水隧道出口上游水質受降雨影響，懸浮固體亦有升高情況發生，而下游測站水質除持續受上游水質影響外，因該河道亦承接引水道之水源，於採樣期間引水道之上游 (桶頭地區)同時有降雨情形，因此引水道水流量明顯偏高(115.2~2,022.6 m^3/min)，因此受水流持續沖刷及上游水質影響，導致測值有超標情況發生。由歷次數據顯示，懸浮固體於降雨後常有異常偏高之情形發生。針對總磷測值常有不符合乙類水體水質標準之情形，分析主要污染來源係為鄰近農田使用之肥料，且降雨後易受雨水沖刷導致磷分溶入水體而被測得。 另本季南勢坑溪上游(引水隧道出口下游)之 9 月生化需氧量(2.9mg/L)略有超過乙類水體水質標準(2.0mg/L)，檢視歷次監測結果，雖曾有超過法規情況發生，惟近期測值均能符合法規標準，推測本次應屬偶發事件，後續將會持續觀察測值變動情形。

參考文獻

參考文獻

1. 山岸高旺，1998。淡水藻類寫真集，內田老鶴圃，日本。
2. 川合禎次，1985。日本產水生昆蟲檢索圖說，東海大學出版社，409 頁。
3. 中央研究院之台灣魚類資料庫(http://fishdb.sinica.edu.tw/)。
4. 中央研究院生物多樣性研究中心，2005。翡翠水庫藻類與水質關係之長期監測(V)，台北翡翠水庫管理局委託計畫。
5. 中央研究院生物多樣性研究中心之台灣貝類資料庫(http://shell.sinica.edu.tw/)。
6. 水野壽彥，1980。日本淡水圖鑑，保育社，日本。
7. 王嘉雄、吳森雄、黃光瀛、楊秀英、蔡仲晃、蔡牧起、蕭慶亮，1991。台灣野鳥圖鑑，亞舍圖書有限公司。
8. 王漢泉，2002。台灣河川水質魚類指標之研究，環境檢驗所環境調查研究年報，9:207-236。
9. 台灣生物多樣性資訊入口網 http://taibif.tw/
10. 台灣省農業試驗所(編)，1996。台灣昆蟲分類學研究現況，87 頁。
11. 巨廷工程顧問股份有限公司，2006。斗六堰魚道效益評估與改善方案規劃報告。經濟部水利署中區水資源局。
12. 巨廷工程顧問股份有限公司。2008。97 年度斗六堰魚道改善後水域生態監測追蹤。經濟部水利署中區水資源局。
13. 民享環境生態調查有限公司。2012。重點河川污染整治生態調查計畫-濁水溪、新虎尾溪、北港溪、愛河及阿公店溪流域。環保署委託調查計畫。
14. 田志仁，汪碧涵，2000。淡水多樣性調查方法與評估指標，東吳大學微生物學系，50 期。
15. 交通部運輸研究所，1991。台灣地區公路容量手冊技術報告。
16. 向高世，2001。台灣蜥蜴自然誌，大樹文化。
17. 朱達仁，2006。溪流複合式指標評估模式之建構。特有生物研究，8(1): 35-56。
18. 朱賢斌，1999。爬蟲類調查方法介紹及應用，台灣省特有生物研究保育中心，野生動物資源調查方法研習會手冊，83-93 頁。
19. 艾奕康工程顧問股份有限公司，2013。急水溪河川情勢調查，經濟部水利署水利規劃試驗所委託調查計畫。
20. 行政院農委會特有生物研究保育中心，1996。保育類野生動物圖鑑，行政院農業委員會。
21. 行政院農委會特有生物研究保育中心，2007。「湖山水庫工程計畫生態保育措施—森林、溪流生態系統之調查研究計畫」(96 年度工作計畫)成果報告書。

22. 行政院農委會特有生物研究保育中心，2014。「湖山水庫工程計畫生態保育措施—森林、溪流生態系統之調查研究計畫」(103 年度工作計畫)成果報告書。
23. 行政院農業委員會，2017。保育類野生動物名錄。
24. 行政院農業委員會特有生物研究保育中心，2012。臺灣維管束植物紅皮書初評名錄 A Preliminary Red List of Taiwanese Vascular Plants。
25. 行政院環保署環境檢驗所，環境檢測方法。
26. 行政院環境保護署，2002。植物生態評估技術規範。
27. 行政院環境保護署，2003，水中浮游植物採樣方法－採水法(NIEA E505.50C)，環署檢字第 0920067727A 號公告。
28. 行政院環境保護署，2011。動物生態評估技術規範。
29. 行政院環境保護署，地面水體分類及水質標準，1998 年 6 月 24 日修正公布，環署水字第 0039159 號令修正。
30. 行政院環境保護署，放流水標準，2016 年 1 月 6 日修正公布，環署水字第 1040110356 號令修正。
31. 行政院環境保護署，空氣品質標準，2004 年 10 月 13 日修正公布，環署空字第 0930072220 號令修正。
32. 行政院環境保護署，開發行為環境影響評估作業準則，2004 年 12 月 22 日修正公布，環署綜字第 0930092953 號。
33. 行政院環境保護署，噪音管制區劃定作業準則，2009 年 9 月 4 日行政院環境保護署環署空字第 0980078181 號令訂定發布。
34. 行政院環境保護署，噪音管制標準，2009 年 9 月 4 日環署空字第 0980078173 號修正。
35. 行政院環境保護署，環境保護法令彙編，1998 年。
36. 行政院環境保護署，環境音量標準，2010 年 1 月 21 日行政院環境保護署環署空字第 0990006225D 號令、交通部交路字第 0990085001 號令會銜修正發布。
37. 行政院環境保護署，環境影響評估法，2003 年 1 月 8 日修正公布，環署綜字第 09100255720 號。
38. 行政院環境保護署，環境影響評估法施行細則，2005 年 6 月 17 日修正公布，環署綜字第 0940045359D 號。
39. 行政院環境保護署，環境影響評估環境監測報告書格式，1997 年 5 月 26 日公告。
40. 行政院環境保護署環境檢驗所，2011。河川底棲水生昆蟲採樣方法(NIEA E801.31C)，環署檢字第 1000109874 號公告。
41. 吳俊宗、高麗珠、周晉文，1998。翡翠水庫浮游藻與水質關係研究(3)，臺北翡翠水庫管理局委託研究計畫。

42. 呂光洋、杜銘章、向高世，1999。台灣兩生爬行動物圖鑑，中華民國自然生態保育協會。
43. 汪良仲。2000。台灣的蜻蛉。人人出版社。
44. 沈世傑。1993。臺灣魚類誌。國立臺灣大學動物學系。
45. 亞太環境科技股份有限公司，2008，97 年度河川環境水體整體調查監測計畫，行政院環境保護署委託計畫。
46. 周立志、宋榆鈞、王岐山、馮紹周，1998。仙八色鶇繁殖習性及雛鳥生長的研究，東北師大學報 3:84-88。
47. 周政翰，2004。台灣地區鼠耳蝠屬分類地位，私立東海大學生物學研究所碩士論文。
48. 松木和雄，1978。台灣產春蜓科稚蟲分類之研究，台灣省立博物館科學年刊 21:133-180。
49. 林良恭、趙榮台、陳一銘、葉雲吟，1998。自然保護區域資源調查監測手冊，行政院農業委員會。
50. 林春吉。2007。臺灣淡水魚蝦（上、下），天下文化出版社。
51. 林春富，1999。兩生類調查方法介紹及應用，台灣省特有生物研究保育中心，野生動物資源調查方法研習會手冊，76-82 頁。
52. 林斯正。1999。台灣產蜻蜓科(蜻蛉目)幼蟲分類研究。私立東海大學生物系碩士論文。
53. 林曜松、梁世雄，1996。台灣野生動物資源調查-淡水魚資源調查手冊，行政院農業委員會，181 頁。
54. 祁偉廉，1998。台灣哺乳動物，大樹出版社。
55. 邵廣昭、陳靜怡，2004。魚類圖鑑，遠流出版社，444 頁。
56. 邵廣昭、陳靜怡。2005。魚類圖鑑-臺灣七百多種常見魚類圖鑑，遠流出版社。
57. 邵廣昭、彭鏡毅、吳文哲主編，2008。2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄。行政院農業委員會林務局。
58. 津田松苗(編)，1962。水生昆蟲學。
59. 胡鴻鈞、魏印心，2006。中國淡水藻類--系統、分類及生態。科學出版社，北京。
60. 徐堉峰，2000。台灣蝶圖鑑第一卷。鳳凰谷鳥園。
61. 徐堉峰，2002。台灣蝶圖鑑第二卷。鳳凰谷鳥園。
62. 徐堉峰，2006。台灣蝶圖鑑第三卷。鳳凰谷鳥園。
63. 徐國士，1980。台灣稀有及有絕滅危機之植物。台灣省政府教育廳。
64. 徐國士，1988。臺灣野生草本植物。臺灣省政府教育廳。
65. 徐國士、柳榗、呂勝由、楊遠波、 林則桐、邱文良，1987。台灣稀有植物群落生態調查。行政院農業委員會。

66. 徐歷鵬，1997。台灣地區毛翅目昆蟲之分類研究，私立東海大學生物系博士論文，3706pp。
67. 特有生物研究中心。2013。卡社溪魚類多樣性調查與外來種移除計畫。行政院農業委員會林務局南投林區管理處委託計畫。
68. 康世昌，1993，台灣的蜉蝣目（四節蜉蝣科除外），國立中興大學昆蟲學研究所博士論文。
69. 張世倉、林斯正、邱啓銘、楊吉宗、李德旺。1997。「烏石坑溪棲地改善之研究(2/5)」。行政院農業委員會特有生物研究保育中心 86 年度試驗研究計畫成果。
70. 張世倉、林斯正、葉明峰、李訓煌。1998。「烏石坑溪棲地改善之研究(3/3)」。農委會特有生物研究保育中心 87 年度試驗研究計畫成果。
71. 張永仁，1999。昆蟲圖鑑，遠流出版社。
72. 曹美華、葉文琪、陳賜隆。2005。臺灣 120 種蜻蜓圖鑑。社團法人臺北市野鳥學會，臺北市。
73. 梁世雄，2005。淡水水域生物監測之採樣器材介紹及資料分析與應用，高雄師範大學生物科學研究所
74. 梁世雄、謝寶森，2012。應優先管理入侵外來種魚類及鳥類治理手冊之編寫，行政院農業委員會林務局。
75. 莊明德、林志明、余嘉娟。2004。水利工程對生物群聚影響之研究— 以赤蘭溪為例。臺灣水利，52(2): 82-91。
76. 莊明德、陳賜賢、李德旺。2008。八寶圳試驗魚道研究站試驗成果回顧與案例應用-以北勢溪防砂壩魚道改善設計為例。中華民國溪流環境協會第九屆第二次會員大會暨生態工程與溪流環境保育研討會。
77. 許建昌，1971。臺灣常見植物圖鑑，I-庭園路旁耕地的花草。臺灣省教育會。
78. 許建昌，1975。臺灣常見植物圖鑑，VII-臺灣的禾草，臺灣省教育會。
79. 許富雄，1999。兩生類及爬蟲類之調查方法，台灣省特有生物研究保育中心，野生動物資源調查方法研習會手冊，69-75 頁。
80. 許富雄、姚正得，1999。鳥類資源調查方法，台灣省特有生物研究保育中心，野生動物資源調查方法研習會手冊，49-68 頁。
81. 郭城孟，1997。台灣維管束植物簡誌第壹卷，行政院農業委員會。
82. 陳文德。2011。臺灣淡水貝類。國立海洋生物博物館，屏東縣。
83. 陳義雄、方力行，1999。台灣河川湖泊魚類的生態特性與棲地現況。
84. 陳義雄、方力行，1999。台灣淡水及河口魚類誌，國立海洋生物博物館籌備處。
85. 陳義雄、陳詠青，2005。台灣淡水魚類原色圖鑑第壹卷鯉形目，水產出版社。
86. 陳義雄、黃世彬、劉建秦。2010。臺灣的外來入侵淡水魚類。臺灣的外來入侵淡水魚類，基隆市。

87. 陳義雄。2009a。臺灣河川溪流的魚類指標—初級淡水魚類。國立臺灣海洋大學，基隆市。

88. 陳義雄。2009b。臺灣河川溪流的魚類指標—兩側洄游淡水魚類。國立臺灣海洋大學，基隆市。

89. 程建中、陳炤杰、郭耀綸、邱郁文、張珩、傅耀賢、黃大駿、蔡哲民、王建仁、沈英謀、陳淵琮，100 年度墾丁國家公園陸域長期生態監測計畫(龍鑾潭重要濕地長期生態監測)，墾丁國家公園管理處委託研究計畫。

90. 黃大駿、梁世雄、邱郁文、左承偉。2017。106 年度墾丁國家公園龍鑾潭重要濕地(國家級)外來種魚類移除計畫。墾丁國家公園辦理計畫。

91. 楊平世，1992，水棲昆蟲生態入門，台灣省政府教育廳。

92. 楊平世、黃國靖、謝森和，1990。北勢溪之水棲昆蟲資源及生態研究(Ⅰ)水棲昆蟲相及其相關生態，中華昆蟲，10:209-224。

93. 楊平世、黃國靖、謝森和，1990。北勢溪之水棲昆蟲資源及生態研究(Ⅱ)水文因子及水棲昆蟲之羣聚結構，中華昆蟲，10:249-269。

94. 楊遠波、劉和義、呂勝由，1997。台灣維管束植物簡誌第貳卷，行政院農業委員會。

95. 楊遠波、劉和義、林讚標，2003。台灣維管束植物簡誌第伍卷，行政院農業委員會。

96. 楊遠波、劉和義、施炳霖、呂勝由，1998。台灣維管束植物簡誌第參卷，行政院農業委員會。

97. 楊遠波、劉和義、彭鏡毅、施炳霖、呂勝由，1998。台灣維管束植物簡誌第肆卷，行政院農業委員會。

98. 經濟部水利處水利規劃試驗所，2000。「雲林縣湖山、湖南水庫環境影響評估報告書（定稿本）」，經濟部水利處水利規劃試驗所。

99. 經濟部水利署中區水資源局，1996-2011。「湖山水庫工程施工期間環境監測季報告」。

100. 劉小如、丁宗蘇、方偉宏、林文宏、蔡牧起、顏重威。2010。台灣鳥類誌。行政院農業委員會林務局。

101. 劉棠瑞，1960。臺灣木本植物圖誌，國立臺灣大學農學院。

102. 劉棠瑞、蘇鴻傑，1983。森林植物生態學，臺灣商務印書館。

103. 劉瓊蓮，1993。臺灣稀有植物圖鑑(Ⅰ) ，臺灣省林務局。

104. 潘致遠、丁宗蘇、吳森雄、阮錦松、林瑞興、楊玉祥、蔡乙榮。2017。2017 年台灣鳥類名錄。中華民國野鳥學會。台北，台灣。

105. 鄭錫奇，1999。陸域哺乳類調查方法介紹與物種特徵辨識，台灣省特有生物研究保育中心，野生動物資源調查方法研習會手冊，32-48 頁。

106. 鄭錫奇、方引平、周政翰。2010。臺灣蝙蝠圖鑑。行政院農委會特生中心。

107. 賴景陽。1988。貝類(臺灣自然觀察圖鑑)。渡假出版社有限公司，臺北市。

108. 賴景陽。1998。貝類（二）。渡假出版社，臺北市。

109. 濱野榮次，1987。台灣蝶類大圖鑑，牛頓出版社。

110. Barbour, M. T., Gerritsen, J., Snyder, B. D. and Stribling, J. B. 1999. Rapid Bioassessment protocols for Use in streams and wadeable rivers: periphyton, benthic macroinvertebrates, and fish. US. Environmental Protection Agency, Washington, DC.

111. Birdlife International. 2001. Threatened Birds of Asia: the Birdlife International Red Data Bool. Cambridge, UK: Birdlife International.

112. Chen, I.-S. and K.-T. Shao. 1996. A taxonomic review of the gobiid fish genus Rhinogobius Gill 1859 from Taiwan, with descriptions of at least three new species. Zoological studies 35: 200-214.

113. Erritzoe, J. and H. B. Erritzoe. 1998. Pittas of the world. Cambridge, UK: The Lutterworth Press.

114. Huang, T. C. et al. (eds). 1993-2003. Flora of Taiwan, Vol. 1-6.

115. Jackson, D. A., S. C. Walker, M. S. Poos. 2010. Cluster Analysis of Fish Community Data: "New" Tools for Determining Meaningful Groupings of Sites and Species assemblages. American Fisheries Society Symposium 73:503–527

116. Karr, J. R. 1981. Assessment of biotic integrity using fish communities. Fisheries. 6: 21-27.

117. Lambert, F., M. Woodcock. 1996. Pittas, Broadbills and Asities. Sussex: Pica Press.

118. Lin, R. S., P. F. Lee, T. S. Ding and Y. K. Lin. 2007. Effectiveness of playbacks in censusing the Fairy Pitta (Pitta nympha) during the breeding season. Zoological Studies 46: 242-248.

119. Norton, S, F.,1991. Habitat use and community structure in an assemblage of cottid fishes'. Ecology 72(6)2181-2192

120. Phomikong,P., M. Fukushima, B. Sricharoendham, S. Nohara, T. Jutagate. 2014. Diversity and Community Structure of Fishes in the Regulated Versus Unregulated Tributaries of the Mekong River. River research and applications 30(10)

121. Sládecek V. 1973. System of water quality from the biological point of view. Arch. Hydrobiol. Beih. Ergebnisse der Limnologie 7: 1-218.

122. Sournia, A. 1978. Phytoplankton Manual, United Nations Educational, Scientific and cultural Organization. 337pp.

123. Tao, J. P., X. C. Tan, Z. Yang, X. Wang, Y. P. Cai, Y. Qiao, J. B. Chang.2014 . Fish migration through a fish passage associated with water velocities at the Changzhou fishway (Pearl River, China). Journal of Applied Ichthyology 31 (1): 72-76

124. Teels, B.M., 2002. Methods for evaluating wetland condition-- Developing metrics and indexes of biological integrityp. 45.

125. Whitmore,T. J. 1989. Florida diatom assemblages as indicators of trophic state and pH. Limnol. Oceanogr. 34: 882-895.

126. Zelinka, M., Marvan, P., 1961. Zur Präzisierung der biologischen klassifikation der reinheit fliessender gewässer. Arch Hydrobiol 57, 387-498.
