

# 工程變更設計會勘紀錄

109年02月10日

|         |                                    |         |                                            |
|---------|------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 工程名稱    | 大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出標-疏濬工程) |         |                                            |
| 執行單位    | 管理課                                | 工程編號    | 108-I-01020-055-000<br>108-I-01020-055-100 |
| 承攬廠商    | 鈺宸營造工程有限公司                         | 契約金額    | 13,164,000 元                               |
| 第一次修正金額 | 增加約 300 萬元                         | 第二次修正金額 | -                                          |
| 第三次修正金額 | -                                  | 第四次修正金額 | -                                          |
| 預定進度    | 10.1%                              | 實際進度    | 11.92%                                     |
| 進度超前    | 1.82%                              | 進度落後    | -                                          |

會勘單位及出席人員

鈺宸營造工程有限公司:

廠商專任工程人員: 施科題

本局會勘人員:

設計單位(設計者): 周文志

監造單位(承辦人): 林正行 楊晉琪

## 壹、會勘情形:

案由: 本工程原運輸路線經新北市樹林區北園里里長反映影響里內民眾通行安全, 擬調整管制站位置(含地磅、洗車台), 需辦理變更設計新增相關工項。

一、本案管制站位置(含地磅、洗車台)係依作業計畫書內容設置(108年12月10日水十管字第10850129120號函核定), 相關設備及基礎業於109年01月03日查驗合格在案(詳附件1), 先予敘明。

二、依據本局109年1月31日研商「大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業」運輸路線調整事宜會勘紀錄結論: 「本工程原運輸路線經新北市樹林區北園里里長反映影響里內民眾通行安全, 經研商後地磅管制站改設置於三峽河左岸由田尾街進出」(詳附件2)。擬將管制站(含地磅、洗車台)拆除後設置於三峽河左岸柑城橋下游處, 並配合原管制站(含地磅、洗車台)基礎拆除復舊、水電網路拆遷及施工便道新設。

三、設計者意見: 本案為配合實際情況調整施工, 無其他意見。

四、本案部分工項為新單價, 概估經費增加約250萬元, 加計廠商利管、營業稅及本局管理費等約計50萬元, 合計增加約新臺幣300萬元, 依據工程變更設計暨修正施工預算作業第4條第4項屬地方反應或陳情案件, 經勘查確屬實際需要者, 尚無設計者責任。

## 貳、結論:

一、本工程原運輸路線經新北市樹林區北園里里長反映影響里內民眾通行安全, 擬調整管制站位置(含地磅、洗車台), 需辦理變更設計新增相關工項, 原則同意。

二、會勘結論在原招標目的範圍內無法分割, 如另行招標, 確有重大不便, 且所需經費未逾原主契約金額50%, 尚符政府採購法第22條第1項第6款規定辦理。

三、本次變更係配合現場實需及地方陳情案件辦理, 未涉及原設計疏失。

四、本次修正施工變更設計修正預算約計增加約250萬元, 加計廠商利管、營業稅及本局管理費等約計50萬元, 合計增加約新臺幣300萬元, 奉核後陳報水利署籌措財源(詳經費概算表)。

五、經查109年2月10日承攬廠商(鈺宸營造工程有限公司)為非拒絕往來廠商(詳附件3)。

六、依據『經濟部水利署辦理工程變更設計暨修正施工預算作業注意事項』第10條規定, 俟奉准後准予先行施工; 涉及新增項目新單價部分於完成議價手續後准予先行施工。

(以下空白)

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出標-疏濬工程）

第一次修正施工變更設計經費概算表

| 案由             | 項次 | 項目               | 單位 | 原設計數量 | 修正設計數量 | 單價        | 增減金額小計    | 備註     |
|----------------|----|------------------|----|-------|--------|-----------|-----------|--------|
| 一              | 1  | 新設臨時，施工便道        | 全  | -     | 1.0    | 1,438,828 | 1,438,828 | 新增項目   |
|                | 2  | 地磅、洗車設備及管制站設備拆遷費 | 式  | -     | 1.0    | 452,290   | 452,290   | 新增項目   |
|                | 3  | 管制站及周邊水電、網路拆遷費   | 式  | -     | 1.0    | 120,100   | 120,100   | 新增項目   |
|                | 4  | 鋼筋，連工帶料          | KG | 8,000 | 16000  | 16.50     | 132,000   | 實作結算   |
|                | 5  | 結構用混凝土           | m3 | 250   | 500    | 1,291.20  | 322,800   |        |
|                | 6  | 場鑄結構混凝土用模板，乙種    | m2 | 300   | 400    | 215.01    | 21,501    |        |
|                |    | 小計               |    |       |        |           | 2,487,519 |        |
| 合計             |    |                  |    |       |        |           | 2,487,519 | 小計一    |
| 廠商利管、營業稅及本局管理費 |    |                  |    |       |        |           | 497,504   | 約合計20% |
| 本次修正金額         |    |                  |    |       |        |           | 2,985,023 | 上列兩項總計 |

概算表

## 經濟部水利署第十河川局 函

機關地址：22061新北市板橋區四川路2段橋頭1號

聯絡人：周克志

聯絡電話：02-89669870 #2305

電子信箱：wra10103@wra10.gov.tw

傳 真：02-89665574

附  
入  
字  
一

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國108年12月10日

發文字號：水十管字第10850129120號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：作業計畫書

主旨：有關貴公司提報「大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出標-疏濬工程）」作業計畫書（第二版），尚符合契約規定，本局同意核定，請查照。

說明：復貴公司108年12月4日鈺宸（大漢溪疏濬）字第108120401號函。

正本：鈺宸營造工程有限公司

副本：

## 經濟部水利署第十河川局

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採  
售分離作業（支出標-疏濬工程）


### 作業計畫書 （第二版）

主辦機關：經濟部水利署第十河川局

監造單位：經濟部水利署第十河川局管理課

承攬廠商：鈺宸營造工程有限公司

中 華 民 國 一 〇 八 年 十 二 月

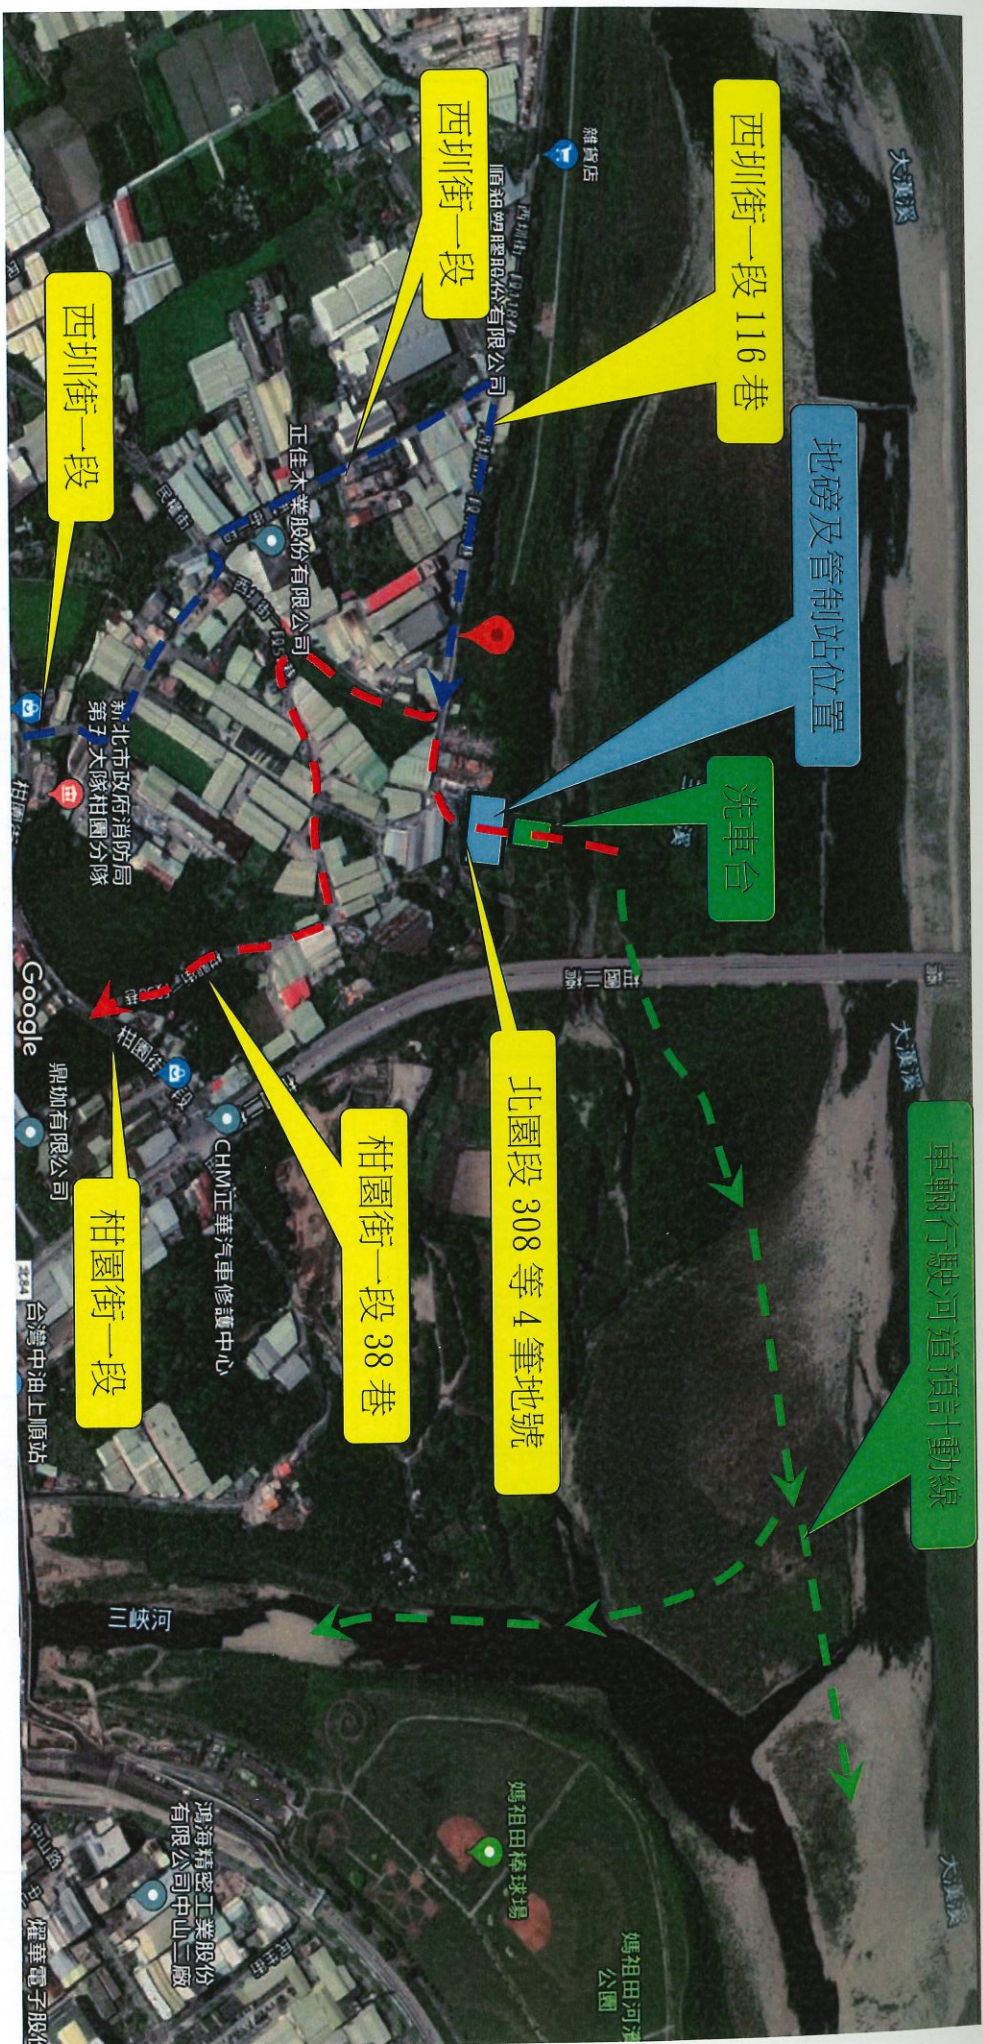

### 工區內行車動線

1. 空車進入動線：樹林區柑園街一段 → 樹林區西圳街一段 → 西圳街一段 116 巷 → 樹林區北園段 308 巷等地號 → 工區
2. 重車出去動線：樹林區北園段 308 巷等地號 → 西圳街一段 116 巷 → 樹林區柑園街一段 38 巷 → 樹林區柑園街一段

# 經濟部水利署第十河川局查驗紀錄

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                    |                                                                   |               |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| 工 程 名 稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | 大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出標-疏濬工程） |                                                                   |               |                                            |
| 主 辦 單 位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | 經濟部水利署第十河川局管理課                     |                                                                   | 工 程 編 號       | 108-I-01020-055-000<br>108-I-01020-055-100 |
| 契 約 金 額<br>(發 包 工 作 費)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | 13,164,000 元                       |                                                                   | 承 包 廠 商       | 鈺宸營造工程有限公司                                 |
| 契 約<br>工 期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 開 工 日 期                                                                    | 108 年 11 月 20 日                    |                                                                   | 工 程<br>進 度    | 預 定<br>實 際                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 完 工 或 展 延                                                                  | 109 年 11 月 13 日                    |                                                                   |               | -                                          |
| 查 驗 日 期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | 109 年 01 月 03 日                    |                                                                   | 奉 派 查 驗 文 號   | 1085013984                                 |
| <p>查驗工程內容：</p> <p>界樁、地磅、管制站、洗車設備、工程告示牌、施工護欄及圍籬及安全告示牌及 C、D 式標示牌。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                                    |                                                                   |               |                                            |
| <p>查驗情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>經現場清點地磅、管制站設備數量，符合契約單價分析表壹.二.2、壹.二.3。</li> <li>地磅及洗車設備已設置，符合作業計畫書施工圖。</li> <li>地磅經標檢局現場測試張貼合格標籤。</li> <li>經現場測試水利署疏濬管理系統連線測試正常，列印測試聯單如附件。</li> <li>界樁施設 73 處，經會同檢測標抽測樁號 C03、C05、C11、C16、C19、E02、E13、E17、E18、E20、K02、K09、F11、F12、F13，符合誤差應在±1.5m 以內之規定，抽測成果如後附。</li> <li>工程告示牌(120cm*75cm)、職業安全衛生告示牌(90cm*150cm)及 C、D 式標示牌各 1 面。</li> </ol> |                                                                            |                                    |                                                                   |               |                                            |
| <p>查驗意見：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>除隱蔽部分由廠商及工務所負責外，其餘符合契約規定，同意查驗合格。</li> <li>相關設備如後續使用功能未能達設置目的，仍應由廠商負責後續改善。</li> </ol> <p>～以下空白</p>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                    |                                                                   |               |                                            |
| 查 驗 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 十 河 局                                                                      | 林 凱 弘                              |                                                                   | 報告者擬辦：        |                                            |
| 會 驗 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 工 務 所                                                                      | 周克志 楊蓉漢                            |                                                                   | 一、擬依查驗意見辦理。   |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 廠 商                                                                        | 林正銘                                |                                                                   | 二、奉核後擲還工務所續辦。 |                                            |
| 單 位 主 管                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 張 玟 斌                                                                      |                                    | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">正工程師林凱弘</div> |               |                                            |
| 批 示                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">正工程師兼管理課課長 田 啓 忠</div> |                                    | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">代為執行</div>    |               |                                            |

## 經濟部水利署第十河川局 會勘紀錄

壹、會勘事由：研商「大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業」運輸路線調整事宜

貳、會勘時間：109 年 1 月 31 日（星期五）上午 10 時

參、會勘地點：柑城橋下

肆、主持人：溫課長啓忠

伍、出席單位及人員：(如后附簽名冊)

記錄：林正修

陸、會勘意見：

新北市樹林區北園里里長辦公室：本工程運輸路線調整至田尾街較為安全影響戶數較少原則同意通行，並會協助告知東園里里長知悉。

柒、會勘結論：

- 一、本工程原運輸路線經新北市樹林區北園里里長反映影響里內民眾通行安全，經研商後地磅管制站改設置於三峽河左岸由田尾街進出，並請北園里里長協助告知東園里里長。
- 二、後續本局將據以辦理本工程變更設計，為避免影響工期，請鈺宸營造工程有限公司於 109 年 2 月 3 日起停工，俟本局完成變更設計程序後再予通知復工。

～以下空白～

研商「大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業」

運輸路線調整事宜簽名冊

主辦單位：經濟部水利署第十河川局

|       |                      |     |            |      |  |
|-------|----------------------|-----|------------|------|--|
| 時 間   | 109 年 1 月 31 上午 10 時 |     | 地 點        | 柑城橋下 |  |
| 主 持 人 | 溫啟忠                  |     | 記 錄        | 林正修  |  |
| 出席人員  | 單 位                  | 職 稱 | 簽名(請以正楷書寫) | 備 註  |  |
|       | 1 新北市樹林區北園里辦公室       | 張   | 王仲卿        |      |  |
|       | 2                    |     |            |      |  |
|       | 3                    |     |            |      |  |
|       | 4 鈺盛營造工程有限公          | 主任  | 張玟玟        |      |  |
|       | 5                    |     |            |      |  |
|       | 6                    |     |            |      |  |
|       | 7 本局工務所              |     | 林正修        |      |  |
|       | 8                    |     | 楊景漢        |      |  |
|       | 9                    |     |            |      |  |
|       | 10                   |     |            |      |  |
|       | 11                   |     |            |      |  |
|       | 12                   |     |            |      |  |
|       | 13                   |     |            |      |  |
|       | 14                   |     |            |      |  |

# 拒絕往來廠商

以廠商資料查詢拒絕往來廠商名單，查詢結果如下：

|                               |
|-------------------------------|
| 查詢特定條件為                       |
| 廠商代碼：85671438<br>(鈺成營造工程有限公司) |
| 廠商名稱：鈺成營造工程有限公司               |

資料取得時間：  
109/02/10 11:43

| 項次                              | 廠商代碼 | 廠商名稱 | 負責人姓名 | 工廠隸屬之事業主體統一編號及名稱 | 備註 | 機關名稱 | 生效日 | 截止日 |
|---------------------------------|------|------|-------|------------------|----|------|-----|-----|
| 無符合條件資料                         |      |      |       |                  |    |      |     |     |
| [第一頁/上一頁] <1> [下一頁/最後一頁] 共有0筆資料 |      |      |       |                  |    |      |     |     |

附件三
